



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2022

Impulsando el desarrollo sostenible del país,
a través de la adaptación al cambio climático

Septiembre de 2022



Fondo Adaptación



Equipo Directivo Fondo Adaptación:

Javier Pava S.
Gerente (E)

Juan Carlos Escobar
Subgerente de Gestión Del Riesgo

Andrés Parra Beltrán
Subgerente de Estructuración

Helga Milena Hernández
Subgerente de Proyectos

Iliana Margarita Garzón
Subgerente de Regiones

Fanny Jeannette Mora
Asesora III - Encargada de las
Funciones de Secretaria General

Claudia Díaz Hernández
Asesora I – Encargada de las
Funciones de Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Cumplimiento

Equipo Técnico:

Diego M. Bustos Q.
Profesional II - Equipo de Trabajo
Planeación y Cumplimiento

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	2022/07/29	Documento inicial segundo trimestre de 2022
2	2022/08/02	Actualización en el número de viviendas contratadas en el Departamento de Antioquia, en el cuadro de seguimiento a la ejecución de las metas regionalizadas de vivienda de la Subgerencia de Proyectos.

**Informe de
ejecución del
Plan de Acción**

2022

Contenido

Presentación

1. Introducción

2. Contexto de la Formulación y el Seguimiento del Plan de Acción 2022

2.1. Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2022

2.2. Criterios para la evaluación del Plan de Acción

2.3. Esquema de seguimiento

3. Ejecución del Plan de Acción 2022 por Objetivos Estratégicos

3.1. Objetivos Estratégicos Misionales

- Seguimiento al Plan de Acción por Macroproyecto
- Seguimiento al Plan de Acción por Sector
- Seguimiento al Plan de Acción regionalizado y por Subgerencia

3.2. Objetivos Estratégicos Transversales

- Área Subgerencia de Regiones
- Área Gerencia – Equipo de Comunicaciones
- Área Oficina de Planeación y Cumplimiento
- Área Secretaría General
- Indicadores Plan de Acción de Alcance Institucional

Presentación

El año 2022, reviste para el Fondo Adaptación (FA) una importancia particular. La Entidad se acerca a finalizar la tarea de concluir y entregar la mayoría de los proyectos con presupuesto asignado que, como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: El Fenómeno de “La Niña” 2010-2011”, fueron identificados, estructurados y gestionados para:

- (i) La recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, medio ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados.
- (ii) La implementación de acciones de recuperación económica y social, junto con comunidades y poblaciones.
- (iii) La ejecución de intervenciones integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático con un enfoque multisectorial y regional.
- (iv) El diseño de soluciones definitivas a problemas focalizados y recurrentes asociados al riesgo hidrometeorológico.

En el marco del Documento Conpes 3776 de 2013, la Entidad ha desarrollado cinco macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no tienen precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con innumerables aprendizajes que posicionan al FA como una entidad líder en la concepción, estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de largo plazo y con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático.

En el Plan de Acción de la vigencia 2022 se plantearon las metas para terminar y entregar la mayoría de los proyectos pendientes por culminar, además incluye metas transversales que dan cuenta del compromiso de la Entidad por convertirse en un referente de la administración pública y ser reconocida como institución líder en la ejecución de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en Latinoamérica.

El presente informe de seguimiento al Plan de Acción 2022 busca presentar y socializar a los grupos de interés del Fondo Adaptación, el estado de las acciones con un enfoque regional, sectorial y por macroproyecto; así como un balance de las actividades de apoyo que promueven las condiciones para el cumplimiento de las metas.

1. Introducción

En el Plan de Acción 2022 del Fondo Adaptación, se establecen las acciones y determinan las metas, e indicadores, que definen la hoja de ruta de la Entidad para impulsar el logro de los objetivos estratégicos y cumplir con su misionalidad durante la vigencia correspondiente.

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que establece que, cada uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán como fundamento para la evaluación de resultados.

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 74), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, y distribución presupuestal de los proyectos de inversión, ligados a los indicadores de gestión.

El Plan de Acción incluye elementos de los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Decreto 1499 de 2017 y las demás disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El propósito de este informe de ejecución postula como objetivo general informar a los diversos grupos de interés y a la ciudadanía, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2022 del Fondo Adaptación, y, como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados periódicos de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

El seguimiento al Plan de Acción 2022 se realiza de manera agregada y a su vez desagregado por: Objetivo estratégico, Sector, Macroproyecto, Subgerencia y Departamento; en el mismo sentido en que se formuló la planeación de la vigencia. En cada caso, por cada uno de los indicadores agregados se registra el avance cuantitativo, acompañado por el resumen cualitativo del estado de las intervenciones o actividades programadas.

2. Contexto de la Formulación y el Seguimiento del Plan de Acción 2022

2.1. Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción

Para facilitar la consulta del Informe de Seguimiento, este se encuentra alineado con la estructura del Plan de Acción 2022, que a su vez da cuenta de los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2022 y la organización de la planta de personal establecida en la Resolución 343 de 2021 y en la Resolución 200 de 2022.

En este sentido, el Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2022 contempla un esquema regionalizado de análisis de los avances, donde los Subgerentes de Riesgos, Proyectos y Estructuración lideran las acciones encaminadas a lograr los resultados contemplados para cada uno de los departamentos del país; a su vez, los líderes de equipo sectorial son los encargados de ejecutar las acciones específicas de un sector en todo el territorio nacional, y los líderes de macroproyecto son los encargados de la ejecución de las intervenciones integrales e intersectoriales en una zona geográfica específica; lo anterior, con el acompañamiento de la Subgerencia de Regiones, responsable de coordinar los intereses de las regiones y sus comunidades y servir como facilitador en su relación con el Fondo. Simultáneamente, los líderes de procesos transversales y de apoyo, son responsables de promover las condiciones administrativas requeridas para el avance exitoso de las intervenciones programadas y su seguimiento.

En consecuencia, el presente documento expone un seguimiento combinado entre gestiones sectoriales a cargo de cada líder sectorial y de macroproyecto y gestiones regionales lideradas por los subgerentes, lo que le busca dar una mayor contundencia a la gestión en términos de resultados.

2.2. Criterios para la evaluación del Plan de Acción

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI. El avance anual de las metas del PEI 2019-2022 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de cada vigencia.

La elaboración del Plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias (las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que contempla que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objeto de tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados).

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente:

Criterios	Validación
Claro. Preciso e inequívoco	Productos Tangibles
Relevante. Apropiado al tema en cuestión	Entregables del Proyecto
Económico. Disponible a un costo razonable	Meta Financiada
Medible. Abierto a validación independiente	Son sujeto de revisión bajo evidencia
Adecuado. Base para estimar resultados	Cuentan con Fuentes de información
Sensible. Se observan cambios en el tiempo	Avanzan en Períodos de Medición C/M/L

Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. La estimación de los resultados se hace con una ponderación importante de estas circunstancias, en la que juega un papel relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales eventos.

2.3. Esquema de seguimiento

El Plan de Acción del Fondo Adaptación permite medir periódicamente el ejercicio institucional desde diferentes perspectivas, con el fin de identificar brechas en la gestión y facilitar la toma de decisiones oportunas para la mejora continua.


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

El seguimiento al Plan de Acción de la Entidad permite hacer análisis cuantitativo y cualitativo para medir el desempeño de la siguiente estructura:


- 6 Objetivos Estratégicos (4 misionales y 2 transversales)
- 7 Áreas
- 25 Equipos
- 27 Gerentes / Líderes de meta
- 5 Macroproyectos y 7 sectores
- 24 Departamentos
- 86 Acciones estratégicas
- 93 indicadores con 363 metas periódicas (mensuales, trimestrales y anuales)

Para el Seguimiento al Plan de Acción se han establecido dos indicadores de control que se presentan gráficamente de la siguiente forma:

1. Indicador de Cumplimiento de Metas Consolidadas. Valoración de una acción estratégica, portafolio de intervenciones, o indicadores agrupados por proceso o área, identificando la relación entre el objetivo, el punto de partida o línea base y el fin o meta medible que se quiere alcanzar en el periodo específico de la medición. Como resultado se obtiene un análisis de cumplimiento o rezago de las metas en el periodo.

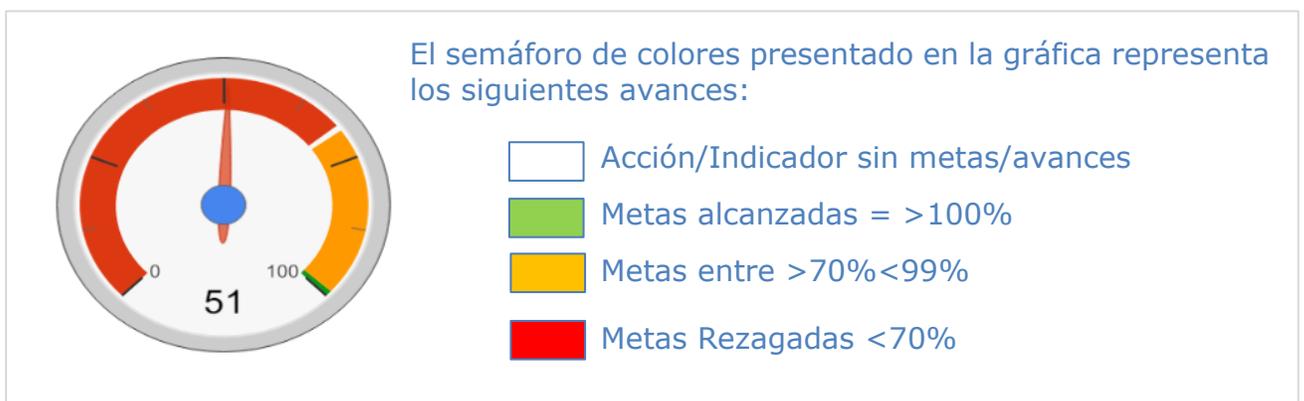

2. Indicador de Avance en el tiempo. Muestra el progreso porcentual de un objetivo en el tiempo, comparando lo programado en la vigencia versus lo ejecutado de manera periódica.

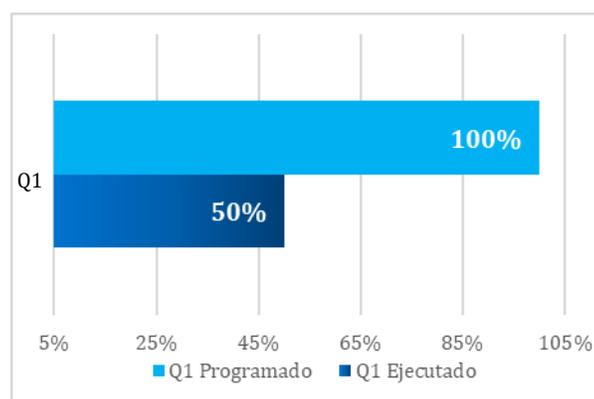

3. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos

La perspectiva de planeación es el punto de vista desde el cual se programa y hace seguimiento y análisis para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Institucional y el Plan de Acción.

El Fondo Adaptación contempla dos perspectivas en su planeación acordes con el perfil de los resultados a lograr en los objetivos estratégicos: la perspectiva externa, en la cual se contempla el punto de vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas por el Fondo (Misional), y la perspectiva interna, desde el que se contempla los resultados del cliente interno (Transversal). Los objetivos estratégicos por cada perspectiva son los siguientes:

Perspectiva externa

OE1. Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

OE2. Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

OE3. Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

OE4. Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población.

Perspectiva interna

OE5. Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

OE6. Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva


En este sentido, el Plan de Acción para la vigencia 2022, contiene un total de 93 indicadores con 363 metas asociadas, distribuidos en los 6 objetivos estratégicos en

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

mención. A continuación, se expone el avance integral de la entidad, con base en los indicadores con metas programadas para el periodo con corte al 30 de septiembre:

De un total de 113 indicadores con metas programadas para el tercer trimestre del año 2022, se identifican 32 indicadores con metas cumplidas al 100% o superior, 6 con un avance mayor al 70% y 75 indicadores sin avance o con un avance menor al 70%.

Se concluye un cumplimiento total del 50,5% de la programación de la entidad para el mes de septiembre de 2022 y un avance del 30% versus el 59% esperado a la fecha de corte. Las metas rezagadas han sido evaluadas y cuentan con un esquema de seguimiento estricto que busca subsanar las dificultades en el menor tiempo posible.

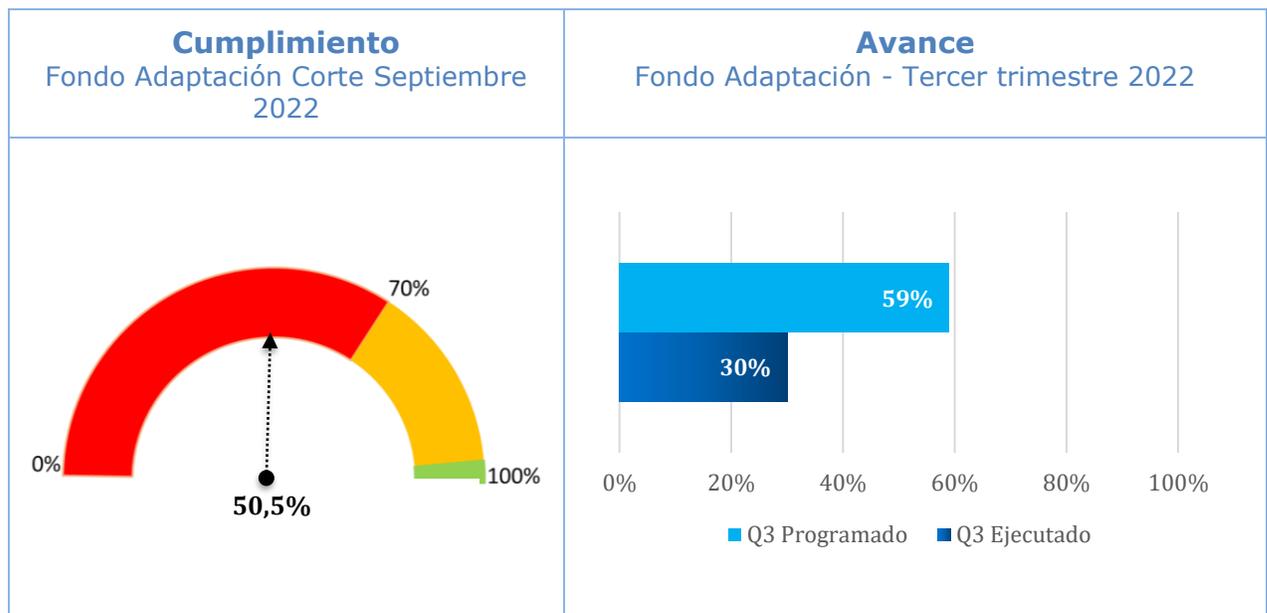

Indicadores con metas programadas para el periodo	
Indicadores con metas alcanzadas = >100%	32
Indicadores con metas entre >70%<99%	6
Indicadores con metas Rezagadas <70%	75


Al discriminar este análisis por objetivo estratégico, se obtienen los resultados que se exponen a continuación, en cumplimiento y avance agregado:

Objetivo Estratégico #1: Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

Entre las metas cumplidas durante el tercer trimestre de la vigencia se destacan la terminación y entrega de 62 soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

de Jarillón de Cali, la terminación de 80 soluciones de vivienda y la contratación de 720 soluciones de vivienda para hogares en riesgo del mismo proyecto. También se realizó la entrega del SENA en el municipio de Majagual en el departamento de Sucre, la entrega de los diseños de obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar) y la contratación de acompañamiento social para la implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí- La bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar.

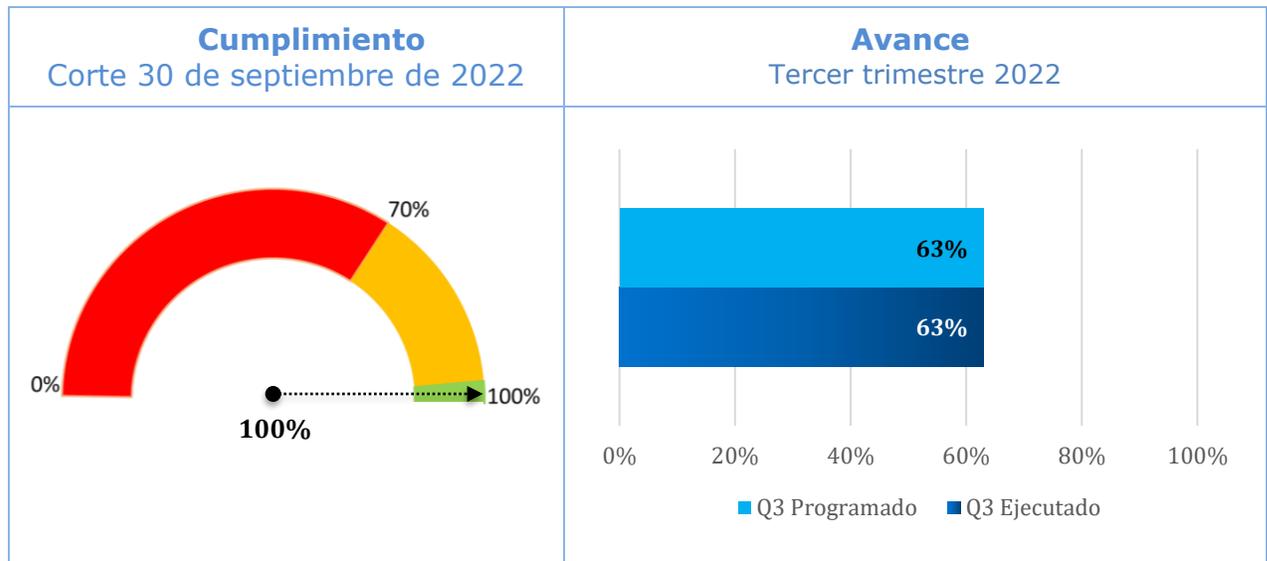


El principal rezago se asocia con la contratación de 128 soluciones de vivienda para el municipio de Gramalote en el departamento Norte de Santander y la terminación de 180 soluciones de vivienda en el marco del Macroproyecto Jarillón de Cali.

Objetivo Estratégico #2: Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.



Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

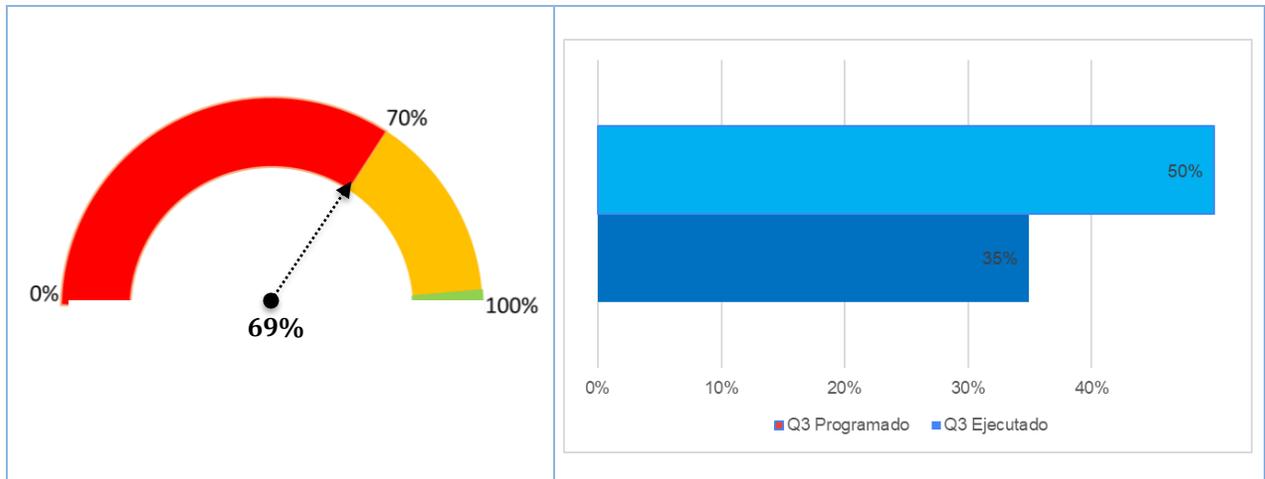

Entre las metas cumplidas alcanzadas durante el tercer trimestre del año 2022 se encuentran la terminación de 449 soluciones de vivienda y la entrega de 460 soluciones de vivienda adjudicadas a familias ubicadas en 10 municipios a lo largo de 7 departamentos. A lo anterior se suma:


- ✓ Entrega acueducto en el municipio de Samaniego – Nariño
- ✓ Terminación Institución Educativa IE Técnica Agropecuaria Puerto De Venecia en el municipio de Achí – Bolívar
- ✓ Entrega Centro Educativo CE De Regencia en el municipio de Montecristo – Bolívar
- ✓ Entrega Sede CE Básico Ampliado De Bomba en el municipio de Pedraza - Magdalena
- ✓ Terminación ESE Hospital Local De Mahates – Bolívar
- ✓ Entrega Hospital Nivel I De La Vega-Ese Suroriente – Cauca
- ✓ Terminación y entrega Hospital Del Cincuentenario Nivel I-Ese Norte 3 en el municipio de Puerto Tejada - Cauca
- ✓ Estructurar el 100% de los estudios de sector y mercado de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y macroproyectos
- ✓ Evaluación técnica, financiera y económica de las diferentes modalidades de contratación de la Entidad.
- ✓ Identificar y / o establecer y/o actualizar políticas y lineamientos, para la priorización y/o estructuración de los proyectos desfinanciados y/o nuevos proyectos de la Entidad
- ✓ Revisión ítems o APU's contractuales adicionales / no previstos de los contratos en ejecución

El principal rezago en este objetivo estratégico se asocia con la terminación de un alcantarillado en el municipio de Cimitarra – Santander; la terminación de cuatro sedes educativas en los departamentos del Cesar, Magdalena y Sucre y la entrega de 2 sedes educativas en los departamentos de Atlántico y Bolívar; así como la terminación de una IPS en Antioquia y la entrega de una IPS en Bolívar. En relación con las soluciones de vivienda el principal retraso en entregas se presenta en los departamentos de La guajira y Sucre.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

A lo largo del documento y la descripción cualitativa de los indicadores, se detallan las gestiones que se adelantan a favor de avanzar con los logros por sector.

Objetivo Estratégico #3: Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

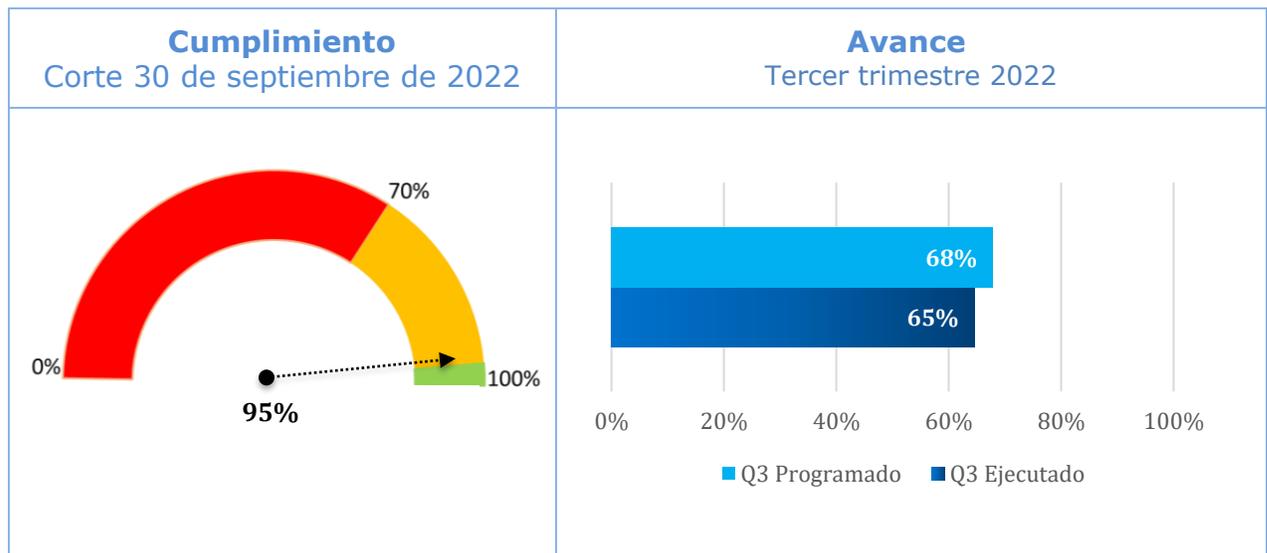


El avance programado a tercer trimestre en la estrategia de gestión del conocimiento corresponde principalmente a la actualización de la información requerida para el proceso de empalme entre gobiernos, que incluye el balance de las postulaciones del CONPES 3776 de 2013, por sector y macroproyecto, así como la información correspondiente a meta financiada y no financiada, proyectos que han sido ejecutados por otras entidades y los proyectos no viables técnica y/o jurídicamente; así como el detalle de las intervenciones adelantadas en el cuatrienio y las entregas que se encuentran en proceso de contratación o ejecución y documentos técnicos que buscan brindar elementos para el análisis del alcance del Fondo hacia el futuro. Por otra parte, se trabaja en la revisión del alcance de la intervención integral de la región de La Mojana.

A esto se suma el lanzamiento de la herramienta VIDHAG, en el cual se realizó la presentación y entrega de la herramienta tecnológica en ambiente web para la integración, gestión y análisis de información a favor de articular los procesos de ordenamiento ambiental, permitiéndole al IDEAM publicar los productos y servicios de información relacionados con el monitoreo de variables ambientales en Colombia, para el fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y del Sistema de Información Ambiental para Colombia –SIAC.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Objetivo Estratégico #4: Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de su resiliencia de las regiones y de su población.

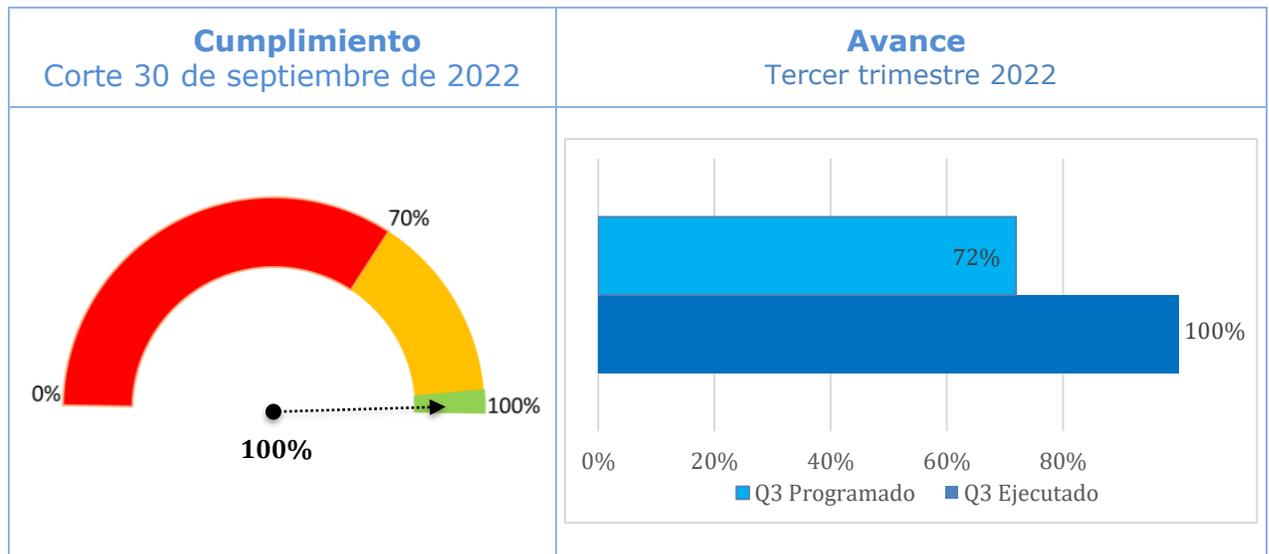


El avance en este objetivo estratégico refleja la importancia de la gestión social para el Fondo Adaptación, por lo que se ha promovido fuertemente los espacios que permiten la implementación de la Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social, así como la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Objetivo Estratégico #5: Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.




Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

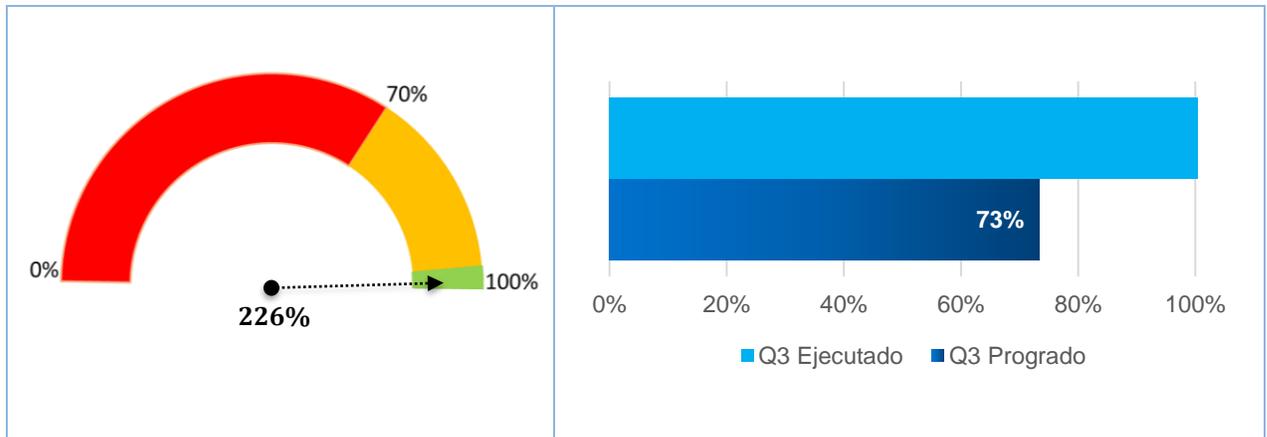

El avance y cumplimiento responden a las acciones realizadas en el marco de las estrategias de comunicaciones internas y externas, acompañado de un adelanto en la ejecución del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Objetivo Estratégico #6: Modernizar y fortalecer el Funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

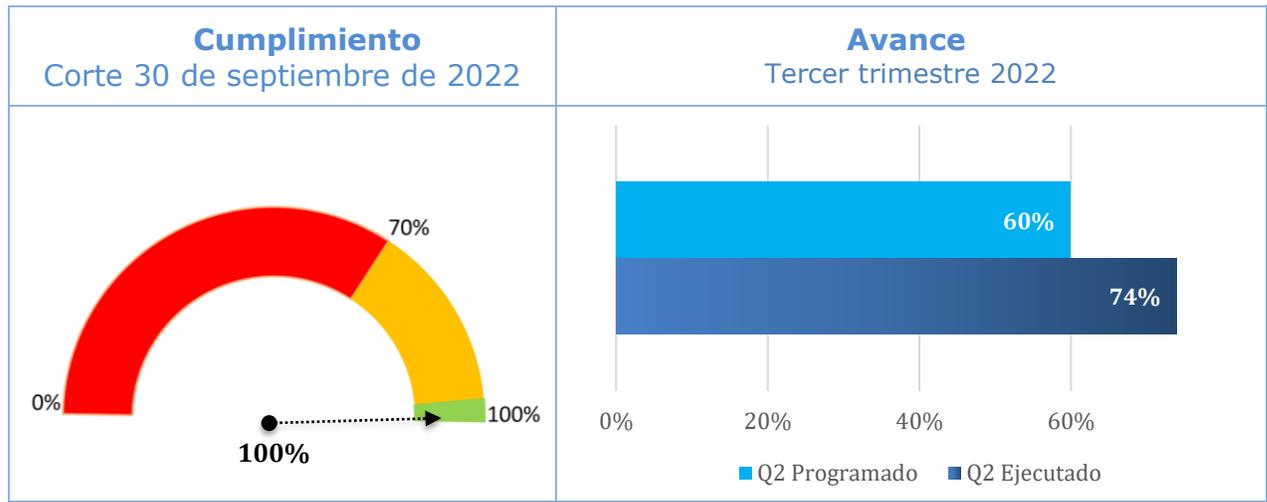

El avance y cumplimiento responden al alcance del Plan de Capacitación realizado en el periodo y la participación de los colaboradores del Fondo Adaptación; al igual que a la gestión que se evidencia en los procesos de contratación y gestión documental, entre otros.

3. 1. Objetivos Estratégicos Misionales

Seguimiento al Plan de Acción por Macroproyecto


El Plan de Acción 2022 contiene 49 indicadores para medir el cumplimiento de 320 metas de los macroproyectos y sectores, asociada cada una de ellas a las intervenciones programadas para la vigencia. Para este caso, los indicadores y sus metas responden al ciclo de vida del proyecto:

- La fase de estructuración culmina con la contratación y se verifica a través del acta de inicio;
- La fase de ejecución culmina con la terminación y se verifica con el acta de terminación;
- La fase de entrega culmina con la verificación de entrega final al beneficiario y se verifica con la firma por las partes del acta de entrega.

De los indicadores relacionados con las metas de los macroproyectos y sectores el balance es el siguiente:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

CANAL DEL DIQUE

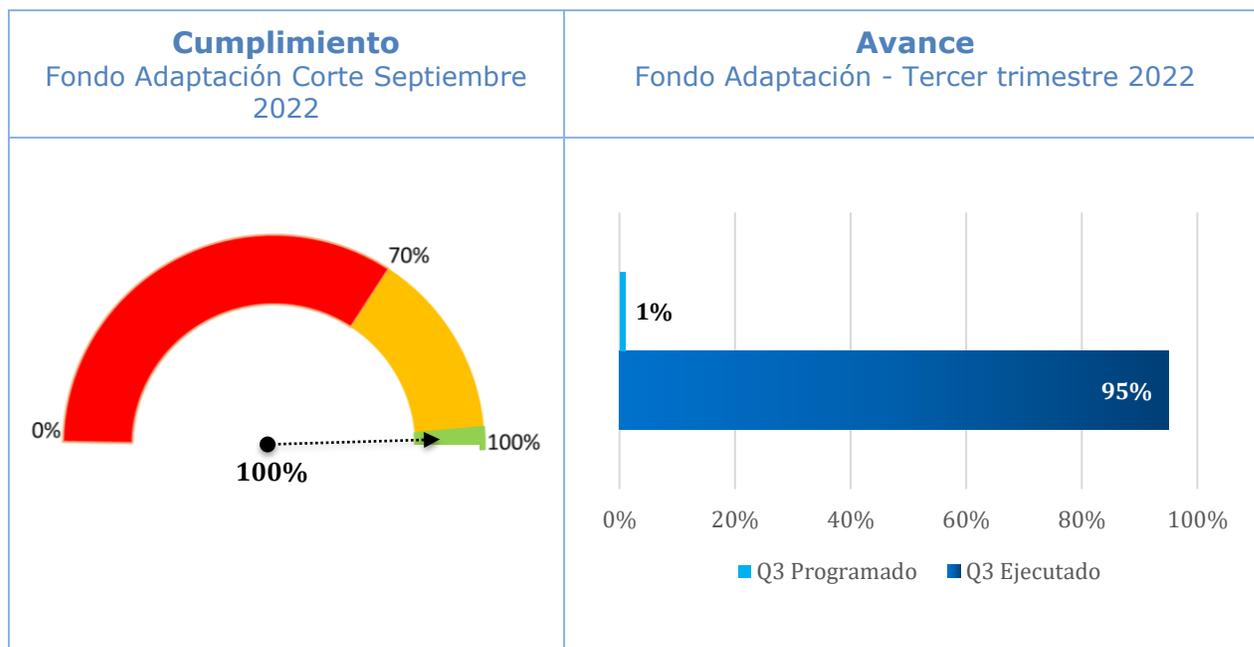

Portafolio/Programa/Proyecto:

CANAL DEL DIQUE

Gerente de Meta:

Asesor E.T Macroproyecto Canal del Dique

Objetivo Estratégico 2018-2022 #1 Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022 (Programas/Proyectos/Actividades /Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA01_Terminar proceso de selección de la APP del Canal del Dique	(AEA01)_Proceso de selección de la APP del Canal del Dique	1	-	-	-	1	N.A.
AEA02_Terminar los contratos de estructuración	(AEA02)_contratos de estructuración (BBI_GC), terminados	2	-	-	-	2	N.A.
AEA03_Elaborar gestión predial	(AEA03)_Gestión predial, elaborada	100%				100%	98

Mes	Avance Cualitativo
(AEA01)_Proceso de selección de la APP del Canal del Dique	
Enero	Mediante aviso modificatorio No. 1 del 24 de enero de 2022, para el proceso de licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021, emitido para la adjudicación de un contrato de concesión bajo el esquema APP al Proyecto de "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE", se comunicó la modificación

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	al cronograma de la licitación. Se continúa en la gestión del logro de las aprobaciones del proyecto ante las entidades gubernamentales.
Febrero	Mediante aviso modificatorio No. 3 del 28 de febrero de 2022, para el proceso de licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021, emitido para la adjudicación de un contrato de concesión bajo el esquema APP al Proyecto de "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE", se comunicó la modificación al cronograma de la licitación. Se avanza con la solicitud de distribución de recursos a través del CONFIS y la concertación de acuerdos en la totalidad de los procesos consultivos con las comunidades del Dique, luego de haber obtenido el aval del DNP para la ejecución del proyecto mediante el mecanismo de APP.
Marzo	Mediante resolución 20227030004215 del 25 de marzo de 2022, la vicepresidencia de estructuración de la ANI ordenó la apertura de la licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 para la adjudicación de un contrato de concesión bajo el esquema APP al Proyecto de "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE". Lo anterior, luego de que el mismo 25 de marzo el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, autorizara a la ANI comprometer el cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras en su presupuesto, por los montos del pliego de condiciones del proceso.
Abril	En abril se continuó con el recibo de las Observaciones realizadas por los interesados al Pliego Definitivo, estas observaciones vienen siendo atendidas con el apoyo de los estructuradores, para su posterior publicación en SECOP I.
Mayo	El 25 de mayo, se publicó la Adenda No. 1 al proceso de selección, con la cual se presentaron los ajustes a los apéndices técnicos y al borrador de la minuta de concesión, en atención a las observaciones del pliego definitivo. El cronograma del proceso también fue ajustado, ampliando el plazo para la presentación de ofertas hasta el 1 de julio de 2022.
Junio	El 15 de junio de 2022 se publicó la Adenda No. 3 al proceso de selección, con la cual se presentaron modificaciones a los apéndices técnicos 1 y 4 y al borrador de la minuta de concesión, en atención a las observaciones extemporáneas del pliego definitivo. El cronograma del proceso también fue ajustado según Adenda No. 2, ampliando el plazo para la presentación de ofertas hasta el 13 de julio de 2022.
Julio	Mediante resolución 20227030004215 del 25 de marzo de 2022, la vicepresidencia de estructuración de la ANI ordenó la apertura de la licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 para la adjudicación de un contrato de concesión bajo el esquema APP al Proyecto de "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE". Así, el pasado 7 de julio se cumplió el plazo para expedición de Adendas, fecha en la cual se contó con la publicación de 4 de estas Adendas en la página del SECOPI. Posteriormente, el 13 de julio se dio el cierre para la recepción de ofertas, recibándose la de un proponente, que según la evaluación del 21 de julio cumple con los requisitos jurídicos y financieros. La audiencia pública de adjudicación está prevista para el 4 de agosto de 2022.
Agosto	El 11 de agosto de 2022 se publica en SECOP I la resolución ANI No. 1100 del 11 de agosto de 2022 "Por la cual se ordena la suspensión de la licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021" bajo la modalidad de Asociación Público-Privada del proyecto Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique a partir del 11 de agosto y hasta el 12 de septiembre de 2022 inclusive, por las siguientes razones: " (...) 1. Que se considera prudente la apertura de espacios de diálogo con los habitantes de las zonas de influencia del proyecto, con el fin de conocer sus

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>preocupaciones e inquietudes en relación con el alcance del proyecto y sus impactos sociales y ambientales, espacios que contarán con el acompañamiento de la Comisión Accidental de Seguimiento al proceso de adjudicación del Canal del Dique.</p> <p>2. Que es importante revisar internamente las observaciones que, en el marco de sus competencias, ha realizado los órganos de control y la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con el proyecto.</p> <p>3. Que, en general, resulta de la mayor relevancia adelantar mesas de dialogo y socialización con autoridades locales, gremios, comunidades y actores claves en el desarrollo de este megaproyecto fluvial, a efectos de socializar sus principales aspectos técnicos, sociales y ambientales.</p> <p>(...)”</p> <p>Como parte de este proceso de socialización y apertura de espacio de diálogo, el Gerente encargado, Subgerente de Riesgos y Líder del E.T. Mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático, asistieron el 26 de agosto de 2022 a la instalación de la comisión accidental “Canal del Dique – Río Magdalena” en el municipio de Santa Lucía, Atlántico, convocada por representantes del Congreso de la República, en la cual se escuchó a los líderes de las comunidades circundantes al Canal del Dique así como representantes de diferentes sectores de Gobierno sobre la percepción respecto al proyecto y los problemas que aquejan actualmente esta región. Allí se definió finalmente la instalación de un puesto de mando unificado – PMU, al cual fue invitado el Fondo Adaptación, para evaluar dicha problemática y tomar decisiones al respecto. Este será acompañado por parte del Fondo, conforme sea solicitado por el Gobierno Nacional. La primera reunión de este PMU se realizó el 31/08/2022 con asistencia del Fondo.</p>
Septiembre	<p>El 9 de septiembre de 2022 se publicó en SECOP I la resolución ANI No. 20227030013965 del 9 de septiembre de 2022 “Por la cual se ordena la prórroga de la suspensión de la licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021” bajo la modalidad de Asociación Público-Privada del Proyecto Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique hasta el treinta (30) de septiembre de 2022 inclusive, para adelantar nuevos espacios de socialización del Proyecto, como los que se han venido realizando desde agosto de 2022 por instrucción del gobierno nacional.</p> <p>El 30 de septiembre de 2022 nuevamente se emitió publicación de la ANI, con resolución No. 20227030015765, “Por la cual se ordena la prórroga de la suspensión de la licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021”, hasta tanto sea emitido el fallo de tutela en cuyo trámite se encuentra vigente la medida provisional de suspensión de la Licitación Pública No VJ-VE-APP-IPB-006-2021, o se decida el levantamiento de esta en la oportunidad procesal correspondiente, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.</p>
(AEA02)_contratos de estructuración (BBI_GC), terminados	
Enero	<p>Los dos (2) contratos de consultoría para la estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos continúan en la etapa de Acompañamiento al proceso de aprobaciones y cierre fiscal y contratación del proyecto “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE” a través del mecanismo de APP. Actualmente, se tramita solicitud de prórroga al contrato de consultoría FA-CD-I-S-242-2019, con fecha de terminación prevista para el 24 de octubre de 2022.</p>
Febrero	<p>No aplica para el periodo del reporte</p>
Marzo	<p>Los 2 contratos de consultoría para la estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos continúan en la etapa de Acompañamiento al proceso de aprobaciones y cierre fiscal y contratación del proyecto “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE” a través del mecanismo de APP. Desde el 25 de marzo de 2022 los estructuradores atienden las observaciones al pliego definitivo que fue publicado por la ANI para el proceso de licitación pública de selección del futuro concesionario.
Abril	Desde el 25 de marzo de 2022 los estructuradores atienden las observaciones al Pliego Definitivo, apoyan las peticiones allegadas a las entidades ANI, Cormagdalena y Fondo y continúan en la Promoción del Proyecto, con la participación en reuniones realizadas con potenciales interesados.
Mayo	Desde el 25 de marzo de 2022 los estructuradores atienden las observaciones al Pliego Definitivo en tiempo y extemporáneas, apoyan las peticiones allegadas a las entidades ANI, Cormagdalena y Fondo, y continúan en la Promoción del Proyecto, con la elaboración de presentaciones y participación en reuniones con potenciales interesados
Junio	Desde el 25 de marzo de 2022 los estructuradores atienden las observaciones al Pliego Definitivo en tiempo y extemporáneas, apoyan las peticiones allegadas a las entidades ANI, Cormagdalena y Fondo, y continúan en la Promoción del Proyecto, con la elaboración de presentaciones y participación en reuniones con potenciales interesados.
Julio	Los 2 contratos de consultoría para la estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos continúan en la etapa de Acompañamiento al proceso de aprobaciones y cierre fiscal y contratación del proyecto “RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE” a través del mecanismo de APP. Del 25 de marzo al 7 de julio de 2022 los estructuradores atendieron las observaciones al Pliego Definitivo en tiempo y extemporáneas, con lo cual, continuó el desarrollo del cronograma de la licitación. Los estructuradores además continúan apoyando la atención a las peticiones, acciones de tutela, entre otros, que se presentan ante las entidades ANI, Cormagdalena y Fondo.
Agosto	Teniendo en cuenta la suspensión de la licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021, de conformidad con las razones que motivan dicha suspensión, la ANI solicitó al Fondo Adaptación mantener los contratos de consultoría de los estructuradores activos, en razón a que la Agencia se encuentra dando respuesta a múltiples actores como son entes de control, terceros interesados, las nuevas directivas de la entidad y en general al nuevo Gobierno Nacional sobre el proyecto y para ello se requiere el apoyo técnico, jurídico y financiero de los estructuradores. Por lo anterior, los estructuradores han atendido en el mes de agosto requerimientos de entidades como la Contraloría General de la República, Ministerio de Ambiente y comunidades, en los cuales se ha solicitado información técnica, jurídica, y financiera acerca del proyecto de APP del Canal del Dique.
Septiembre	En el marco del convenio interadministrativo 001-003-005 de 2019, la ANI recomendó con radicado R-2022-021291 del 23 de septiembre de 2022 la necesidad de prorrogar los contratos de estructuración hasta el 31 de diciembre de 2022, para continuar acompañando las socializaciones en la zona de influencia del Proyecto y la atención de las peticiones sobre inquietudes del Proyecto. En este sentido, el Fondo solicitó a finales de septiembre de 2022 a los 2 estructuradores, Bonus Banca de Inversión y Gómez Cajiao, la presentación de la solicitud de prórroga de sus contratos para adelantar los trámites modificatorios en octubre de 2022.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEA03)_Gestión predial, elaborada	
Enero	Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 81.92%, de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación. Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-097-2022 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el estudio previo de los avalúos comerciales se encuentra terminado en revisión jurídica para adelantar el proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía.
Febrero	Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 83%. Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-097-2022 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados el cual alcanzó un porcentaje de avance del 22%. El estudio previo de los avalúos comerciales se encuentra terminado en revisión jurídica, por parte del ET jurídico sectorial para adelantar el proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía.
Marzo	Al corte de este seguimiento, el avance acumulado asciende a un 90%. Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-003-2021 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos para radicar ante el IGAC con un avance del 36.17%. El estudio previo de los avalúos comerciales se encuentra terminado en revisión jurídica para adelantar el proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía.
Abril	Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 91%. Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-003-2021 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos para radicar ante el IGAC con un avance del 53.67%. El proceso de contratación para la elaboración de los avalúos comerciales por selección abreviada de menor cuantía se encuentra radicado para publicación.
Mayo	Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 92%. Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-003-2021 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos para radicar ante el IGAC con un avance del 63%. El proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto es "Elaboración de avalúos comerciales de predios A nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación" se encuentra en licitación con el pliego de condiciones definitivo y publicado.
Junio	Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 92%. Respecto a la ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-003-2021, el avance se mantiene en el 63%, dado que el IGAC se encuentra en revisión de los documentos entregados por el contratista.


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>El proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto es "Elaboración de avalúos comerciales de predios A nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación" se encuentra en licitación listo para adjudicación; en respuesta a las observaciones presentadas por uno de los 9 proponentes.</p>
Julio	<p>Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 94.75%, de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.</p> <p>Se encuentra suspendido el contrato FA-SAMC-I-S-003-2021 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos para radicar ante el IGAC con un avance del 63%, se encuentra suspendido por 2 meses dado que el IGAC se encuentra en revisión de los documentos entregados por el contratista, se estima que la entidad le dé continuidad al trámite de visita a los predios, elaboración, notificación e inscripción de los actos administrativos, en el tiempo de la suspensión.</p> <p>Se suscribió el contrato FA-SAMC-I-S-097-2032, cuyo objeto es "Elaboración de avalúos comerciales de predios A nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación" se encuentra con acta de inicio firmada.</p>
Agosto	<p>Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 98%, de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.</p> <p>Asimismo, se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-097-2022 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos radicados ante el IGAC con un avance del 63%, dado que no se presenta avance el contrato se encuentra suspendido.</p> <p>También, se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-206-2022 "Elaboración de avalúos comerciales de predios A nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación" está pendiente de elaboración y publicación el cronograma del PSA</p>
Septiembre	<p>Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 100%, con las actividades hasta ahora proyectadas, en espera de la terminación de los procesos que se adelantan en los contratos FA-SAMC-I-S-097-2022 Rectificación de Cabida y linderos y FA-SAMC-I-S-206-2022 de avalúos comerciales, con los cuales se deberá actualizar la línea base de la gestión predial inhouse de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución,</p> <p>Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-097-2022 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos radicados</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>ante el IGAC con un avance del 63%, el 15 de septiembre se suscribió otrosí #2 el cual amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-206-2022 "Elaboración de avalúos comerciales de predios A nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación" se encuentra pendiente de elaboración y publicación el cronograma del PSA.</p>

LA MOJANA

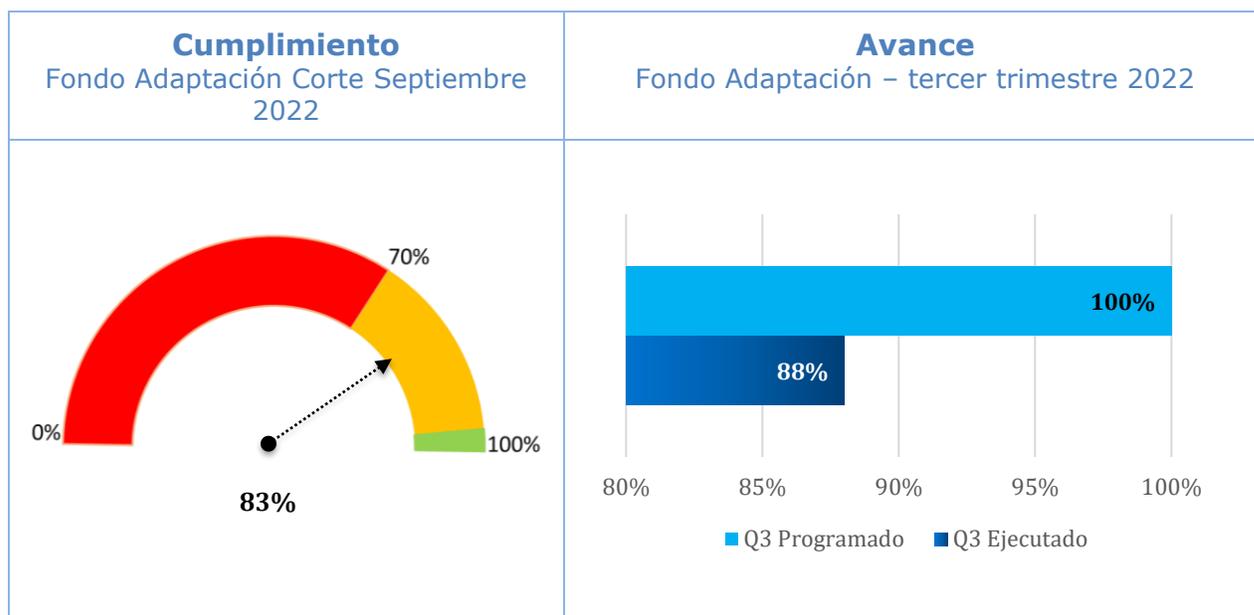

Portafolio/Programa/Proyecto: **LA MOJANA**
Gerente de Meta: Asesor Macroproyecto La Mojana

Objetivo estratégico 2018-2022 #1		Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático						
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/ Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta	
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4		
AEA08_Terminar y entregar diseños de obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEA08)_Diseños de obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), terminados y entregados	2			2		2	
AEA09_Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE	(AEA09) Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual	0.05%			0.05%		0.05%	

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

AEA10_Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA10)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	2	1	1	1
--	---	---	---	---	---

Mes	Avance Cualitativo
(AEA08)_Diseños de obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), terminados y entregados	
Enero	<p>Se cuenta con los contratos vigentes nro. FA IC I F 140 de 2020 y su correspondiente interventoría nro. FA CD I F 146 de 2020. El proyecto cuenta con dos etapas, la etapa 1 corresponde a la culminación de los diseños de detalle que, a su turno contiene tres versiones a saber (versión P, versión A y versión 0), y la etapa 2 contiene a su turno una fase de preconstrucción y una fase de construcción. El contrato prevé la entrega de tres versiones en la etapa de diseños, la versión P fue aprobada por la interventoría el 16 de diciembre de 2020, posteriormente la versión A, que corresponde al informe de avance de ingeniería de detalle, fue aprobada 01 de julio de 2021.</p> <p>El 18 de enero de 2022 se reiniciaron los contratos que se encontraban suspendidos desde el mes de noviembre de 2021 y se suscribió la modificación que amplía el plazo de ejecución de la etapa 1 de diseños, hasta el 18 de abril de 2022.</p> <p>El porcentaje de avance de la etapa de diseños es de 85,52% para Magangué y 86.63% para San Marcos. Cabe anotar que los porcentajes de avance se mantienen respecto de reporte anterior, en el entendido que los nuevos cronogramas a partir de la modificación indicada anteriormente, a la fecha se encuentran en ajuste para su posterior aprobación por parte de la interventoría. Teniendo en cuenta lo anterior y a la luz del estado de ejecución del contrato, en la actualidad se encuentra en curso la versión 0 de la etapa 1 de diseño, en la cual el Contratista debe desarrollar los diseños a nivel de ingeniería de detalle para con ello dar paso al inicio de la etapa 2 del proyecto.</p>
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	<p>Se encuentra en elaboración la versión 0 de la etapa 1 de diseño, en la cual el Contratista debe desarrollar los diseños a nivel de ingeniería de detalle para con ello dar paso al inicio de la etapa 2 del proyecto.</p> <p>Con la firma del Otrosí No 5 del contrato de obra y Otrosí No 4 del contrato de interventoría, se prorroga la entrega de la versión 0 de estudios y diseños y culminación de la etapa 1 del proyecto.</p> <p>Con el objeto de analizar la pertinencia de la aplicación de la condición resolutoria en los términos establecidos contractualmente y teniendo en cuenta la actual situación que vive el país en relación con el fenómeno de "La Niña" la cual se encuentra afectando la zona en la que se debe ejecutar el proyecto, se define suscribir la suspensión No 4 del contrato de obra a partir del 18 de abril de 2022 por 15 días calendario, esperando su reinicio el 03 de mayo de 2022.</p>
Mayo	Se encuentra en elaboración la versión 0 de la etapa 1 de diseño, en la cual el Contratista debe desarrollar los diseños a nivel de ingeniería de detalle para con ello dar paso al inicio de la etapa 2 del proyecto.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Tras el reinicio del contrato de obra el 03 de mayo de 2022, dada la finalización de la suspensión No. 4, y con el objeto de avanzar en el cierre de la Versión 0 de estudios y diseños y culminación de la etapa 1 del proyecto, en el marco de la "solución de controversias" establecida en el contrato de obra, se adelantan mesas de trabajo técnicas entre el contratista, el interventor y el equipo técnico de la supervisión del Fondo Adaptación, con el fin de dirimir las diferencias en los diseños. Del resultado de las mesas de trabajo técnicas, se definirán las estrategias por cada uno de los componentes de diseño que permitan establecer un diseño costo eficiente y con ello establecer la hoja de ruta que propenda por el cumplimiento del objeto contractual y el interés público en la construcción de las obras para protección de la población.</p>
Junio	<p>Se encuentra en elaboración la versión 0 de la etapa 1 de diseño, en la cual el Contratista debe desarrollar los diseños a nivel de ingeniería de detalle para con ello dar paso al inicio de la etapa 2 del proyecto.</p> <p>Con respecto al avance de la ejecución de las obras de protección en los municipios de San Marcos y Magangué, el contratista solicitó la suspensión del contrato en el marco del mecanismo contractual de "solución de controversias" con el fin de adelantar mesas de trabajo técnicas entre el contratista, el interventor y el equipo técnico de la supervisión del Fondo Adaptación, con el fin de dirimir las diferencias en los productos de diseño que permitan la aprobación de la Etapa I. A la fecha de corte, el contratista entregó los productos de diseño ajustados conforme con los resultados de las mesas de trabajo y se encuentran en revisión por parte de la interventoría. De manera paralela se trabaja en la estructuración de una modificación contractual que permita la creación de una fase de priorización de obras, de acuerdo con los recursos disponibles.</p>
Julio	<p>La interventoría dio cierre al arreglo directo el día 15 de julio de 2022, con un informe en el cual realiza un recuento de las mesas de trabajo adelantadas en el marco de este proceso y los respectivos compromisos acordados. Actualmente se trabaja en la estructuración de una modificación contractual que permita aprobar los estudios y diseños, trasladar algunos productos a la etapa de preconstrucción y la creación de una fase de priorización de obras, de acuerdo con los recursos disponibles.</p>
Agosto	<p>El 26 de agosto de 2022 se suscribieron el otrosí nro. 6 del contrato de obra FA-IC-I-F-140-2020 y el otrosí nro. 5 del contrato de interventoría FA-CD-I-F-146-2020. Con la suscripción de esta modificación se superan los condicionamientos que tenía el contrato y se viabiliza i) la obtención de los diseños fase III para la solución total de la mitigación del riesgo por inundación y manejo de aguas de escorrentía para los cascos urbanos de San Marcos y Magangué, ii) la división de los diseños por frentes de obra funcionales y priorización de las obras de protección contra inundación a construir con el POE comprometido con el contrato y disponible en el sector, iii) la evaluación de los frentes de obra restantes para completar el 100% de las obras.</p>
Septiembre	<p>El contratista entregó al interventor los diseños fase III correspondientes a la Versión 0 de la Etapa 1 de Diseño, remitiendo al Fondo Adaptación su aprobación el 26 de septiembre de 2022. Así, el 30 de septiembre el interventor remitió al Fondo Adaptación los mencionados diseños. Mediante radicados R-2022-021546 y R-2022-021599 del 30 de septiembre de 2022, la interventoría realiza entrega de versión digital de los productos de la versión 0 al Fondo Adaptación.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEA09) Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual	
Enero	<p>El proyecto se desarrolla en el marco del convenio 018 de 2017, suscrito entre el SENA, la Agencia Nacional Inmobiliaria- ANIM y Fondo Adaptación, en el cual se establece que la ejecución será realizada por la ANIM. Así las cosas, la ANIM constituyó un patrimonio autónomo, a través del cual, por instrucciones de dicha Agencia, se realiza la contratación derivada para la ejecución del proyecto.</p> <p>Es preciso indicar que el proyecto cuenta con dos fases, la primera, financiada con el aporte del Fondo Adaptación, comprende los siguientes cuatro (4) ambientes de aprendizaje: Agroindustrial, Acuícola, Área Administrativa y Bienestar, así como los servicios asociados, esto es movimiento de tierras, tanque, PTAR, PTAP, redes externas y RCI; y la segunda fase, financiada con los aportes del SENA, incluye: Ras, Cancha deportiva, Urbanismo, Vía interna, Residuos sólidos, Piscina acuícolas, Quiosco, Pecuario, Conocimiento mecanizado, Aire Acondicionado, Red de Gas, Aula polivalente.</p> <p>Para la construcción de la fase I, se suscribió un contrato que finalizó por vencimiento de plazo (abril de 2020) sin el cumplimiento satisfactorio del alcance de este, para lo cual, la ANIM y la Fiduciaria Colpatria, adelantó el procedimiento correspondiente para la imposición de la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios al contratista CRAING Ltda. El contrato finalizó con un avance de ejecución del 41.9%. Luego de surtido un nuevo proceso de contratación para la culminación de las obras de la etapa I, es decir para la construcción del 58.1% faltante; es así como el 08 de abril de 2021, se dio inicio los contratos de obra e interventoría correspondientes, posteriormente el 13 de octubre de 2021, se suscribió una prórroga al contrato de obra, ampliando el plazo de ejecución en dos meses, es decir hasta el 13 de diciembre de 2021.</p> <p>El 16 de noviembre de 2021 se realizó la suscripción una nueva modificación al contrato de obra, ajustando las actividades con un balance de mayores y menores cantidades y la inclusión de ítems no previstos. Es importante resaltar, que el Fondo, requirió de manera reiterada a la ANIM que la culminación de la fase I, incluyera todas las actividades necesarias para poner en funcionamiento las áreas construidas una vez finalizaran. El 24 de noviembre de 2021, en comité operativo del convenio, la ANIM solicitó la aprobación de una modificación al convenio, con el fin de incluir las actividades para garantizar la puesta en funcionamiento de la fase I del proyecto, dentro del contrato de obra vigente.</p> <p>El 10 de diciembre de 2021, la ANIM remitió la solicitud de modificación sobre la cual, el Fondo requirió los soportes que fueron enviados el 13 de diciembre de 2021 y sobre ello se solicitaron aclaraciones y complementaciones que sustentaran la inversión total de los recursos aportados por la entidad en el entendido que varias de las actividades indicadas en el convenio para la fase I, no se habrían podido financiar con dichos recursos. Así las cosas, la ANIM informó la suspensión del contrato de obra para la revisión de la solicitud presentada al Fondo.</p> <p>Con base en el último informe semanal (No. 42) de interventoría de las obras de terminación de fase I, para fecha de corte 24 de enero de 2022, se reporta que el avance programado del contrato es de 96.93% de avance ejecutado sobre el 58.1% faltante para la culminación de la fase I del proyecto, acumulando en total un avance del 97.71% sobre la fase I, faltando 2.29% de avance para la culminación.</p>
Febrero	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	<p>El proyecto se desarrolla en el marco del convenio 018 de 2017, suscrito entre el SENA, el Fondo Adaptación y la Agencia Nacional Inmobiliaria- ANIM, quien funge como ejecutora de los contratos de obra (No. 17-002/2021) e interventoría (No. 17-001/2021), los cuales tuvieron inicio el 8 de abril de 2021 para la terminación de la Fase I. Teniendo en cuenta que el 8 de abril de 2022 se suscribió otrosí No. 7 al contrato de obra, prorrogándolo hasta el 30 de junio de 2022, la interventoría reportó un avance con corte al 30 de abril de 2022, programado del 69.61% y ejecutado del 68.47%.</p> <p>El 26 de abril se suscribió el otrosí No. 3 al convenio, que tiene por objetivo trasladar y apropiar recursos de la fase II a la Fase I para hacer operativa y funcional la Fase I; y apropiar recursos para la asistencia técnica de la ANIM. El 8 de abril se realizó visita de obra por parte del Fondo Adaptación, identificando que en la actualidad se vienen ejecutando obras que correspondían a la terminación de fase I en su alcance inicial y no han sido iniciadas las correspondientes a la Fase I operativa.</p>
Mayo	<p>El cierre financiero de la fase I de la obra de construcción del SENA - Majagual por \$8.000 millones, a cargo del Fondo Adaptación, fue realizado en diciembre de 2017.</p> <p>El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio, para lo cual se realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita por parte de Ingeniera de campo del FA a las obras, el 25/05/2022, en la cual se evidenció el avance físico reportado de 89,11%. - Comité operativo No. 28 el 31 de mayo de 2022, en el cual se solicitó información respecto a la dotación de la sede, a lo cual el SENA informó que se encuentra avanzando en el trámite con el proveedor. Así mismo, se reiteró el compromiso de terminación de las obras para el 30 de junio, se realizará nueva visita por parte del FA en junio para verificación del avance, y conjunta con la ANIM para verificación previa a la entrega.
Junio	<p>El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio, para lo cual se realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita por parte del Subgerente de Gestión del Riesgo a las obras, el 28/06/2022, para la cual, se contaba con un avance físico reportado de 95,93%. Se identificó que no se cumplirá con el plazo inicialmente establecido para la culminación de las obras (30-JUN-22). La ANIM informó que las obras serán terminadas el 10-JUL-2022. - Debido a las falencias identificadas en la visita realizada, en términos de: calidad de las obras, la ausencia de algunos elementos básicos para la operatividad y funcionalidad de la sede y el avance actual de las obras, se solicitó por parte del Fondo Adaptación, por medio de comunicación E-2022-013505 (del 30-JUN-22), se presente un plan de acción para la culminación satisfactoria de las obras, de tal manera que las obras entregadas sean funcionales y operativas de acuerdo con los establecido en el Otrosí No. 3 suscrito el 27/04/2022.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Julio	<p>El compromiso de entrega de la fase I, establecido para el 30 de junio de 2022, no fue cumplido por parte de la ANIM, entidad ejecutora de las obras. El Fondo Adaptación solicitó mediante comunicaciones que se presente el plan de acción para el cumplimiento de estos compromisos y sea posible culminar esta fase de manera satisfactoria y con resultados operativos. En respuesta, la ANIM ha manifestado que los atrasos presentados se deben a la fuerte ola invernal que aqueja la zona del proyecto y no permite el avance normal de las obras.</p> <p>Se tiene previsto realizar comité operativo nro. 29 el 4 de agosto, en el cual se realizará la verificación de los avances de obra en conjunto con la ANIM y el SENA.</p>
Agosto	<p>La ANIM suscribió las actas de entrega y recibo a satisfacción de la obra por parte del SENA el 29 de julio de 2022, situación que fue informada al Fondo Adaptación, como parte del convenio, en comité operativo No. 29 que se realizó el 4 de agosto de 2022, y remitidas de manera oficial mediante radicado R-2022-019681 del 10 de agosto de 2022. Por lo anterior, en el marco de dicho comité y reiteración mediante comunicado E-2022-025185, se solicitó a la ANIM adelantar las actividades necesarias para gestionar la salida del Fondo Adaptación de este convenio, dado que se han cumplido la totalidad de obligaciones a cargo y de conformidad con lo establecido en el otrosí nro. 3.</p>
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte
(AEA10)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	
Enero	<p>ACHÍ: Con corte al 31 de enero de 2022 los documentos de los estudios previos, estudio de mercado, matriz de riesgos, oferta económica, presupuesto, anexo técnico, fueron remitidos a la Subgerencia de Estructuración para revisión y aprobación. El cumplimiento de esta meta está supeditado al desarrollo del contrato No. 153 de 2017 y la entrega de las 748 viviendas. Por tanto, desde el sector de Apropiación y Fortalecimiento de Capacidades se ha venido realizando un seguimiento y monitoreo semanal a la ejecución de dicho contrato.</p> <p>Documentos elaborados y remitidos a la Subgerencia de Estructuración, incluida la comunicación entre los dos sectores que evidencia el cronograma del sector Vivienda: Anexo 1. Estudios previos, Anexo 2. Estudio de mercado, Anexo 3. Matriz de riesgos, Anexo 4. Oferta económica, Anexo 5. Presupuesto, Anexo 6. Anexo técnico, Anexo 7. Comunicaciones entre los sectores de Apropiación y Vivienda.</p> <p>SAN BENITO: Una vez cumplida la meta al 100% de la fase de "versión final para concurso", se inicia la etapa de respuestas a las observaciones al Pliego de Condiciones (25/01/22), publicando la respectiva Adenda (31/01/22) e iniciando la etapa de Presentación de Ofertas (04/02/2022). La fecha para presentar el informe de evaluación de ofertas está fijada para el (10/02/22). Posterior a esta fecha se elaborará el informe de presentación de observaciones al informe de evaluación de las ofertas (15/02/22), y se realizará la expedición del acto de adjudicación o declaratoria desierta el (18/02/22).</p> <p>Mediante comunicación por parte del Equipo de Gestión Contractual, se envía al E.T. Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento soporte de publicación de Adenda el día (31-01-22).</p>
Febrero	<p>ACHÍ: Se cuenta con los documentos elaborados de los estudios previos, estudio de mercado, matriz de riesgos, oferta económica, presupuesto, anexo técnico, los cuales se remitieron a la Subgerencia de Estructuración para revisión y aprobación. Dichos documentos en su totalidad fueron devueltos con modificaciones el (05/02/2022). Posterior a ello, se tuvo reunión nuevamente con dicha Subgerencia,</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
	<p>los días 18 y 21 de febrero de 2022, para continuar con los ajustes de los estudios previos y estudio de mercado.</p> <p>Actualmente, los documentos están en revisión interna del sector de Apropiación y Fortalecimiento de Capacidades. Posterior a ello, se pretende contar con una versión final para concurso de méritos; posteriormente, la etapa de contratación y la contratación se tiene estimada para mayo de 2022. Sin embargo, es de mencionar que el cumplimiento de esta meta ha estado supeditado al desarrollo del contrato No. 153 de 2017 y la entrega de las 748 viviendas; en la última comunicación del sector vivienda, del 8 de febrero de 2022, se reiteró que el cronograma de entrega se mantiene, acorde con la información suministrada por el mismo sector el 17 de noviembre de 2021</p> <p>SAN BENITO: Actualmente, el proceso para la contratación de la consultoría modalidad concurso de méritos FA-CMA-I-S-006-2021, se encuentra en proceso y publicado en Secop II desde el 22 de diciembre de 2021, el cual tiene, conforme el cronograma, fecha estimada de firma en Marzo del 2022 por parte de la UNION TEMPORAL FORTALECER 2022, según Resolución 188 del 22 de Febrero del 2022.</p>
Marzo	<p>ACHÍ: Se cuenta con los documentos elaborados de los estudios previos, estudio de mercado, matriz de riesgos, oferta económica, presupuesto, anexo técnico, los cuales se remitieron al área jurídica para revisión y aprobación el 8 de marzo de 2022. De los documentos enviados, el área jurídica hizo correcciones al Estudio previo y fueron remitidos al ET de Apropiación el 22 de marzo. Se procedió a la realización de las correcciones competentes el 25 de marzo; no obstante, se hizo necesario la remisión al área de Estructuración para un ajuste técnico de su parte. Actualmente, los documentos están en revisión nuevamente del área jurídica. Posterior a ello, se pretende contar con una versión final para concurso de méritos y se tiene estimada la etapa de contratación para mayo de 2022.</p> <p>No obstante, el cumplimiento de esta meta está supeditado al desarrollo del contrato No. 153 de 2017 y la entrega de las 748 viviendas. Por tanto, desde el sector de Apropiación y Fortalecimiento de Capacidades se ha venido realizando un seguimiento y monitoreo semanal a la ejecución de dicho contrato.</p> <p>SAN BENITO: Con el cumplimiento de los requisitos según el Anexo Generalidades del Pliego de Condiciones el día 10 de marzo se suscribió el contrato por parte de la UNION TEMPORAL FORTALECER 2022, y se informa al contratista los pasos previos a cumplir para la firma del acta de inicio según Estudio Previo del proceso, en el ítem 2.4.5. OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES. El 25 de marzo se le informa a la Unión Temporal por parte del Sector según MEMORANDO E-2022-001544, la aprobación de los perfiles y por consiguiente se cumple con los pasos previos a la firma del acta de inicio.</p>
Abril	<p>Las metas de contratación del proyecto socioeconómico, cuyo objeto es: "Realizar acompañamiento socioeconómico a las familias beneficiarias del programa de vivienda del Fondo Adaptación en la modalidad de reubicación en la zona de La Mojana", está condicionado a la entrega de las viviendas, lo cual tiene inicio programado entre junio y agosto de la actual vigencia.</p>
Mayo	<p>En mesas de trabajo contractual, sostenidas en el mes de mayo de 2022, se identificó que debido al cambio reciente al manual de contratación del F.A. se debía modificar la forma de pago contemplada en el proceso. Asimismo, se estableció que dicho</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>proceso debe estructurarse por modalidad de licitación pública; lo anterior implica la necesidad de modificar los documentos adelantados.</p> <p>De otro lado, considerando que el cumplimiento de esta meta está supeditado al desarrollo del contrato No. 153 de 2017 y la entrega de las 748 viviendas, se hace permanentemente seguimiento a la programación de inicio de estas entregas. Se proyecta iniciar con la entrega de 120 viviendas en agosto de 2022.</p>
Junio	Se trabajó en la estructuración de los documentos, (Estudio previo, estudio de mercado, matriz de riesgos, anexo técnico, etc.), para la futura contratación por licitación pública del acompañamiento socioeconómico de Achí.
Julio	Se trabajó en la estructuración de los documentos (Estudio previo, estudio de mercado, matriz de riesgos, anexo técnico) y en correcciones realizadas por la Líder del sector de Reactivación Económica; asimismo, se remitieron dichos documentos a revisión a las áreas jurídica y contractual.
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron los ajustes pertinentes del EP, Matriz de riesgos, estudio de mercado, POE, Oferta Económica, Anexo técnico, etc., de Achí para visto bueno de las áreas Jurídica y Contratación. - 24 de agosto se envió solicitud de comité de contratación a las áreas correspondientes con sus respectivos soportes. - El 26 de agosto se realizó Comité de Contratación, bajo acta No.33. - Se está en la recolección de firmas para radicación de los documentos al área de Contratación y realizar los trámites pertinentes para iniciar el respectivo proceso de publicación.
Septiembre	<p>El 5 de septiembre se recibió la Constancia de Disponibilidad de Recursos CDR. Este mismo día, se remitió para firma del ordenador del gasto - Secretaria General (E) el estudio previo y matriz de riesgos.</p> <p>El 7 de septiembre se contó con la matriz de riesgos y estudio previo firmados por parte del ordenador del gasto (Secretaria General E).</p> <p>El 8 de septiembre se radicó la solicitud de contratación al E.T. Gestión Contractual. Así mismo, dicha área publicó el proceso en el SECOP.</p> <p>El 22 de septiembre de 2022 se cerró el plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones de la licitación pública No. FA-LP-I-S-005-2022. Se recibieron comentarios de 4 posibles oferentes, por lo que desde el E.T. de Reactivación Económica - Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento se procedió a remitir a la Subgerencia de Estructuración aquellas de carácter financiero. Frente a las técnicas, de igual forma se gestionaron para el 27 de septiembre, teniendo en cuenta que se publicaron las respuestas a las observaciones el pasado 29 de septiembre.</p> <p>El 29 de septiembre de 2022 se cerró el plazo para publicar las observaciones realizadas por 4 posibles oferentes a los Pliegos de Condiciones; sin embargo, en atención a los nuevos lineamientos de la Gerencia del Fondo, no se continuó.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

JARILLÓN DE CALI

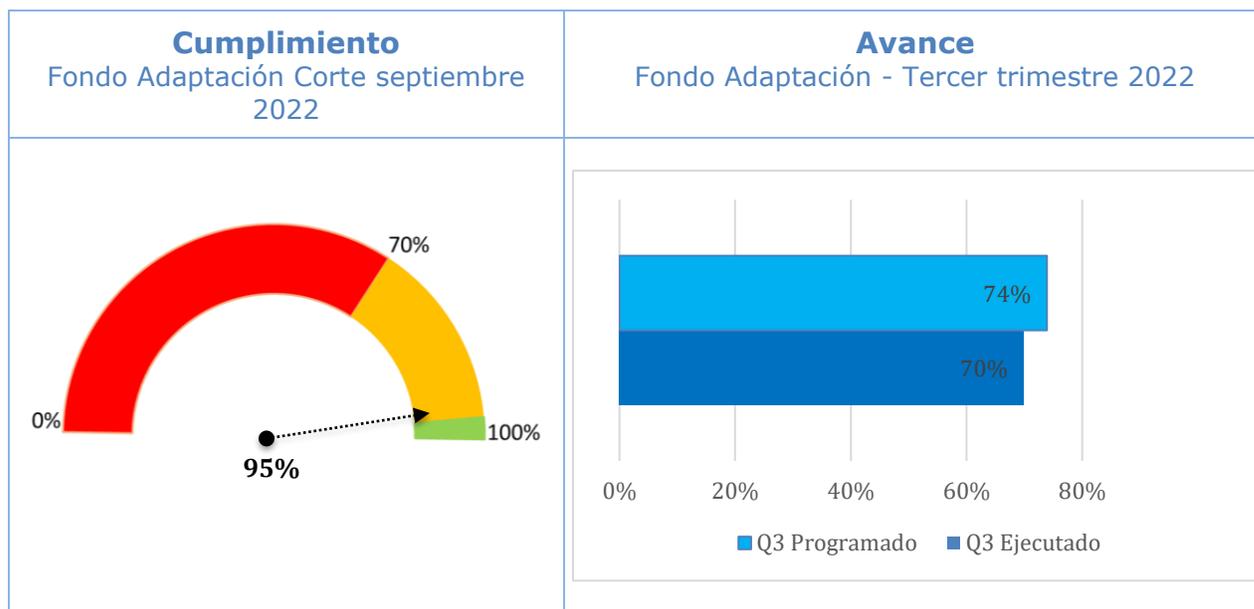

Portafolio/Programa/Proyecto: **JARILLÓN DE CALI**

Gerente de Meta: Asesor E.T. Macroproyecto Jarillón de Cali

Objetivo estratégico 2018-2022 #1

Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático

Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades/hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA11_Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA11)_Soluciones de vivienda, contratadas	800		400	400		720
AEA12_Terminar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	(AEA12)_Soluciones de vivienda, terminadas	400		380		20	200
AEA13_Entregar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA13)_Soluciones de vivienda, entregadas	400				400	202
AEA14_Contratar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA14)_Km de Jarillón, contratado	0,055		0,055			0
AEA15_Terminar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA15)_Km de Jarillón, terminado	1,5	0,65		0,08	0,77	0,712
AEA16_Entregar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA16)_Km de Jarillón, entregado	19,16		8,693	5,723	4,745	11,39
AEA17_Terminar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR)	(AEA17)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	2		2			0
Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades/hitos)	Indicador	Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
AEA18_Entregar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)	(AEA18)_Obras infraestructura estratégica, entregadas (PTAR, PTAP)	2			2		0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEA11)_Soluciones de vivienda, contratadas	
Enero	<p>En mesa de trabajo entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali se define que la contratación para 800 VIP se realizara bajo la modalidad de licitación. Por lo anterior, se debe adelantar la modificación del convenio 007-21 e iniciar la estructuración de la licitación.</p> <p>Ley de garantías para la definición de modalidad de contratación y Estructuración de nuevos proyectos habitacionales y obtención del plan de trabajo.</p>
Febrero	<p>Continua en proceso la modificación del convenio 007-21 para la inclusión del lote por parte del FEV en el proyecto Santa Elena y balancear los recursos conforme a los proyectos que se desarrollen a través del Convenio. Se inició la etapa precontractual (Estudios previos) de la licitación.</p> <p>El estudio de mercado arrojo que no es común salir a licitación pública en este tipo de proyecto y encontró que entidades han licitado hasta 100 VIP, pero no en el tamaño que buscamos las 800 VIP.</p>
Marzo	<p>El 15 de marzo 2022, se suscribe la modificación 01 al Convenio 007-21 para el aporte del lote del FEV por 7.400 millones de pesos y obligaciones asociadas a este aporte; además de reasignar los recursos del FA viabilizando el proyecto Altos de Santa Elena. El 30 de marzo 2022 finaliza la elaboración de los Estudios Previos, Análisis de Sector y Mercado, Anexo Técnico e información complementaria para los Prepliegos relacionados al proceso de licitación pública para el proyecto Altos de Santa Elena Fase II, que se encuentran en revisión final por parte del Fondo Adaptación. Se encuentran en análisis</p>
Abril	<p>Se definió la viabilidad para el desarrollo de 720 soluciones de vivienda para el proyecto habitacional Altos de Santa Elena Fase II. Se publicó en SECOP el 19 de abril de 2022, Prepliegos relacionados al proceso de licitación pública para el proyecto Altos de Santa Elena Fase II.</p> <p>El lote aportado por el Fondo Especial de Vivienda – FEV, permite el desarrollo de hasta 720 VIP y no 800 VIP como se tenía proyectado.</p>
Mayo	<p>Se publicó en SECOP el 19 de abril de 2022, Prepliegos relacionados al proceso de licitación pública de obra para el proyecto Altos de Santa Elena Fase II. En el proceso, se recibieron observaciones y el 26 de mayo 2022 se dieron alcance a las mismas.</p> <p>Se publicaron Prepliegos del proceso de Licitación Interventoría el 20 de mayo 2022.</p> <p>El proceso de licitación de obra se encuentra suspendido, debido a la solicitud de los proponentes para poder tramitar pólizas de seriedad de la oferta.</p>
Junio	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de las Obras: Se publicó en SECOP el 19 de abril de 2022, Prepliegos relacionados al proceso de licitación pública de obra para el proyecto Altos de Santa Elena Fase II. En el proceso, se recibieron observaciones y el 26 de mayo 2022 se dieron alcance a las mismas. <p>El 6 de julio 2022 mediante Audiencia, se adjudicará el proyecto Obra Altos de Santa Elena Fase II, al consorcio Plan Jarillón de Cali.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Licitatorio interventoría: Se publicaron Prepliegos del proceso de Licitación Interventoría el 20 de mayo 2022. En el proceso, se recibieron observaciones hasta el 27 de mayo 2022 y se dio respuesta el 8 de junio 2022 a las mismas. <p>Dificultades: El lote aportado por el Fondo Especial de Vivienda – FEV, permite el desarrollo de hasta 720 VIP y no 800 VIP como se tenía proyectado.</p>
Julio	<ul style="list-style-type: none"> Adjudicación CONTRATO DE OBRA No. FA-LP-I-S-208-2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y CONSORCIO PLAN JARILLON DE CALI.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: Realizar el diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONTRATACION VIVIENDA – ACTIVIDADES: Se definió la viabilidad para el desarrollo de 720 soluciones de vivienda para el proyecto habitacional Altos de Santa Elena Fase II. Se publicó en SECOP el 19 de abril de 2022, Prepliegos relacionados al proceso de licitación pública de obra para el proyecto Altos de Santa Elena Fase II. En el proceso, se recibieron observaciones y el 26 de mayo 2022 se dieron alcance a las mismas. El 6 de julio de 2022 se adelantó la audiencia y se adjudicó el proceso al CONSORCIO PLAN JARILLÓN DE CALI, compuesto por J&S CONSTRUCCIONES S.A.S., TÉCNICAS INNOVADORAS DE CONSTRUCCIÓN TIC S.A.S y TERRAPIN S.A.S. El 11 de julio de 2022 se publicó el acto administrativo de adjudicación y el 14 de julio de 2022 se suscribió el contrato (firmado en la plataforma SECOP II). Se publicaron Prepliegos del proceso de Licitación Interventoría el 20 de mayo 2022. El 12 de julio se recibieron 6 ofertas y el 19 de julio se publicó el informe de evaluación En el proceso, se recibieron observaciones hasta el 27 de mayo 2022 y se dio respuesta el 8 de junio 2022 a las mismas. Se proyecta adjudicar el 02 de agosto 2022. • CONTRATACION VIVIENDA – DIFICULTADES: El lote aportado por el Fondo Especial de Vivienda – FEV, permite el desarrollo de hasta 720 VIP y no 800 VIP como se tenía proyectado.
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRATACION VIVIENDA – ACTIVIDADES: Se definió la viabilidad para el desarrollo de 720 soluciones de vivienda para el proyecto habitacional Altos de Santa Elena Fase II. Obra: El 14 de julio de 2022 se suscribió el contrato (firmado en la plataforma SECOP II) s con el CONSORCIO PLAN JARILLÓN DE CALI, compuesto por J&S CONSTRUCCIONES S.A.S., TÉCNICAS INNOVADORAS DE CONSTRUCCIÓN TIC S.A.S y TERRAPIN S.A.S. Proyección de Acta de Inicio: 15 septiembre 2022. Interventoría: El 17 de agosto se procedió a la suscripción del contrato con el CONSORCIO INTERVENTOR VIP. Proyección de Acta de Inicio: 15 septiembre 2022. • CONTRATACION VIVIENDA – DIFICULTADES: El lote aportado por el Fondo Especial de Vivienda – FEV, permite el desarrollo de hasta 720 VIP y no 800 VIP como se tenía proyectado.
Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRATACION VIVIENDA – ACTIVIDADES: Se definió la viabilidad para el desarrollo de 720 soluciones de vivienda para el proyecto habitacional Altos de Santa Elena Fase II. Obra: El 14 de julio de 2022 se suscribió el contrato (firmado en la plataforma SECOP II) s con el CONSORCIO PLAN JARILLÓN DE CALI, compuesto por J&S CONSTRUCCIONES S.A.S., TÉCNICAS INNOVADORAS DE CONSTRUCCIÓN TIC S.A.S y TERRAPIN S.A.S. Pendiente aprobación requisitos previos a firma del acta de inicio, incluido hojas de vida. Interventoría: El 17 de agosto se procedió a la suscripción del contrato con el CONSORCIO INTERVENTOR VIP. Pendiente aprobación requisitos previos a firma del acta de inicio, incluido hojas de vida. • CONTRATACION VIVIENDA – DIFICULTADES: El lote aportado por el Fondo Especial de Vivienda – FEV, permite el desarrollo de hasta 720 VIP y no 800 VIP como se tenía proyectado.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEA12)_Soluciones de vivienda, terminadas	
Enero	<ul style="list-style-type: none"> - Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. - El 26 de enero de 2022, se suscribió la modificación contractual No 13 en el cual se prorrogan las fechas de entregas a las familias beneficiarias de 140 VIP para 01 y 02 de marzo 2022. - El contratista avanza en la construcción y acabados de las 380 VIP y del urbanismo. <p>Dificultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torres de Alamadina: está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal y el cambio de la estratificación del proyecto. Se encuentra en revisión en Oficina de Registro Público. - Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.
Febrero	<p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. El 25 de febrero se suscribió modificación contractual N°14 en el cual COMFANDI apalancara el proyecto habitacional por un valor de \$5.360 millones. El contratista avanzó en la construcción y acabados de las 380 VIP proyectados para ser entregados en los meses de abril y julio de 2022. El contratista hizo entrega del registro de la propiedad horizontal del Sector 1. Carta cheque: Firma de promesa de compraventa e inventario de 1 carta - cheque No. contrato 2017-CV-0016-21-CP-0062</p> <p>Está pendiente por parte del contratista del proyecto Torres de Alamadina la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4, y el cambio de la estratificación del proyecto. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización. Carta - cheque: rezagos por parte del Municipio de Cali en la postulación y trámite de las compensaciones económicas a las familias beneficiarias del proyecto.</p>
Marzo	<p>Terminaciones: Corresponde a 60 certificados de habitabilidad de las torres A,D,E del proyecto habitacional Torres de Alamadina proyectados para ser entregados en el mes de abril 2022.</p> <p>Entrega y finalización de Vivienda – Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. - El 11 de marzo de 2022, la interventoría suscribió y entrego los certificados de existencia y habitabilidad de 60 VIP correspondientes a las Torres A-D-E del sector 4. - El contratista inicio con el proceso del permiso de ocupación de las VIP del Sector 4, con la radicación ante la Secretaría de Planeación de Jamundí de la solicitud del Permiso de las primeras 60 VIP correspondientes a las Torres A-D-E del sector 4 - En el presente mes, el contratista inició en la Notaría 14 el proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 1, para posterior revisión de la Supervisión y entrega a las familias beneficiarias. - Están finalizando actividades de acabados de obra en las VIP pendientes del sector 4, programadas para ser entregadas a las familias beneficiarias el 28 y 29 de abril de 2022. <p>En el proyecto Torres de Alamadina está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación del cambio de estratificación del proyecto habitacional. Por parte del contratista está pendiente la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Abril	<p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. El contratista inicio con las obras de mitigación de inundabilidad en el Zanjón Villegas.</p> <p>El contratista continuo con el proceso del permiso de ocupación de las VIP del Sector 4, con la radicación ante la Secretaría de Planeación de Jamundí de la solicitud del Permiso de las 80 VIP pendientes correspondientes a las Torres B-C-F-G del sector 4.</p> <p>El equipo técnico de la secretaria de Planeación de Jamundí realizó visita a las 7 torres que componen el sector 4. Está pendiente la entrega del informe de esta visita. En el presente mes se encuentran revisadas y aprobadas 160 escrituras públicas de las viviendas del Sector 1, y en proceso de firma por parte de Alianza Fiduciaria</p>
Mayo	<p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución en el sector 3. Continúan en ejecución la construcción de la Vía V-3A la cual está programada finalizar en julio de 2022 y con la construcción el Box Coulver sobre el zanjón Villegas.</p> <p>Las torres que componen el Sector 4 se encuentran listas para ser entregadas a las familias beneficiarias, programado para junio de 2022.</p> <p>La Secretaría de Planeación de Jamundí mediante resolución N° 39-49-298 del 23 de mayo de 2022, resuelve aplicar estrato socioeconómico UNO a las viviendas del proyecto Multifamiliar abierto Torres de Alamadina, por ser viviendas de interés prioritario.</p> <p>El 19-05-2022, funcionarios de la secretaria de Planeación de Jamundí realizaron una visita técnica con el objeto de identificar los avances en las actividades del urbanismo general, del sector 4 y del sector 3.</p> <p>La Supervisión y Comfandi continúan realizando el seguimiento y control semanal de las actividades de obra del sector 3.</p>
Junio	<p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución en el sector 3 y en el urbanismo general. Continúan en ejecución la construcción el urbanismo la cual está programada finalizar en julio de 2022, incluyendo la construcción el Box Coulver y adecuación del zanjón Villegas.</p> <p>El 30 de junio, se realizó reunión con la Secretaría de Planeación con la participación del Artekton Constructora, Pri-Colombia (interventoría), COMFANDI (Promotor de vivienda), ProPacífico (Supervisión) y Fondo Adaptación, en el cual se revisaron los avances de las actividades de obra y de las obligaciones urbanísticas. Generando nuevos compromisos de entrega de dichas actividades. La Supervisión y Comfandi continúan realizando el seguimiento y control semanal de las actividades de obra del sector 3 y urbanismo.</p>
Julio	<p>Finalización de 20 VIP sin entregar en el proyecto Habitacional Torres de Alamadina torre G sector 4.</p> <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – ACTIVIDADES</p> <p>Torres de Alamadina:</p> <p>Continúan con la fase de acabados, carpintería metálica y exteriores de las 12 torres que componen el sector 3 y del urbanismo en general. Continúan en ejecución la construcción el urbanismo la cual está programada finalizar el 05-08-2022.</p> <p>El 22 de julio, se realizó reunión con la Secretaría de Planeación con la participación del Artekton Constructora, Pri-Colombia (interventoría), COMFANDI (Promotor de vivienda), ProPacífico (Supervisión) y Fondo Adaptación, en el cual se hizo</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>seguimiento al cumplimiento de acuerdo pactados en la reunión del 30-06-2022, respecto a las actividades de obra y de las obligaciones urbanísticas. La Supervisión y Comfandi continúan realizando el seguimiento y control semanal de las actividades de obra del sector 3 y urbanismo.</p> <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – DIFICULTADES</p> <p>Torres de Alamadina:</p> <p>Cumplimiento de las entregas de las 260 VIP pendientes a entregar a las familias beneficiarias. Está pendiente la expedición de acto administrativo de la entidad ambiental CVC sobre la solicitud de "Concesión de aguas para reúso de aguas residuales de la PTAR" Está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>
Agosto	<p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – ACTIVIDADES</p> <p>-Torres de Alamadina: Fueron entregadas a las familias beneficiarias de PJC 59 unidades de vivienda correspondientes a las Torres A-B-L del sector 3. La Supervisión y Comfandi continúan realizando el seguimiento y control semanal de las actividades de obra del sector 3 y urbanismo. El contratista cuenta con las escrituras de propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4.</p> <p>-Torres de la Paz:</p> <p>Producto del trabajo mancomunado del Fondo Adaptación, COMFANDI y ProPacífico, se suscribió acta de reinicio de obra con fecha 24 de junio 2022, al contrato de promesa de compraventa N° 2013-CV-0164-16-J0237, con las siguientes fechas contractuales: Finalización y Entrega de Obras: 24 diciembre 2022 Final Escrituras y Registro: 24 junio 2023.</p> <p>* Se avanza en la ejecución de la obra en tres (3) frentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminación VIP torres 5-6 de la manzana B. (Áticos, carpintería metálica, acabados) 2. Estructura VIP torres 7-8 de la manzana B. (Acero de refuerzo, Fundición de muros estructurales) 3. Urbanismo de la Manzana B (Estructura vías y parqueadero, UAR) <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – DIFICULTADES</p> <p>-Torres de Alamadina:</p> <p>Cumplimiento de las entregas de las 200 VIP pendientes a entregar a las familias beneficiarias. Está pendiente la expedición de acto administrativo de la entidad ambiental CVC sobre la solicitud de "Concesión de aguas para reúso de aguas residuales de la PTAR" Dar inicio al proceso de escrituración de las 260 VIP del Sector 2 y 4. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>
Septiembre	<p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – ACTIVIDADES</p> <p>Torres de Alamadina:</p> <p>Fue entregada a la familia beneficiaria de PJC 1 unidad de vivienda correspondientes al apartamento 502 de la Torres L del sector 3. Continúan con la fase de acabados, carpintería metálica y exteriores de las 7 torres que componen el sector 3 y del urbanismo en general. La Supervisión y Comfandi continúan realizando el seguimiento y control semanal de las actividades de obra del sector 3 y urbanismo.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>El contratista cuenta con el aval de ProPacífico de 49 escrituras públicas correspondientes a las VIP del Sector 1. El contratista inicio la solicitud de prórroga y la modificación de la autorización y ocupación del cauce del Zanjón Villegas. Debido al incumplimiento en las entregas de las VIP del sector 3 por parte del contratista, COMFANDI inicio con la aplicación de ANS, hasta que sean entregadas la totalidad de las viviendas pendientes.</p> <p>Torres de la Paz:</p> <p>Producto del trabajo mancomunado del Fondo Adaptación, COMFANDI y ProPacífico, se suscribió acta de reinicio de obra con fecha 24 de junio 2022, al contrato de promesa de compraventa N° 2013-CV-0164-16-J0237, con las siguientes fechas contractuales:</p> <p>Finalización y Entrega de Obras: 24 diciembre 2022 Final Escrituras y Registro: 24 junio 2023. Se avanza en la ejecución de la obra en tres (3) frentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminación VIP torres 5-6 de la manzana B. (Áticos, carpintería metálica, acabados) 2. Estructura VIP torres 7-8 de la manzana B. (Acero de refuerzo, Fundición de muros estructurales) 3. Urbanismo de la Manzana B (Estructura vías y parqueadero, UAR) <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – DIFICULTADES</p> <p>Torres de Alamadina:</p> <p>Incumplimiento de las entregas de las 180 VIP pendientes a entregar a las familias beneficiarias, programadas para el 3 de agosto de 2022. Pendiente la expedición de acto administrativo de la entidad ambiental CVC sobre la solicitud de "Concesión de aguas para reúso de aguas residuales de la PTAR" Dar inicio al proceso de escrituración de las 260 VIP del Sector 2 y 4. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización y de la revalidación de la licencia de urbanismo en modalidad de saneamiento.</p>
(AEA13) Soluciones de vivienda, entregadas	
Enero	<p>El proyecto Torres de Alamadina se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. El 26 de enero de 2022, se suscribió la modificación contractual No 13 en el cual se prorrogan las fechas de entregas a las familias beneficiarias de 140 VIP para 01 y 02 de marzo 2022. El contratista avanza en la construcción y acabados de las 380 VIP y del urbanismo.</p> <p>Está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal y el cambio de la estratificación del proyecto. Se encuentra en revisión en Oficina de Registro Público. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>
Febrero	<p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. El 25 de febrero se suscribió modificación contractual N°14 en el cual COMFANDI apalancara el proyecto habitacional por un valor de \$5.360 millones. El contratista avanzó en la construcción y acabados de las 380 VIP. El contratista hizo entrega del registro de la propiedad horizontal del Sector 1. Carta - cheque: Pago efectivo de una (1) carta - cheque conforme al Convenio Derivado 0016 -2017 firmado entre el FA y el Municipio de Santiago de Cali.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Continua pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4, y el cambio de la estratificación del proyecto. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización. Carta - cheque: rezagos por parte del Municipio de Cali en la postulación y trámite de las compensaciones económicas a las familias beneficiarias del proyecto.</p>
<p>Marzo</p>	<p>Avance: corresponde a siete (7) carta cheques efectivamente pagadas a los beneficiarios del Plan Jarillón de Cali, conforme al Convenio 016-2017 firmado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. - El 11 de marzo de 2022, la interventoría suscribió y entrego los certificados de existencia y habitabilidad de 60 VIP correspondientes a las Torres A-D-E del sector 4. - El contratista inicio con el proceso del permiso de ocupación de las VIP del Sector 4, con la radicación ante la Secretaría de Planeación de Jamundí de la solicitud del Permiso de las primeras 60 VIP correspondientes a las Torres A-D-E del sector 4 - El contratista inició en la Notaría 14 el proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 1, para posterior revisión de la Supervisión y entrega a las familias beneficiarias. - Están finalizando actividades de acabados de obra en las VIP pendientes del sector 4. <p>Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación del cambio de estratificación del proyecto habitacional. Por parte del contratista está pendiente la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2. Continua pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>
<p>Abril</p>	<p>Torres de Alamadina: En el presente mes se encuentran revisadas y aprobadas 160 escrituras públicas de las viviendas del Sector 1, y en proceso de firma por parte de Alianza Fiduciaria.</p> <p>El contratista está finalizando actividades de acabados de obra en las VIP pendientes del sector 4. Sin embargo, este incumplió las fechas de entregas a las familias beneficiarias programadas para abril de 2022, ya que de las 140 VIP que componen el sector, 80 VIP no cuentan con los certificados de habitabilidad y 140 VIP no tienen el Permiso de Ocupación expedido por la Secretaría de Planeación de Jamundí.</p> <p>Pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación del cambio de estratificación del proyecto habitacional. Por parte del contratista está pendiente la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2.</p> <p>Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p> <p>Carta cheque: Durante abril del 2022 se registra el pago efectivo de siete (7) compensaciones económicas a las familias beneficiarias del proyecto Plan Jarillón de Cali, conforme a lo establecido en el Convenio 0016-2017 firmado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali:</p> <p>Meta compensaciones 2022: 20 Total bonificaciones 2022: 15 % de avance: 75%</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Mayo	<p>Torres de Alamadina: Las torres que componen el Sector 4 se encuentran listas para ser entregadas a las familias beneficiarias, programado para junio de 2022.</p> <p>La Secretaría de Planeación de Jamundí mediante resolución N° 39-49-298 del 23 de mayo de 2022, resuelve aplicar estrato socioeconómico UNO a las viviendas del proyecto Multifamiliar abierto Torres de Alamadina, por ser viviendas de interés prioritario.</p> <p>Está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>
Junio	<p>Torres de Alamadina: El 06 de junio se entregaron a las familias beneficiarias 120 VIP del sector 4. Quedando pendiente de entrega 260 VIP. El proyecto se encuentra en ejecución en el sector 3 y en el urbanismo general.</p> <p>Está pendiente la expedición de acto administrativo de la entidad ambiental CVC sobre la solicitud de "Concesión de aguas para reúso de aguas residuales de la PTAR". Está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p> <p>Carta Cheque: En el mes de junio se registra el pago efectivo por parte del FA de 5 compensaciones económicas para adquisición de vivienda usada a las familias beneficiarias del Plan Jarillón de Cali, conforme a lo establecido en el convenio interadministrativo 0016-2017 firmado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali.</p> <p>Meta compensaciones 2022: 20 Total bonificaciones 2022: 20 % de avance: 100%</p>
Julio	<p>Pago efectivo al corte de julio 22 de una compensación económica conforme a Convenio 0016/2017 firmado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali: Contrato: 2017-CV-0016-22-CP-0070 Beneficiario: Jhonny Jair Hernández Cédula: 1.143.953.730 Fecha de pago: 11/07/2022 Valor: \$61.446.210</p> <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – ACTIVIDADES</p> <p>Torres de Alamadina:</p> <p>Continúan con la fase de acabados, carpintería metálica y exteriores de las 12 torres que componen el sector 3 y del urbanismo en general. Continúan en ejecución la construcción el urbanismo la cual está programada finalizar el 05-08-2022. El 22 de julio, se realizó reunión con la Secretaría de Planeación con la participación del Artekton Constructora, Pri-Colombia (interventoría), COMFANDI (Promotor de vivienda), ProPacífico (Supervisión) y Fondo Adaptación, en el cual se hizo seguimiento al cumplimiento de acuerdo pactados en la reunión del 30-06-2022, respecto a las actividades de obra y de las obligaciones urbanísticas. La Supervisión y Comfandi continúan realizando el seguimiento y control semanal de las actividades de obra del sector 3 y urbanismo.</p> <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – DIFICULTADES</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Torres de Alamadina:</p> <p>Cumplimiento de las entregas de las 260 VIP pendientes a entregar a las familias beneficiarias. Está pendiente la expedición de acto administrativo de la entidad ambiental CVC sobre la solicitud de "Concesión de aguas para reúso de aguas residuales de la PTAR". Está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>
Agosto	<p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – ACTIVIDADES</p> <p>- Torres de Alamadina: Fueron entregadas a las familias beneficiarias de PJC 59 unidades de vivienda correspondientes a las Torres A-B-L del sector 3. La Supervisión y Comfandi continúan realizando el seguimiento y control semanal de las actividades de obra del sector 3 y urbanismo. El contratista cuenta con las escrituras de propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4.</p> <p>- Torres de la Paz: Producto del trabajo mancomunado del Fondo Adaptación, COMFANDI y ProPacífico, se suscribió acta de reinicio de obra con fecha 24 de junio 2022, al contrato de promesa de compraventa N° 2013-CV-0164-16-J0237, con las siguientes fechas contractuales: Finalización y Entrega de Obras: 24 diciembre 2022 Final Escrituras y Registro: 24 junio 2023. * Se avanza en la ejecución de la obra en tres (3) frentes: 1. Terminación VIP torres 5-6 de la manzana B. (Áticos, carpintería metálica, acabados) 2. Estructura VIP torres 7-8 de la manzana B. (Acero de refuerzo, Fundición de muros estructurales) 3. Urbanismo de la Manzana B (Estructura vías y parqueadero, UAR)</p> <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – DIFICULTADES</p> <p>- Torres de Alamadina: Cumplimiento de las entregas de las 200 VIP pendientes a entregar a las familias beneficiarias. Está pendiente la expedición de acto administrativo de la entidad ambiental CVC sobre la solicitud de "Concesión de aguas para reúso de aguas residuales de la PTAR" Dar inicio al proceso de escrituración de las 260 VIP del Sector 2 y 4. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>
Septiembre	<p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – ACTIVIDADES</p> <p>Torres de Alamadina:</p> <p>Fue entregada a la familia beneficiaria de PJC 1 unidad de vivienda correspondientes al apartamento 502 de la Torres L del sector 3. Continúan con la fase de acabados, carpintería metálica y exteriores de las 7 torres que componen el sector 3 y del urbanismo en general. La Supervisión y Comfandi continúan realizando el seguimiento y control semanal de las actividades de obra del sector 3 y urbanismo. El contratista cuenta con el aval de ProPacífico de 49 escrituras públicas correspondientes a las VIP del Sector 1.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>El contratista inicio la solicitud de prórroga y la modificación de la autorización y ocupación del cauce del Zanjón Villegas. Debido al incumplimiento en las entregas de las VIP del sector 3 por parte del contratista, COMFANDI inicio con la aplicación de ANS, hasta que sean entregadas la totalidad de las viviendas pendientes.</p> <p>Torres de la Paz:</p> <p>Producto del trabajo mancomunado del Fondo Adaptación, COMFANDI y ProPacífico, se suscribió acta de reinicio de obra con fecha 24 de junio 2022, al contrato de promesa de compraventa N° 2013-CV-0164-16-J0237, con las siguientes fechas contractuales: Finalización y Entrega de Obras: 24 diciembre 2022 Final Escrituras y Registro: 24 junio 2023. Se avanza en la ejecución de la obra en tres (3) frentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminación VIP torres 5-6 de la manzana B. (Áticos, carpintería metálica, acabados) 2. Estructura VIP torres 7-8 de la manzana B. (Acero de refuerzo, Fundición de muros estructurales) 3. Urbanismo de la Manzana B (Estructura vías y parqueadero, UAR) <p>ENTREGA Y FINALIZACION DE VIVIENDA – DIFICULTADES</p> <p>Torres de Alamadina:</p> <p>Incumplimiento de las entregas de las 180 VIP pendientes a entregar a las familias beneficiarias, programadas para el 3 de agosto de 2022. Pendiente la expedición de acto administrativo de la entidad ambiental CVC sobre la solicitud de "Concesión de aguas para reúso de aguas residuales de la PTAR" Dar inicio al proceso de escrituración de las 260 VIP del Sector 2 y 4. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización y de la revalidación de la licencia de urbanismo en modalidad de saneamiento.</p>
(AEA14)_Km de Jarillón, contratado	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	Eball Guadales: Teniendo en cuenta que el contrato de obra e interventoría no se alcanzó a adjudicar en el 2021, se pierde la figura de vigencia futura excepcional que se estimaba utilizar para esta contratación por parte de EMCALI, siendo necesario entonces actualizar el presupuesto del proyecto a la presente vigencia, y tramitar una nueva vigencia futura ordinaria.
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	<p>En proceso de contratación por parte de EMCALI.</p> <p>Teniendo en cuenta que el proyecto no se alcanzó a adjudicar por parte de EMCALI en el 2021, es necesario que la entidad tramite nueva vigencia futura, debiéndose surtir un proceso similar al del proyecto Paso del Comercio, para lo cual se deben actualizar las condiciones del proyecto Eball incluido el presupuesto estimado por EMCALI. En el comité de seguimiento, EMCALI informo que en el mes de junio de 2022 el presupuesto se encuentra revisado, y están adelantando el trámite de ajuste de la ficha de inversión para posterior solicitud de vigencias futuras.</p>
Julio	CONTRATACION JARILLON:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Obra Eball Guadales (a cargo de EMCALI): EMCALI finalizó la actualización del presupuesto, la ficha de inversión e inicio el proceso de solicitud asignación de recursos.</p> <p>CONTRATACION JARILLON _ DIFICULTADES:</p> <p>Aprobación de recursos y expedición certificados de vigencias futuras. Contratación de las obras de reforzamiento en la estación de bombeo de aguas lluvias de Eball Guadales.</p>
Agosto	<p>CONTRATACION JARILLON:</p> <p>-Obra Eball Guadales (a cargo de EMCALI): EMCALI aprobó la ficha de inversión y la junta directiva en sesión de agosto de 2022 autorizó llevar al COMFIS la solicitud de vigencia futura.</p> <p>-EMCALI y ProPacífico ha venido adelantando los documentos requeridos para elevar la solicitud de modificación de este convenio al Fondo Adaptación, los cuales serán radicados una vez se cuente con la solicitud formal de EMCALI acompañado del correspondiente certificado de vigencias futuras.</p> <p>-Con respecto al proceso licitatorio, la unidad de interventoría de EMCALI radicó en la Gerencia de Abastecimiento la documentación técnica del proyecto para adelantar la lista de precalificados tanto para el contrato de obra como de interventoría.</p> <p>CONTRATACION JARILLON _ DIFICULTADES:</p> <p>-La reunión del COMFIS para la aprobación de recursos y expedición certificados de vigencias futuras.</p> <p>-Modificación convenio N° 014 de 2021.</p> <p>-Contratación de las obras de reforzamiento en la estación de bombeo de aguas lluvias de Eball Guadales.</p>
Septiembre	<p>CONTRATACION JARILLON</p> <p>Obra Eball Guadales (a cargo de EMCALI): EMCALI aprobó la ficha de inversión y la junta directiva autorizó presentar al COMFIS la solicitud de vigencia futura. ProPacífico remitió a EMCALI la revisión preliminar de la minuta del otrosí N°1 al convenio 014 de 2021, con el fin que inicien una revisión preliminar del área jurídica.</p> <p>CONTRATACION JARILLON _ DIFICULTADES:</p> <p>La reunión del COMFIS del mes de septiembre de 2022, no se pudo realizar debido a la situación actual de la entidad EMCALI, por lo tanto, no hubo aprobación ni expedición de certificados de vigencias futuras.</p> <p>Con respecto al proceso licitatorio, por instrucción del Gerente General € desde 28 de septiembre de 2022, se suspendieron de manera inmediata todos los procesos de contratación a cargo de esta entidad.</p> <p>Sin la expedición de las vigencias futuras, EMCALI no ha podido realizar la solicitud de modificación de los convenios derivados N° 004 de 2018 y 014 de 2021.</p>
(AEA15)_Km de Jarillón, terminado	
Enero	<p>- Tramo IV: obra finalizada y en proceso de liquidación por parte de la CVC. Está pendiente la revisión de la documentación del acta de liquidación del contrato de obra por parte de la Dirección Técnica Ambiental.</p> <p>- Tramo V: el 10 de enero de 2022 se reanudaron las actividades de obra, se finalizó el reforzamiento en los sectores I, II y III. Se adelantan mesas técnicas con la comunidad para que se permita el inicio de las actividades de refuerzo estático en Las Palmas.</p> <p>- Tramo VI. Contrato de obra suspendido hasta el 31 de marzo de 2022, el contratista de obra radicó en la ANLA la solicitud del permiso de aprovechamiento</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>forestal. Actualmente se está a la espera que la ANLA realice la revisión y presente las observaciones a la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal.</p> <p>- Tramo VII: el 4 de enero de 2022 se suscribió el otrosí No.8 al contrato de obra mediante el cual se amplió el plazo contractual por 3 meses y 2 días hasta el 6 de junio de 2022, incluyendo la etapa de recibo y entrega. Continúan las labores de hincado de tablestaca y construcción de anclajes. Se mantiene como ruta crítica la actividad "Instalación de anclajes", el contratista debe ejecutar estas actividades con 3 frentes de obra en simultaneo.</p> <p>Corresponde al avance de reforzamiento de Jarillón del Rio Cauca: Obras Tramo V: 0,2998 kilómetros reforzados Obras Tramo VII: 0,0185 kilómetros reforzados Total Avance año 2022: 0,3183 kilómetros</p>
Febrero	<p>Tramo V: Las actividades de reforzamiento en los sectores I, II y III ya finalizaron. El contratista continúa reforzamiento en el sector Las Palmas, siendo este el ultimo frente de obra. Se mantienen las mesas técnicas en el sector Las Palmas para mantener buenas relaciones con la comunidad, atender sus solicitudes y evitar así cualquier afectación en el desarrollo del proyecto.</p> <p>Tramo VI. Contrato de obra suspendido hasta el 31 de marzo de 2022, el contratista de obra radicó en la ANLA la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal.</p> <p>Tramo VII: El contratista terminó el hincado de tablestaca, por otro lado, continúan las labores de construcción de anclajes.</p> <p>Dificultades: Tramo V: La actividad de reforzamiento con columnas suelo cemento en el sector Las Palmas presenta bajos rendimientos dado que no se puede dar continuidad en la ejecución, debido a la necesidad de hacer traslados de acometidas eléctricas que interfieren con los equipos en la corona del Jarillón.</p> <p>Tramo VI: Actualmente la ANLA, solicitó al Contratista el complemento de la información cartográfica. El contratista solicitó esta información a Bienes e Inmuebles de la Alcaldía. Actualmente está a la espera de esta información para poder radicar en la ANLA.</p> <p>Tramo VII: Se mantiene como ruta crítica la actividad "Instalación de anclajes", el contratista debe mantener la ejecución de esta actividad con 3 frentes de obra en simultaneo para terminar en el periodo contractual.</p>
Marzo	<p>Avance: Corresponde a la finalización del reforzamiento del Jarillón del tramo V, equivalente a 317 metros - 0.712 km.</p> <p>- Tramo V: Las actividades de reforzamiento en todos los frentes de tramo V finalizaron. En este sentido, el contrato de obra de tramo V terminó el pasado 27 de marzo de 2022, no obstante, quedaron unos pendientes menores tales como: foro final, reconstrucción de cancha y juegos y empradización de Las Palmas.</p> <p>- Tramo VI. Contrato de obra suspendido hasta el 02 de mayo de 2022, el contratista de obra radicó en la ANLA la información complementaria a principios del mes de marzo, la ANLA notificó al Contratista del auto de inicio del proceso el 24 de marzo de 2022 y el 31 de marzo de 2022 la ANLA realizó visita de verificación del inventario forestal. A partir de la notificación del Auto de Inicio del proceso para la obtención del permiso de aprovechamiento forestal, la ANLA tiene 30 días hábiles para adelantar la revisión técnica y jurídica del permiso.</p> <p>- Tramo VII: El contrato de obra se encuentra suspendido, por 30 días desde el 18 de marzo de 2022 hasta el 18 de abril de 2022. El contrato se encuentra suspendido por las fuertes lluvias que se presentan en la zona de la obra, afectando el desarrollo de la misma, toda vez que se han presentado inundaciones en la zona de construcción de anclajes, la cual está localizada al lado del canal interceptor sur.</p>
Abril	<p>-Tramo V: El contrato de obra de tramo V terminó el pasado 27 de marzo de 2022, no obstante, quedaron unos pendientes por situaciones ajenas a la voluntad y capacidad del contratista, tales como: aumento del nivel del río cauca lo que dificulta</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>la instalación de válvulas para el control de las aguas lluvias, retrasos en la llegada de insumos para finalización de la cancha y juegos infantiles. Para la finalización de estos pendientes, la interventoría, mediante ajuste al acta de terminación, aprobó una ampliación del plazo hasta el 20 de mayo de 2022.</p> <p>-Tramo VI. Se suscribió ampliación 1 a la suspensión del contrato de obra hasta el 01 de junio de 2022, el 31 de marzo de 2022 la ANLA realizó visita de verificación del inventario forestal. En el proceso de revisión interna en ANLA, ya se surtió la revisión Técnica, estando en revisión jurídica en este momento.</p> <p>A partir de la notificación del Auto de Inicio del proceso para la obtención del permiso de aprovechamiento forestal, la ANLA tiene 30 días hábiles para adelantar la revisión técnica y jurídica del permiso, por lo tanto. para mantener la dinámica de la gestión, es importante el trabajo conjunto entre el contratista de obra, el FA y la Supervisión de tal forma que facilite la resolución de observaciones.</p> <p>-Tramo VII: Se suscribió suspensión No.6 del contrato de obra por 30 días desde el 22 de abril de 2022 hasta el 23 de mayo de 2022; lo anterior, por las fuertes lluvias que se presentan en la zona de la obra, afectando el desarrollo de la misma, toda vez que se han presentado inundaciones en la zona de construcción de anclajes, la cual está localizada al lado del canal interceptor sur.</p>
Mayo	<p>Tramo V: El contrato de obra de tramo V terminó el pasado 27 de marzo de 2022, durante el mes de mayo se cerraron los pendientes de obra. El 20 de mayo de 2022 se firmó acta de entrega y recibo entre contratista e interventoría.</p> <p>Tramo VI. La ANLA emitió el permiso de aprovechamiento forestal, Los contratos de obra e interventoría se reinician el 02 de junio de 2022. Una vez se reinicien los contratos. El contratista de obra y la interventoría de obra deben gestionar la aprobación de los pendientes para la suscripción de la etapa de Construcción (validación diseños CVC, aprobación obras preliminares de obra, entre otros)</p> <p>Tramo VII: Se suscribió suspensión No.7 del contrato de obra por 20 días desde el 27 de mayo de 2022 hasta el 15 de junio de 2022. El contrato se encuentra suspendido por las fuertes lluvias que se presentan en la zona de la obra, afectando el desarrollo de la misma, la saturación del terreno afecta los accesos a la obra y la ejecución de las actividades constructivas con maquinaria pesada, por lo que no se pueden ejecutar actividades como retiro de material, rellenos, anclajes, etc.</p>
Junio	<p>Tramo V: El contrato de obra de tramo V terminó el pasado 27 de marzo de 2022, durante el mes de junio continuó el proceso de revisión de la unidad documental para la suscripción del acta de liquidación de obra.</p> <p>Tramo VI. Reiniciaron los contratos de obra e interventoría el 29 de junio de 2022 en la etapa de Construcción, sobre la necesidad del permiso de ocupación de Cauce, la CVC y el DAGMA informaron que no se requiere para la obra, La CVC emitió comunicado aprobando los diseños. El contratista de obra y la interventoría de obra deben gestionar la aprobación y suscripción de la modificación contractual para la inclusión de items nuevos que resultaron de la optimización de los diseños.</p> <p>Tramo VII: Se suscribió ampliación No.1 de la suspensión No.7 del contrato de obra por 15 días desde el 16 de junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2022. El contrato se encuentra suspendido por las fuertes lluvias que se presentan en la zona de la obra, afectando el desarrollo de la misma, la saturación del terreno afecta los accesos a la obra y la ejecución de las actividades constructivas con maquinaria pesada, por lo que no se pueden ejecutar actividades como retiro de material, rellenos, anclajes, etc.</p>
Julio	REFORZAMIENTO DE JARILLON _ ACTIVIDADES

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Tramo V: El contrato de obra de tramo V terminó el pasado 27 de marzo de 2022, durante el mes de julio continuó el proceso de revisión de la unidad documental para la suscripción del acta de liquidación de obra.</p> <p>Tramo VI. Reiniciaron los contratos de obra e interventoría el 29 de junio de 2022 en la etapa de Construcción, el contratista se encuentra avanzando en actividades de Aprovechamiento forestal, se efectuó el Foro Inicial de Auditorías Visibles el 15 de julio de 2022: Así mismo, el contratista y la interventoría de obra se encuentran avanzando en los acuerdos para la definición de los APUs de los ítems nuevos eléctricos, para la debida gestión del trámite de la modificación contractual, requerida para la ejecución de estas actividades.</p> <p>Tramo VII: Se suscribió ampliación No.1 de la suspensión No.8 del contrato de obra por 15 días desde el 27 de julio de 2022 hasta el 10 de agosto de 2022.</p> <p>REFORZAMIENTO DE JARILLON _ DIFICULTADES</p> <p>Tramo V: De acuerdo con la gestión realizada entre CVC, Contratista e Interventoría, se vio la necesidad de ajustar las pólizas de la obra para incluir los mantenimientos de los árboles bajo compensación del proyecto, así como ajustes en el balance financiero, por lo cual se ha postergado la fecha de suscripción del acta de liquidación.</p> <p>Tramo VI: El contratista de obra y la interventoría de obra deben gestionar la aprobación y suscripción de la modificación contractual para la inclusión de ítems nuevos que resultaron de la optimización de los diseños.</p> <p>Tramo VII: El contrato se encuentra suspendido dada la necesidad de tiempo para efectuar el trámite de la solicitud de prórroga del contrato de obra en la etapa de construcción.</p>
Agosto	<p>REFORZAMIENTO DE JARILLON _ ACTIVIDADES</p> <p>-Tramo V: El contrato de obra de tramo V terminó el pasado 27 de marzo de 2022, durante el mes de agosto continuó el proceso de revisión del documento acta de liquidación, se requirió un nuevo balance de pagos por parte del FA para los contratos de obra e interventoría, así como la actualización de la póliza del contratista para incluir el mantenimiento de la compensación ambiental.</p> <p>REFORZAMIENTO DE JARILLON _ DIFICULTADES</p> <p>-Tramo V: De acuerdo con la gestión realizada entre CVC, Contratista e Interventoría, se vio la necesidad de ajustar las pólizas de la obra para incluir los mantenimientos de los árboles bajo compensación del proyecto, así como ajustes en el balance financiero, motivos que obligaron postergar la fecha de suscripción del acta de liquidación para septiembre de 2022.</p> <p>REFORZAMIENTO DE JARILLON _ ACTIVIDADES</p> <p>-Tramo VI. En ejecución de la etapa de Construcción, el contratista se encuentra avanzando en actividades de Aprovechamiento forestal, se lograron los acuerdos de los APU's de los ítems nuevos entre el Contratista y la Interventoría de obra, los cuales se deberán incluir en el contrato, la modificación contractual se encuentra en proceso de revisión por parte del Fondo Adaptación.</p> <p>REFORZAMIENTO DE JARILLON _ DIFICULTADES</p> <p>-Tramo VI: El contratista y la interventoría de obra deben gestionar la aprobación y suscripción de la modificación contractual para la inclusión de ítems nuevos que resultaron de la optimización de los diseños.</p> <p>REFORZAMIENTO DE JARILLON _ ACTIVIDADES</p> <p>-Tramo VII: el 12 de agosto de 2022 se suscribió acta de suspensión No.9 por un término de 1 mes y 2 días, desde el 12 de agosto de 2022 hasta el 13 de septiembre de 2022.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>REFORZAMIENTO DE JARILLON _ DIFICULTADES</p> <p>-Tramo VII: El contrato se encuentra suspendido dada la necesidad de tiempo para que, en el marco del debido proceso, se agote la posibilidad de la cesión o en su defecto promover lo contemplado en el numeral 1 de la cláusula décima séptima del contrato (terminación por mutuo acuerdo) de interventoría, lo anterior debido al reporte de inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación – PGN realizado a la firma interventora del proyecto.</p>
Septiembre	<p>REFORZAMIENTO DE JARILLON _ ACTIVIDADES</p> <p>Tramo V: El contrato de obra de tramo V terminó el pasado 27 de marzo de 2022, durante el mes de septiembre se culminó el proceso de revisión por parte del Departamento Jurídico de la DTA CVC del documento acta de liquidación, obteniendo su visto bueno.</p> <p>Tramo VI. En ejecución de la etapa de Construcción, el contratista se encuentra avanzando en actividades de Aprovechamiento forestal y excavaciones para reemplazo de material no competente, se lograron los acuerdos de los APUs de los ítems nuevos entre el Contratista y la Interventoría de obra, los cuales se deberán incluir en el contrato, actualmente se está gestionando la modificación contractual para la inclusión de estos Ítems al contrato de obra.</p> <p>Tramo VII: el 14 de septiembre de 2022, una vez superadas las razones que motivaron la suspensión No.9 se da reinicio a la obra.</p> <p>REFORZAMIENTO DE JARILLON _ DIFICULTADES</p> <p>Tramo V: Cambio del director de la Dirección Técnica Ambiental de CVC a finales del mes de septiembre, lo que ralentiza por su normal proceso de empalme, los pendientes, tendientes a la Liquidación Tramo V y por ende su entrega.</p> <p>Tramo VI: El contratista y la interventoría de obra deben gestionar la suscripción de la modificación contractual para la inclusión de ítems nuevos que resultaron de la optimización de los diseños.</p> <p>Tramo VII: el 14 de septiembre de 2022, una vez superadas las razones que motivaron la suspensión No.9 se da reinicio a la obra.</p>
(AEA16) Km de Jarillón, entregado	
Enero	<p>Se encuentra en proceso de elaboración y radicación por parte de CVC las actas de entrega al Municipio de los tramos Tramo I, subtramos, Calimio Decepaz, Tramo III. Se encuentra en proceso de liquidación los proyectos Tramo IV y lote 6A, una vez estos proyectos se encuentren liquidados, se podrá surtir por parte de CVC el mismo proceso que con los tramos mencionados anteriormente.</p> <p>A considerar, que no se tiene certeza acerca de los tiempos que se pueda tomar el Municipio para la revisión y aprobación de la documentación necesaria para el recibo de las obras de reforzamiento que ya se encuentren terminadas y listas para su entrega, lo cual puede extender el plazo que se ha estimado para el recibo por parte del Municipio.</p>
Febrero	<p>Las actas de entrega de Tramo I, Tramo III, Calimio Decepaz, y subtramos fueron revisadas por la unidad de Bienes y Servicios y por la oficina de Plan Jarillón del Distrito, CVC se encuentra realizando ajustes para posterior radicación en el Departamento de Gestión Jurídica Pública, quienes avalarán las actas de entrega para firma del alcalde. Para el caso de Lote 6A, el día 16-02-2022 se suscribió acta de liquidación del contrato de obra. CVC se encuentra estructurando la minuta de acta de entrega para remitirla al Distrito con los documentos necesarios para el proceso de entrega de esta obra. En el caso de tramo IV, CVC adelanta el proceso de liquidación del contrato de obra e interventoría.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Se mantiene la dificultad asociada a los tiempos que se pueda tomar el Municipio para la revisión y aprobación de la documentación necesaria para el recibo de las obras.</p>
<p>Marzo</p>	<p>Las actas de entrega de Tramo I, Tramo III, Calimio Desepaz, y subtramos fueron revisadas por la unidad de Bienes y Servicios y por la oficina de Plan Jarillón del Distrito, CVC radicó en el Departamento de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía para revisión, habiéndose efectuado observaciones por este organismo, las cuales actualmente se encuentran siendo atendidas por la CVC para una nueva radicación y aprobación.</p> <p>Para el caso de Lote 6A, el día 16-02-2022 se suscribió acta de liquidación del contrato de obra. CVC se encuentra estructurando la minuta de acta de entrega para remitirla al Distrito con los documentos necesarios para el proceso de entrega de esta obra.</p> <p>En el caso de tramo IV, el acta de liquidación fue suscrita el día 18 de marzo de 2022.</p> <p>Se mantiene la dificultad asociada a los tiempos que se pueda tomar el Municipio para la revisión y aprobación de la documentación necesaria para el recibo de las obras.</p>
<p>Abril</p>	<p>En ceremonia de entrega llevada a cabo entre Alcaldía, Fondo Adaptación, CVC, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Municipio, y Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, el día 06 de abril de 2022, se hizo el recibo por parte de la Alcaldía de las siguientes obras de reforzamiento del Jarillón del Río cauca:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tramo I (6,610 km) -Tramo III (2,465 km) -Tramo CaliMio Decepaz (0,080 km) -Tramo Subtramos (2,0 km) -Lote 6A (0,23 Km) <p>Para un total entregado de 11,39 Kilómetros</p> <p>En el caso de tramo IV, el acta de liquidación fue suscrita el día 18 de marzo de 2022. Se estima finalizar el proceso de entrega por parte de CVC en el mes de julio de 2022.</p> <p>En el caso de tramo V, el contrato de obra terminó el 27 de marzo de 2022. Actualmente se surte el proceso de liquidación de obra y posteriormente se adelantará el proceso de entrega y recibo al municipio programado para diciembre de 2022.</p> <p>De acuerdo con los procesos surtidos con la CVC y el Municipio, actualmente no se reportan dificultades para la elaboración y revisión de actas de recibo.</p>
<p>Mayo</p>	<p>Obras tramo IV, el acta de liquidación fue suscrita el día 18 de marzo de 2022. Se estima finalizar el proceso de entrega por parte de CVC en el mes de julio de 2022.</p> <p>Obras tramo V, el contrato de obra terminó el 27 de marzo de 2022. Actualmente se surte el proceso de liquidación de obra y posteriormente se adelantará el proceso de entrega y recibo al municipio programado para diciembre de 2022.</p>
<p>Junio</p>	<p>De acuerdo con los procesos surtidos con la CVC y el Municipio, hasta el momento se han presentado algunas inquietudes por parte de PJC Municipio sobre el cierre de tramo IV, por lo anterior desde la Supervisión de ProPacífico se solicitó una reunión</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Julio	<p>entre las entidades para aclarar dudas y definir línea de trabajo que permita la entrega de este tramo para julio de 2022.</p> <p>ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO _ ACTIVIDADES</p> <p>En el mes de abril de 2022 se hizo la entrega al Municipio de Tramo I, Tramo III, Subtramos, Calimio Decepaz y las obras del Lote 6A.</p> <p>Obras tramo IV, el acta de liquidación fue suscrita el día 18 de marzo de 2022. Se estima finalizar el proceso de entrega por parte de CVC en el mes de octubre de 2022.</p> <p>Obras tramo V, el contrato de obra terminó el 27 de marzo de 2022. Actualmente se surte el proceso de liquidación de obra, se estima que el acta de liquidación se firme en el mes de agosto de 2022. Posteriormente se adelantará el proceso de entrega y recibo al municipio, el cual se estima sea para diciembre de 2022.</p> <p>ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO _ DIFICULTADES</p> <p>De acuerdo con los procesos surtidos con la CVC y el Municipio, hasta el momento continúan las inquietudes por parte de PJC Municipio sobre el cierre de tramo IV, por lo anterior se llevó a cabo reunión del CDL el 29 de julio de 2022 en donde se acordó que tanto CVC como PJC Municipio se reunirán para aclarar las dudas y poder suscribir el acta de entrega.</p>
Agosto	<p>ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO _ ACTIVIDADES</p> <p>-En el mes de abril de 2022 se hizo la entrega al Municipio de Tramo I, Tramo III, Subtramos, Calimio Decepaz y las obras del Lote 6A.</p> <p>-Obras tramo IV, el acta de liquidación fue suscrita el día 18 de marzo de 2022. Se estima finalizar el proceso de entrega por parte de CVC en el mes de octubre de 2022.</p> <p>-Obras tramo V, el contrato de obra terminó el 27 de marzo de 2022. Actualmente se surte el proceso de liquidación de obra, se estima que el acta de liquidación se firme en el mes de septiembre de 2022. Posteriormente se adelantará el proceso de entrega y recibo al municipio, el cual se estima sea para diciembre de 2022.</p> <p>ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO _ DIFICULTADES</p> <p>-De acuerdo con los procesos surtidos con la CVC y el Municipio, hasta el momento persisten las inquietudes por parte de PJC Municipio sobre el cierre de tramo IV, por lo anterior se requiere reunión entre el director de la DTA de CVC y gerente de PJC Municipio para aclarar dichas inquietudes y formalizar la entrega de la obra y poder suscribir el acta.</p>
Septiembre	<p>ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO _ ACTIVIDADES</p> <p>En el mes de abril de 2022 se hizo la entrega al Municipio de Tramo I, Tramo III, Subtramos, Calimio Decepaz y las obras del Lote 6A.</p> <p>Obras tramo IV, el acta de liquidación fue suscrita el día 18 de marzo de 2022. Se estima finalizar el proceso de entrega por parte de CVC en el mes de diciembre de 2022.</p> <p>Obras tramo V, el contrato de obra terminó el 27 de marzo de 2022. Actualmente se surte el proceso de liquidación de obra, se estima que el acta de liquidación se firme en el mes de noviembre de 2022. Posteriormente se adelantará el proceso de entrega y recibo al municipio, el cual se estima sea para diciembre de 2022.</p> <p>ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO _ DIFICULTADES</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Cambio del director de la Dirección Técnica Ambiental de CVC a finales del mes de septiembre, lo que ralentiza por su normal proceso de empalme, los pendientes tendientes tanto a la entrega de Tramo IV y Liquidación Tramo V.</p> <p>De acuerdo con los procesos surtidos con la CVC y el Municipio, hasta el momento persisten las inquietudes por parte de PJC Municipio sobre el cierre de tramo IV, por lo anterior se requiere reunión entre el director de la DTA de CVC y gerente de PJC Municipio para aclarar dichas inquietudes y formalizar la entrega de la obra y poder suscribir el acta.</p>
(AEA17) Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	
Enero	<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> _ El contrato de obra tuvo su reinicio automático el día 19/01/2022 con fecha de terminación del 08/02/2022. El contratista de obra solicitó una nueva suspensión por un periodo de 30 días, la cual se encuentra en estudio por parte del Fondo Adaptación. _ Se adelanta viabilidad de hacer entrega técnica y ante EMCALI de las obras PTAP las cuales se encuentran ejecutadas en un 100%. - El contratista de obra se encuentra adelantando ante las autoridades ambientales (DAGMA, CVC) el permiso de cierre de la PTAR Cañaveralejo, como labor previa para la instalación de las válvulas pico de pato. <p>Dificultades</p> <ul style="list-style-type: none"> _ El periodo restante del contrato de obra es reducido, lo cual implica que el contratista deba establecer procesos en paralelo para lograr culminar las labores pendientes de ejecución en la PTAR referidas al reforzamiento del canal de descarga y la instalación de las válvulas pico de pato. _ La gestión de aprobación del cierre de la PTAR, puede tomarse un tiempo considerable alterando el cronograma de ejecución del contrato de obra (Instalación, pruebas y recibo de válvulas pico de pato). Adicional a lo anterior, las condiciones de caudales para poder adelantar la maniobra de instalación son muy específicos y de no darse los mismos, puede causar alteraciones en el desarrollo de los trabajos.
Febrero	<p>Obra Ptar-Ptap: El contrato de obra se suspendió a partir del 02 de febrero de 2022 con fecha de reinicio del 19 de abril de 2022, lo anterior motivado por los altos niveles presentados en el canal de descarga PTAR. Actualmente, el contratista de obra se encuentra adelantando ante las autoridades ambientales (DAGMA, CVC) el permiso de cierre de la PTAR Cañaveralejo, como labor previa para la instalación de las válvulas pico de pato.</p>
Marzo	<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> _ El contrato de obra se suspendió a partir del 02 de febrero de 2022 con fecha de reinicio del 19 de abril de 2022, lo anterior motivado por los altos niveles del Río Cauca presentados en el canal de descarga PTAR. Actualmente, el contratista de obra se encuentra adelantando ante las autoridades ambientales (DAGMA, CVC) el permiso de cierre de la PTAR Cañaveralejo, como labor previa para la instalación de las válvulas pico de pato, para lo cual ha venido atendiendo las observaciones efectuadas por las autoridades ambientales, teniéndose la última radicación del contratista al DAGMA el día 8 de marzo de 2022. <p>Dificultades</p> <ul style="list-style-type: none"> _ El periodo restante del contrato de obra es reducido, lo cual implica que el contratista deba establecer procesos en paralelo para lograr culminar las labores pendientes de ejecución en la PTAR referidas al reforzamiento del canal de descarga y la instalación de las válvulas pico de pato. De igual manera, el contratista debe definir y gestionar la estrategia que le permita cumplir con la totalidad de las obligaciones del contrato, solicitando si es del caso plazo adicional. _ La gestión de aprobación del cierre de la PTAR, puede tomarse un tiempo considerable alterando el cronograma de ejecución del contrato de obra (Instalación, pruebas y recibo de válvulas pico de pato). Adicional a lo anterior, las condiciones de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Abril	<p>caudales para poder adelantar la maniobra de instalación son muy específicos y de no darse los mismos, puede causar alteraciones en el desarrollo de los trabajos.</p> <p>El contrato de obra se suspendió a partir del 02 de febrero de 2022 con fecha de reinicio actualizada del 03 de junio de 2022, de acuerdo a lo indicado en el acta de ampliación No 2 a la suspensión No 13, lo anterior motivado por los altos niveles del Río Cauca presentados en el canal de descarga PTAR.</p> <p>El 04 de abril 2022 el DAGMA emitió aprobación para el cierre de la PTAR Cañaveralejo, como labor previa para la instalación de las válvulas pico de pato.</p> <p>El periodo restante del contrato de obra es reducido, lo cual implica que el contratista deba establecer procesos en paralelo para lograr culminar las labores pendientes de ejecución en la PTAR referidas al reforzamiento del canal de descarga y la instalación de las válvulas pico de pato. De igual manera, el contratista debe definir y gestionar la estrategia que le permita cumplir con la totalidad de las obligaciones del contrato.</p> <p>Con la aprobación emitida por la entidad ambiental, el contratista debe valorar las actividades a ejecutar durante el cierre de la PTAR para posteriormente, si es el caso, gestionar recursos adicionales por parte de EMCALI.</p>
Mayo	<p>El contrato de obra se suspendió a partir del 02 de febrero de 2022 con fecha de reinicio actualizada del 19 de julio de 2022, de acuerdo a lo indicado en el acta de ampliación No 3 a la suspensión No 13, lo anterior motivado por los altos niveles del Río Cauca presentados en el canal de descarga PTAR.</p>
Junio	<p>El contrato de obra se suspendió a partir del 02 de febrero de 2022 con fecha de reinicio actualizada del 19 de julio de 2022, de acuerdo a lo indicado en el acta de ampliación No 3 a la suspensión No 13, lo anterior motivado por los altos niveles del Río Cauca presentados en el canal de descarga PTAR.</p> <p>Con la aprobación emitida por la entidad ambiental, el contratista debe valorar las actividades a ejecutar (APU´s) correspondientes al monitoreo ambiental durante el cierre de la PTAR como sustento para posteriormente, si es del caso, EMCALI pueda adelantar la gestión de consecución de recursos adicionales.</p>
Julio	<p>OBRAS PTAR-PTAP_ACTIVIDADES</p> <p>El contrato de obra se suspendió a partir del 22 de julio de 2022 con fecha de reinicio actualizada del 2 de agosto de 2022, de acuerdo con lo indicado en el acta de ampliación No 14, dada la necesidad de evaluar y analizar los APU´s remitidos por el contratista relacionados al monitoreo ambiental durante la parada de la PTAR, como requisito para adelantar el trámite de la solicitud de prórroga a la ejecución.</p> <p>OBRAS PTAR-PTAP_DIFICULTADES</p> <p>Si bien se presentaron dificultades en la entrega de los APU´s del monitoreo ambiental por parte del contratista, estos fueron remitidos formalmente por el contratista el 21 de julio de 2022 a la interventoría y Emcali, no obstante, se requiere de tiempo para la respectiva revisión de los ítems no previstos que posiblemente serán objeto de adición de recursos y prórroga al contrato de obra para su correcta ejecución y terminación de las demás actividades contractuales (reforzamiento del canal de descarga y la instalación de las válvulas pico de pato) así como la totalidad de las obligaciones del contrato.</p>
Agosto	<p>OBRAS PTAR-PTAP_ACTIVIDADES</p> <p>Se amplió la suspensión 14 del contrato de obra a partir del 3 de agosto de 2022 con fecha de reinicio actualizada del 6 de septiembre de 2022, dada la necesidad de evaluar y analizar los APU´s remitidos por el contratista relacionados al monitoreo ambiental durante la parada de la PTAR, como requisito para adelantar el trámite de la solicitud de prórroga a la ejecución.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
	<p>OBRAS PTAR-PTAP_DIFICULTADES</p> <p>Si bien se presentaron dificultades en la entrega de los APU's del monitoreo ambiental por parte del contratista, estos fueron remitidos formalmente por el contratista el 21 de julio de 2022 a la interventoría y Emcali, no obstante, todavía se requiere de tiempo para la revisión de los ítems no previstos que posiblemente serán objeto de adición de recursos y prórroga al contrato de obra para su correcta ejecución y terminación de las demás actividades contractuales (reforzamiento del canal de descarga y la instalación de las válvulas pico de pato) así como la totalidad de las obligaciones del contrato.</p>
Septiembre	<p>OBRAS PTAR-PTAP_ACTIVIDADES</p> <p>Se amplió la suspensión 14 del contrato de obra a partir del 6 de septiembre de 2022 con fecha de reinicio actualizada del 21 de octubre de 2022, dada la necesidad de que EMCALI evalúe y analice los APU's remitidos por el contratista relacionados al monitoreo ambiental durante la parada de la PTAR, como requisito para adelantar el trámite de la solicitud de prórroga a la ejecución.</p> <p>OBRAS PTAR-PTAP_DIFICULTADES</p> <p>En atención a último comunicado enviado por EMCALI del 7 de septiembre de 2022, en respuesta a la solicitud hecha por el contratista, en lo particular a la revisión de APUS (Plan de monitoreos, Plan de difusión y Plan de emergencia), EMCALI solicita en reunión posterior, a la interventoría dar alcance y complementar su concepto, con el fin de fortalecer sus argumentos de aprobación, que sirvan de base para la revisión de estos APUS, por parte de EMCALI.</p>
(AEA18) Obras infraestructura estratégica, entregadas (PTAR, PTAP)	
Enero	<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> _ El contrato de obra tuvo su reinicio automático el día 19/01/2022 con fecha de terminación del 08/02/2022. El contratista de obra solicitó una nueva suspensión por un periodo de 30 días, la cual se encuentra en estudio por parte del Fondo Adaptación. _ Se adelanta viabilidad de hacer entrega técnica y ante EMCALI de las obras PTAP las cuales se encuentran ejecutadas en un 100%. - El contratista de obra se encuentra adelantando ante las autoridades ambientales (DAGMA, CVC) el permiso de cierre de la PTAR Cañaveralejo, como labor previa para la instalación de las válvulas pico de pato. <p>Dificultades</p> <ul style="list-style-type: none"> _ El periodo restante del contrato de obra es reducido, lo cual implica que el contratista deba establecer procesos en paralelo para lograr culminar las labores pendientes de ejecución en la PTAR referidas al reforzamiento del canal de descarga y la instalación de las válvulas pico de pato. _ La gestión de aprobación del cierre de la PTAR, puede tomarse un tiempo considerable alterando el cronograma de ejecución del contrato de obra (Instalación, pruebas y recibo de válvulas pico de pato). Adicional a lo anterior, las condiciones de caudales para poder adelantar la maniobra de instalación son muy específicos y de no darse los mismos, puede causar alteraciones en el desarrollo de los trabajos. <p>ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP A EMCALI _ ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI. Dificultad frente el cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras que tiene fecha de terminación actualizada de su contrato para el día 8 de febrero de 2022.
Febrero	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	<p>Entrega Ptar-Ptap: EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI. Ante la consulta adelantada ante EMCALI acerca de la viabilidad de hacer entrega técnica parcial de las obras de la PTAP las cuales se encuentran ejecutadas en un 100%, esta entidad manifestó que no es viable hacer recibos parciales de obras, y que adicionalmente se requiere el acta de liquidación del contrato de obra.</p> <p>Dificultades: Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras que tiene fecha de terminación actualizada de su contrato para el día 23 de abril 2022.</p>
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	<p>EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI, estimada para diciembre de 2022.</p> <p>Se identifica como dificultad que el cierre técnico de las actividades a cargo del contratista está definido con fecha de terminación para el día 23 de julio de 2022. Una vez se reactive el contrato el 19 de julio de 2022, el contrato tendría solo una duración restante de 5 días.</p>
Julio	<p>ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP A EMCALI _ ACTIVIDADES</p> <p>EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI, estimada para el 30 diciembre 2022.</p> <p>ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP _ DIFICULTADES</p> <p>Con la suspensión 14 suscrita el 22 de julio de 2022, el cierre técnico de las actividades a cargo del contratista tiene nueva fecha de terminación para el día 4 de agosto de 2022. Una vez se reactive el contrato el 3 de agosto de 2022, tentativamente se procedería con la suscripción del otrosí al contrato de obra para ampliar el periodo de ejecución, esto supeditado al análisis previo de los APU´s del monitoreo ambiental.</p>
Agosto	<p>ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP A EMCALI _ ACTIVIDADES</p> <p>EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI, estimada para enero 2023.</p> <p>ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP _ DIFICULTADES</p> <p>Con la ampliación No. 1 de la suspensión 14 suscrita el 2 agosto de 2022, el cierre técnico de las actividades a cargo del contratista tiene nueva fecha de terminación para el día 7 de septiembre de 2022. Una vez se reactive el contrato el 6 de septiembre de 2022, tentativamente se procedería con la suscripción del otrosí al contrato de obra para ampliar el periodo de ejecución, esto supeditado al análisis previo de los APU´s del monitoreo ambiental y posiblemente la necesidad de ampliar nuevamente la suspensión 14.</p>
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

GRAMALOTE

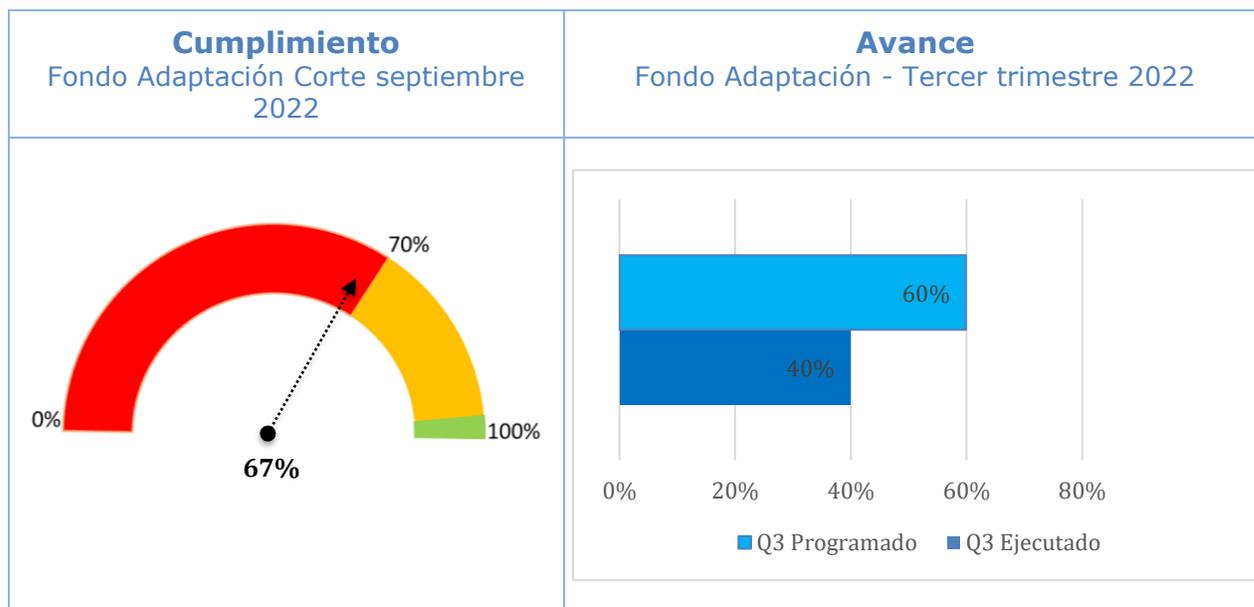

	Portafolio/Programa/Proyecto: GRAMALOTE Gerente de Meta: Asesor Macroproyecto Gramalote						
Objetivo estratégico 2018-2022 #1	Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático						
Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades/hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación trimestral Meta Q1 Meta Q2 Meta Q3 Meta Q4				Avance meta
AEA20_Terminar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento	(AEA20)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos terminados	1	1				1
Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades/hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación trimestral Meta Q1 Meta Q2 Meta Q3 Meta Q4				Avance meta
AEA21_Entregar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento	(AEA21)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos entregados	2	2				2
AEA22_Contratar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA22)_Viviendas municipio gramalote, contratadas	128		128			0
AEA23_Terminar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA23)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	72			72		N.A.
AEA24_Entregar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA24)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	67			67		N.A.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEA20)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos terminados	
Enero	El pasado 31 de enero de 2022, se terminó el equipamiento Casa de la Cultura, adicionalmente, el 19 de marzo se realizó la socialización de los manuales de mantenimiento y el plan de sostenibilidad a los funcionarios de la alcaldía de Gramalote, así como el 23 del mismo mes se realizó el foro final del equipamiento a la comunidad gramalotera. Actualmente, el estado de la Casa de la Cultura se encuentra a la espera de la firma del acta de entrega por parte de la entidad territorial.
Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	La Casa del campesino se terminó el pasado 14 de diciembre de 2021, así mismo, el 11 de marzo se realizó el foro final del equipamiento y se encuentra a la espera de la firma del acta de entrega por parte de la entidad territorial.
Abril	El pasado 31 de enero de 2022, se terminó el equipamiento Casa de la Cultura, adicionalmente, el 19 de marzo se realizó la socialización de los manuales de mantenimiento y el plan de sostenibilidad a los funcionarios de la alcaldía de Gramalote. El acta de entrega a satisfacción de la Casa de la Cultura se firmó el 29 de abril de 2022
Mayo	Meta de la vigencia cumplida
Junio	Meta de la vigencia cumplida
Julio	Meta de la vigencia cumplida
Agosto	Meta de la vigencia cumplida
Septiembre	Meta de la vigencia cumplida
(AEA21)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos entregados	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	Si bien, los dos equipamientos (C. Cultura y C. Campesino) se terminaron en diciembre de 2021 y enero de 2022, la entrega de dichos equipamientos se encuentra a la espera de la firma del alcalde como representante de la entidad territorial, en línea con este avance se ha gestionado la firma del alcalde en varios escenarios de seguimiento, sin embargo, no ha sido posible por agenda del mandatario municipal.
Abril	El pasado 29 de abril la Entidad Territorial de Gramalote en cabeza de su alcalde, firmó el acta de entrega a satisfacción de los equipamientos Casa de la Cultura y Casa del Campesino cumpliendo así la entrega de 2 equipamientos al municipio.
Mayo	Meta de la vigencia cumplida
Junio	Meta de la vigencia cumplida
Julio	Meta de la vigencia cumplida
Agosto	Meta de la vigencia cumplida
Septiembre	Meta de la vigencia cumplida
(AEA22)_Viviendas municipio gramalote, contratadas	
Enero	No aplica para el periodo de reporte
Febrero	No aplica para el periodo de reporte
Marzo	Se recibieron observaciones en el marco del proceso No. FA-LP-I-S-001-202 abierto en el mes de febrero y se modificó el cronograma de publicación de respuestas y fechas estimadas de contratación de las 128 viviendas. Así mismo, el PNUD presentó propuesta económica el pasado 15 de marzo, la cual se encuentra en análisis por parte del equipo del macroproyecto. El proceso fue retirado el 23 de marzo con el fin de ajustar el presupuesto del proceso y a la espera del análisis aplicado a la propuesta del PNUD.
Abril	El 5 de abril en el Consejo Directivo del Fondo Adaptación se aprobó la adición de recursos para continuar con la contratación de las 128 viviendas, en este sentido, se actualizaron los estudios previos tanto de la obra como de la interventoría. Paralelo

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	a esta actividad se realizaron mesas de trabajo con el PNUD con el fin de definir el objetivo del acompañamiento que brindará esta entidad para lograr la terminación de las 128 viviendas en el municipio de Gramalote.
Mayo	El 27 de mayo se tomó la decisión de continuar a través de un convenio interadministrativo con el PNUD, la construcción terminación y entrega de las viviendas faltantes del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, por lo que se continúa con las mesas de trabajo con el PNUD, con el fin de definir las condiciones técnicas del convenio, el cual se estima ser suscrito en junio de 2022.
Junio	Durante el mes de junio de 2022 se aprobaron los recursos de la adición para la construcción de las 128 viviendas faltantes en el municipio de Gramalote, adicionalmente, el macroproyecto continúa realizando la actualización de los documentos económicos y estudios previos para el proceso de obra y de interventoría, ajustado de acuerdo a las nuevas condiciones del mercado.
Julio	<p>El 19 de julio de 2022 fue aprobado por parte del comité de contratación la publicación del nuevo proceso de Licitación Pública a través de la página del SECOP II, el 21 de julio de 2022, el Fondo Adaptación publicó el aviso de convocatoria pública, con los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones del proceso.</p> <p>Las observaciones al proyecto de pliego se recibirán hasta el 4 de agosto y el 12 del mismo mes se publicará el pliego definitivo.</p> <p>Se tiene prevista una visita al sitio de las obras durante el mes de agosto de 2022 para el mejor conocimiento de la zona, del sitio de desarrollo del proyecto y de las viviendas existentes que serán objeto de terminación, esta visita por parte de los interesados y acompañados por el Fondo Adaptación será de gran importancia con el fin de que se conozca de manera directa el estado actual y avance de las obras ya existentes y las condiciones y características propias de la intervención a ser contratada.</p>
Agosto	<p>El 4 de agosto de 2022 se recibieron 5 observaciones de posibles participantes del proceso.</p> <p>El 9 de agosto se realizó la visita por parte de los interesados, acompañados por el Fondo Adaptación al lugar de ejecución del contrato, con el objeto de que se conozca de manera directa el estado actual y avance de las obras ya existentes y las condiciones y características propias de la intervención a ser contratada.</p> <p>El 12 de agosto de 2022 se publicaron las respuestas a las observaciones y se publicó el Pliego definitivo.</p> <p>El 30 de agosto de 2022, se publicó la Adenda No 1 mediante la cual se modifica el cronograma del proceso en razón a: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, y en atención a las observaciones recibidas al pliego de condiciones definitivo, con relación a las garantías que amparan el proceso, se hace necesario modificar el CRONOGRAMA, ya que, a pesar de las mesas de trabajo adelantadas por la Entidad, se considera oportuno retomar las mesas de trabajo, de manera que, sea posible identificar la potencial participación que habrá por parte de las compañías de seguros en el proceso.</p>
Septiembre	El 19 de septiembre fue publicado en la página del SECOP II, el proceso de selección FA-CMA-I-S-003-2022, con el cual se pretende contratar la interventoría Integral al contrato de construcción y terminación de las viviendas faltantes del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote. El pasado 28 de septiembre se publicaron los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones, así mismo, el mismo día fue publicado el informe de evaluación de la oferta presentada en el marco del proceso FA-LP-I-S-004-2022 "construcción de vivienda" con oportunidad para el contratista de subsanar y de acuerdo con el cronograma el plazo para hacerlo es hasta el 5 de octubre de 2022.
(AEA23)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	
Enero	No aplica para el periodo de reporte
Febrero	No aplica para el periodo de reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	Durante el primer trimestre del presente año se hizo apertura de un proceso de licitación pública el 22 de febrero de 2022 el cual debió cerrarse el 23 de marzo, en la etapa de prepliegos por motivos de resolución de observaciones que conllevó a la elaboración de un nuevo estudio de mercado que arrojó como resultado la actualización del presupuesto estimado. A la fecha nos encontramos en aprobación y trámite de los recursos adicionales requeridos para el macroproyecto.
Abril	No aplica para el periodo de reporte
Mayo	No aplica para el periodo de reporte
Junio	No aplica para el periodo de reporte
Julio	<p>El 19 de julio de 2022 fue aprobado por parte del comité de contratación la publicación del nuevo proceso de Licitación Pública a través de la página del SECOP II, el 21 de julio de 2022, el Fondo Adaptación publicó el aviso de convocatoria pública, con los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones del proceso.</p> <p>Las observaciones al proyecto de pliego se recibirán hasta el 4 de agosto y el 12 del mismo mes se publicará el pliego definitivo.</p> <p>Se tiene prevista una visita al sitio de las obras durante el mes de agosto de 2022 para el mejor conocimiento de la zona, del sitio de desarrollo del proyecto y de las viviendas existentes que serán objeto de terminación, esta visita por parte de los interesados y acompañados por el Fondo Adaptación será de gran importancia con el fin de que se conozca de manera directa el estado actual y avance de las obras ya existentes y las condiciones y características propias de la intervención a ser contratada.</p>
Agosto	<p>El 4 de agosto de 2022 se recibieron 5 observaciones de posibles participantes del proceso.</p> <p>El 9 de agosto se realizó la visita por parte de los interesados, acompañados por el Fondo Adaptación al lugar de ejecución del contrato, con el objeto de que se conozca de manera directa el estado actual y avance de las obras ya existentes y las condiciones y características propias de la intervención a ser contratada.</p> <p>El 12 de agosto de 2022 se publicaron las respuestas a las observaciones y se publicó el Pliego definitivo.</p> <p>El 30 de agosto de 2022, se publicó la Adenda No 1 mediante la cual se modifica el cronograma del proceso en razón a: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, y en atención a las observaciones recibidas al pliego de condiciones definitivo, con relación a las garantías que amparan el proceso, se hace necesario modificar el CRONOGRAMA, ya que, a pesar de las mesas de trabajo adelantadas por la Entidad, se considera oportuno retomar las mesas de trabajo, de manera que, sea posible identificar la potencial participación que habrá por parte de las compañías de seguros en el proceso.</p>
Septiembre	El 19 de septiembre fue publicado en la página del SECOP II, el proceso de selección FA-CMA-I-S-003-2022, con el cual se pretende contratar la interventoría Integral al contrato de construcción y terminación de las viviendas faltantes del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote. El pasado 28 de septiembre se publicaron los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones, así mismo, el mismo día fue publicado el informe de evaluación de la oferta presentada en el marco del proceso FA-LP-I-S-004-2022 "construcción de vivienda" con oportunidad para el contratista de subsanar y de acuerdo con el cronograma el plazo para hacerlo es hasta el 5 de octubre de 2022.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
(AEA24)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	
Enero	No aplica para el periodo de reporte
Febrero	No aplica para el periodo de reporte
Marzo	Durante el primer trimestre del presente año se hizo apertura de un proceso de licitación pública el 22 de febrero de 2022 el cual debió cerrarse el 23 de marzo, en la etapa de prepliegos por motivos de resolución de observaciones que conllevó a la elaboración de un nuevo estudio de mercado que arrojó como resultado la actualización del presupuesto estimado. A la fecha nos encontramos en aprobación y trámite de los recursos adicionales requeridos para el macroproyecto.
Abril	No aplica para el periodo de reporte
Mayo	No aplica para el periodo de reporte
Junio	No aplica para el periodo de reporte
Julio	<p>El 19 de julio de 2022 fue aprobado por parte del comité de contratación la publicación del nuevo proceso de Licitación Pública a través de la página del SECOP II, el 21 de julio de 2022, el Fondo Adaptación publicó el aviso de convocatoria pública, con los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones del proceso.</p> <p>Las observaciones al proyecto de pliego se recibirán hasta el 4 de agosto y el 12 del mismo mes se publicará el pliego definitivo.</p> <p>Se tiene prevista una visita al sitio de las obras durante el mes de agosto de 2022 para el mejor conocimiento de la zona, del sitio de desarrollo del proyecto y de las viviendas existentes que serán objeto de terminación, esta visita por parte de los interesados y acompañados por el Fondo Adaptación será de gran importancia con el fin de que se conozca de manera directa el estado actual y avance de las obras ya existentes y las condiciones y características propias de la intervención a ser contratada.</p>
Agosto	<p>El 4 de agosto de 2022 se recibieron 5 observaciones de posibles participantes del proceso.</p> <p>El 9 de agosto se realizó la visita por parte de los interesados, acompañados por el Fondo Adaptación al lugar de ejecución del contrato, con el objeto de que se conozca de manera directa el estado actual y avance de las obras ya existentes y las condiciones y características propias de la intervención a ser contratada.</p> <p>El 12 de agosto de 2022 se publicaron las respuestas a las observaciones y se publicó el Pliego definitivo.</p> <p>El 30 de agosto de 2022, se publicó la Adenda No 1 mediante la cual se modifica el cronograma del proceso en razón a: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, y en atención a las observaciones recibidas al pliego de condiciones definitivo, con relación a las garantías que amparan el proceso, se hace necesario modificar el CRONOGRAMA, ya que, a pesar de las mesas de trabajo adelantadas por la Entidad, se considera oportuno retomar las mesas de trabajo, de manera que, sea posible identificar la potencial participación que habrá por parte de las compañías de seguros en el proceso.</p>
Septiembre	El 19 de septiembre fue publicado en la página del SECOP II, el proceso de selección FA-CMA-I-S-003-2022, con el cual se pretende contratar la interventoría Integral al contrato de construcción y terminación de las viviendas faltantes del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote. El pasado 28 de septiembre se publicaron los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones, así mismo, el mismo día fue publicado el informe de evaluación de la oferta presentada en el marco del proceso

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	FA-LP-I-S-004-2022 "construcción de vivienda" con oportunidad para el contratista de subsanar y de acuerdo con el cronograma el plazo para hacerlo es hasta el 5 de octubre de 2022.

Nota: Para el cálculo de los avances de cumplimiento se hace un promedio de los porcentajes planeado y de ejecución de cada uno de los indicadores del año y al trimestre de corte.

RÍO FONCE



Portafolio/Programa/Proyecto:

RÍO FONCE

Gerente de Meta:

Asesor Proyecto Río Fonce (+ Sector Medio Ambiente)

Objetivo estratégico 2018-2022 #1 IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO							
Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades/hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA19_Entregar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES PEI)	(AEA19)_Obras de estabilización entregadas (INDICADOR PEI) [2 pte +1 obra estab]	3				3	N.A.

Mes	Avance Cualitativo
	(AEA19)_Obras de estabilización entregadas (INDICADOR PEI) [2 pte +1 obra estab]
Enero	No aplica para el periodo de reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Febrero	No aplica para el periodo de reporte
Marzo	<p>PINCHOTE: Los principales rezagos en Pinchote corresponden a la falta de la instalación de biomanto de fique para la finalización con la hidrosiembra, Limpieza del canal del vertedero, planos récord, manual de mantenimiento y buen uso de la obra y el acta de entrega de la obra. Avance: 99.9%+</p> <p>ONZAGA: Falta Colocar y compactar material rampa derecha del puente, segunda mano de pintura en barandas, resanar el hormigoneo que se encuentra bajo la viga, demolición de los soportes de formaleta, repello de gaviones, prueba de carga, planos récord, manual de mantenimiento y buen uso de la obra y el acta de entrega de la obra. Avance: 95%</p> <p>SAN JOAQUIN: Falta resanar el hormigoneo que se encuentra bajo la viga, cortar los alambres de amarre de formaleta de las vigas, prueba de carga, planos récord, manual de mantenimiento y buen uso de la obra y el acta de entrega de la obra. Avance: 99%</p> <p>El 03, 09 y 15 de marzo del 2022 el Fondo convocó y sostuvo reuniones con los directivos del Departamento de Santander, con el fin de que dicha entidad implemente las acciones necesarias para lograr terminar y entregar las obras. El 15 de marzo de 2022, el Departamento, remitió copia el informe de incumplimiento del contrato nro. 3553 de 2015 elaborado por de la interventoría, indicando en reunión que el informe debía ser complementado. Se espera que el Departamento avance en este proceso.</p>
Abril	Mediante oficio radicado nro. 20220067825 (R-2022-004445 del 8/4/2022) el Departamento de Santander presentó solicitud de ampliación del plazo del convenio. La solicitud no presenta las acciones a efectuar en el plazo adicional solicitado, incluyendo el plan de trabajo que pretende cumplir para lograr la terminación de las obras; por la anterior será requerido el Departamento por parte del Fondo.
Mayo	El día 26 de mayo se llevó a cabo la audiencia de declaratoria de incumplimiento realizada de manera virtual, con la participación de la Gobernación de Santander, Contratista de obra, Interventoría del contrato de obra y el Fondo Adaptación, donde según informe presentado por el contratista las 3 obras se encuentran terminadas. Se realizaron observaciones por parte de la Interventoría frente a la obra de la Represa Las Lajas las cuales serán verificadas en el marco de las visitas programadas para la entrega a la Gobernación de Santander e Interventoría de los 3 frentes de obra los días 6 y 7 de junio.
Junio	<p>Se reprogramó audiencia de posible incumplimiento para el día 30 de junio de 2022 la cual se llevó a cabo de manera virtual por parte de la Gobernación de Santander con la participación del contratista de obra Consorcio Río Fonce, Interventoría del contrato de obra, aseguradora y el Fondo Adaptación, donde según informe presentado por el supervisor de la gobernación las 3 obras se encuentran con faltantes, incumpliendo los compromisos de entrega de las obras para los días 6 y 7 de junio como se había acordado en la audiencia del 26 de mayo de 2022.</p> <p>Se cito para dar continuación a la audiencia pública de posible incumplimiento y dar lectura al auto administrativo de la misma para el día 14 de julio de 2022.</p>
Julio	Se realizó continuación de la audiencia programada por la Gobernación de Santander de un posible incumplimiento del contratista de obra del contrato 3553 el día 25 de julio de 2022, donde se acepta la suspensión de la audiencia para


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	reanudarla el 5 de septiembre de 2022 con el fin de que el contratista realice y entregue las pruebas de carga solicitadas por el Departamento.
Agosto	<p>Se proyecta oficio E-2022-025236 de 29 de agosto de 2022, donde se reitera la importancia de la terminación y entrega de las obras del Contrato nro. 3553 de 2015, así como los pendientes relacionados con los contratos nro 3552 y 3553 de 2015. Mediante el mencionado oficio se propone a la gobernación programar una reunión en la sede de la Gobernación para septiembre con el fin de conocer las condiciones de finalización y entrega de las obras del proyecto Río Fonce.</p> <p>Es importante resaltar que la Gobernación de Santander actualmente adelanta el proceso de presunto incumplimiento al Contrato nro. 3553 de 2015, siendo la última citación el 25 de julio de 2022, en la cual se suspendió la audiencia concluyendo que se reanudaría el 5 de septiembre de 2022.</p>
Septiembre	<p>La Gobernación de Santander en el desarrollo del proceso de presunto incumplimiento que se ha venido adelantando desde el 26 de mayo de 2022 al Contrato nro. 3553 de 2015, concluye en su última audiencia del 20 de septiembre de 2022, que no procede la declaración de incumplimiento, teniendo en cuenta que el contratista culminó las obras civiles.</p> <p>Dentro de los compromisos establecidos, se pactó que el 30 de octubre de 2022 se remitirán por parte de la Gobernación de Santander las actas de recibo a satisfacción de las 3 obras pendientes por entregar, así como el acta de liquidación del contrato derivado 3553 entre el Departamento de Santander y el Consorcio Río Fonce.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Seguimiento al Plan de Acción por Sector

MEDIO AMBIENTE

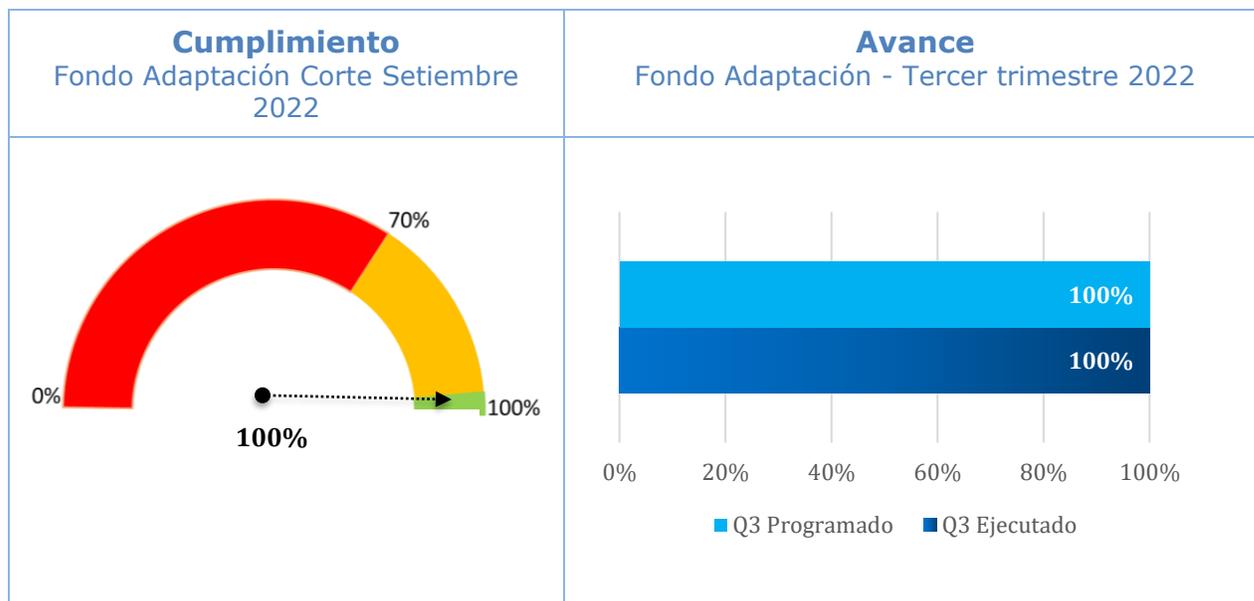

Portafolio/Programa/Proyecto: **MEDIO AMBIENTE**
Gerente de Meta: Asesor Sector Medio Ambiente

Objetivo Estratégico 2018-2022 #3

Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA25_Entregar integración tecnológica	(AEA25)_Integración Tecnológica, terminada, entregada	1	-	-	1	-	1

Mes	Avance Cualitativo
(AEA25)_Integración Tecnológica, terminada, entregada	
Enero	Solución HPC: El proyecto se encuentra finalizado y aguarda firma de acta de cierre. Como resultado, se logró generar salidas de modelos meteorológicos en resoluciones sin precedentes en Colombia. En relación con la infraestructura HPC, BIOS accedió a mantener los accesos al IDEAM hasta el mes de marzo de 2022, siguiendo el mismo periodo contemplado en la prórroga realizada para el componente de Fábrica de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
	<p>Software. Es de resaltar que en la última semana de enero de 2022 se logró un incremento en la velocidad de descarga de datos por la red Renata pasando de 40 megabits por segundo a 250 megabits por segundo. Está pendiente realizar pruebas de interoperabilidad con el equipo del IDEAM.</p> <p>Fábrica de software: El equipo BIOS se encuentra avanzando en el desarrollo y mapeos de fuentes de datos, en reuniones con las diversas áreas del IDEAM, se encuentran en proceso de aprobación de los documentos de levantamiento de requisitos por parte del IDEAM. Los contratistas asociados al proyecto se vincularon nuevamente al IDEAM, por lo que se estima avanzar con las aprobaciones pendientes. Además, en cuanto a la infraestructura para los ambientes de pruebas, está ya se encuentra finalizada.</p> <p>Compra de equipos: El 27 de enero de 2022 se llevó a cabo una reunión entre el proveedor ADSUM y el IDEAM para validar los archivos del levantamiento de la información para la instalación y puesta en marcha de la solución. En este espacio ADSUM informó que los equipos adquiridos se encuentran en el proceso de envío a Colombia y nacionalización, para la posterior entrega al IDEAM. Se programó un espacio el 2 de febrero de 2022 en las instalaciones físicas del IDEAM, para conocer los espacios requeridos, conectividad, energía, enfriamiento en el data center para los equipos que se adquirieron mediante la negociación. Asimismo, se está gestionando la exclusión de IVA ante el ANLA, para una posible reinversión de recursos en equipos. El IDEAM avanzó internamente evaluando una posible adición de recursos al contrato de compra de equipos, debido a que se cuenta con un remanente proveniente de ahorros en el proceso adelantado con Bolsa Mercantil.</p> <p>Estado general: A 25 de enero, El proyecto presenta un avance planeado del 89% Vs 70% de ejecución. Esta diferencia porcentual está enmarcada en las aprobaciones de las historias de usuario, diseños y mockups, requeridas para afinar los entregables intermedios del alcance del proyecto. Se estima, nivelar el proyecto en los dos próximos meses, paralelizando actividades y realizando iteraciones cortas para la aprobación de productos.</p>
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	<p>Solución HPC: Componente finalizado, recibido y en proceso de validación de calidad. Fábrica de software: Componente finalizado, recibido y en proceso de validación de calidad.</p> <p>Compra de equipos: El IDEAM informa que recibió los equipos y está en proceso de validación de calidad.</p> <p>Estado general: A corte del 25 de marzo, El IDEAM reporta el 93% de avance vs. 99% proyectado, e indica que la diferencia del 8% se debe a que IDEAM se encuentra en validación de calidad de los entregables en sus hitos de: desarrollo, pruebas, documentación, despliegue y transferencia de conocimiento. El IDEAM espera que el contratista subsane las recomendaciones impartidas durante en la fase de liquidación.</p>
Abril	<p>La Herramienta WEB, en el mes de abril de 2022, conforme lo reportado por el IDEAM, tuvo el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solución HPC, mediante la cual se logró pasar de tener 1 nodo a tener 11 nodos, teniendo un aumento de 10000 % de la capacidad de procesamiento y almacenamiento de información generada por IDEAM (Oficina de Pronósticos) por diferentes fuentes de información (RADAR, Estaciones hidrometeorológicas, entre

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>otros), en tiempo real, de manera simultánea y bajo la velocidad necesaria para el funcionamiento de la herramienta WEB. Componente finalizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fábrica de software: El equipo BIOS bajo la supervisión del IDEAM, avanzó en el desarrollo de módulos correspondientes a la visualización de datos y normalización de variables de la Herramienta Web. Componente finalizado, recibido y en proceso de estabilización. • Compra de equipos: el IDEAM informa que recibió los equipos y está finalizando el proceso de validación de calidad. <p>Por todo lo anterior, en mesa de seguimiento realizada el 22 de abril de 2022, El IDEAM reportó el 100% de avance vs. 100% proyectado.</p>
Mayo	<p>En el mes de mayo de 2022, en el marco del proyecto de la Herramienta WEB se avanzó en la estabilización y compatibilización de licencias en los equipos adquiridos en el marco del Contrato M0435 de 2021. Así mismo, se realizó el recibo a satisfacción por parte del IDEAM e ingreso a almacén de los ítems adquiridos bajo la ejecución del Contrato. Se tiene programada visita por parte del Fondo al IDEAM para la validación y verificación de los equipos y software entregados.</p>
Junio	<p>El día 3 de junio de 2022 se realizó mesa de seguimiento de la Herramienta WEB, con la participación del IDEAM y del Fondo Adaptación, donde el IDEAM realizó presentación sobre el convenio y el alcance para la consolidación de la herramienta web, así mismo se realizó prueba de funcionamiento de la Herramienta y visualización de las mejoras realizadas correspondientes al procesamiento de pronósticos, cargue de los POMCA con relación a la gestión del riesgo, cargue de capas en cuanto a clima, sensores, alertas, pronósticos, entre otros.</p>
Julio	<p>El 25 de julio de 2022 se llevó cabo el evento de lanzamiento de la herramienta VIDHAG, en el cual se realizó la presentación y entrega de esta al Fondo Adaptación y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), como consta en el "Informe de lanzamiento – entrega Herramienta Web – VIDHAG (Convenio 004 de 2012 suscrito entre IDEAM y Fondo Adaptación)" remitido por el IDEAM mediante radicado Fondo R-2022-019256, que se adjunta como evidencia.</p> <p>Cabe destacar, que el VIDHAG, es una herramienta web interactiva que dispone productos y servicios de información de origen hidrometeorológico, para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD y el Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC. Asimismo, se constituye un mecanismo que apoya los procesos de conocimiento, planificación, toma de decisiones a nivel nacional, regional y local, mediante la disponibilidad de información oportuna y de la mejor calidad.</p>
Agosto	Meta para el periodo cumplida
Septiembre	Meta para el periodo cumplida

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

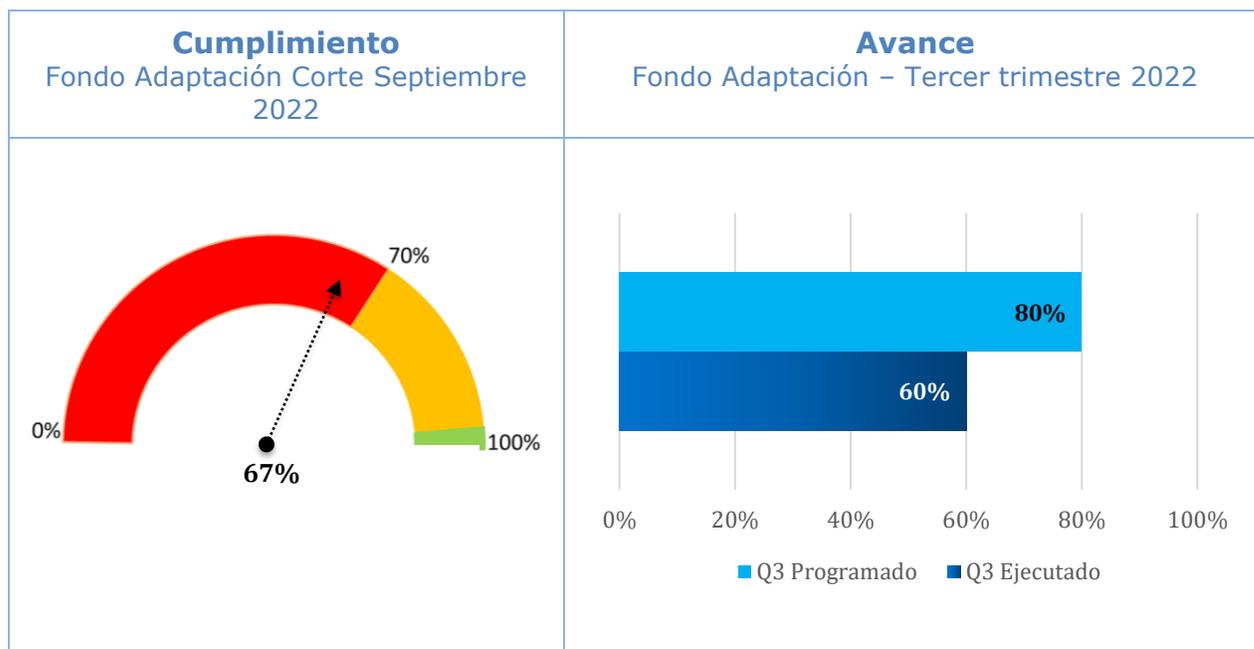

Portafolio/Programa/Proyecto: **REACTIVACIÓN ECONÓMICA**
 Gerente de Meta: Asesor Apropiación de capacidades y fortalecimiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #1

Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA04_Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos – Proyecto “Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati – Bodega”	(AEA04)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, contratado	1	-	1	-	-	1
AEA05_Terminar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA05)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, terminado	1	-	-	1	-	0
AEA06_Entregar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA06)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado	1	-	-	-	1	N.A.
AEA07_Entregar Proyectos Reactivar	(AEA07)_Proyectos Reactivar, entregados	2	2	-	-	-	2

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEA04)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, contratado	
Enero	Se realizó la contratación de los profesionales de apoyo y seguimiento al proyecto, también se ha avanzado con jurídica en la revisión de los estudios previos remitidos el 4 de enero de 2022 que permitirá hacer la convocatoria por concurso de méritos.
Febrero	Se avanzó en la elaboración de estudios previos. Se debe cambiar de modalidad de contratación, pasar de Concurso de Méritos a Licitación Pública, en ese sentido se adecuaron los estudios y se enviaron el 24 de febrero de 2022; por lo que se realizó nuevamente ajuste a los EP. El E.T Jurídico para los Sectores y el E.T de Gestión contractual convocó a mesa de trabajo el 02 de marzo de 2022 para nueva revisión.
Marzo	Se continua con la elaboración, revisión y ajuste de estudios previos: se cambió la forma de pago, se ajustó la matriz de riesgos, se hizo la presentación para consideración del Comité de Compras, se ajustaron los formatos. El documento se encuentra en proceso de ajuste.
Abril	<p>En el mes de Abril 2022 se continuó con la revisión y ajuste del pliego de condiciones, estudios previos y estudio del sector y se continúa con la finalización del estudio de Sector y de Mercado.</p> <p>En el mes de abril se han realizado ajustes en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio del sector en extenso • Revisión y actualización de códigos de Naciones Unidas • Actualización de requisitos habilitantes, según códigos UNSC • Consulta sobre matriz de riesgos a la luz del decreto 1860 • Inclusión de requisitos establecidos en el decreto 1860 • Actualización de cifras en estudio de mercado • Actualización de formatos financieros
Mayo	En el mes de mayo se aprobaron los estudios previos y el 13 de mayo mediante Acta de Comité de Contratación No 17 se aprobó proceder con la publicación de la Licitación Pública. El 20 de mayo 2022, se publicó Licitación pública en SECOP con el proceso No. FA-LP-I-S-003-2022.
Junio	<p>El proyecto para la "Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar", se encuentra en etapa de contratación en el marco del proceso de Licitación Pública FA-LP-I-S-003-2022 desde el 20 de mayo de 2022.</p> <p>La publicación del pliego de condiciones definitivo se realizó el 10 de junio y se tenía como plazo para presentación de ofertas el 30 de junio, se dio respuesta a las observaciones de los pliegos que presentaron entidades interesadas.</p> <p>Posteriormente, se recibieron observaciones de otras dos firmas (CONICA PROYECTOS SAS e INGENIERIA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA SAS), mediante las cuales solicitaban ampliar el plazo para la presentación de las propuestas, teniendo en cuenta que no había sido posible obtener la garantía de seriedad de la oferta; por lo cual mediante Resolución N° 521 del 29 de junio de 2022 emitida por la Secretaría General del Fondo Adaptación, se suspendió el proceso licitatorio mientras se adelanta reunión con el sector asegurador para identificar y precisar las dificultades y poder darle viabilidad a la continuidad del proceso. En este momento el proceso está suspendido.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Julio	<p>El proyecto para la “Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar”, se encuentra en etapa de contratación en el marco del proceso de Licitación Pública FA-LP-I-S-003-2022 desde el 20 de mayo de 2022.</p> <p>El proceso licitatorio estuvo suspendido desde el 29/jun/22 hasta el 17/jul/22. El 18 de julio de 2022, se publicó en el Secop II aviso reanudando el proceso mediante Resolución 1159 de 18/jul/22, lo anterior teniendo en cuenta que se había solicitado previamente a la Federación de Aseguradores Colombianos- FASECOLDA gestionar una reunión con el sector asegurador con el fin de identificar y precisar las dificultades en la expedición de las pólizas solicitadas en el proceso de selección; por lo anterior, FASECOLDA realizó la convocatoria a 25 aseguradoras, de las cuales participaron 13. En el desarrollo de la reunión el FONDO presentó el proyecto objeto de contratación, se absolvieron las dudas e interrogantes, concluyendo que las aseguradoras demostraron receptividad frente al proyecto, que las compañías revisarían con mayor profundidad los documentos del proceso para reanalizar el riesgo y determinar viabilidades técnicas en su aseguramiento. Teniendo en cuenta que el día que se suspendió el proceso solo quedaba un día para terminar el plazo para el envío de las ofertas, al ser reanudado el 18/jul/22, quedó como fecha de presentación de las ofertas el 19/jul/22 y consecuentemente se ajustaron las demás fechas del cronograma, el cual fue publicado en SECOP II mediante adenda.</p> <p>El 19 de julio se recibieron ofertas de las siguientes firmas, las cuales fueron revisadas y evaluadas: UNIÓN TEMPORAL BOLIVAR 2022, UT INCLUSIÓN PRODUCTIVA 2022, UNIÓN TEMPORAL PRODUCTIVA CARIBE 2022 y FUNDACIÓN FUNDALIANZA.</p> <p>La fecha de publicación del informe de evaluación de las ofertas estaba prevista para el 26/jul/22, no obstante, se actualizó el cronograma aplazando la fecha de esta actividad hasta el 27/jul/22.</p> <p>El 27 de julio de 2022 se publicó el informe preliminar de evaluación de las ofertas que se recibieron, en los aspectos técnico, jurídico y financiero, teniéndose como resultado lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> •UNIÓN TEMPORAL BOLIVAR 2022: No habilitado en los componentes técnico, jurídico ni financiero. Debe subsanar según informe de verificación. •UT INCLUSIÓN PRODUCTIVA 2022: Habilitado en componente jurídico y financiero; habilitado por experiencia habilitante, no habilitado por Equipo mínimo requerido habilitante. Debe subsanar aspecto técnico según informe de verificación. •UNIÓN TEMPORAL PRODUCTIVA CARIBE 2022: habilitado en componente financiero, no habilitado en componentes jurídico ni técnico. Debe subsanar aspectos técnicos y jurídicos según informe de verificación. •FUNDACIÓN FUNDALIANZA: habilitado en componente financiero y en la experiencia habilitante, no habilitado en componente jurídico ni en Equipo mínimo requerido habilitante. Debe subsanar aspectos técnicos y jurídicos según informe de verificación. <p>De acuerdo con el cronograma actualizado del proceso licitatorio, el plazo para la presentación de observaciones al informe de evaluación por parte de los oferentes era hasta el 3/ago/22.</p>
Agosto	<p>De acuerdo con el proceso licitatorio No. FA- LP-I-S-235-2022, mediante resolución N° 1244 del (22 de agosto de 2022 LA SECRETARIA GENERAL (E) DEL FONDO ADAPTACIÓN en uso de las atribuciones legales que le confieren las leyes: Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los decretos que las reglamentan, y la Resolución n.º</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	1188 del 29 de julio de 2022, y, teniendo en cuenta otras consideraciones, RESOLVIÓ: ADJUDICAR el proceso de Licitación Pública No. FA-LP-I-S 003-2022, cuyo objeto es "Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar.", al proponente FUNDACIÓN FUNDALIANZA identificada con NIT 819.005.064, por la suma DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$17.146.358.720) incluidos todos impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar. El 24 de agosto de 2022 se firmó el contrato y, terminando el mes de agosto, el proceso ha continuado con la evaluación de pólizas y de hojas de vida del equipo de trabajo.
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte
(AEA05)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, terminado (AEA06)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado	
Enero	Con corte a 31 de enero de 2022 se tienen 140 ítems tipo A de acuerdo con la categoría establecida por la consultoría, la cual hace referencia a los productos esenciales para el desarrollo de la idea de negocio. Se tienen 82 beneficiarios en estado activo en el proceso de compras con un valor presupuestado de \$2.174.980.230. Sobre esta actividad, se ha realizado la solicitud de cotizaciones de 17 tipologías. Se llevó a cabo CIDEG presencial donde se presentaron 63 ideas de negocio sobre la segunda convocatoria y se acompañó el desarrollo de las actividades de manera presencial por parte de la supervisión.
Febrero	Se cuenta con un total de 85 beneficiarios activos para compras, de los cuales se han beneficiado a 63 con la compra de 205 ítems por un valor de \$345.892.693. De igual manera, se llevó a cabo CIDEG de validación de ideas de negocio para completar la segunda convocatoria. Adicionalmente, se aprobó el avance reportado para el hito 10 del contrato que corresponde al pago N°7 correspondientes a los siguientes productos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración y publicación de línea base del proyecto en la herramienta PSA, 2. Informe de la socialización de criterios para la convocatoria Express para máximo 70 proyectos, 3. Informe de lanzamiento y cierre de la convocatoria, 4. cierre de la convocatoria con resultados preliminares, 5. Informe final consolidado de evaluación del 100% de las iniciativas presentadas por la comunidad, 6. Informe de realización de mesas de trabajo con miembros del CIDEG para la validación de la calificación de las ideas de negocio, que contenga: <ol style="list-style-type: none"> a. actas de aprobación, b. informe de evaluación de ideas de negocio, ajustadas por el consultor y validadas por la Interventoría, c. Informe de aprobación de hasta 70 ideas de negocio presentadas al CIDEG para pasar a la fase de Estructuración.
Marzo	Acompañamiento Socioeconómico Gramalote (Terminar): Actualmente se cuenta con un total de 91 beneficiarios activos para compras, con un avance de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • 16 planes entre el 61 y 100% • 17 planes entre el 41 y 60% • 28 planes entre el 11 y 40% • 30 planes entre el 0 y 10%

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Sobre lo anterior, se adelantan gestiones para dar celeridad a las compras y se realizaron cambios al manual de compras para validar las cotizaciones acordes a la dinámica actual de mercado en la zona y los proveedores inscritos en el banco de proyectos.</p> <p>A corte 31 de marzo se cuenta con 67 tipologías que corresponden a 8.340 ítems y un total de compras por valor de \$657.228.917. Se continúan con las actividades de solicitud de cotizaciones para tipologías como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipos de cómputo, • equipos e instrumentos deportivos, • máquinas y equipos de confección, • muebles y enseres para exterior, • productos de belleza, • textiles • artículos para el hogar, • equipos industriales, • muebles metálicos, • maquinaria especializada, • insumos y productos bisutería, • equipos e instrumentos médicos, • muebles decorativos para eventos, • electrodomésticos línea blanca, • electrodomésticos línea marrón, • pequeños electrodomésticos, • productos de papelería, • muebles de oficina y escritorio, • muebles escolares. <p>De igual manera, el 3 y 30 de marzo se llevaron a cabo CIDEG de validación de ideas de negocio estructuradas para proceder a la etapa de implementación de postulaciones de la segunda convocatoria acorde al otrosi N° 2 del contrato donde se atienden hasta 70 nuevos proyectos no priorizados en la primera convocatoria.</p>
Abril	<p>2. AEA 05 / ACOMPAÑAMIENTO SOCIOECONÓMICO GRAMALOTE:</p> <p>De la primera convocatoria de reactivación económica se cuenta con 117 beneficiarios de los cuales 91 están habilitados para compras. A corte abril 2022, se cuenta con el total de compras por \$1.181.898.518, se han realizado 51 visitas técnicas con el objetivo de revisar el uso de los productos entregados a los beneficiarios. El avance de los proyectos habilitados para compras se presenta de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 planes de negocios de 1% a 10% • 28 planes de negocios de 11 a 40% • 33 planes de negocios de 41 a 80% • 8 planes de negocios de 81 a 100% <p>De la segunda convocatoria se cuentan con 59 proyectos estructurados y aprobados en CIDEG, de igual manera se cuentan con las actas de compromiso firmadas por los proponentes de los proyectos y cartilla plan de negocio diligenciada por cada uno de los proponentes. De igual manera, se reporta radicación del hito 11 correspondiente al pago N°8 del contrato.</p>
Mayo	<p>De la primera convocatoria de Reactivación Económica se cuenta con 117 beneficiarios de los cuales 91 están habilitados para compras. Se cuenta con 164 proveedores inscritos con 84 tipologías de productos y se han socializado 3.039 ítems</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>cotizados a los beneficiarios quienes han aprobado 2.499 ítems de los cuales han rechazado 540.</p> <p>Con corte 31 de mayo, se han realizado 93 órdenes y 9 en proceso de compra. Acorde a lo anterior, se cuenta con un total de compras por \$ 1.791.317.796 con avance promedio del 62%; El avance de los proyectos habilitados para compras se presenta de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 proyectos en 0%, • 33 entre el 1 y 30%, • 17 entre el 31 y 60%, • 18 entre 61 a 99% y • 24 proyectos en 100%. <p>De la segunda convocatoria se cuentan con 59 proyectos estructurados y aprobados en CIDEG, de igual manera se cuentan con las actas de compromiso firmadas por los proponentes de los proyectos y cartilla plan de negocio diligenciada por cada uno de los proponentes.</p> <p>Para el componente de lotes comerciales, 19 beneficiarios cuentan con licencias de construcción de los 20 proponentes de la primera convocatoria. En el avance financiero del proyecto, se reporta radicación del hito 11 correspondiente al pago N°8 del contrato.</p>
Junio	<p>FA-CD-I-S-340-2019 / FA-CD-I-S-342-2019 Acompañamiento Socioeconómico Gramalote. De la primera convocatoria de reactivación económica se cuenta con 117 beneficiarios de los cuales 91 están habilitados para compras. Se cuenta con 164 proveedores inscritos en el banco de proveedores, 84 tipologías de productos se han socializado, 3.039 ítems cotizados a los beneficiarios quienes han aprobado 2.499 ítems y rechazado 540. Acorde a lo anterior, a la fecha se cuenta con un total de compras por \$2.022.438.199.</p>
Julio	<p>Acompañamiento Socioeconómico de Gramalote: De la primera convocatoria de reactivación económica se cuenta con 116 beneficiarios. De esto, se han realizado 162 órdenes de compra a 61 proveedores que corresponden a 4.906 ítems que a su vez representan 42.829 unidades, para 101 beneficiarios habilitados por un total de compras de \$2.431.561.533.</p> <p>De los anteriores, 43 proyectos se encuentran al 100% sobre lo socializado y aprobado en comité de compras y 14 proyectos se encuentran al 100% con entregas totales para implementar.</p>
Agosto	<p>Del proyecto de reactivación económica se cuentan con 146 planes de negocio activos que corresponden a 105 de la primera convocatoria con el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 planes de negocio entre el 91 y 100%, • 19 planes de negocio entre el 61 al 90%, • 11 planes de negocio entre el 31 al 60%, • 20 planes de negocio entre el 1 al 30% y • 4 planes de negocio en 0%. <p>Para la segunda convocatoria 41 planes de negocio activos con el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36 activos por iniciar compras, • 2 entre el 1 y 30%, 2 entre el 31 y 60%, • 1 entre el 61 y 99%.


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Lo anterior, tiene como avance con corte 31 de agosto de 2022 un total de compras aprobadas en comité por valor de \$2.712.923.829 y órdenes de compra pagadas y entregadas por valor de \$1.899.583.108.</p> <p>De igual manera, el consultor viene adelantando visitas técnicas de acompañamiento de acuerdo con los requerimientos para cada proyecto productivo en la cuales se verifica que estén funcionando correctamente y se recomienda la formalización de su actividad comercial.</p>
Septiembre	<p>Para el proyecto de reactivación económica, se cuenta con 153 planes de negocio activos para compras que corresponden a 106 de la primera convocatoria con el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 49 planes de negocio entre el 91 y 100% • 21 planes de negocio entre el 61 al 90% • 11 planes de negocio entre el 31 al 60% • 20 planes de negocio entre el 1 al 30% • 5 planes de negocio en 0%. <p>Estos planes activos suman un valor de \$3.838.448.379.</p> <p>Para la segunda convocatoria se cuenta con 47 planes de negocio activos para compras con el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 42 activos por iniciar compras • 2 entre el 1 y 30% • 2 entre el 31 y 60% • 1 entre el 61 y 99%. <p>Estos planes activos suman un valor de \$1.587.078.898. Lo anterior, tiene como avance con corte 30 de septiembre un total de compras aprobadas en comité por valor de \$2.694.204.038 y órdenes de compra pagadas y entregadas por valor de \$2.015.940.673.</p>
(AEA07)_Proyectos Reactivar, entregados	
Enero	<p>Reactivar agrícola Cauca: Radicación del informe final consolidado, por parte del operador Vallenpaz, mediante radicado No. R-2020-001320, documento que permitirá preparar el informe de supervisión final y con los cuales se dará respuesta a solicitud de jurídica para continuar con el proceso de liquidación.</p> <p>Reactivar Panela Cauca: Remisión de memorando E-2022-000465 dirigido al contratista en el que se requirió en cumplimiento de sus obligaciones contractuales radicar la documentación exigida para continuar con el proceso de liquidación del contrato.</p>
Febrero	<p>Reactivar agrícola Cauca: 28 de febrero se radicó factura por el último pago de gerencia contra entrega de acta de liquidación. El acta de liquidación fue firmada el 25 de febrero de 2022 (R-2020-001852)</p> <p>Reactivar Panela Cauca El 15 de febrero se radicó factura por el 9o pago de gerencia con el código R-2022-009394. El 28 de febrero se radicó archivo físico del contrato en gestión documental (R-2022-002411) requerido para proceder con la liquidación del contrato.</p>
Marzo	<p>El Proyecto Reactivar Cauca Panela ya tiene gestionadas las actas de entrega correspondientes denominadas " 4-GPY-F-65 Acta entrega recibo proyecto</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	productivo" y " 4-GPY-F-66 Acta validación proyectos productivo". Los documentos anteriores en efecto muestran la manifestación del recibo a satisfacción de la totalidad de insumos y servicios por cada beneficiario con su respectiva rúbrica. De igual forma el acta de liquidación se encuentra en gestión de firmas.
Abril	Proyecto Reactivar Cauca Panela, FA-CD-I-S-334-2019. Se firmó el acta de liquidación (se anexa) y se radicó último pago mediante radicado R-2022-005133.
Mayo	Meta de la vigencia cumplida.
Junio	Meta de la vigencia cumplida.
Julio	Meta de la vigencia cumplida.
Agosto	Meta de la vigencia cumplida.
Septiembre	Meta de la vigencia cumplida.

TRANSPORTE

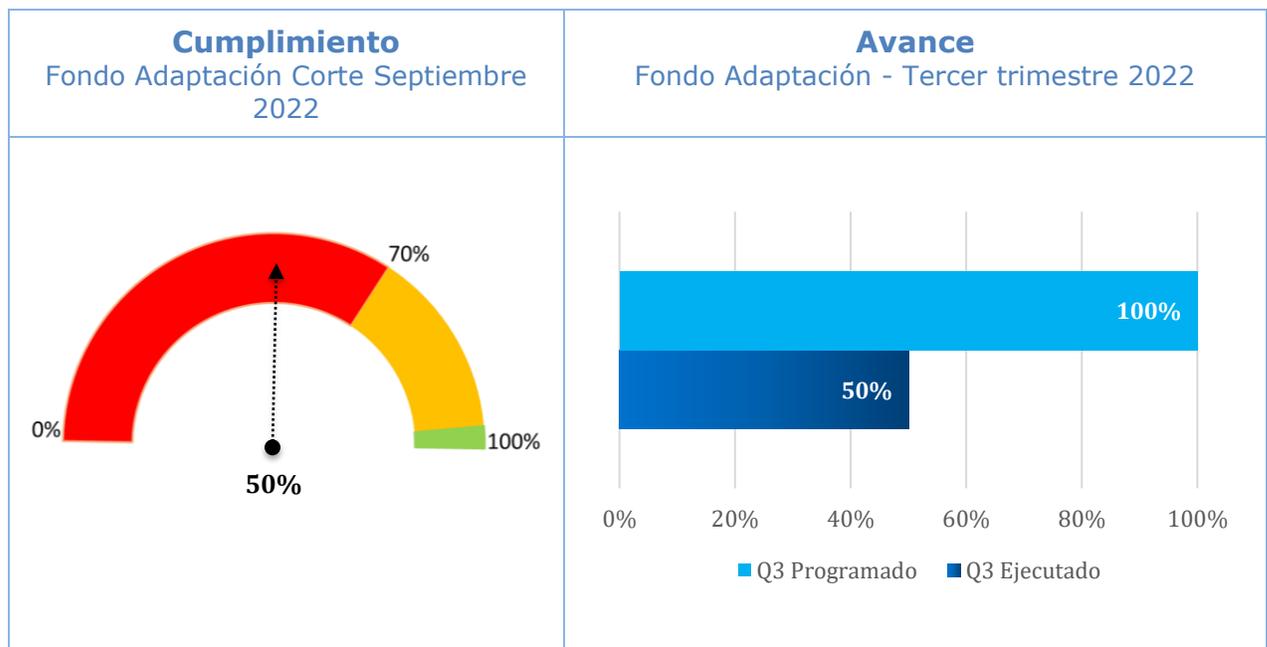

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022



Portafolio/Programa/Proyecto: **TRANSPORTE**

Gerente de Meta: Asesor Sector Transporte

Objetivo Estratégico 2018-2022 #2

Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB01_Terminar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB01)_Sitios Críticos con Obras terminar	1	-	1	-	-	1
AEB02_Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB02)_Sitios Críticos con Obras entregar (INDICADOR PEI)	1	-	1	-	-	0

Mes	Avance Cualitativo
(AEB01)_Sitios Críticos con Obras terminar	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	El contrato se encuentra suspendido (No. 3), del periodo comprendido entre el 13 de enero de 2022 al 12 de marzo de 2022, sustentado en la situación de orden público que actualmente se presenta en el departamento de Arauca.
Marzo	El 9 de marzo de 2022, se generó la reactivación del contrato. Se realizó reunión presencial con contratistas de obra e interventoría en las instalaciones de la entidad, con el fin de fijar fecha de izaje de vigas, actividad a la que se dio cumplimiento el 30 y 31 de marzo de año en curso. Contractualmente el proyecto se encuentra en proceso de prórroga por un mes, para la culminación del mismo.
Abril	Actualmente se realiza el trámite para suscribir el Acta de Concertación de la medida de compensación entre el FONDO y CORPORINOQUIA. Se encuentra pendiente realizar actividades de compensación ambiental, ajuste y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social. Con el fin de darle trámite y avance a lo anteriormente descrito, se desarrollan mesas de trabajo con los profesionales de CORPORINOQUIA, el Ministerio de Medio Ambiente y el INVIAS.
Mayo	El contrato finalizó el 05 de mayo de 2022, cuenta con acta de entrega y recibo en la que se registró "el proyecto se encuentra ubicado en el corredor la cabuya – Tame en el PR 20+940, teniendo como PR inicial K20+800 y PR final K21+092,4 el avance del proyecto a la fecha es de 93%, quedando pendientes, señalización horizontal y vertical, entrega de informe, resultados de ensayos de la MDC y la instalación del 10% faltante."
Junio	Proyecto del Puente La Colorada – Sácama - La Cabuya; La Cabuya – Saravena en el departamento de Arauca El proyecto cuenta con acta de entrega y recibo de Obra del 07 de junio de 2022, fecha de terminación en acta 05 de mayo de 2022.
Julio	No aplica para el periodo del reporte


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte
(AEB02)_Sitios Críticos con Obras entregar (INDICADOR PEI)	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	De acuerdo con la suspensión No. 3 del contrato, se encuentra pendiente para la terminación y entrega, un porcentaje del 36% de ejecución.
Abril	La actividad de Izaje de las Vigas del puente se desarrolló los días 29 y 30 de abril de 2022, posteriormente se realizó la actividad de riostras carril derecho, Instalación de acero para tablero - costado derecho, Instalación de Steel deck costado derecho puente, Vaciado concreto tablero costado derecho y las demás actividades para la terminación del puente. Actualmente la obra cuenta con un avance del 78.01%.
Mayo	A 31 de mayo de 2022, se reporta avance del 99% del proyecto, el contratista se encuentra terminando la actividad de Pavimentación y Señalización para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Acta de Entrega y Recibo suscrita con el Interventor.
Junio	Proyecto del Puente La Colorada – Sácamá - La Cabuya: Se encuentra pendiente suscripción de acta de entrega entre el Fondo Adaptación y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, pendiente culminar gestión de cierre ambiental y actualización de pólizas.
Julio	Las pólizas fueron actualizadas frente a Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, en espera de aprobación por parte del FONDO.
Agosto	Mediante el Oficio E-2022-024827 el Fondo Adaptación aprueba las Pólizas que amparan el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra para el CONTRATO No. FA-IC-I-S-213-2018 "TERMINACIÓN PUENTE VEHICULAR LA COLORADA UBICADO EN LA VÍA SÁCAMÁ - LA CABUYA - SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.. La Unión Temporal Puentes 2019 realiza las actividades estipuladas para dar cumplimiento a la resolución 500.41.15 - 123 del 05 de noviembre de 2015 - ACTA DE CONCERTACION suscrita entre el FONDO ADAPTACION y CORPORINOQUIA y las actividades para dar cumplimiento a la compensación establecida en la Resolución 1936 de 2015. Mediante Oficio E-2022-024924 del 11 de agosto de 2022, por medio del cual el Fondo Adaptación, solicita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Aprobación del trámite desarrollado por la Unión Temporal Puentes 2019 para dar cumplimiento a la resolución No. 1936 del 02 de septiembre de 2015 Una vez se cuente con la aprobación de las pólizas y la aceptación de las Entidades competentes para el cierre ambiental del proyecto se procederá con la Entrega al INVIAS.
Septiembre	El 22 de septiembre de 2022 CORPORINOQUIA emite el Concepto Técnico de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>verificación de productos finales de restauración ambiental realizada por la Unión Temporal Puentes 2019 para dar cumplimiento a la resolución 500.41.15 - 123 del 05 de noviembre de 2015 - ACTA DE CONCERTACIÓN suscrita entre el FONDO ADAPTACIÓN y CORPORINOQUIA en el que se registró "Se da por cumplida la medida de compensación interpuesta en el Acta de Concertación Numero 100.2.22.20 suscrita el 12 de mayo de 2022".</p> <p>Actualmente se está en espera de la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Sostenibilidad a la solicitud realizada tanto por el Contratista de Obra como por el Fondo Adaptación en cuanto a la cesión total de obligaciones otorgadas bajo la Resolución No. 1936 del 02 de septiembre de 2015 a la Unión Temporal Puentes 2019.</p> <p>Mediante el Oficio E-2022-024827 el Fondo Adaptación aprueba las Pólizas que amparan el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra para el CONTRATO No. FA-IC-I-S-213-2018.</p>

EDUCACIÓN

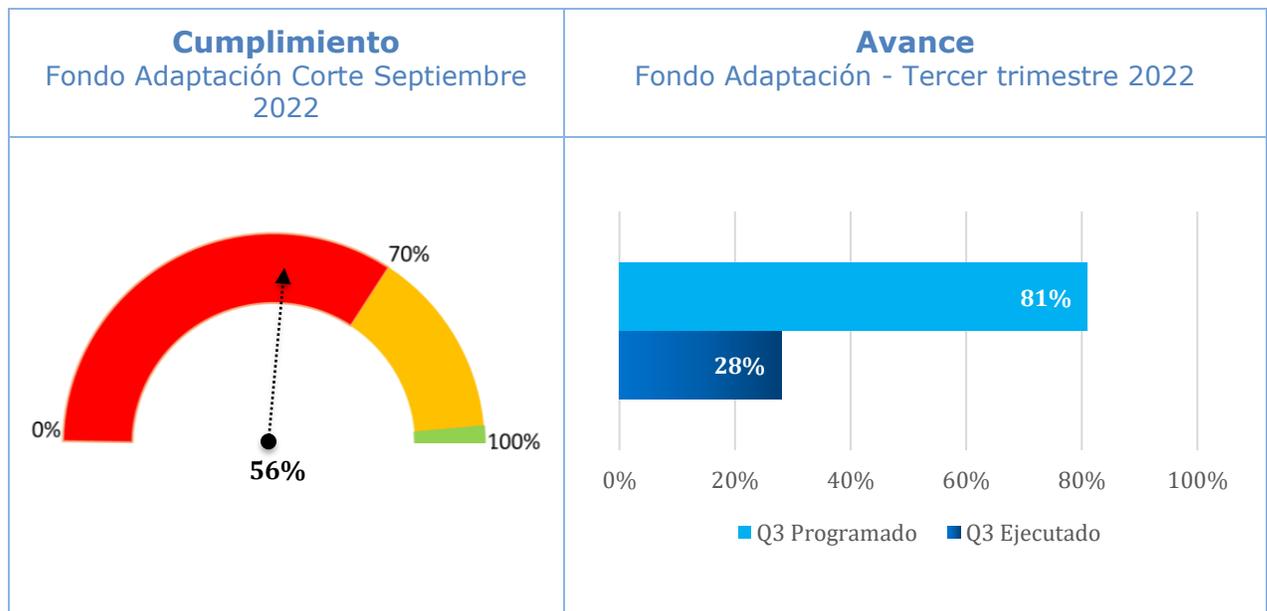

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022



Portafolio/Programa/Proyecto: **EDUCACIÓN**
Gerente de Meta: Asesor Sector Educación

Objetivo Estratégico 2018-2022 #2

Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB03_Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB03)_Sedes Educativas, terminadas	13	4	3	6	-	5
AEB04_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB04)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	19	3	7	3	6	4

Mes	Avance Cualitativo
(AEB03)_Sedes Educativas, terminadas	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	Conforme a lo programado, el sector educación terminó las sedes Escuela Mixta No 1 y EUM San Antonio, en Gamarra Cesar; al igual que la terminación de las sedes CE JORGE ELIECER GAITAN, y la sede CE DE REGENCIA del departamento de Bolívar.
Abril	Al respecto de la meta de terminaciones del mes de abril de 2022, el sector educación tenía programado la terminación de la sede IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA, del municipio de Achí del departamento de Bolívar, sin embargo, esta no fue posible teniendo en cuenta la situación de orden público presentada en la zona de influencia de los proyectos del contrato en referencia (paro armado), ocasionando un retraso en los rendimientos del personal operativo, y la llegada de materiales e insumos como cemento, materiales pétreos entre otros y que impidieron el buen funcionamiento de las actividades. Se suscribió el otrosí No 4 mediante el cual se realizó la prórroga por 58 días hasta el 20 de junio de 2022.
Mayo	Al respecto de la meta de terminaciones del mes de mayo de 2022 el sector tenía programado terminación de la SEDE COL COMUNAL AGROPECUARIO del municipio banco del Departamento de Magdalena, sin embargo, esto no fue Posible teniendo en cuenta que el proyecto está suspendido desde el 2-11-2021 y hasta el 21-06-2022, actualmente se encuentra en proceso de revisión de análisis de prórroga y adición por reconocimiento o ajuste de precios por afectación de pandemia, paro nacional y aumento del dólar. Igualmente, el sector tiene rezagada la terminación de la sede IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA, del municipio de Achí del departamento de Bolívar, que de acuerdo a la última suspensión por orden público tiene fecha de terminación para el 05-07-2022 por lo que se espera que para los próximos meses pueda realizarse el respectivo reporte.
Junio	Al respecto de la meta de terminaciones del mes de junio el sector tenía programado la terminación de Manatí (2 sedes), sin embargo, se encuentra en trámite la solicitud de cesión de la posición contractual que fue presentada al comité de modificaciones

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>del 21-06-2022 la cual fue aprobada pero condicionada a que el contratista presente las cesiones de derechos económicos y las pólizas actualizadas; por lo anterior a la fecha no se ha podido reiniciar las obras, igualmente se presentan rezagos en las sedes de COL COMUNAL AGROPECUARIO del municipio Banco del Departamento de Magdalena teniendo en cuenta que el proyecto está suspendido desde el 2-11-2021 y hasta el 10-08-2022, actualmente se encuentra en proceso de revisión de análisis de prórroga y adición por reconocimiento o ajuste de precios por afectación de pandemia, paro nacional y aumento del dólar.</p> <p>Respecto la sede IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA, del municipio de Achí del departamento de Bolívar, que de acuerdo con la última suspensión por orden público tiene fecha de terminación para el 05-09-2022 por lo que se espera que para los próximos meses pueda realizarse el respectivo reporte.</p>
Julio	<p>Para el mes de julio, el sector no tenía programado la terminación de ninguna sede. Sin embargo, se presenta rezagos con el reporte de las siguientes sedes:</p> <p>IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA de municipio de Achí del departamento de Bolívar, se encuentra suspendida por aumento de nivel del río Cauca generando desbordamiento e inundación parcial de la sede educativa, razón por la cual no se logró trabajar de manera regular en las actividades de mampostería y cubierta, retrasando la terminación prevista.</p> <p>SEDE COL COMUNAL AGROPECUARIO del municipio El Banco del departamento de Magdalena, el proyecto está suspendido desde el 2-11-2021 y hasta el mes de agosto; actualmente se encuentra en proceso de revisión de análisis de prórroga y adición por reconocimiento o ajuste de precios por afectación de pandemia, paro nacional, problemática en ucrania y aumento del dólar.</p> <p>SEDE PISCICOLA DE COMPUERTAS del municipio de Manatí del departamento de Atlántico, se encontraba suspendida hasta que fuera aprobada la cesión de la posición contractual. En este contexto el contrato reinicio el 6 de julio, teniendo en cuenta que ya se contaba con el lleno de los requisitos para la suscripción de la cesión, situación que se dio el 15 de julio de 2022 y suspendiendo nuevamente el contrato a partir del 18 de julio de 2022 por 30 días calendario con el fin de que el nuevo cesionario ya en su calidad de contratista presentara a la entidad la revisión del presupuesto y posible adición y prórroga para la terminación de la sede.</p>
Agosto	<p>Al respecto de la meta de terminaciones del mes de agosto, el sector tenía programado reportar las siguientes sedes:</p> <p>CE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN en el municipio de Chimichagua y la IE DEPARTAMENTAL ANTONIO BRUJES CARMONA en el municipio de Santa Ana, las cuales se encuentran suspendidas desde el 1-07-2021, reiniciando el 30-08-2022 después de realizar el trámite de cesión de la posición contractual, así como, la suscripción de otrosí de prórroga y adición haciendo su fecha de terminación y entrega se postergue hasta mayo del 2023.</p> <p>IE GUARANDA (SEDE PRINCIPAL - SEDE SEÑOR DE LOS MILAGROS - SEDE SAN JOAQUIN), sin embargo, el proyecto estuvo suspendido entre el 24-06-2022 y el 9-08-2022 debido al incremento de las lluvias y a la afectación de las vías de ingreso por la inundación en el sector de la mojana; razón por la cual la fecha de terminación y entrega se postergo.</p> <p>Igualmente, el sector tiene rezagadas el reporte de las siguientes sedes:</p> <p>IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA de municipio de Achí, proyecto que reinicio el 10 de agosto ya que se encontraba suspendido debido a que el aumento de nivel del río Cauca generó desbordamiento e inundación parcial de la sede educativa, razón por la cual no se logró trabajar de manera regular en las actividades de mampostería y cubierta y retrasando la terminación prevista por lo que su nueva fecha se prevé para el mes de septiembre.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>SEDE COL COMUNAL AGROPECUARIO del municipio de El Banco del Departamento de Magdalena, sin embargo, esto no fue posible teniendo en cuenta que el proyecto estaba suspendido desde el 2-11-2021 y solo hasta el 23-08-2022 reinició su etapa de construcción, sin embargo, pese al reinicio de obra en la fecha mencionada el contratista de obra no ha hecho presencia para retomar la ejecución de actividades, razón por la cual se solicitó a la interventoría remitir el informe de presunto incumplimiento parcial pero definitivo del contrato y así el Fondo iniciar las actividades administrativas que conlleven al presunto incumplimiento.</p> <p>SEDE PISCICOLA DE COMPUERTAS del municipio de Manatí, no puede ser reportada ya que el contrato se encontraba suspendido hasta que fuera aprobado la cesión de la posición contractual. En este contexto el contrato reinició el 6 de julio, teniendo en cuenta que ya se contaba con el lleno de los requisitos para la suscripción de la cesión, situación que se dio el 15 de julio de 2022 y suspendiendo nuevamente el contrato a partir del 18 de julio de 2022 y hasta el 12 de septiembre debido a que el cesionario contratista presentó a la entidad la propuesta de adición de prórroga avalada por la interventoría, y revisada por la subgerencia de estructuración; dicha solicitud fue presentada al comité de contratación el 30 de agosto en cuya sesión los miembros del comité recomendaron continuar con el trámite correspondiente. En la actualidad se adelantan las actividades administrativas para la suscripción del modificatorio.</p>
Septiembre	<p>Para el mes de septiembre, el sector no tenía programado la terminación de ninguna sede, sin embargo, el sector reportará la sede IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA de municipio de Achí, que se encontraba rezagada ya que el reporte de entrega se encontraba para el mes de abril de 2022.</p> <p>A la fecha, el sector tiene rezagadas el reporte de las siguientes sedes:</p> <p>SEDE COL COMUNAL AGROPECUARIO del municipio de El Banco del departamento de Magdalena, sin embargo, esto no fue posible teniendo en cuenta que el proyecto estuvo suspendido desde el 2-11-2021 y solo hasta el 23-08-2022 reinició su etapa de construcción, sin embargo, por solicitud del contratista de obra se suscribió una nueva suspensión debido a la solicitud por parte del contratista de obra a la aseguradora en cuanto al apalancamiento por \$350 millones para poder culminar las obras, por lo anterior se está a la espera de la respuesta de la aseguradora.</p> <p>SEDE PISCICOLA DE COMPUERTAS del municipio de Manatí, no puede ser reportada ya que el contrato se encontraba suspendido hasta que fuera aprobado la cesión de la posición contractual. En este contexto el contrato reinicio el 6 de julio, teniendo en cuenta que ya se contaba con el lleno de los requisitos para la suscripción de la cesión, situación que se dio el 15 de julio de 2022 y suspendiendo nuevamente el contrato a partir del 18 de julio de 2022 y hasta el 12 de septiembre debido a que el cesionario contratista presentó a la entidad la propuesta de adición de prórroga avalada por la interventoría, y revisada por la subgerencia de estructuración, dicha solicitud fue presentada al comité de contratación el 30 de agosto en cuya cesión los miembros del comité recomendaron continuar con el trámite correspondiente. En la actualidad se adelantan las actividades administrativas para la suscripción del modificatorio.</p> <p>SEDES CE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN en el municipio de Chimichagua y la IE DEPARTAMENTAL ANTONIO BRUJES CARMONA en el municipio de Santa Ana, se encontraban suspendidos desde el 1-07-2021, reiniciando el 30-08-2022 después de realizar el trámite de cesión de la posición contractual, así como, la suscripción de otrosí de prórroga y adición haciendo que su fecha de terminación y entrega se postergue hasta mayo del 2023. Sin embargo, El 13 de septiembre de 2022 se suscribió la suspensión parcial No 7 para la sede del municipio de Chimichagua debido al colapso del puente a la altura del Km 1,2 de la vía de acceso al corregimiento de Sempegua, impidiendo el tránsito por vía terrestre al corregimiento.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	SEDE IE GUARANDA (SEDE PRINCIPAL - SEDE SEÑOR DE LOS MILAGROS - SEDE SAN JOAQUIN), estuvo suspendida entre el 24 de junio hasta el 9 de agosto teniendo en cuenta el incremento de las lluvias y a la afectación de las vías de ingreso debido a la inundación en el sector de la mojana, razón por la cual la fecha de terminación y entrega se postergo.
(AEB04)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	Para el mes de febrero de 2022, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del municipio de Pedraza y la SEDE EUM DARÍO VÁSQUEZ CABALLERO del municipio de Remolino. Sin embargo, se debió postergar su entrega debido a que la firma certificadora de RETIE no pudo realizar las visitas en las fechas inicialmente programadas, debido al paro armando en la zona. Finalmente, en ambos proyectos, a finales de mes se realizaron las visitas y se está a la espera de la expedición de los respectivos certificados. Una vez obtenidos los certificados, se continuará con el trámite ante el operador AIRE.
Marzo	<p>Conforme a lo proyectado se reporta la entrega de las sedes CE ARTESANAL JOSÉ DE LA LUZ MARTINEZ SEDE ERM DEL HORNO, en San Zenón, Magdalena.</p> <p>Sin embargo, se encuentra rezagada la entrega de las sedes de CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del municipio de Pedraza, que está en el proceso energización definitiva; el sector ha realizado seguimiento permanente al contratista y durante el mes de marzo el Certificador RETIE - CERTICAPITAL S.A.S, emitió nuevamente observaciones, las cuales fueron atendidas por el contratista el 15 de marzo. El sector Educación programó mesa de trabajo con el Certificador y contratista el 22 de marzo a fin de validar el estado del trámite. Actualmente se encuentra en el proceso de revisión, el Certificador solicitó varios documentos dentro de los cuales está el soporte de calidad de los equipos y accesorios instalados en la media tensión, los cuales fueron entregados en debida forma por parte del contratista el 4 de abril de 2022, por lo que se está a la espera de la validación final por parte del Certificador.</p> <p>Respecto la SEDE EUM DARÍO VÁSQUEZ CABALLERO del municipio de Remolino, se encuentra en proceso de energización definitiva y con seguimiento permanente del sector, durante el mes de marzo el Certificador RETIE - RTL CERTIFICATIONS S.A.S. emitió el certificado de uso final del proyecto. El municipio entregó documentación complementaria para trámite ante AIRE el 16 de marzo de 2022. El contratista radicó ante AIRE el 18 de marzo de 2022, la solicitud de visita y descargo de energización. AIRE realizó la visita el 4 de abril de 2022 por lo que el sector se encuentra a la espera del dictamen de la visita para continuar con el trámite respectivo.</p>
Abril	El sector tenía rezagada la entrega de la sede EUM DARÍO VÁSQUEZ CABALLERO del municipio de Remolino en departamento del Magdalena, que fue entregada el 27 de abril del año en curso. De esta manera, queda únicamente en rezago la sede CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del municipio de Pedraza, que está en el proceso energización definitiva; la cual no se ha podido llevar a cabo teniendo en cuenta las observaciones que se han presentado durante el proceso de certificación Retie, para la expedición de uso final. Estas observaciones están relacionadas con los documentos de los equipos neumáticos de la red contra incendio que deben ser expedidos por el Proveedor con el respectivo aval del ministerio de minas ya que son equipos importados.
Mayo	El CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del municipio de Pedraza, continua en el proceso energización definitiva actividad fue aplazada por tres semanas por el operador del

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
	<p>servicio Air-e justificado en el paro armado de comienzos del mes de mayo y posteriormente por la semana de elecciones presidenciales, razón por la cual la visita se aplaza para junio. Actualmente se está a la espera del dictamen de Air-e y su posterior energización; igualmente el sector se encuentra realizando las gestiones con respecto a pólizas y firma del acta de entrega de las sedes IE DE PROMOCION SOCIAL EUM NØ 1 y SEDE EUM SAN ANTONIO.</p>
Junio	<p>Para el mes de junio de 2022, el Sector educación tenía proyectada la entrega de SEDE CE JORGE ELIECER GAITAN, SEDE CE LA CHAPETONA, CE DE REGENCIA, IE DE ARMENIA PRINCIPAL, todos proyectos que hacen parte del convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra y que a la fecha tiene pendiente la suscripción del acta de recibo del beneficiario como ente contratante, y la entrega de las sedes IE DE PROMOCION SOCIAL EUM NØ 1 y SEDE EUM SAN ANTONIO de las cuales se está realizando las gestiones para la actualización de las pólizas y posterior firma del acta de entrega.</p> <p>El CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del municipio de Pedraza, continua en el proceso energización definitiva actividad fue aplazada y realizada hasta el 3 de junio y actualmente se está a la espera del dictamen de Air-e y su posterior energización, el sector se encuentra realizando las gestiones con respecto a pólizas y firma del acta de entrega.</p>
Julio	<p>Para el mes de julio de 2022, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA de municipio de Achí, proyecto que se encuentra suspendido por el aumento del nivel del río Cauca generando desbordamiento e inundación parcial de la sede educativa, por lo cual la sede no ha podido ser terminada ni entregada a la fecha.</p> <p>No obstante, para el mes de julio el sector reportará la entrega de la sede CE DE REGENCIA que se tenía programada en el mes de junio.</p> <p>Igualmente, el sector tiene rezagadas la entrega de las siguientes sedes: CE JORGE ELIECER GAITAN, SEDE CE LA CHAPETONA, IE DE ARMENIA PRINCIPAL, estas sedes hacen parte del convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra, sin embargo, a la fecha no han sido recibidos por problemas con las postventas y deudas con proveedores. Las sedes IE DE PROMOCION SOCIAL EUM NØ 1 y SEDE EUM SAN ANTONIO se encuentran a la espera de que el contratista de obra actualice las pólizas respectivas y la entrega del CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del municipio de Pedraza, se encuentra en proceso de energización definitiva.</p>
Agosto	<p>Para el mes de agosto de 2022, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede COL COMUNAL AGROPECUARIO del municipio de El Banco del Departamento de Magdalena, sin embargo, esto no fue posible teniendo en cuenta que el proyecto estaba suspendido desde el 2-11-2021 y solo hasta el 23-08-2022 reinició su etapa de construcción. No obstante, pese al reinicio de obra en la fecha mencionada el contratista de obra no ha hecho presencia para retomar la ejecución de actividades, razón por la cual se solicitó a la interventoría remitir el informe de presunto incumplimiento parcial pero definitivo del contrato y así el Fondo iniciar las actividades administrativas que conlleven al presunto incumplimiento.</p> <p>Para el mes de agosto el sector reportará la entrega de la sede CER BASICO AMPLIADO DE BOMBA que se tenía programada para el mes de febrero y se encontraba rezagada por falta de la energización definitiva.</p> <p>A la fecha el sector tiene rezagadas la entrega de las siguientes sedes:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA de municipio de Achí, ya que estuvo suspendido entre el 24 de junio hasta el 9 de agosto debido al incremento de las lluvias y a la afectación de las vías de ingreso por la inundación en el sector de la mojana, razón por la cual la fecha de terminación y entrega se postergó.</p> <p>CE JORGE ELIECER GAITAN, SEDE CE LA CHAPETONA, IE DE ARMENIA PRINCIPAL, estas sedes hacen parte del convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra; a la fecha las actas de entrega se encuentran en trámite de firma entre la gobernación, los rectores, y alcaldías para poder realizar el respectivo reporte.</p> <p>SEDES IE DE PROMOCION SOCIAL EUM NØ 1 y SEDE EUM SAN ANTONIO se encuentran a la espera de que el contratista de obra actualice las pólizas respectivas por lo que se inició el proceso de presunto incumplimiento parcial pero definitivo ya que no ha sido posible que el contratista subsane pendientes de calidad y actualice las pólizas.</p>
Septiembre	<p>Para el mes de septiembre de 2022, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede PISCICOLA DE COMPUERTAS del municipio de Manatí, la cual no puede ser reportada ya que se encontraba suspendida hasta que fuera aprobado la cesión de la posición contractual. En este contexto el contrato reinició el 6 de julio, teniendo en cuenta que ya se contaba con el lleno de los requisitos para la suscripción de la cesión, situación que se dio el 15 de julio de 2022 y suspendiendo nuevamente el contrato a partir del 18 de julio de 2022 y hasta el 12 de septiembre debido a que el cesionario contratista presentó a la entidad la propuesta de adición de proroga avalada por la interventoría, y revisada por la subgerencia de estructuración; dicha solicitud fue presentada al comité de contratación el 30 de agosto en cuya cesión los miembros del comité recomendaron continuar con el trámite correspondiente. En la actualidad se adelanta las actividades administrativas para la suscripción del modificatorio.</p> <p>El sector tiene rezagadas la entrega de las siguientes sedes:</p> <p>CE JORGE ELIECER GAITAN, SEDE CE LA CHAPETONA, IE DE ARMENIA PRINCIPAL, estas sedes hacen parte del convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra; a la fecha las actas de entrega se encuentran en trámite de firma entre la gobernación, los rectores, y alcaldías para poder realizar el respectivo reporte.</p> <p>IE DE PROMOCION SOCIAL EUM NØ 1 y SEDE EUM SAN ANTONIO se encuentran a la espera de que el contratista de obra actualice las pólizas respectivas por lo que se inició el proceso de presunto incumplimiento parcial pero definitivo ya que no ha sido posible que el contratista subsane pendientes de calidad y actualice las pólizas.</p> <p>SEDE IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA de municipio de Achí, se reportará este mes su terminación por lo que se espera en los meses siguientes se realice el reporte de la respectiva entrega.</p> <p>SEDE COL COMUNAL AGROPECUARIO del municipio de El Banco del Departamento de Magdalena, no fue posible el reporte de la entrega ya que el proyecto estuvo suspendido desde el 2-11-2021 y solo hasta el 23-08-2022 reinició su etapa de construcción, sin embargo, por solicitud del contratista de obra se suscribió una nueva suspensión debido a la solicitud de parte del contratista de obra a la aseguradora en cuanto al apalancamiento por \$ 350 millones para poder culminar las obras, por lo anterior se está a la espera de la respuesta de la aseguradora.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO

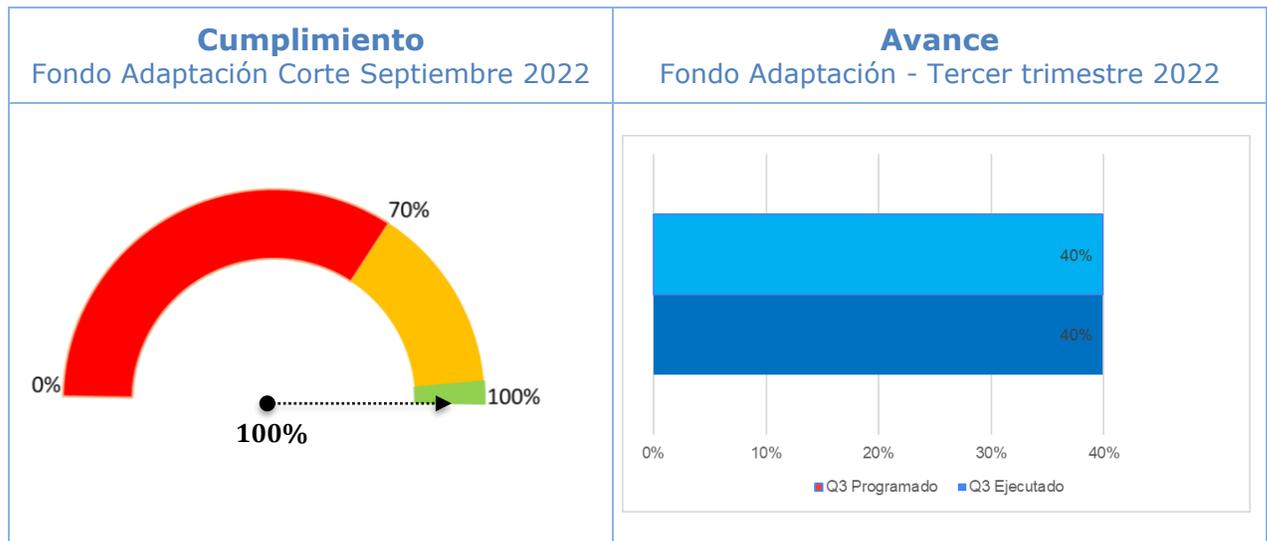

Portafolio/Programa/Proyecto:

ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO

Área:

Subgerencia de Estructuración

Gerente de Meta:

Asesor Sector Acueducto y Alcantarillado

Objetivo Estratégico 2018-2022 #2

Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB05_Terminar obras infraestructura de acueducto	(AEB05)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	5	-	-	2	3	2
AEB06_Terminar obras infraestructura de alcantarillado	(AEB06)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	2	-	-	1	1	0
AEB07_Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AEB07)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	6	-	1	1	4	2
AEB08_Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	(AEB08)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	2	-	1	-	1	2

Mes	Avance Cualitativo
(AEB05)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	Casanare – Yopal: El día 10 de febrero, se continuó con el comité de verificación de cumplimiento realizado el 27 de enero con las entidades condenadas en el fallo de la sentencia. El día 28 de febrero se realizó mesa de trabajo con las mismas entidades, en la cual Findeter informa que se tiene previsto realizar el alistamiento de las obras de integración para el 25 de marzo. El municipio manifestó que se deben garantizar los recursos para la funcionalidad del sistema de abastecimiento y planta de tratamiento de agua potable, por lo menos para los próximos tres meses. El tribunal administrativo de Casanare convocó audiencia pública de verificación el 02 de marzo de 2022 a las entidades condenadas y las partícipes del convenio 199 de 2014.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Aguachica - Cesar: El proyecto reinició el 19 de febrero de 2022, luego de superar los motivos del estado de suspensión, los cuales fueron protocolizados con la suscripción de la modificación No. 1 al contrato de obra y Otrosí No. 12 del contrato de interventoría, suscritos el 21 de febrero, los cuales fueron adicionados en recursos y prorrogados en el término de tres (3) meses.</p> <p>Nóvita – Choco: El 11 de febrero la Corporación CODECHOCO emitió concepto de aprobación de los permisos ambientales y solicito al Municipio de Nóvita la entrega de las medidas ambientales de prevención y mitigación de la adecuación de la zona y obras a intervenir. El proyecto continúa suspendido hasta el 16 de marzo de 2022, debido a que el sector realizó observaciones al documento de justificación técnica, económica y jurídica, presentado por la interventoría de solicitud de costos adicionales por concepto de transporte fluvial y a lomo de mula para el proyecto de Juntas de Tamana.</p> <p>Murillo – Tolima: El 18 de febrero mediante oficio E-2022-000788, se enviaron al interventor las observaciones al informe de presunto incumplimiento contractual del proyecto "Rehabilitación sistema de acueducto vereda La Esperanza – municipio Murillo, departamento del Tolima". El 28 de febrero mediante comunicación CSB-123-714, el interventor envía al Fondo de Adaptación el "Informe de incumplimiento del proyecto VEREDA LA ESPERANZA – MUNICIPIO MURILLO". Resultado de la revisión del informe por parte del sector, se hace necesario el ajuste en la valoración de los perjuicios y observaciones menores, los cuales, para evitar más reprocesos, será ajustado el informe por el sector.</p>
Marzo	<p>Casanare – Yopal: El municipio de Yopal y la empresa EAAAY recibieron el sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable en óptimo funcionamiento, mediante Acta de Entrega y recibo al Municipio y el operador de gerencia de agua y saneamiento básico, suscrita el 23 de marzo de 2022 por parte de la Alcaldía Municipal, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY, la interventoría, el contratista y Findeter.</p> <p>Aguachica - Cesar: El 10 de marzo se realizó el Foro del 50% de avance de obra, con el objetivo de socializar ante la comunidad y el Municipio, el avance técnico y social en referencia al desarrollo de la obra. El 31 de marzo, se realizó visita de seguimiento a la ejecución del proyecto "Sistema de acueducto en el Municipio de Aguachica – Cesar", donde se evidenció el avance de la obra, encontrándose ejecutado el 74% de la ejecución física. Actualmente se encuentra en proceso las actividades de ejecución final (excavación en roca para perfilación de taludes e instalación de accesorios para el empalme del sistema).</p> <p>Nóvita – Choco: El 15 de marzo de 2022 mediante oficio E-2022-001354, se notificó a Seguros del Estado S.A, sobre la problemática presentada con la interventoría, por la falta de atención a satisfacción a los requerimientos efectuados por la Entidad, respecto a la solicitud de reconocimiento de costos adicionales de transporte. El 16 de marzo de 2022 se suscribió la ampliación No 03 de la suspensión No 01 para los contratos de obra e interventoría, quedando fecha pactada de reinicio el 17/05/2022.</p> <p>El 30 de marzo de 2022 mediante oficio E-2022-001694, se envían las observaciones respecto a la solicitud presentada por el contratista de obra, referente a un reconocimiento de transporte por kilometraje adicional, motivado por el cambio de ruta para llegar hasta el Corregimiento de Juntas de Tamana (condiciones de orden público y dificultad para la navegabilidad en el río Ingara).</p> <p>Murillo – Tolima: El 11 de marzo de 2022 mediante comunicación CSB-123-717, el interventor envía al Fondo de Adaptación el ajuste al "Informe de incumplimiento del proyecto VEREDA LA ESPERANZA – MUNICIPIO MURILLO". El 24 de marzo de 2022 mediante memorando I-2022-001546 el sector remite a la Secretaría General el</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>informe ajustado de acuerdo a los requerimientos recibidos. Mediante comunicados No. E-2022-001602 y E-2022-001603 del 25 de marzo de 2022 se citan al contratista y la aseguradora respectivamente a audiencia por el presunto incumplimiento del contrato FA-IC-I-S-353 de 2019 el día 13 de abril de 2022.</p>
Abril	<p>Aguachica – Cesar: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución física del 83,31%, desarrollando actividades finales para acondicionamiento de las obras, consistentes en perfilación de taludes, empalme de tuberías, instalación de accesorios y válvulas. Se tiene programada la terminación de las obras el 22 de mayo de 2022.</p> <p>Nóvita – Chocó: El día 20 de abril de 2022, se firman las actas de reinicio de los contratos FA-CMA-I-S-002-2021 interventoría y FA-LP-I-S-001-2021 obra, estableciendo como nueva fecha de terminación de los contratos el día 18 de diciembre de 2022, con el reinicio, se adelantan actividades preliminares de localización y replanteo en el sitio de las obras.</p> <p>El 29 de abril de 2022, mediante oficio E-2022-002239 se solicita a la interventoría el documento de ajuste de la justificación integral técnica, financiera y jurídica de las obras complementarias de los acueductos Juntas de Tamaná y Curundó, necesarios para adelantar la modificación en valor y plazo de los contratos, sin que esto imposibilite que el contratista continúe con la ejecución de la etapa de construcción.</p> <p>Murillo – Tolima: El día 25 de abril de 2022, se realizó la sesión de la audiencia en el marco del proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento, en desarrollo de la cual el contratista de obra presentó los descargos y manifestó nuevamente a la entidad y la compañía de seguros, la propuesta de culminar las actividades de la etapa II-construcción y lograr la entrega de un proyecto funcional, con las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prorrogar la ejecución de los contratos de obra e interventoría para la etapa II-construcción por el plazo de cinco (05) meses calendario. 2. Los mayores costos de la interventoría sean asumidos por el contratista de obra. <p>El 25 de abril de 2022, mediante comunicado No. CSB-123-746, la interventoría remitió al Fondo Adaptación el comunicado del contratista de obra No. FAD-05-2022 de la misma fecha, por el cual manifestó la ratificación de la terminación del proyecto SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDA LA ESPERANZA – MUNICIPIO MURILLO, la cual se encuentra en análisis del Sector y en el evento de requerirse complementos serán solicitados a la Interventoría.</p> <p>El día 25 de abril de 2022, se suscriben las actas de suspensión total No 06, para los contratos de obra e interventoría, por el término de un (01) mes y quince (15) días calendario, hasta el 09 de junio de 2022.</p>
Mayo	<p>Aguachica – Cesar: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución física del 99,00%, los contratos de obra e interventoría terminaron el 22 de mayo de 2022. La interventoría se encuentra en el proceso de validación de las obras y pruebas de verificación con el contratista, que permita la suscripción del acta de recibo final de obras. Se socializará con el municipio y el prestador dichas actividades para que se apropien de la infraestructura.</p> <p>Nóvita – Chocó: El día 26 de mayo de 2022, la interventoría mediante oficio INT-FA-CMA-I-S-002-2021-048, presentó la justificación y análisis integral técnico, financiero y jurídico para el trámite de modificación contractual, para lo cual, el Sector se encuentra en la revisión de la ficha de modificación contractual por concepto de adición de recursos acorde al balance económico y solicitud de prórroga de dos meses.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>A la espera del aval de dichas fichas, para presentar ante comité de contratación la modificación contractual.</p> <p>Murillo – Tolima: Mediante oficio No. E-2022-002278 del 02 de mayo de 2022 el Fondo de Adaptación solicitó a la interventoría emitir el concepto técnico, económico y jurídico de la propuesta presentada por el contratista para culminar la ejecución del proyecto. En respuesta, se recibe de la interventoría el comunicado No. CSB-123-756 del 02 de mayo de 2022 donde presente el concepto solicitado, sin embargo, dicho concepto no respondió los requerimientos efectuados por ello se solicitó complementos.</p> <p>Mediante comunicado No. CSB-123-759 del 11 de mayo de 2022, la interventoría remite el concepto técnico, económico y jurídico de la propuesta presentada por el contratista para culminar la ejecución del proyecto, pero no se informó el costo por la mayor permanencia de la interventoría ni su argumentación. La interventoría mediante comunicado No. CSB-123-767 del 26 de mayo de 2022 remite el análisis del costeo solicitado y la argumentación solicitada.</p>
Junio	<p>Aguachica – Cesar: El día 21 de junio de 2022, se suscribió el acta de entrega y recibo final del objeto contractual "Reconstrucción del sistema de acueducto (bocatoma, aducción, tratamiento preliminar y obras adicionales) Municipio de Aguachica - Departamento de Cesar", por parte del contratista Benjamín Obando Delgado y el interventor Consultoría Técnica Latinoamericana y del Caribe S.A.S, evidenciando un porcentaje de ejecución física del 100%. Por lo anterior, con la suscripción de esta acta se da cumplimiento a la meta de terminación del proyecto.</p> <p>Nóvita – Chocó: En el componente técnico se avanza en la ejecución, con mayor énfasis en la rehabilitación del sistema de acueducto del Corregimiento de Curundó realizando la intervención de la bocatoma y el sistema de tratamiento; en el sistema de acueducto de Juntas de Tamaná se avanza en transporte de materiales.</p> <p>El día 21 de junio de 2022, se presentó ante el comité de contratación la necesidad de adición y prórroga de los contratos de obra e interventoría. Actualmente se elabora el documento para la solicitud de elaboración de la novedad contractual y su respectiva suscripción. Mediante memorando E-2022-013398 del 23 de junio de 2022, se solicitó al interventor el envío de un plan de contingencia por bajos rendimientos y avance en la ejecución de las obras objeto del contrato.</p> <p>Murillo – Tolima: Mediante comunicados No. CSB-123-769 y CSB-123-770 del 06 de junio de 2022, la interventoría remite la solicitud de prorrogar la suspensión de los contratos de obra e interventoría, con el fin de tener el tiempo necesario para culminar el análisis de la propuesta del contratista para lograr culminar la ejecución del proyecto.</p> <p>El 08 de junio de 2022, se suscribe la ampliación a la suspensión de los contratos de obra e interventoría por el término de dos (02) meses calendario, pactando reinicio el día 09 de agosto de 2022, por la necesidad de realizar la evaluación jurídica, técnica y financiera para la cesión de la participación del integrante inhabilitado que permita presentar en comité de contratación dicha cesión, así como la solicitud de prórroga al plazo de ejecución de los contratos de obra e interventoría.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-013317 del 17 de junio de 2022, el Fondo Adaptación reiteró la necesidad de recibir la documentación jurídica, técnica y financiera y cada integrante del consorcio y la persona natural o jurídica a la que se propone la cesión de la participación.</p>
Julio	<p>Nóvita – Chocó: El proyecto presenta ejecución normal, desarrollándose actividades en los (2) sistemas de acueducto.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Mediante comunicado E-2022-024636 del 28 de julio de 2022, se reitera a la interventoría Sociedad técnica SOTA LTDA el comunicado E-2022-024400 del 15 de julio de 2022, debido a los retrasos en el cargue del cronograma en el aplicativo PSA, el cual a cierre de julio de 2022 no se ha cumplido.</p> <p>Murillo – Tolima: Mediante comunicado No. E-2022-024269 del 12 de julio de 2022, el Fondo Adaptación devolvió a la interventoría los documentos remitidos para la cesión del contrato de obra mediante comunicado No. CSB-123-778 pues los mismos no cumplen con los requerimientos jurídicos para efectuar el trámite.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-024317 del 13 de julio de 2022 se notifica a la Equidad Seguros que el Consorcio Saneamiento Básico no ha suministrado la documentación que permita la evaluación integral de la cesión de la participación contractual del contrato de obra No. FA-IC-I-S-353 de 2019.</p> <p>Teniendo en cuenta los atrasos de contratista e interventoría para remitir la documentación que permita evaluar la cesión del contrato de obra FA-IC-I-S-353 de 2019 se acuerda convocar mesa de trabajo para el 02 de agosto de 2022.</p>
Agosto	<p>Nóvita – Chocó: El proyecto presenta ejecución normal, desarrollándose actividades en los (2) sistemas de acueducto, reportándose un porcentaje de ejecución física del 42,31%. (Ejecución física del proyecto de Curundó 52% y ejecución física del proyecto de Juntas de Tamaná 32,62%).</p> <p>El sector ha requerido en forma permanente al contratista de obra e interventoría para la presentación de cuentas de cobro, sin embargo, al corte del mes de agosto de 2022 no se han radicado. Con relación al componente social, se viene coordinando con el profesional las actividades preliminares, punto de atención al ciudadano, vallas informativas, instalación del buzón de PQR, para determinar la fecha del foro inicial, el cual se tiene previsto de forma virtual por las difíciles condiciones de orden público.</p> <p>En el corregimiento de Juntas de Tamaná se enfocan las actividades en la construcción de la Bocatoma y el corregimiento de Curundó las actividades correspondientes a la instalación de pañete exterior en caseta de desinfección, construcción de caja macromedidor en concreto de 3000 psi (incluye tapa en concreto no incluye acero de refuerzo); Suministro, transporte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60000 PSI -Macromedición.</p> <p>Murillo – Tolima: El 04 de agosto de 2022 se recibe el comunicado CSB-123-794 por parte de la interventoría, mediante el cual se recibe la información de otro cesionario propuesto por el contratista y evaluado por la interventoría. Al realizar las evaluaciones jurídica, financiera y técnica en la entidad, se logra evidenciar que la persona jurídica propuesta no cumple con el requerimiento jurídico.</p> <p>El contratista de obra remite el auto No. 133 del 17 de agosto de 2022, mediante el cual la CGR resuelve archivar por pago total el proceso de cobro coactivo en contrato de Bernardo Enrique Bravo Pérez, para lo cual, la Entidad solicitará los soportes: i) Copia del Auto mediante el cual quedó en firme el Auto No. 133 del 17 de agosto de 2022 y ii) Copia del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, mediante el cual, se verifique que no existe reporte de la entidad ante Bernardo Enrique Bravo Pérez.</p>
Septiembre	<p>Nóvita – Chocó: El día 13 de septiembre de 2022 mediante oficio nro. E-2022-025528, se reiteró a la interventoría cumplir con obligación contractual consignada en el numeral 6.2.3 "Obligaciones de carácter administrativo". Numeral 25. Cargar en el aplicativo PSA o sistema equivalente del FONDO el cronograma correspondiente al proyecto y llevar a cabo el seguimiento del mismo, de acuerdo con los lineamientos y manuales vigentes emitidos por EL FONDO".</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>De acuerdo con lo reportado por la interventoría en la última reunión de seguimiento adelantada el pasado 28 de septiembre de 2022, el proyecto se encuentra en ejecución normal, con un avance general ejecutado del contrato es del 51,69% versus el programado del 48,1%. En cuanto al proyecto de Curundó, se tiene un avance del 56,05% versus el programado del 52,97%., mientras que para el proyecto de Juntas de Tamaná se tiene un avance del 43,85% versus el programado del 51,65%</p> <p>Mediante oficio E-2022-025855 del 29 de septiembre de 2022, se reiteró a la interventoría lo indicado en el comunicado radicado No. E-2022-025528 del 13 de septiembre de 2022, y se solicitó atender de manera inmediata, las obligaciones contractuales a su cargo, particularmente las referentes al cargue y seguimiento del cronograma del proyecto en la plataforma PSA y el seguimiento para normalizar la desviación que presentan las obras</p> <p>Murillo – Tolima: Mediante comunicado No. E-2022-025369 del 02/09/2022, el Fondo Adaptación solicita al contratista “Consortio Tol-ima 2019” remitir soportes adicionales que permitan verificar el auto No. 133 del 17/08/2022 mediante el cual se ha archivado la inhabilidad contra Bernardo Bravo Pérez debido al pago de las respectivas multas instauradas.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-025370 del 02/09/2022, el Fondo Adaptación solicita a la interventoría “Consortio Saneamiento Básico” remitir el informe por los descargos presentados por el contratista en la audiencia de presunto incumplimiento y las fichas de modificación contractual de los contratos de obra e interventoría.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-025453 del 08/09/2022, el Fondo Adaptación solicita a la interventoría “Consortio Saneamiento Básico” realizar la evaluación jurídica y manifieste si se requiere o no continuar con el trámite de cesión del contrato de obra pues el contratista presentó los soportes del archivo de la inhabilidad contra Bernardo Bravo Pérez debido al pago de las respectivas multas instauradas.</p> <p>El 27/09/2022 se lleva a cabo mesa de trabajo virtual entre la interventoría y el Fondo Adaptación en la cual se presenta la evidencia de que mediante comunicados No. CSB-123-812 del 26/09/2022 y CSB-123-815 del 29/09/2022 la interventoría ha subsanado las observaciones por el concepto jurídico por la inhabilidad del consorciado Bernardo Bravo Pérez y el informe por los descargos que presentó el contratista en la audiencia de presunto incumplimiento.</p>
(AEB06)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	<p>Candelaria – Atlántico: El 24 de febrero se realizo visita por parte del sector de agua y subgerencia de regiones para verificar el estado de avance de las obras y seguimiento a compromisos sociales.</p> <p>El 25 de febrero se presentó ante el comité de contratación novedad de adición al contrato de obra, la cual fue aprobada, razón por la cual se adelantan los trámites para el modificatorio del contrato, donde se tiene en cuenta mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos. El sector adelanto el trámite de CDR por valor \$ 486.707.270,39 para amparar presupuestalmente la adición de recursos.</p> <p>Cimitarra – Santander: Los días 9, 15 y 22 de febrero se adelantaron mesas técnicas, con el contratista de obra, la interventoría y el Fondo de Adaptación, encaminadas a concretar el planteamiento técnico de los ajustes de los diseños y cierre del presupuesto del proyecto.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>El 23 de febrero se adelantó mesa de trabajo virtual con la participación del contratista de obra, interventoría, Aseguradora solidaria SA y el Fondo de Adaptación, en la cual se expuso las acciones adelantadas encaminadas a lograr la reactivación de las obras y estado actual del contrato. En dicha reunión se establecieron compromisos para la entrega de información técnica por parte del contratista, aprobación de la interventoría y demás trámites para la formalización de la modificación del contrato.</p>
Marzo	<p>Candelaria – Atlántico: El 03 de marzo de 2022, se expidió el CDR 6376 por valor de valor \$ 486.707.270,39, con el objeto de amparar presupuestalmente los recursos con cargo a fuente Fondo de Adaptación, requeridos para la adición del contrato de obra. El 25 de marzo de 2022 se realizó visita de seguimiento al proyecto donde se evidencia un avance de las obras del 19%, con el objetivo de realizar el foro de inicio, el cual se desarrolló con la participación de representantes del municipio y la comunidad, allí se informó sobre la intervención actual, así mismo, fueron socializados algunos temas como la reubicación de ladrilleros que se encontraban localizados en el terreno donde se ejecutan las obras. De otro lado se identificó el avance de las obras, las cuales están centralizadas en la excavación para la construcción de la laguna facultativa, suministro e instalación de tuberías de ingreso y salida. Actualmente el sector en conjunto con la Secretaria General adelanta los trámites para lograr la suscripción de la novedad de adición al contrato de obra.</p> <p>Cimitarra – Santander: Mediante oficio E-2022-001284 del 14 de marzo del 2022, se remite a la interventoría el aval de los dos ítems no previstos adicionales; mediante oficio CMA-003-2021-15-03-22-113 del 15 de marzo del 2022, la interventoría envía la aprobación al ajuste final de diseño.</p> <p>Mediante oficio E-2022-001317 del 15 de marzo del 2022, se reitera al contratista de obra la necesidad de implementar el plan de contingencia para normalizar estado de ejecución de las obras contratadas.</p> <p>La interventoría mediante oficio CMA-003-2021-28-03-22-122 del 28 de marzo de 2022, recomendó al Fondo Adaptación realizar una prórroga por cinco (5) meses a la etapa de construcción del contrato No. FA-LP-I-S-003-2021 de obra, con el fin de compensar el tiempo adicional que requirió la actividad de ajuste del proyecto, y permitir culminar las obras para beneficio de la comunidad. Actualmente se adelanta la elaboración de los documentos para proceder con el modificadorio de prórroga del plazo contractual.</p>
Abril	<p>Candelaria – Atlántico: El 21 de abril de 2022, mediante memorando I-2022-001943 se solicita la modificación No. 01 del contrato de obra No. FA-IC-I-S-151-2020, con el objetivo de adicionar \$1.086.707.270, correspondientes a \$486.707.270,39 aportados por el Fondo de Adaptación y \$ 600.000.000 por el Departamento del Magdalena. La minuta proyectada por la Secretaria General fue remitida a la Secretaria de Agua y Saneamiento del Departamento del Atlántico el 27 de abril de 2022, para su revisión y aval de la forma de pago de los recursos aportados por el Departamento.</p> <p>Cimitarra – Santander: El 11 de abril de 2022, mediante memorando I-2022-001855 se solicitó la modificación No 01 del contrato de obra FA-LP-I-S-003-2021, la cual se suscribe el 26 de abril de 2022, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución por 5 meses y se ajustó el valor total del contrato, resultado del balance realizado, el cual dio como resultado una reducción del valor del contrato por \$105.642.460, con lo cual el valor actualizado del contrato es de \$3.678.200.768.</p> <p>De igual manera se adelantó la modificación contractual del contrato FA-CMA-I-S-003-2021, por concepto de prórroga del plazo de ejecución de 05 meses.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Mayo	<p>Candelaria – Atlántico: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución física del 36,22%. Actualmente se encuentra acondicionada el área de la laguna facultativa y humedales, los cuales corresponden a las estructuras principales del proyecto, para la instalación de material filtrante e instalación de geomembrana.</p> <p>En el componente social se ha solicitado apoyo a la Gobernación del Atlántico de seguimiento a los compromisos con la comunidad de fabricación artesanal de ladrillos, a fin de que no afecte la ejecución de las obras. Se programará visita de seguimiento en el mes de junio de 2022.</p> <p>Cimitarra – Santander: El 06 de mayo de 2022 la Contraloría General de la República mediante oficio 2023EE0077251, con radicado en el Fondo R-2022-00554, informó su decisión de iniciar seguimiento permanente al contrato de Obra FA-LP-I-S-003-2021, para lo cual citó a mesa de instalación el 17 de mayo de 2022, a la cual fueron convocados el contratista de obra e interventoría.</p> <p>El 17 de mayo de 2022 se adelantó instalación de mesa de seguimiento permanente citada por la Contraloría General de la República, como compromiso de la misma se remitió el 23 de mayo de 2022 información correspondiente al cronograma ajustado y los estudios y diseños ajustados del proyecto, soporte del ajuste del presupuesto y soporte otrosíes suscritos.</p> <p>El 19 de mayo de 2022 se realizó visita a las obras por parte del Fondo, en la cual se evidenció un bajo avance y se encontró falta de suministro de tubería, la cual es el ítem representativo del contrato. El 26 de mayo de 2022 se adelantó reunión presencial en las oficinas del Fondo Adaptación, con la participación de delegados del contratista de obra, interventoría y del Fondo de Adaptación, con el fin de realizar seguimiento al estado de ejecución de las obras del proyecto.</p>
Junio	<p>Candelaria – Atlántico: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución físico del 32%; actualmente se ejecutan actividades de conformación de la laguna facultativa y humedales con el suministro e instalación de material filtrante e instalación de geomembrana y geotextil.</p> <p>El 10 de junio de 2022 se realizó visita de seguimiento al sitio del proyecto por parte del apoyo a la supervisión, allí se evidenció el avance físico de la ejecución y se adelantó reunión con representantes de la alcaldía municipal para reiterar la prioridad para atender los compromisos con la comunidad de ladrilleros, previniendo futuras afectaciones a la ejecución del proyecto por parte de estos.</p> <p>Cimitarra – Santander: Se adelantaron las mesas de seguimiento a la ejecución convocadas por la DIARI de la CGR los días 02, 17 y 21 de junio de 2022, que contaron con la participación del contratista de obra, interventoría, Fondo Adaptación y la CGR.</p> <p>El 9 de junio de 2022 se realizó visita a las obras por parte del Fondo, con el fin de realizar seguimiento al avance de las obras. Se constató el suministro de e instalación de tubería de diámetro 1242 mm y materiales granulares. También se evidencia disposición de material de excavación. Se evidencia desviación entre lo ejecutado y lo programado. Mediante oficio E-2022-013239 del 14 de junio de 2022, se atendió requerimiento realizado por la CGR en la mesa de seguimiento No. 2, remitiendo el informe mensual de interventoría con corte al 15 de mayo de 2022. El Fondo Adaptación mediante oficio E-2022-013417 del 23 de junio de 2022, reiteró a la interventoría cumplir con el compromiso establecido en la mesa de trabajo de 21 de junio de 2022, de que se remita el plan de contingencia para normalizar la desviación que presenta el contrato.</p>
Julio	<p>Candelaria – Atlántico: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución físico del 46,85%; actualmente se ejecutan actividades de conformación de la laguna</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>facultativa y humedales con el suministro e instalación de material filtrante e instalación de geomembrana y geotextil.</p> <p>El 14 de julio de 2022 se realizó visita de seguimiento al sitio del proyecto por parte del apoyo a la supervisión, allí se evidenció el avance físico de la ejecución, sin embargo se reporto por parte de la interventoría que en el mes de julio de 2022 se presentaron periodos extensos de lluvia que han dificultado el desarrollo de las actividades de instalación de geotextil y geomembrana, adicionalmente se han presentado algunas alteraciones de la comunidad de ladrilleros que labora en el predio anexo al sitio de construcción por el incumplimiento del acondicionamiento de una vía de acceso, la cual esta a cargo de la alcaldía de Candelaria; se realiza permanente seguimiento a este tema social.</p> <p>Cimitarra – Santander: Con corte al 31 de julio de 2022, se tiene un avance físico ejecutado del 14,5% versus un avance programado del 41%. El atraso reportado en la ejecución de las obras se debe a causas imputables al contratista como demoras en el suministro de materiales pétreos y tubería, ausencia de maquinaria y otras causas manifestadas por el contratista como restricciones de la comunidad para la ejecución en simultaneo de varios tramos del trazado de alcantarillado y paro de volqueteros.</p> <p>Mediante oficio E-2022-023832 del 7 de julio de 2022, se solicitó a la alcaldía municipal de Cimitarra, el apoyo para el acompañamiento en las mesas de trabajo programadas por el contratista de obra con la asociación de volqueteros y la comunidad residente.</p> <p>Es pertinente señalar que desde mediados de julio de 2022, se cuenta con el aval de la comunidad para iniciar a trabajar en tramos simultáneamente, y se acordó con los volqueteros las tarifas de los fletes, razón por la cual, se requirió al contratista mediante oficios y en las mesas de seguimiento DIARI, proceder con la ejecución del tramo No. 2, lo cual ha incumplido.</p> <p>Mediante oficio E-2022-024434 del 18 de julio de 2022, se solicitó a la interventoría informar las razones por las cuales no se dio cumplimiento al compromiso definido en las mesas de seguimiento DIARI, respecto a la entrega del plan de contingencia, requerido igualmente mediante oficios No. E-2022-023721 del 06 de julio de 2022 y E-2022-024361 del 14 de julio del 2022, el cual a la fecha no se ha recibido. Así mismo, se solicitó conminar al contratista a que realice de manera inmediata la entrega del plan de contingencia, y en caso de requerirse, reportar a la compañía de seguros la situación presentada del presunto incumplimiento contractual.</p> <p>Teniendo en cuenta los inconvenientes y demoras presentadas, se solicitará a la interventoría un informe con las recomendaciones y acciones jurídicas a adelantar, con el fin de normalizar el presunto estado de incumplimiento del contratista.</p>
Agosto	<p>Candelaria – Atlántico: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución físico del 54,43%; actualmente se ejecutan actividades de conformación de la laguna facultativa y humedales con el suministro e instalación de material filtrante e instalación de geomembrana y geotextil de acuerdo con el informe de interventoría No. 8.</p> <p>El 18 de agosto de 2022 se realizó visita de seguimiento al sitio del proyecto por parte del apoyo a la supervisión, allí se evidenció el avance físico de la ejecución y se concluyó que las lluvias que afectan el terreno de intervención aunado la falta de disponibilidad de material en el sitio, generan atraso en el desarrollo de las actividades del cronograma, a pesar de que el contratista logra recuperar el terreno drenando el agua depositada, al no encontrarse el material granular en el sitio, la actividad de instalación de geotextil y geomembrana no se desarrolla y al retornar nuevamente las lluvias se empozan en el terreno generando un ciclo que culmina</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>con la falta de construcción de la estructura definida para la laguna facultativa. La etapa de obra finaliza el 21 de septiembre de 2022.</p> <p>El 26 de agosto de 2022 se realizó el foro del 50% con el acompañamiento del profesional social.</p> <p>De acuerdo con las comunicaciones con radicado No. R-2022-019838 del 18 de agosto de 2022, No. E-2022-025242 del 29 de agosto de 2022 y No. R-2022-020394 del 01 de septiembre de 2022, se identificó la necesidad de prorrogar el contrato de obra e interventoría en el termino de dos (2) meses para la terminación del proyecto, sin embargo, no se ha recibido una solicitud solida por parte de la interventoría que justifique los motivos del atraso y la necesidad de la prórroga. En virtud de lo anterior se tiene previsto programar una mesa de trabajo para analizar y concertar con el contratista de obra y la interventoría la solución, de igual forma definir quien asumirá los mayores costos de interventoría por concepto de la mayor permanencia. Actualmente se elabora el análisis jurídico, técnico y financiera que motive la necesidad de modificación de los contratos.</p> <p>Cimitarra – Santander: Actualmente el proyecto presenta una baja ejecución de obra, teniendo en cuenta que el contratista de obra no adelantó los trabajos de acuerdo con el cronograma establecido, dado que no contó en obra con la maquinaria, ni con los insumos correspondientes a agregados pétreos y tubería.</p> <p>Mediante oficio E-2022-024751 del 2 de agosto de 2022, se solicitó a la interventoría presentar un informe con las recomendaciones de las acciones a emprender por parte de la entidad, debido a los atrasos y baja ejecución que presenta la ejecución del contrato.</p> <p>Mediante oficio E-2022-024813 del 8 de agosto de 2022, se solicitó a la interventoría realizar correcciones, ajustes y/o complementación del informe de presunto incumplimiento del contrato de obra, allegado al Fondo mediante oficio CMA-003-2021-04-08-22-223 del asunto del 4 de agosto de 2022.</p> <p>Mediante oficio E-2022-025183 del 25 de agosto de 2022, se informó a la interventoría de la devolución por parte del área de incumplimiento del Fondo, del informe presentado y se solicitó proceder con su ajuste conforme las observaciones realizadas.</p> <p>Mediante memorando I-2022-024366 del 26 de agosto de 2022, se remitió al área de incumplimiento del Fondo, el informe de presunto incumplimiento del contrato de obra, ajustado y remitido por la interventoría.</p> <p>Mediante oficio E-2022-025324 del 31 de agosto, se informa a la interventoría sobre la segunda devolución del informe de presunto incumplimiento y se solicita atender las observaciones realizadas por el área de incumplimiento del Fondo.</p>
Septiembre	<p>Candelaria – Atlántico: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución físico del 55,6% en la ejecución de actividades de conformación de la laguna facultativa y humedales artificiales.</p> <p>Desde el 21 de septiembre de 2022 fue necesario suscribir la suspensión No. 3 de los contratos de obra e interventoría, de acuerdo con la solicitud de suspensión requerida por el contratista de obra y avalada por la interventoría, dado el incremento de las lluvias en el país, y específicamente en el departamento del Atlántico, lo que imposibilita la ejecución de las actividades requeridas para la construcción de la estructura de la laguna facultativa y el humedal. Con relación a la solicitud de reconocimiento y adición de dos meses al plazo de ejecución del contrato de obra Nro. FA-IC-I-S-151-2020 actualmente se están realizando las revisiones correspondientes.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Cimitarra – Santander: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución físico del 20,9% respecto al 83% programado.</p> <p>Mediante oficio E-2022-025428 del 07 de septiembre de 2022, se solicitó al Municipio de Cimitarra remitir una copia de la totalidad de la información de los estudios y diseños adelantados por el Municipio correspondiente a los “DISEÑOS ALCANTARILLADO COMBINADO CARRERA 6 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12 MUNICIPIO DE CIMITARRA – DPTO. DE SANTANDER”.</p> <p>Mediante oficio E-2022-025439 del 7 de septiembre de 2022, se realizó un Llamado de atención a la interventoría, por la falta de respuesta al contratista y se solicitó dar respuesta a los oficios OF-160-CT-FA-003, OF-159-CT-FA-003 y demás remitidos por el contratista de obra con relación a la solicitud de inclusión de ítem no previstos NP 03 Transporte y disposición RCD.</p> <p>Mediante memorando nro. I-2022-024716 del 09 de septiembre de 2022 remitido a la Secretaria General, se realizó la entrega del informe de presunto incumplimiento contractual presentado por la interventoría.</p> <p>Mediante oficio E-2022-025530 del 13 de septiembre se citó al contratista de obra a la audiencia de imposición de multas citada para el 23 de septiembre de 2022, la cual por solicitud del contratista se reprograma para el 03 de octubre de 2022 conforme a oficios E-2022-025705 y E-2022-025706 del 22 de septiembre de 2022</p> <p>El no cumplimiento de la meta de entrega proyectada para septiembre de 2022 obedece a que durante el primer trimestre del 2022 fue necesario realizar ajustes al diseño del proyecto, inclusión de APUs no previstos y balance del contrato, posterior a lo cual se procedió a solicitar y suscribir el otrosí No 1 del contrato el 26 de abril de 2022, mediante el cual se prorrogó el plazo del contrato en 5 meses, de manera que la nueva fecha de terminación del contrato es el 14 de noviembre de 2022.</p> <p>Así mismo, durante la ejecución del proyecto se han presentado atrasos por causas imputables al contratista, debido a los bajos rendimientos, suministro tardío de insumos y materiales, y falta de disponibilidad de maquinaria de manera permanente.</p>
(AEB07)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	<p>Samaniego - Nariño: El 22 de febrero de 2022 mediante oficio E-2022-000849, se solicitó al contratista de obra continuar con las actividades de alistamiento y toma de muestra de calidad de agua, para la puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, que permita al Fondo de Adaptación realizar la entrega de la infraestructura al municipio. El 23 de febrero de 2002 se llevó a cabo reunión virtual con la participación del municipio, contratista de obra, interventoría y el Fondo de Adaptación, en la cual se reiteraron los compromisos y se informó que por las fuertes lluvias presentadas en el municipio, se imposibilitó el alistamiento de la planta y toma de muestras de calidad.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: Finalizando el mes de enero de 2022, se remitió oficio E-2022-000381 a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, con el fin de solicitar apoyo en el proceso de entrega y recibo de las obras de agua potable y saneamiento básico con el Municipio de Cúcuta. El 28 de febrero de 2022, se recibió comunicado de la Contraloría General de la República, en el cual informa al Fondo de Adaptación la necesidad de ampliar la comisión de seguimiento a la petición de apoyo para la entrega y recibo de las obras, debido a la complejidad de los asuntos a analizar.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Dolores - Tolima: El 01 de febrero mediante oficio E-2022-000447, se reiteró la necesidad de la suscripción del acta de entrega de la infraestructura construida "Reconstrucción del sistema de acueducto vereda Llanitos – municipio de Dolores, departamento del Tolima". El 18 de febrero mediante oficio E-2022-000800, se envía al alcalde Municipal de Dolores, "Derecho de petición y reiteración de oficios previos del 2021 y 2022, con copia a los entes de control, PGN y CGR, con el objetivo de la suscripción Acta de entrega de la infraestructura "Reconstrucción del sistema de acueducto vereda Llanitos – municipio de Dolores, departamento del Tolima".</p>
Marzo	<p>Yopal – Casanare: El municipio y la empresa EAAAY recibieron el sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable en óptimo funcionamiento, mediante Acta de Entrega y recibo al Municipio y el operador de gerencia de agua y saneamiento básico, suscrita el 23 de marzo de 2022 por parte de la Alcaldía Municipal, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY, la interventoría, el contratista y Findeter.</p> <p>Samaniego - Nariño: La interventoría mediante comunicado CAN-123-174 del 25 de marzo de 2022, informa que el 16 de marzo de 2022, fueron tomadas las muestras de calidad del agua para remitir al laboratorio de EMPOPASTO S.A E.S.P., pruebas requeridas para el alistamiento final que permita la entrega de la infraestructura construida (plan de tratamiento de agua potable).</p> <p>El 31 de marzo de 2022, el Fondo Adaptación solicitó sea informado el resultado y conclusiones de las muestras de calidad, requeridas para el cierre de la fase puesta en marcha que permita la entrega de la infraestructura construida al ente territorial, para que se encargue de las actividades de operación y mantenimiento del sistema.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: El 8 de marzo de 2022 se adelantó reunión con delegados de la alta consejería de presidencia, coordinada por la subgerente de proyectos del Fondo, con el fin de requerir apoyo para lograr la entrega y recibo de las obras. Se encuentra en definición las acciones jurídicas se pueden adelantar frente al informe de trazabilidad de la problemática, en la entrega y recibo de las obras de estabilización de taludes sector "Canoítas – La Unión" línea de aducción, desarenador planta pórtico del sistema pamplonita en el municipio de Cúcuta- Norte de Santander".</p> <p>En atención al requerimiento realizado por el Municipio de Cúcuta, en el cual informan del no recibo de las obras el Fondo de Adaptación mediante oficio E-2022-001462 del 22 de marzo, la Subgerencia de Proyectos informa nuevamente al Municipio las conclusiones del informe técnico presentado por la Interventoría, el cual a la fecha Aguas Capital no ha dado respuesta al mismo. El 25 de marzo de 2022, mediante comunicado 2022EE0051260, se recibió por parte de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental, Norte de Santander, respuesta al oficio E-2022-000381, mediante el cual el Fondo solicitó apoyo en el proceso de entrega y recibo de las obras de agua potable y saneamiento básico con el Municipio de Cúcuta. La Contraloría Departamental informó que no es posible acceder a la solicitud, debido a que las obras ya están terminadas desde febrero de 2020 e informa que se dio traslado al Grupo de Vigilancia Fiscal.</p> <p>Dolores - Tolima: El día del 15 de marzo de 2022 mediante comunicado No. SP-120-101, el alcalde municipal envía respuesta el derecho de petición radicado con número E-2022-000800 del 18 de febrero de 2022, solicitando se realice una visita a las obras, para verificar el estado físico de las mismas y el funcionamiento del sistema. Por lo anterior, se procede a programar visita de inspección para los días 31 de marzo y 01 de abril de 2022.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Abril	<p>Samaniego - Nariño: La interventoría Consorcio Aguas Normalizar, el día 6 de abril de 2022, mediante comunicado No. CAN-123-176, remitió los resultados de análisis de calidad del agua, por lo anterior, mediante oficio E-2022-001804 del 6 de abril de 2022, se solicitó a la interventoría, emitir un concepto de interpretación, análisis de los resultados y conclusiones, que permita a la entidad programar mesa de trabajo con el municipio de Samaniego para coordinar la entrega de la infraestructura. La interventoría mediante comunicado No. CAN-123-177 del 11 de abril de 2022, remitió el concepto de interpretación, análisis y conclusiones de los resultados de laboratorio entregados por EMPOPASTO, los cuales mediante oficio No. E-2022-002063 del 20 de abril de 2022, se remiten al municipio de Samaniego.</p> <p>El 25 de abril de 2022, se realizó mesa de trabajo con el Municipio, contratistas de obra e interventoría y Fondo de Adaptación, donde el Municipio solicitó continuar con el acompañamiento técnico y operativo para culminar a satisfacción el proceso de calibración de los procesos de tratamiento y alistamiento de la planta de tratamiento para el recibo de la infraestructura. En este sentido, mediante oficio E-2022-002230 del 28 de abril de 2022, se solicitó a la interventoría coordinar con el contratista lo pertinente, para que se adelante un nuevo proceso de calibración de los procesos de tratamiento de la planta, se adelante nueva toma de muestras y análisis de calidad del agua tratada y se realice nueva capacitación al personal del municipio que estará a cargo de su operación.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: El 1 de abril de 2022 se adelantó una segunda mesa de trabajo con delegados de la Alta Consejería de la Presidencia, con el fin de informar adelantos referentes a la gestión para la entrega y recibo de la infraestructura. El 22 de abril de 2022 se adelantó mesa de trabajo entre la Secretaría General del Fondo Adaptación, Secretaría General y Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de infraestructura del municipio de Cúcuta, con el fin de establecer los acuerdos para la entrega y recibo de la infraestructura del proyecto de acueducto. Se está a la espera de que se confirme la fecha de la mesa de trabajo a realizar con el Municipio y el operador Aguas Kpital.</p> <p>Dolores - Tolima: El 08 de abril de 2022 mediante comunicado No. E-2022-001915 y conforme a visita de inspección del 01 de abril de 2022, se envía el informe del estado físico de las obras construidas y operativo del sistema de acueducto, mediante el cual, se dejaron consignados los requerimientos a cargo del contratista Consorcio Tolima 2019, consistente en las reparaciones que debe realizar a las obras para subsanar las fallas de calidad y/o estabilidad de obras encontradas.</p> <p>El 26 de abril de 2022, mediante comunicado No. E-2022-002176 se reitera el comunicado mencionado anteriormente y se solicita que en calidad de interventoría se presente un informe de avance de estas reparaciones. El 29 de abril de 2022, mediante comunicado No. E-2022-002248, se convoca a mesa de trabajo presencial el día 03 de mayo de 2022, dado que las reparaciones del proyecto debieron culminarse el 29 de abril de 2022.</p>
Mayo	<p>Samaniego - Nariño: La interventoría mediante oficio CAN-123-181 del 04 de mayo de 2022, informó al Fondo respecto al nuevo plan de trabajo para el alistamiento y calibración de la planta, con actividades y fechas proyectadas para la entrega de esta, como compromiso de la mesa de trabajo realizada el 25 de abril de 2022, dado que los resultados no arrojaron agua potable. El contratista de obra mediante oficio PC-SA-TO-125-2022 del 10 de mayo, informó que el día 9 de mayo se adelantó nueva toma de muestras del agua tratada por la PTAP, la cual fue remitida a los laboratorios de Empopasto para su respectivo análisis. A la espera de que la interventoría remita los resultados y la interpretación de los mismos.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: El municipio de Cúcuta remitió al Fondo el oficio nro. 2022102000099204 del 03 de mayo de 2022, reiterando su postura de no acceder al recibo de la infraestructura. Se proyectó respuesta relacionando los oficios e</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>informes técnicos que no han sido respondidos por el municipio y Aguas Kpital de aclaración del alcance técnico de las obras construidas y las posibles fallas de la tubería que no son atribuibles al contratista.</p> <p>Dolores - Tolima: Mediante comunicado No. CSB-123-754 del 02 de mayo de 2022, la interventoría reporta los avances del contratista en la subsanación de observaciones realizadas en el proceso de operación del proyecto. Durante el mes de mayo de 2022, el Sector de Agua y Saneamiento realiza seguimiento y requerimientos a la interventoría y contratista que se informe la fecha en que serán entregadas las reparaciones, so pena de iniciar los respectivos procesos de reclamación de la póliza de calidad y estabilidad así como de calidad del servicio de la interventoría, se remite copia de estos requerimientos a las compañías de seguros de ambos contratos.</p>
Junio	<p>Samaniego - Nariño: El contratista de obra mediante oficio PC-SA-TO-126-2022 del 07 de junio de 2022, remitió al Fondo los resultados de laboratorio realizados para evaluar la calidad del agua tratada por la PTAP, donde EMPOPASTO certificó agua sin riesgo, apta para el consumo humano. Así mismo, el Fondo de Adaptación remitió al municipio los resultados de laboratorio mediante oficio E-2022-013119 del 8 de junio de 2022.</p> <p>Mediante oficio E-2022-013455 del 28 de junio de 2022, se envió invitación al Alcalde de Samaniego para su participación al foro social de cierre del proyecto a realizarse el 8 de julio de 2022, con la finalidad de socializar con la comunidad y el municipio el alcance técnico, objetivos e impactos de la planta de tratamiento construida. El 29 de junio de 2022 mediante oficio E-2022-013487 se remitió por parte del Fondo al municipio, el acta de entrega de la infraestructura para revisión y suscripción.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: El 1 de junio de 2022 se envió al municipio el oficio E-2022-002965, mediante el cual se reiteró la trazabilidad de los principales hechos y gestiones adelantadas por el Fondo Adaptación para la entrega y recibo de las obras, enfatizando en la ausencia de respuesta a los informes y oficios remitidos por el FA al Municipio y Aguas Kpital.</p> <p>El 02 de junio de 2022 se acompañó por parte del Fondo Adaptación, la visita a las obras de rehabilitación del acueducto sector Canoítas en el municipio de Cúcuta, citada por la CGR con el fin de constatar el estado de las obras ejecutadas.</p> <p>El 23 de junio de 2022 mediante oficio E-2022-013410, se dio respuesta a la solicitud de información AG8-8-1/1; con la cual se aclaró los antecedentes del proyecto, así como el alcance técnico de los estudios y diseños; así como el de las obras contratadas.</p> <p>Dolores - Tolima: Mediante comunicado No. CSB-123-768 del 02 de junio de 2022, la interventoría remite el reporte de las reparaciones efectuadas por el contratista y del funcionamiento del sistema de acueducto.</p> <p>El 10 de junio de 2022, se llevó a cabo la visita de inspección a la obra, en la cual se evidenció que el proyecto se encuentra operando sin inconvenientes, se realizaron muestreos para verificar el funcionamiento de la red de distribución, cuyos resultados fueron óptimos. Se observó que algunos usuarios realizan el uso del sistema no para consumo humano sino para otras actividades que desbalancean el sistema en términos de caudal y presión.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-013275 del 15 de junio de 2022, se convocó al municipio a mesa de trabajo para socializar los resultados de visita realizada a las obras el 10 de junio de 2022, a la cual, se extendió invitación a la PGN y se reiteró al municipio la necesidad de designar el personal permanente para las actividades</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>de operación y mantenimiento del acueducto. El municipio no participó de la mesa de trabajo.</p> <p>El 30 de junio de 2022, se envía comunicado radicado No. E-2022-013515, mediante el cual, se hace entrega del informe con los resultados de la visita y se envía nuevamente el acta de entrega de infraestructura para la suscripción, toda vez que, el sistema de acueducto se encuentra en funcionamiento y ya se realizó mantenimiento a los componentes, actividades que están a cargo del municipio, de la cual, se remitió copia a la PGN.</p> <p>La principal dificultad en la entrega de este acueducto obedece principalmente a la falta de voluntad del municipio en apropiarse de la infraestructura construida, no ha designado el personal permanente para la operación y mantenimiento del acueducto y se evidenció que algunos usuarios se abastecen de agua para otros fines distintos al consumo humano, situación que afecta el óptimo funcionamiento del sistema de acueducto. Se continua con el acompañamiento que viene realizando la PGN para culminar el proceso de entrega y recibo de la infraestructura.</p>
Julio	<p>Aguachica – Cesar: Estado del proyecto normal, presenta un porcentaje de ejecución física del 100,00%, las actividades del proyecto están dirigidas a culminar lo necesario para el cierre integral del proyecto.</p> <p>Mediante comunicado E-2022-024663 del 28 de julio de 2022, se remitió al municipio el informe técnico relacionado con la observación por agrietamiento de enrocado en concreto ciclópeo que se localiza cerca del tanque de amortiguación, allí se informó que esta observación no afecta estructuralmente el elemento bocatoma y tanque; sin embargo se informa que no ha sido reparado dado que las crecientes súbitas de la quebrada no lo han permitido.</p> <p>Samaniego - Nariño: El 8 de julio de 2022 se adelantó en el municipio de Samaniego, el foro de cierre social del proyecto, con la participación de la comunidad, delegados de la alcaldía municipal de Samaniego, operarios de la PTAP designados por parte del municipio, personería, concejo contratistas de obra e interventoría y profesionales del Fondo Adaptación. En dicha reunión se acordó realizar recorrido a la PTAP, con el fin de informar arreglos que requiere el municipio sean atendidos, los cuales el contratista de obra se comprometió a atender.</p> <p>Mediante oficio E-2022-024302 del 13 de julio de 2022 dirigido al Municipio de Samaniego, se remitió nuevamente suscrita por el Fondo, el acta de entrega y recibo de la infraestructura, con el ajuste solicitado el 8 de julio de 2022, referente al encargo de las funciones de ordenación del gasto y la contratación de la Alcaldía del Municipio de Samaniego.</p> <p>Mediante oficio E-2022-024615 del 27 de julio de 2022, se requirió a la interventoría remitir un Informe técnico detallado con todas las observaciones de calidad y/o estabilidad, reportar cuales ya han sido atendidas por el contratista, cuales están pendientes o deben ser reparadas.</p> <p>El incumplimiento en la meta de entrega obedece a que existen a la fecha reparaciones a cargo del contratista de obra, requeridas por parte del Municipio en el foro de cierre social adelantado el pasado 8 de julio de 2022. No obstante, lo anterior, y después de validar el estado de las reparaciones con los secretarios de planeación y obras de Municipio, persisten varias de las observaciones, las cuales se informaron a la interventoría para que esta entregue un informe con el estado de las reparaciones, con su respectivo soporte de su cumplimiento, e indique en el caso de que existan arreglos por realizar, la fecha estimada en que quedarán solucionadas.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: En el seguimiento de la CGR, el 1 de julio de 2022 se adelantó mesa de trabajo No. 2 con la Gerencia Departamental Colegiada, Municipio,</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Aguas Kpital y el Fondo Adaptación, en la cual, se reiteró nuevamente el alcance técnico de las obras ejecutadas y se acordó que la Entidad proyectara y remitiera el acta de entrega de infraestructura dejando la claridad del alcance de las obras, para revisión y/o ajustes a cargo del municipio.</p> <p>Mediante correo electrónico del 08 de julio de 2022 se remitió al municipio para su revisión y comentarios, el acta de entrega y recibo de la infraestructura, conforme los compromisos acordados en la mesa de trabajo del 01 de julio de 2022, en la cual, en las consideraciones se dejó los antecedentes de la postulación, quién elaboró los estudios y diseños y el alcance técnico de las obras contratadas en el contrato No. 157 de 2018, el cual corresponde a rehabilitación tubería de acueducto y obras complementarias para control del flujo de escorrentía superficial e infiltración y no a estabilización del talud.</p> <p>Mediante oficio E-2022-024692 del 28 de julio de 2022 remitido al Municipio de Cúcuta con copia a la Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander de la CGR, se solicitó agilizar la revisión del acta de entrega de infraestructura, se dejó la trazabilidad de las gestiones adelantadas en el marco del seguimiento que viene realizando la CGR, con la finalidad de continuar con las gestiones definidas en la hoja de ruta acordada para la entrega y recibo de la infraestructura.</p> <p>Dolores - Tolima: Mediante comunicado No. E-2022-023996 del 08 de julio de 2022, el Fondo Adaptación solicitó a la interventoría presentar un concepto respecto a la prueba de presión de simultaneidad solicitada por el municipio mediante SP-120-308 del 06 de julio de 2022. Adicionalmente se solicitó que la interventoría remita formalmente los estudios y diseños del proyecto al municipio.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-023995 del 08 de julio de 2022, se informa al municipio el estado de las obras y funcionamiento óptimo del sistema.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-024622 del 27 de julio de 2022, se informó al municipio las razones técnicas de la no procedencia de la prueba hidráulica de presiones con todos los usuarios operando el sistema, la necesidad de que el municipio apropie la infraestructura designando el personal técnico y operativo permanente para realizar los mantenimientos preventivos y socializar con la comunidad que los consumos promedios no pueden exceder los estimados en los estudios y diseños para no desestabilizar hidráulicamente la red de distribución.</p> <p>Para el 03 de agosto de 2022, se programa visita de inspección para verificar el estado del servicio en las 13 viviendas que quedaron pendientes por verificar en la visita del 10 de junio de 2022.</p> <p>El incumplimiento en la meta de entrega de este acueducto obedece principalmente a la falta de voluntad del municipio en apropiarse de la infraestructura construida, no ha designado el personal permanente para la operación y mantenimiento del acueducto, lo que ha ocasionado mal funcionamiento y/o reparaciones de algunos componentes intervenidos que ha afectado la operación eficiente, agregado a ello, en visita realizada se evidenció que algunos usuarios se abastecen de agua para otros fines distintos al consumo humano, situación que ocasiona desbalance hidráulico de la red de distribución debido a que son redes abiertas y los consumos por vivienda no pueden superar los estimados en los estudios y diseños.</p> <p>Se deberá continuar con el acompañamiento que viene realizando la PGN para culminar el proceso de entrega y recibo de la infraestructura.</p>
Agosto	<p>Aguachica – Cesar: Proyecto terminado en proceso de entrega -Obras terminadas al 100%, actualmente se atienden observaciones menores de calidad, recibidas por el prestador ESPA ESP SA y el Municipio de Aguachica – Cesar.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Se realizó la puesta en marcha de la infraestructura construida, aumentando el caudal de entrega a la planta de tratamiento el cual aumento de 250 litros / segundo a 450 litros / segundo. Las obras cumplen con su objeto de suministrar el caudal suficiente para el abastecimiento de agua del municipio, sin embargo, se han recibido observaciones menores de calidad, que están siendo atendidas por el contratista.</p> <p>En mesas de trabajo se ha solicitado al prestador la suspensión del servicio por 24 horas para realizar últimos ajustes, pero afecta el suministro en gran parte del municipio porque el sistema tiene circuitos operativos y por otra parte, para atender la reparación de un concreto ciclópeo en zona de la amortiguación de la bocatoma, se requiere que la quebrada Buturama baje el nivel de aguas.</p> <p>Se entregó informe técnico al municipio y prestador, que esto no afecta la estabilidad de la estructura por no ser un tema de acabado ni del suministro de agua.</p> <p>Una vez se concluyan los ajustes que se espera a mediados de septiembre de 2022, se remitirá el acta de entrega de infraestructura al municipio.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: El 09 de agosto de 2022 se remitió el oficio E-2022-024867 al Municipio de Cúcuta con copia a la Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander de la CGR, mediante el cual se solicitó agilizar la revisión del acta de entrega de infraestructura definida en la hoja de ruta acordada para la entrega y recibo de la infraestructura.</p> <p>El 29 agosto de 2022 se adelantó mesa de trabajo con la secretaria general, subgerencia de proyectos y el sector, para revisar acciones a seguir en consecuencia de lo manifestado por el municipio sobre no proceder con el recibo de las obras del proyecto Canoítas, y para dar respuesta al requerimiento de la CGR, relacionada con Observación No. 1, Alcance del objeto contractual - Contrato de obra No 157 - 2018, con presunta incidencia disciplinaria en el marco del proceso Denuncia 2022-235688-80544-D, del cual, se dio respuesta mediante oficio E-2022-025325 del 31 de agosto de 2022.</p>
Septiembre	<p>Aguachica – Cesar: Proyecto terminado en proceso de entrega -Obras terminadas al 100%, actualmente se atienden observaciones menores de calidad, realizadas por el prestador ESPA ESP SA y el Municipio de Aguachica – Cesar.</p> <p>En mesas de trabajo se solicitó al prestador, la suspensión del servicio por 24 horas para realizar últimos ajustes, el 14 de septiembre de 2022 se logró realizar dicho corte y se avanzó en el ajuste y atención de observaciones identificadas. Previamente se entregó informe técnico al municipio y al prestador, donde se informó que estos aspectos no afectan la estabilidad de obra, y se refieren a un ajuste y puesta a punto.</p> <p>El sector a través de comunicación con radicado No. E-2022-025730 del 23 de septiembre de 2022 remitió a la alcaldía municipal de Aguachica – Cesar el acta de entrega de la infraestructura con sus anexos (Acta de terminación, acta entrega y recibo del contrato de obra, planos récord, manual de mantenimiento y operación e informe técnico de atención a las observaciones técnicas realizadas el cual fue radicado en Fondo por la interventoría a través de comunicación con radicado No. R-2022-021234 del 21 de septiembre de 2022). Encontrándose pendiente la reparación del concreto ciclópeo en la zona de amortiguación de la bocatoma, sitio al que no se ha podido ingresar por creciente permanente del caudal de la quebrada Buturama. Es de resaltar que el sistema de acueducto se encuentra funcionando, suministrando agua al Municipio de Aguachica – Cesar. Respecto al comunicado anterior a la fecha no se ha recibido pronunciamiento del ente territorial</p> <p>De otro lado con el acompañamiento del profesional social del Fondo se está coordinando realizar el foro final del proyecto en la primera quincena del mes de octubre de 2022.</p>


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Cúcuta - Norte de Santander: El 14 de septiembre se recibe oficio del Municipio de San José Cúcuta con radicado 2022119000636441, en el cual manifiesta su posición de no proceder con el recibo de la infraestructura del proyecto de Canoítas (acueducto). Respecto a esto se proyecta oficio de respuesta, el cual se encuentra en revisión de la Subgerencia de proyectos y área jurídica de la secretaria general.</p> <p>El 23 de septiembre mediante correo electrónico se remitió a la interventoría y contratista de obra, la última versión del acta de liquidación, para su revisión y comentarios. El día 29 de septiembre de 2022 se recibió mediante correo electrónico el acta de liquidación con salvedades por parte del contratista Consorcio Cúcuta 2017.</p> <p>El 30 de septiembre de 2022 se realizaron ajustes al acta de liquidación por parte del equipo de liquidaciones y el Sector Acueducto, y se remitió con Salvedades por parte del equipo de liquidaciones al Equipo de Trabajo de Defensa Judicial, para revisión del pronunciamiento del Fondo a las salvedades del contratista.</p> <p>Dolores - Tolima: Mediante comunicado No. E-22022-025516 del 12/09/2022, se remitió al alcalde municipal el informe de reparaciones remitido por el contratista de obra y se solicitó agilizar el trámite de firma del acta de entrega de la infraestructura, dado que los compromisos de la visita del 03/08/2022 se encuentran cumplidos.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-025697 del 21/09/2022, se recuerda al alcalde municipal la necesidad de suscribir el acta de entrega de la infraestructura y de efectuar el acompañamiento a la comunidad para lograr la operación y mantenimiento del sistema de acueducto.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-025895 del 30/09/2022, se remitió al alcalde municipal el informe de interventoría respecto a las reparaciones efectuadas por el contratista y en el cual se evidencia que se cumplieron los compromisos asumidos en la visita de inspección del 03/08/2022, por lo tanto, se reitera la necesidad de suscribir el acta de entrega de la infraestructura.</p>
(AEB08)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	<p>Santa Lucía – Atlántico: En el mes de febrero del 2022 la Alcaldía de Santa Lucía remitió oficialmente al Fondo Adaptación el acta de entrega, firmada por parte del Fondo de Adaptación y recibo a satisfacción por el beneficiario, para el proyecto "Rehabilitación y adecuación del sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Santa Lucía – Departamento del Atlántico – Etapa 1", meta programada inicialmente para la vigencia 2023.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: Finalizando el mes de enero de 2022, se remitió oficio E-2022-000381 a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, con el fin de solicitar apoyo en el proceso de entrega y recibo de las obras de agua potable y saneamiento básico con el Municipio de Cúcuta. El 28 de febrero de 2022, se recibió comunicado de la Contraloría General de la República, en el cual informa al Fondo de Adaptación la necesidad de ampliar la comisión de seguimiento a la petición de apoyo para la entrega y recibo de las obras, debido a la complejidad de los asuntos a analizar.</p> <p>Cimitarra – Santander: Los días 9, 15 y 22 de febrero se adelantaron mesas técnicas, con el contratista de obra, la interventoría y el Fondo de Adaptación, encaminadas a concretar el planteamiento técnico de los ajustes de los diseños y cierre del presupuesto del proyecto. El 23 de febrero se adelantó mesa de trabajo virtual con la participación del contratista de obra, interventoría, Aseguradora solidaria SA y el</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	Fondo de Adaptación, en la cual se expuso las acciones adelantadas encaminadas a lograr la reactivación de las obras y estado actual del contrato. En dicha reunión se establecieron compromisos para la entrega de información técnica por parte del contratista, aprobación de la interventoría y demás trámites para la formalización de la modificación del contrato.
Marzo	<p>Cúcuta - Norte de Santander: El 4 de marzo de 2022 se recibieron del Municipio de Cúcuta, las observaciones al acta de entrega y recibo a satisfacción por el beneficiario, del proyecto "Rehabilitación colector margen derecha quebrada La Cañada en el municipio de Cúcuta", enviada por el Fondo Adaptación el 2 de septiembre de 2021.</p> <p>Mediante oficio E-2022-001125 del 7 de marzo, se remitió al Municipio el acta de entrega y recibo a satisfacción por el beneficiario, del proyecto "Rehabilitación colector margen derecha quebrada La Cañada en el municipio de Cúcuta" con los ajustes según las observaciones realizadas.</p>
Abril	<p>El 22 de abril de 2022 se adelantó mesa de trabajo entre la Secretaría General del Fondo Adaptación, Secretaría General y Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Cúcuta, con el fin de establecer los acuerdos para la suscripción del acta de entrega de infraestructura.</p> <p>Se continua a la espera del acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el Municipio de San José de Cúcuta, del proyecto "Rehabilitación colector margen derecha quebrada La Cañada en el municipio de Cúcuta", remitida por el Fondo mediante oficio E-2022-001125 del 7 de marzo de 2022, con los ajustes según las observaciones realizadas.</p>
Mayo	El 3 de mayo de 2022 se suscribió el Acta de entrega por parte del Fondo Adaptación y recibo a satisfacción por el beneficiario, para el proyecto "Rehabilitación Colector Margen Derecha Quebrada la Cañada en el Municipio de Cúcuta, Departamento Norte de Santander".
Junio	Meta del periodo cumplida.

SALUD

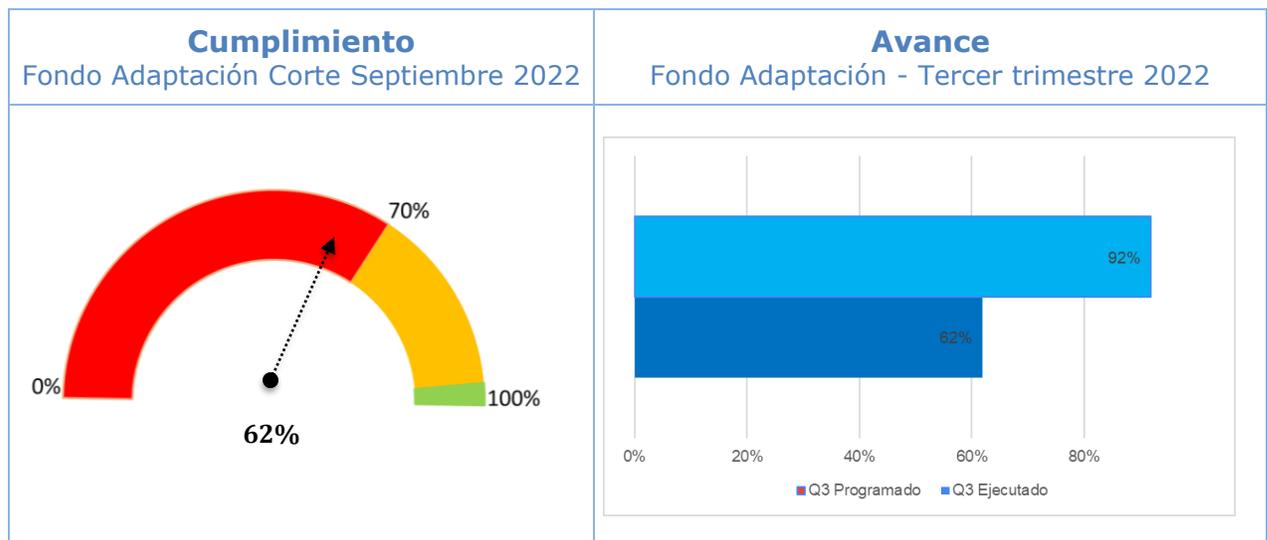

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022



Portafolio/Programa/Proyecto:
Gerente de Meta:

SALUD
Asesor Sector Salud

Objetivo Estratégico 2018-2022 #2

Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático

Acciones Estratégicas 2022
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)

Indicador

Meta
2022

Programación Trimestral
Meta Q1 Meta Q2 Meta Q3 Meta Q4

AVANCE
META

AEB09_Terminar obras de infraestructura de IPS	(AEB09)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	6	1	4	1	0	4
AEB10_Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AEB10) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	7	1	4	1	1	4

Mes	Avance Cualitativo
(AEB09)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	<p>Turbo – Antioquia: La ejecución de la obra esta en el 35% contra el 33% programado con una desviación positiva del 2%. La obra se está ejecutando sin inconvenientes, sin embargo, aun el predio no cuenta con los puntos de conexión a las redes de servicios públicos, actividad que está a cargo de la entidad territorial.</p> <p>Mahates – Bolívar: *Actualmente el proyecto esta en ejecución y tiene un 89.85%, con una avance positivo del 0.28%. Se está ejecutando sin inconvenientes, se adelantan actividades de remate, acabados e instalación de equipos, muebles y aparatos. Sin embargo sigue pendiente el pago de la ESE a Afinia, por un aproximado de \$590 millones de pesos, pago que debe realizarse antes de la terminación del proyecto (programada para mayo de 2022) para garantizar la electrificación del mismo).</p> <p>La Vega – Cauca: La obra se encuentra terminada, por condiciones de orden público no se ha podido realizar la verificación de la terminación de las No conformidades en el acta de terminación. Visita programada para marzo de 2022.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: *Actualmente se encuentra en ejecución con múltiples retrasos, se suscribió el pasado 23 de febrero de 2022 los otros 8 y 9 (obra e interventoría respectivamente) prorrogando nuevamente los dos contratos por 2 meses y con una adición del valor de esos dos meses al contrato de interventoría con cargo al contratista de obra, toda vez que los motivos de los retrasos continúan siendo atribuibles a él.</p> <p>*Las actividades principales que tienen rezagado el avance del proyecto que está en un 9% son eléctricas, instalación de muebles de carpintería y metálicos, y remates generales que impiden cerrar espacios. Diariamente se le remiten oficios al contratista solicitando el incremento de personal para cumplir con los compromisos.</p> <p>*Un punto importante que afectaría la entrega de la obra en el tiempo establecido (23 de mayo de 2022) sería que el ente certificador de RETIE, no de el certificado, pero para que lo emita las obras deben estar 100% terminadas. Se estima que el 25 de marzo esa visita de certificación se lleve a cabo.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Contrato suspendido. con un 85% de ejecución. Inicialmente, el proyecto requiere se incluya en su alcance las obras de la PTAR; indexar recursos al contrato de obra por ajuste de precios cambio de IVA; más tiempo de ejecución,</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Sin embargo, el contrato de obra no ha entregado desde oct de 2021 actualizadas las pólizas, por lo cual, el 2 de febrero se recibió la solicitud de cesión de la posición contractual por parte de la Unión temporal. En consecuencia, de lo anterior, es necesario resolver inicialmente la cesión contractual entre los contratistas y por ende obtener actualizadas las pólizas del contrato.</p> <p>En ese sentido se han adelantado mesas de trabajo, entre contratistas de obra e interventoría, aseguradora y Fondo Adaptación, para establecer la posición del Fondo, en la urgencia por actualizar las pólizas y poner en marcha el contrato. La aseguradora citará a contratistas para exigir documentos que le permitan actualizar las pólizas. Una vez subsanado lo anterior, se procederá con la modificación contractual que permita realizar la cesión de la posición contractual inclusión de PTAR, adición por indexación, y prórroga por 4.5 meses al contrato de obra.</p> <p>Guaranda – Sucre: La obra civil se encuentra terminada, pendiente por entregar. Debido a que la ESE tiene una deuda económica ante AFINIA, lo cual ha imposibilitado que esta empresa de energía autorice la energización. Se han adelantado mesas entre la ESE, ALCALDIA, AFINIA Y EL FONDO para lograr llegar a un acuerdo de pagos sin que a la fecha exista el mismo.</p> <p>Por otra parte, se radicó el 10 de feb 2022, solicitud de descarga de obras previas a la empresa de energía eléctrica de AFINIA para programar maniobra. A finia programó descarga para marzo de 2022. Otorgado este permiso y realizada la maniobra, el paso siguiente es la programación por parte de AFINIA de la energización para conectarse a la red pública.</p>
Marzo	<p>Turbo – Antioquia: Suspendida la obra desde el 24 de marzo, se realizó visita de campo el 17 y 18 de marzo, se realizaron comités de seguimiento cada semana los días martes. Remisión de comunicado a alcalde de Turbo y personería informando razones de suspensión.</p> <p>Mahates – Bolívar: Se suscribió acuerdo de transacción entre la ESE y AFINIA con la finalidad de garantizar el pago y de esta forma obtener la electrificación del proyecto para la fecha de entrega 27 de mayo de 2022.</p> <p>La Vega – Cauca: Durante el periodo se realizó visita de campo el 10 de marzo, remisión de informe de visita de campo al contratista, reunión virtual para observaciones encontradas en visita de campo y reunión presencial para avance en correcciones de observaciones o no conformidades.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Se realiza visita al proyecto para realizar seguimiento en campo, en miras a terminación para abril 2022.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Se realizaron reuniones presenciales y virtuales con la compañía aseguradora. Se realizó una nueva reunión, con los contratistas de obra e interventoría y Sector salud, en la que se informó que no se había recibido el documento de autorización de cesión. Se suscribió acta de ampliación 7 a suspensión 19 del contrato de obra. Con fecha prevista de reinicio el 19 de abril de 2022.</p> <p>Guaranda – Sucre: El 22 de marzo se realizó visita con el fin de notificar los pendientes para su recibo desde el punto de vista de obra blanca, carpintería entre otras. El proyecto cuenta con acta de terminación con pendientes, los cuales el contratista se comprometió a culminar el 22 de abril de 2022. Contando con que la energización sea programada por AFINIA en este periodo.</p>
Abril	<p>Turbo – Antioquia: El contrato se encuentra suspendido hasta el 04 de mayo de 2022 por condiciones negativas de orden público, se suspendió desde el 24 de marzo. Hasta la suspensión del contrato, se estaba ejecutando sin novedades y se encontraba con una desviación positiva de 2%. El contratista a través de gestiones sociales logró que le permitieran reanudar las obras el 5 de mayo de 2022. El Fondo</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>remitió comunicado a la alcaldía de Turbo indicando la situación del contrato y las razones de la suspensión.</p> <p>Mahates – Bolívar: Teniendo en cuenta el retraso que presenta la obra, aunque mínimo representativo, se solicitó al Contratista visita en obra para hacer seguimiento a los compromisos pactados en el acuerdo de transacción suscrito el 3/12/2021, él ratifica que entregará en los tiempos allí acordados. Se hizo reunión con Representantes Legales de contratistas el 25/04/2022.</p> <p>La Vega – Cauca: Se realizaron 3 mesas de trabajo con el contratista de obra e interventoría para coordinar procesos de entrega y verificación de productos necesarios para entregar las obras a la ESE. Se realizó la instalación de la dotación de la sede a fin de proceder con la entrega. se efectuó mesa de trabajo con la ESE y la Secretaria de Salud de Cauca. Se remitieron informes de no conformidades a la interventoría y contratista.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: El contratista continua aunando esfuerzos para lograr la terminación del proyecto, sin contar aún con el número de personal solicitado en campo, durante el mes de abril se le solicitó en varios comunicados que incrementara su personal. Se tramitó la prórroga 9 al proyecto por 16 días, modificando la fecha de terminación y entrega para el 9 de mayo y 9 de junio respectivamente.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: El 18 de abril de 2022, se suscribió acta de ampliación a la suspensión 19 del contrato de obra, teniendo en cuenta que para realizar la cesión de contrato a favor de JV ingeniería debe cumplir con la idoneidad técnica, jurídica y financiera establecida en los estudios previos. Sin embargo, revisada la información allegada no cumplía con el componente técnico. Por lo cual, se prorrogó la suspensión con fecha de reinicio 3 de mayo de 2022 y terminación el 7 de mayo de 2022. Se realizará la cesión de posición contractual inicialmente, y posterior otra modificación ya con el cesionario para incluir la actividad en el contrato de la PTAR, adicionar recursos y prorrogar por 4.5 meses el contrato 76 de 2015. Se prevé finalizar obras civiles en el cuarto trimestre de 2022.</p>
Mayo	<p>Turbo – Antioquia: Se reiniciaron las obras con normalidad, continúan las ejecuciones de las mismas y se realizaron los comités semanales de seguimiento programados, el contratista realizó a la interventoría solicitud de adición de obras no previstas las cuales se encuentran en revisión de esta.</p> <p>La Vega – Cauca: Se realizó mesa de trabajo con la subgerente de proyectos, el contratista, la interventoría, la gobernación del Cauca y la ESE para ver la corrección de las No conformidades para la habilitación de la sede hospitalaria. Se realizó informe de las no conformidades de la sede para corrección del contratista, se efectuó visita de campo del contratista, la interventoría y personal de la ESE para verificación de las correcciones de las no conformidades, se remitió oficio al interventor solicitando el estado de las no conformidades detectadas por la secretaria de salud del cauca para la habilitación del Hospital.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Se programa su entrega protocolaria en junio de 2022.</p> <p>Mahates – Bolívar: Teniendo en cuenta que hay actividades que aún no han sido culminadas por el contratista de Obra y por el Municipio, se tramitó prórroga al AC hasta el 24 de junio de 2022.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Se suscribió cesión contractual, actualmente suspendido y en proceso de prórroga.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Junio	<p>Guaranda – Sucre: Debido a situaciones de orden público, el contratista no pudo atender los pendientes a subsanar en la obra, por tal motivo se reprograma la entrega para el mes de junio.</p> <p>Turbo – Antioquia: Se continua ejecutando las obras sin problemas, se realizó reunión con la alcaldía para seguimiento de compromisos de ejecución de obras complementarias para las redes de servicios públicos, la alcaldía indica inicio de obras de redes de alcantarillado y agua en la primera semana de julio de 2022</p> <p>Mahates – Bolívar: Proyecto que se culminó en su fase de construcción, pero que debió ser suspendido el 23 de junio de 2022 hasta el 6 de julio del mismo año o hasta tanto no sean recibidos los certificados de RETIE y RETILAP para la energización definitiva por parte de AFINIA.</p> <p>La Vega – Cauca: Proyecto terminado en su etapa de construcción, sin embargo, en revisión conjunta con la ESE y la secretaría de Salud de Cauca se evidenciaron diferentes no conformidades para la habilitación del servicio, el contratista se encuentra en corrección de estas no conformidades con el propósito de entregar las obras en el tercer trimestre de 2022.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Terminado con pendientes desde el pasado 9 de mayo de 2022. No se ha podido suscribir el acta por problemas técnicos de las bombas que fueron retiradas del Hospital por garantía.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Durante el mes de junio se realizaron las actividades administrativas necesarias para la lograr la modificación del contrato de obra e interventoría, que permitieran su reinicio. Se suscribió el 23 de junio de 2022, acta de ampliación 2 a suspensión 20 del contrato de obra con fecha de reinicio el 1 de julio de 2022, teniendo en cuenta que se estaba pendiente por cumplir actividades preoperativas por parte del contratista. Adicionalmente se realizaron las gestiones y solicitudes necesarias para la actualización de la licencia de construcción con el municipio, la cual se entregó el 22 de junio de 2022.</p>
Julio	<p>La Vega – Cauca: Según lo programado, se suscribió acta de terminación y recibo de las obras del Hospital Nivel I de la Vega el 30 de junio de 2022. Proyecto localizado en el municipio de la Vega, departamento del Cauca.</p> <p>Turbo – Antioquia: Se continua con la ejecución de las obras, se realizó la mesa de trabajo con la alcaldía de Turbo para la revisión de los avances en los compromisos de las obras complementarias de los servicios públicos, sin embargo se evidencia que no se han iniciado las obras por parte del municipio.</p> <p>Se realizó mesa de trabajo con el municipio, la ESE y EPM para ver las condiciones actuales para la energización de la nueva infraestructura, se evidencia deuda de la ESE con EPM y se plantean alternativas para la energización definitiva</p> <p>Mahates – Bolívar: Proyecto suspendido hasta tanto AFINIA no energice de manera definitiva el proyecto. Las actividades están culminadas desde el pasado 23 de junio. Según compromiso de AFINIA la energización se hará el 6 de agosto de 2022, así las cosas, se debería reiniciar el 8 de agosto y terminar el 9 de agosto de 2022.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: El 1 de julio de 2022, se suscribió otrosí N° 10 del contrato 076 de 2015 por medio del cual, se incluyó la actividad de la PTAR al contrato; se adicionaron recursos por indexación y para la ejecución de la PTAR; así como también se amplió el plazo establecido del contrato de obra por 5.5 meses más. Por lo cual, la terminación de las obras se estableció para el 17 de diciembre de 2022. En ejecución.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Puerto Tejada – Cauca: Contrato VENCIDO. El proyecto culminó el pasado 8 de junio de 2022 y a la fecha continúa con pendientes, así las cosas, NO se ha podido entregar ni dar por terminado. El 25 de Julio de 2022 se remitió al área de incumplimientos del FA oficio para dar inicio a un presunto incumplimiento.</p>
Agosto	<p>Turbo – Antioquia: El contrato de obra e interventoría se suspendió por condiciones de orden público. El municipio no ha cumplido con la construcción de las redes de servicios públicos para acueducto y alcantarillado, con lo cual se evalúa la pertinencia de dar continuidad a las ejecuciones de las obras hasta tanto no se evidencie un verdadero compromiso por parte de la alcaldía para solucionar estos temas. Se está evaluando una prórroga por el término de 4 meses por afectaciones de orden público, dificultad de disponibilidad de materiales y mayores cantidades de obra.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Contratos en ejecución. Durante el mes de agosto el contratista presentó a la interventoría, los diseños de la PTAR para su revisión y visto bueno con el fin de avanzar con el permiso necesario para su construcción. Paralelamente se han desarrollado actividades de obra según los informes de interventoría, tales como, labores de estucos, construcción de mesones (bloque consulta externa y odontología), destronque de pisos, construcción de muro para rampa. Así mismo, se están adelantando actividades en cuanto a balance de las condiciones actuales del proyecto, se realiza verificación del estado de las obras, teniendo en cuenta que durante el tiempo suspendido se presentaron robos de algunos materiales y daños a infraestructura como lo es tejado y vidrios instalados que rompieron. Sin embargo, el avance no ha sido el esperado en el tiempo transcurrido por lo cual, se ha solicitado al contratista aumento tanto en la llegada de materiales como de personal para acoger actividades que se encuentran atrasadas. Visita del Fondo prevista para el 12 de septiembre de 2022.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Se suscribe acta de terminación por parte del contratista de obra e interventoría el 8 de agosto de 2022.</p> <p>Mahates – Bolívar: El proyecto se terminó el pasado 12 de agosto de 2022 y se recibió a satisfacción por parte de la Interventoría.</p>
Septiembre	<p>Turbo – Antioquia: Proyecto suspendido con el 66% de ejecución, se suspendió por la no ejecución de las obras a cargo del municipio concernientes a redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, así como por la solicitud del contratista de adición y prórroga por obras complementarias, para el cumplimiento de norma y mejor funcionamiento de la infraestructura hospitalaria.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: El avance de obra a corte del 24 de septiembre es de 73,87%, frente a un programado de 83,41%, con una desviación del 9.54%. En visita realizada y en informes de interventoría, se registran avances en la ejecución de construcción de mesones, instalación de cielos rasos, destroncado de pisos, instalación de enchapes, fabricación de carpintería de aluminio. Se observó presencia de poco personal en obra (13 personas), por lo cual se ha solicitado plan de contingencia e incremento de personal para nivelar el contrato. Por otra parte, fueron remitidos el 23 de septiembre a la alcaldía Municipal, la solicitud y diseños aprobados por la interventoría, con respecto al PTAR, con el fin que sea expedido el permiso y se incluya en la licencia de construcción actual. Por otra parte, el contratista no ha entregado el inventario del estado del contrato una vez se reinició el contrato afectando decisiones jurídicas y técnicas, toda vez que manifestó daños a obras ya ejecutadas y pérdidas de equipos que se encontraban en la obra y desaparecieron durante la suspensión del contrato. Esto podría afectar la fecha de terminación de las obras.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEB10) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	
Enero	Tibú – Norte de Santander: Se efectuó la suscripción del acta de entrega de la IPS Centro de Salud La Gabarra del municipio de Tibú, por parte del Fondo Adaptación y el alcalde del municipio.
Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	<p>Turbo – Antioquia: El proceso de contratación para la dotación se publicará en el transcurso del mes de abril de 2022.</p> <p>Mahates – Bolívar: El proceso de contratación para la dotación se publicará en el transcurso del mes de mayo de 2022.</p> <p>La Vega – Cauca: Dotación contratada y en proceso de entrega.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Contratos de dotación suscritos (9), y con acta de inicio del pasado 24 de febrero de 2022. A partir de esa fecha se tiene 5 meses para su terminación. Se tiene prevista dotación durante el mes de mayo de 2022. Se realiza visita al proyecto para realizar seguimiento en campo, en miras a terminación para abril 2022.</p>
Abril	<p>Puerto Tejada – Cauca: Todas las mejoras o solicitudes para cumplimiento de norma hechas por parte de la Ingeniera Biomédica del Fondo han sido atendidas, así las cosas se garantiza el producto a entregar. Respecto a la fecha de entrega la misma se modificó por la nueva solicitud de prórroga.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Una vez validado por la interventoría el cumplimiento del contrato, El Fondo realizará visita para validar que todo este al día y sin pendiente alguno para programar la entrega a beneficiario en el cuarto trimestre de 2022.</p> <p>Guaranda – Sucre: Una vez validado por la interventoría cada uno de los pendientes e informado su cumplimiento por interventoría, El Fondo realizará visita para validar que todo este al día y sin pendiente alguno para reprogramar la entrega a beneficiario en el segundo trimestre de 2022.</p>
Mayo	<p>La Vega – Cauca: Sede dotada en su totalidad, se realizó capacitación al personal indicado por la ESE.</p> <p>Turbo – Antioquia: Se llevo a cabo mesa de trabajo con el equipo de dotación, al cual el contratista le manifestó diferentes consultas con el fin de prever las instalaciones pertinentes para los equipos de dotación. Las profesionales del FONDO remitieron las respuestas a las consultas del contratista sobre equipos y redes.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Se programa su entrega protocolaria para junio de 2022.</p> <p>Mahates – Bolívar: Teniendo en cuenta que hay actividades que aún no han sido culminadas por el contratista de Obra y por el Municipio, se tramitó prórroga al AC hasta el 24 de junio de 2022.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Se suscribió cesión contractual, actualmente suspendido y en proceso de prórroga.</p> <p>Guaranda – Sucre: Debido a situaciones de orden público, el contratista no pudo atender los pendientes a subsanar en la obra, por tal motivo se reprograma la entrega para el mes de junio.</p>
Junio	Turbo – Antioquia: La obra avanza sin mayores inconvenientes con 52% de avance físico ejecutado.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
	<p>La Vega – Cauca: Proyecto terminado en su etapa de construcción, sin embargo, en revisión conjunta con la ESE y la secretaría de Salud de Cauca se evidenciaron diferentes no conformidades para la habilitación del servicio, el contratista se encuentra en corrección de estas no conformidades con el propósito de entregar las obras en el tercer trimestre de 2022.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Terminado con pendientes desde el pasado 9 de mayo de 2022. No se ha podido suscribir el acta por problemas técnicos de las bombas que fueron retiradas del Hospital por garantía. Hasta no superar los pendientes que permitan la suscripción de acta de terminación no se podrá gestionar la entrega.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: De conformidad con la solicitud de modificación del contrato de obra, se tiene previsto culminar las actividades inherentes a dicho contrato el 17 de diciembre de 2022. Se planificará en el mes de julio con los contratistas tanto de obra como de dotación el ingreso para establecer una fecha de entrega que incluya la dotación.</p> <p>Guaranda – Sucre: El 27 de mayo de 2022, se suscribieron las actas de entrega y recibo final de las obras, entre contratista de obra, interventoría y Fondo dado que se atendieron todos los pendientes. Mediante acta de entrega por parte del Fondo Adaptación y recibo a satisfacción por el beneficiario, se entrega la obra al Municipio de Guaranda y la Gerencia de la ESE el pasado 4 de junio de 2022.</p>
Julio	<p>Turbo – Antioquia: Se continua con la ejecución de las obras, se realizó la mesa de trabajo con la alcaldía de Turbo para la revisión de los avances en los compromisos de las obras complementarias de los servicios públicos, sin embargo se evidencia que no se han iniciado las obras por parte del municipio.</p> <p>Se realizó mesa de trabajo con el municipio, la ESE y EPM para ver las condiciones actuales para la energización de la nueva infraestructura, se evidencia deuda de la ESE con EPM y se plantean alternativas para la energización definitiva</p> <p>Magüi Payan – Nariño: De conformidad con el plazo establecido en el otro sí 10 del contrato de obra suscrito el 1 de julio de 2022, la terminación de las obras se estableció para el 17 de diciembre de 2022. Paralelamente se realizará la dotación de la IPS. Una vez superadas estas dos situaciones se programará la fecha de la entrega al Municipio y la ESE de Magui Payan.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Contrato VENCIDO. El proyecto culminó el pasado 8 de junio de 2022 y a la fecha continua con pendientes, así las cosas, NO se ha podido entregar ni dar por terminado. el 25 de Julio de 2022 se remitió al área de incumplimientos del FA oficio para dar inicio a un presunto incumplimiento.</p> <p>Mahates – Bolívar: Proyecto suspendido hasta tanto AFINIA no energice de manera definitiva el proyecto. Las actividades están culminadas desde el pasado 23 de junio. Según compromiso de AFINIA la energización se hará el 6 de agosto de 2022, así las cosas, se debería reiniciar el 8 de agosto y terminar el 9 de agosto de 2022.</p> <p>La Vega – Cauca: El 26 de julio de 2022, se efectuó la entrega del proyecto Hospital Niel I de la Vega a la Gobernación del Cauca y la Gerencia de la empresa social del Estado suroriente E.S.E Cauca, en el municipio de la Vega, departamento del Cauca.</p>
Agosto	<p>Turbo – Antioquia: El contrato de obra e interventoría se suspendió por condiciones de orden público. El municipio no ha cumplido con la construcción de las redes de servicios públicos para acueducto y alcantarillado, con lo cual se evalúa la pertinencia de dar continuidad a las ejecuciones de las obras hasta tanto no se evidencie un verdadero compromiso por parte de la alcaldía para solucionar estos temas. Se está evaluando una prórroga por el término de 4 meses por afectaciones de orden público, dificultad de disponibilidad de materiales y mayores cantidades de obra.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Magüi Payan – Nariño: La entrega de la IPS se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2022, teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato de obra 076 de 2015, que corresponde al 17 de diciembre de 2022. Se encuentra en coordinación las actividades de obra con los contratos de dotación con el fin de terminar ambas actividades en el mismo momento.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: El proyecto se terminó a satisfacción el 8 de agosto de 2022 y el Fondo Adaptación le hizo entrega a la Gobernación del Cauca y la gerente de la ESE el 12 de Agosto del año en curso, en el municipio de puerto Tejada, Departamento del Cauca.</p> <p>Mahates – Bolívar: La entrega del proyecto se efectuara hasta que se cumpla con el 100% de la dotación del equipo Biomédico a sitio, el cual se estima su llegada durante la última semana de septiembre y la primera de octubre de 2022.</p>
Septiembre	<p>Turbo – Antioquia: Proyecto suspendido con el 66% de ejecución, se suspendió por la no ejecución de las obras a cargo del municipio concernientes a redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, así como por la solicitud del contratista de adición y prórroga por obras complementarias, para el cumplimiento de norma y mejor funcionamiento de la infraestructura hospitalaria.</p> <p>Mahates – Bolívar: Proyecto terminado el pasado 12 de agosto de 2022. Actualmente se adelantan reparaciones de Postventas por parte del Contratista de obra.</p> <p>Gran parte del mobiliario de Dotación llegó al hospital durante la semana del 15 al 23 de septiembre, se adelantó el recibo por parte de la ESE y se hicieron las capacitaciones al personal cualificado y que consideró viable por la Gerencia de la ESE.</p> <p>Los contratos se encuentran en proceso de gestionar la Liquidación.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Teniendo en cuenta el estado de las obras, se han ampliado las suspensiones de los contratos de dotación de la IPS de MAGUI, ya que en la visita realizada el 12 de septiembre, también se realizaron algunas solicitudes por parte del equipo biomédico y contratistas, para la instalación de algunos equipos y para la habilitación de la IPS.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

VIVIENDA

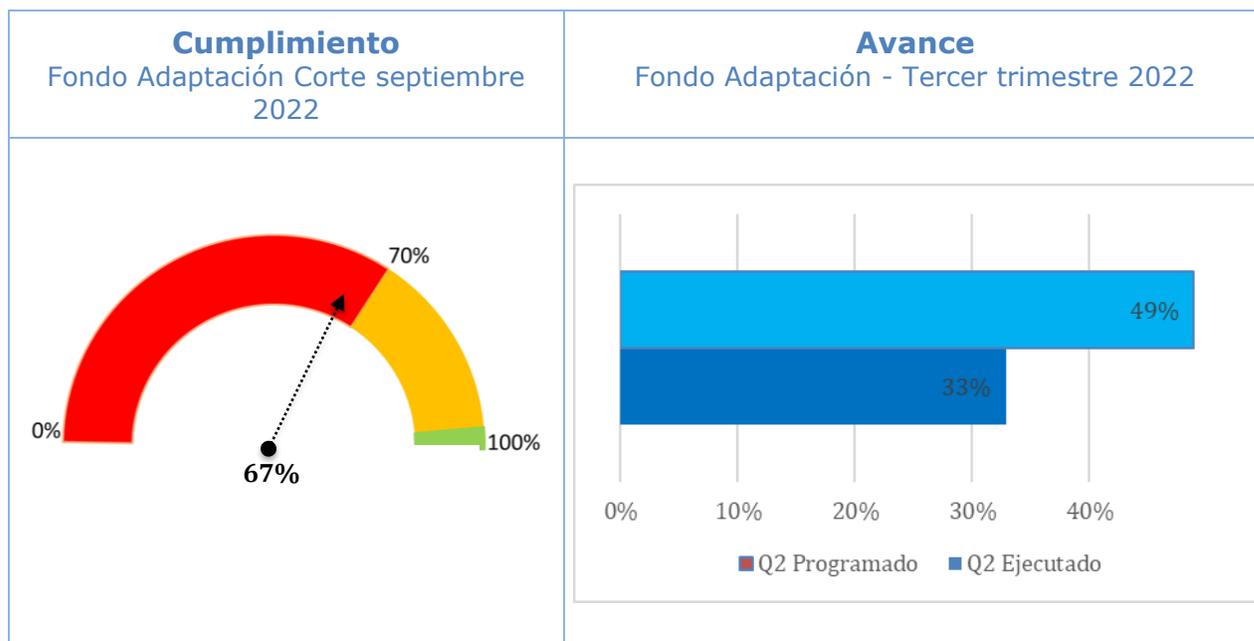

Portafolio/Programa/Proyecto: **VIVIENDA**
 Gerente de Meta: Asesor Sector Vivienda

Objetivo Estratégico 2018-2022 #2

Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA26_Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEA26)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	484	279	-	205	-	359
AEA27_Terminar soluciones de vivienda	(AEA27)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	3687	139	570	1179	1799	958*
AEA28_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEA28)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	3570	211	644	540	2175	1212*

*Incluye las terminaciones y entregas derivadas de los procesos conciliatorios con los operadores zonales.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEA26)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	
Enero	<p>El sector Vivienda en el mes de enero suscribió 8 contratos para un total de 277 VIP contratadas, superando en una (1) vivienda la meta definida para el periodo. Las soluciones de vivienda contratadas se dividen así:</p> <p>FA-CD-I-S-175-2022 Antioquia Valparaiso 10 FA-CD-I-S-170-2022 Antioquia La Pintada 6 FA-CD-I-S-172-2022 Atlántico Soledad 60 FA-CD-I-S-178-2022 Bolívar San Pablo 61 FA-CD-I-S-177-2022 Cauca Popayán 100 FA-CD-I-S-161-2022 Tolima Casabianca 19 FA-CD-I-S-167-2022 Tolima Ortega 20 FA-CD-I-S-176-2022 Valle Del Cauca Bugalagrande 1</p> <p>Estos contratos representan la futura entrega en 6 departamentos diferentes de 277 soluciones de vivienda a las familias afectadas por la ola invernal.</p>
Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	No existe reporte para el periodo
Abril	Meta del periodo cumplida.
Mayo	Meta del periodo cumplida.
Junio	Meta del periodo cumplida.
Julio	No existe reporte para el periodo
Agosto	<p>El sector vivienda reportaron dos adiciones a los siguientes contratos:</p> <p>FA-CD-I-S-232-2021 en Sabanalarga Atlántico por 10 viviendas FA-CD-I-S-230-2020 en Caucasia Antioquia por 15 viviendas</p>
Septiembre	<p>En el mes de septiembre se realizó la suscripción del contrato de compraventa no. 238 de 2022 con el contratista TAYKA COLOMBIA SAS con NIT: 814007224-8 para la adquisición de 47 VIP en el municipio de San Lorenzo, Nariño, con lo cual se espera beneficiar a este número de familias en esta región del país, mejorando así sus condiciones de vida y generando un gran impacto social.</p> <p>Adicionalmente, el sector vivienda reportó una adición al siguiente contrato:</p> <p>FA-CD-I-S-227-2021 en Fundación Magdalena por 5 viviendas</p>
(AEA26)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	
Enero	<p>En el mes de enero se lograron terminar los trámites documentales necesarios para el reporte de 9 viviendas nuevas terminadas, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Departamento de Antioquia, municipio de Vigía del Fuerte, 2 VIP Departamento de Sucre, municipio de San Marcos, 4 VIP Departamento de Nariño, municipio de Peñol, 3 VIP.</p> <p>Del plan inicialmente trazado, no se pudieron reportar 10 viviendas más en el municipio de San Pablo Nariño, cuyas obras se encuentran totalmente terminadas, pero que, por demoras en la definición del suministro de acueducto por parte del municipio, no se pudieron conectar al sistema. Sobre este particular el sector continuo las gestiones para tener una solución.</p>
Febrero	<p>En el mes de febrero el sector Vivienda reportó la terminación de 77 nuevas viviendas, para un acumulado en los dos primeros meses del año de 86 viviendas terminadas. La distribución de estas 77 VIP por departamentos es la siguiente: 21 en Nariño, 1 en César, 35 en Sucre, 1 en Valle del Cauca y 19 en la Guajira. Así, se continúa con un avance muy importante para beneficiar a la población damnificada por la ola invernal, sin embargo, los efectos del fuerte invierno y problemas de orden público han generado rezagos con respecto a la meta por municipio inicialmente definida, los cuales se tienen contemplados, con base en las gestiones realizadas, ir solucionando en el transcurso del trimestre.</p>
Marzo	<p>Las gestiones permanentes adelantadas por el sector permitieron la terminación de 39 y entrega de 35 viviendas en el municipio de Zaragoza, la cual inicialmente se tenía planeada para el mes de diciembre del año en curso, beneficiando de manera anticipada a todas estas familias afectadas por la ola invernal. En el mes de marzo se dio la energización de las viviendas construidas por el Fondo Adaptación con lo cual se logró el reporte de terminación de las mismas.</p>
Abril	<p>Se realizó el reporte de 10 VIP terminadas en el municipio de San Pablo, departamento de Nariño las cuales tienen ya registro de habitabilidad, proceso que se rezagó en espera de la energización por parte del ente territorial. Se continúan los trámites respectivos para el reporte de entrega de las mismas.</p> <p>Con 21 nuevas VIP terminadas y entregadas en el municipio de Soledad, Atlántico, se completan 60 VIPs en este municipio, beneficiando así a la población afectada por la ola invernal.</p> <p>En el municipio de La Cruz, Nariño, las gestiones del FA y las labores realizadas por el contratista, han permitido el reporte de manera anticipado con respecto a la planeación inicial, de 22 nuevas Viviendas terminadas en este municipio, beneficiando así a la comunidad afectada por la fuerte ola invernal, mejorando su calidad de vida.</p>
Mayo	<p>En el mes de mayo se dio el reporte de 2 nuevas viviendas terminadas, con base en el cumplimiento de los documentos requeridos.</p> <p>Con base en las revisiones de soportes y documentos en el mes de mayo se dio el reporte de la terminación de las viviendas asociadas en el municipio de Manaure en el departamento de La Guajira.</p> <p>Con base en las validaciones documentales y revisión de soportes se dio el reporte de la terminación de 3 viviendas nuevas en el municipio de Uribia, en el departamento de la Guajira.</p> <p>Se realizó el reporte de la terminación de 3 viviendas en el municipio de Hatillo de Loba en el departamento de Bolívar.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Derivados de las gestiones realizadas en los últimos meses se realizó el reporte de la terminación de 54 viviendas nuevas en el municipio de La Cruz, en el departamento de Nariño</p> <p>En el mes de mayo se realizó el reporte de la terminación de 20 viviendas nuevas en el municipio de Linares, en el departamento de Nariño.</p> <p>En el mes de mayo se realizó el reporte de la terminación de 32 viviendas en el municipio de Tamalameque, en el departamento del Cesar.</p> <p>Gracias a las gestiones realizadas se realizó el reporte en el mes de mayo de la terminación de 5 viviendas en el municipio de Zaragoza, departamento de Antioquia.</p>
Junio	<p>Con el reporte de la terminación de 14 VIP, el sector completa 50 en el municipio de La Cruz bajo, beneficiando así a la población damnificada por la ola invernal</p> <p>Con el reporte de La Guaca Santander se cumple la terminación de las 12 VIP contratadas para ejecución, beneficiando así a la población afectada por la ola invernal en ese municipio.</p>
Julio	<p>El Fondo Adaptación adelantó las gestiones pertinentes que permitieron la terminación, entrega y reporte de las 20 VIP desarrolladas en el marco del contrato asociado en el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda. Este proyecto beneficia a igual número de familias, mejorando sus condiciones de vida e impactando profundamente en su bienestar familiar, así seguimos cumpliendo a la población vulnerable y afectada del país.</p> <p>En el mes de julio gracias a las gestiones adelantadas por el Fondo Adaptación se logró la terminación, entrega y reporte de 6 VIP en el municipio de Fundación, departamento del Magdalena, con lo cual se impacta de manera directa la calidad y condiciones de vida del mismo número de familias en dicho municipio.</p> <p>En el mes de Julio el sector Vivienda realizó la terminación, entrega y reporte de 120 VIP en el municipio de Achí, beneficiando a igual número de familias en el municipio e impactando de manera real y positiva, sus condiciones de vida y su bienestar en general.</p> <p>En el mes de Julio el sector vivienda logró posterior a las gestiones realizadas en los últimos meses, consolidar los trámites y actividades necesarios para finalmente poder reportar la terminación de 151 VIP en este municipio, proyecto de gran envergadura que beneficia a igual número de familias y mejora de manera dramática sus condiciones de vida.</p> <p>El sector vivienda en el mes de julio a través de las permanentes gestiones realizadas logró la terminación, entrega y reporte de 30 VIP en el municipio de Sabanalarga, departamento del Atlántico, beneficiando a igual número de familias y contribuyendo así a mejorar sus condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo y bienestar de los más vulnerables y damnificados de la ola invernal.</p>
Agosto	<p>En el mes de agosto, las gestiones adelantadas por el equipo de trabajo del sector Vivienda permitieron el reporte de la terminación y entrega de las 14 VIP contempladas contractualmente en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander. Así se impacta de manera positiva la calidad de vida de igual número de familias, que en su momento se vieron afectadas por la ola invernal, pero que ahora, gracias al gobierno nacional a través del Fondo Adaptación, tienen una nueva oportunidad.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Septiembre	<p>Con la terminación y entrega en el mes de septiembre de 50 VIP en el municipio de Sabanalarga, departamento del Atlántico, se llega a un total de 80 VIP terminadas y entregadas en el marco del contrato 232 de 2021, con lo cual se beneficia a igual número de familias de esta zona, impactando positivamente su calidad de vida y mejorando las condiciones sociales de la región.</p> <p>Con la terminación y entrega en el mes de septiembre de 32 VIP en el municipio de Ospina, departamento de Nariño en el marco del contrato 098 de 2019, se benefician a igual número de familias damnificadas por el fenómeno la niña 2020-2011 en esta zona, impactando positivamente su calidad de vida y mejorando las condiciones sociales de la región.</p> <p>En el mes de septiembre se reportó la terminación 26 VIP en el municipio de Matanza, departamento de Santander en el marco del contrato 080 de 2019, con lo que se beneficia a igual número de familias damnificadas por el fenómeno la niña 2020-2011 en esta zona, impactando positivamente su calidad de vida y mejorando las condiciones sociales de la región.</p>
(AEA28)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	
Enero	<p>El sector vivienda continua las gestiones permanentes para lograr entregar la mayor cantidad de Viviendas a las familias afectadas por la ola invernal. Así, en el mes de enero, gracias al seguimiento realizado se materializó la entrega de 80 nuevas viviendas en diferentes zonas del país, a saber:</p> <p>Antioquia Vigia Del Fuerte 10 Sucre San Marcos 4 Atlántico Campo De La Cruz 1 Cauca Purace 9 Nariño Peñol 39 Nariño Imues 17</p> <p>Este resultado supera la meta proyectada para este mes y permite anticipar las entregas planeadas para meses futuros.</p>
Febrero	<p>En el mes de febrero el sector Vivienda reportó la Entrega de 23 nuevas viviendas, para un acumulado en los dos primeros meses del año de 103 viviendas nuevas entregadas a la población afectada a lo largo del país. La distribución de estas 23 VIP por departamentos fue así: 1 en Nariño, 1 en Cesar, 1 en Valle del Cauca, 1 en Magdalena y 19 en la Guajira.</p> <p>El invierno que se ha presentado en el país y problemas de orden público aislados han afectado la normalidad del desarrollo de algunos contratos generando una desviación negativa en el avance de las obras y los trámites de escrituración, con lo cual existe un rezago en el avance acumulado con respecto a la meta inicial que se proyecta con base en las gestiones realizadas solucionar en los próximos meses.</p>
Marzo	<p>Las gestiones permanentes adelantadas por el sector permitieron la terminación de 39 y entrega de 35 viviendas en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico; asimismo, se logró no solo la terminación, sino también la entrega de 19 VIP a igual número de familias afectadas en el municipio de Zaragoza.</p> <p>En Málaga – Santander, la energización de las viviendas terminadas por el Fondo Adaptación permitió la entrega a la comunidad de 20 nuevas VIP para beneficiar a la población afectada por la ola invernal.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>En el mes de marzo se dio la entrega de 19 VIP en el municipio de Colón, Nariño y se continúan las gestiones con el ente territorial quien tiene a cargo el descole del servicio de alcantarillado de 11 VIP restantes, trámite necesario para proceder al reporte de terminación y entrega definitiva a la comunidad.</p> <p>Adicionalmente, se realizó la entrega de 33 VIP a la comunidad afectada por la ola invernal del municipio de Caimito, en el departamento de Sucre. Con este avance, queda pendiente el reporte de la entrega de 2 VIP ya terminadas, para finalizar así la meta establecida en este municipio.</p>
Abril	<p>En el mes de abril se realizó el reporte de la entrega de 26 nuevas VIP en el municipio de Corinto, departamento del Cauca en el marco del contrato 2016-C-0178, beneficiando así al mismo número de familias en este municipio. En este contrato ya se han entregado 140 viviendas repartidas en los departamentos de Cauca y Nariño.</p> <p>Con el reporte de las 2 viviendas entregadas en el municipio de Caimito, departamento de Sucre, se completa el total de las 35 VIP planeadas en el marco del contrato 2016-C-0188 para entregar a esta comunidad, dando cumplimiento al plan definido para la presente vigencia y beneficiando a la comunidad damnificada.</p> <p>El reporte de 21 nuevas VIP entregadas en el municipio de Soledad Atlántico permiten beneficiar a más de 56 familias del departamento.</p> <p>La entrega de 22 VIP en el municipio de la Cruz - Nariño, representa una oportunidad de mejorar la calidad de vida de igual número de familias beneficiadas. Las buenas gestiones del FA permitieron adelantar la entrega planeada inicialmente para el mes de junio del presente año.</p>
Mayo	<p>Con el reporte de la entrega de 9 vip en el municipio de Puracé, departamento de Cauca, el FA llega a 18 viviendas nuevas en este municipio en el marco de este proyecto.</p> <p>En el marco del proyecto Peños – Nariño, con la entrega de 1 VIP nueva, se llega a un total de 41 soluciones de vivienda entregadas.</p> <p>En el marco del proyecto en Lórica – Córdoba, con la entrega de 2 VIPs nuevas, se llega a un total de 279 soluciones de vivienda entregadas en el municipio de Lórica, de las cuales disfrutaban igual número de familias vulnerables y que en su momento fueron afectadas por la ola invernal, pero ahora se encuentran en mejores condiciones de vida.</p> <p>En el marco del proyecto de Ayapel – Córdoba, con la entrega de 1 VIP nueva, se llega a un total de 166 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p> <p>En el marco del proyecto en Dibulla – La Guajira, se entregaron 18 VIPs nuevas en el municipio.</p> <p>En el marco del proyecto en Manaure – La Guajira, con la entrega de 8 VIPs nuevas, se llega a un total de 46 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p> <p>En el marco del proyecto en Maicao – La Guajira, con la entrega de 13 VIPs nuevas, se llega a un total de 29 soluciones de vivienda entregadas en el municipio de Maicao, de las cuales disfrutaban igual número de familias vulnerables y que en su momento fueron afectadas por la ola invernal, pero ahora cuentan con mejores condiciones de vida.</p> <p>En el marco del proyecto en Uribia - La Guajira, con la entrega de 3 VIPs nuevas, se llega a un total de 118 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Hatillo de Loba – Bolívar: En el marco de este proyecto y gracias a las gestiones adelantadas desde el FA, con la entrega de 9 VIPs nuevas, se llega a un total de 261 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p> <p>Se entregaron 54 VIPs nuevas en el municipio de La Cruz, de las cuales disfrutaban igual número de familias.</p> <p>En el marco del proyecto en Linares – Nariño, con la entrega de 20 VIPs nuevas, se llega a un total de 37 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p> <p>Soledad – Atlántico: Con la entrega de 3 VIPs nuevas, se llega a un total de 59 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p> <p>Con la entrega de 32 VIPs nuevas, se llega a un total de 68 soluciones de vivienda entregadas en el municipio de Tamalameque en Cesar, de las cuales disfrutaban igual número de familias vulnerables y que en su momento fueron afectadas por la ola invernal.</p> <p>Con la entrega de 5 VIPs nuevas, se llega a un total de 24 soluciones de vivienda entregadas en el municipio de Zaragoza – Antioquia.</p>
Junio	<p>El Fondo Adaptación completa 60 VIP entregadas en Soledad – Atlántico, cumpliéndole así al país y al departamento.</p> <p>El departamento de Nariño ha sido afectado por la ola invernal de manera constante, la entrega de 14 nuevas VIP por parte del Fondo Adaptación, permite completar solo en este contrato, 50 VIP entregadas a igual número de familias, que ven como su calidad de vida mejora gracias a las acciones realizadas por la entidad.</p> <p>El Fondo Adaptación ha entregado 12 nuevas VIP a familias afectadas por la ola invernal en el municipio de Guaca - Santander, permitiendo mejorar la calidad de vida de igual número de familias.</p> <p>Es importante tener en cuenta que el consolidado de terminaciones y entregas del primer semestre del año 2022, incluye el registro de 86 terminaciones y 196 entregas logradas como resultado del cierre de los planes de intervención con los operadores zonales. A pesar de que los contratos suscritos con los operadores zonales están inmersos en demandas judiciales, se han venido adelantando acuerdos conciliatorios, para que se avance con unidades habitacionales que cumplan con las condiciones de haber sido terminadas, entregadas y legalizadas, bajo la modalidad de reubicación y reconstrucción.</p> <p>En este sentido se registran en la base de datos de entregas, las viviendas con operadores zonales que se entienden como legalizadas al cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escritura pública y certificado de tradición (Para la modalidad de reubicación) • Inscripción en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (para la modalidad de reconstrucción)
Julio	<p>El sector Vivienda del Fondo Adaptación realizó la entrega de 20 VIP en el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda, en lo que representa un logro más de la entidad y la satisfacción de beneficiar a igual número de familias damnificadas, con una nueva vivienda adaptada al cambio climático que mejora sus condiciones de vida e impacta en la calidad de la misma.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>El sector Vivienda del Fondo Adaptación realizó la entrega de 6 VIP en el municipio de Fundación, departamento de Magdalena, en lo que representa un logro más de la entidad y la satisfacción de beneficiar a igual número de familias damnificadas, con una nueva vivienda adaptada al cambio climático que mejora sus condiciones de vida e impacta en la calidad de la misma.</p> <p>El sector Vivienda del Fondo Adaptación realizó la entrega de 120 VIP en el municipio de Achí, departamento de Bolívar, en lo que representa un logro más de la entidad y la satisfacción de beneficiar a igual número de familias damnificadas, con una nueva vivienda adaptada al cambio climático que mejora sus condiciones de vida e impacta en la calidad de la misma.</p> <p>El sector Vivienda del Fondo Adaptación realizó la entrega de 144 VIP en el municipio de Tenerife, departamento de Magdalena, en lo que representa un logro más de la entidad y la satisfacción de beneficiar a igual número de familias damnificadas, con una nueva vivienda adaptada al cambio climático que mejora sus condiciones de vida e impacta en la calidad de la misma.</p> <p>El sector Vivienda del Fondo Adaptación realizó la entrega de 30 VIP en el municipio de Sabanalarga, departamento de Atlántico, en lo que representa un logro más de la entidad y la satisfacción de beneficiar a igual número de familias damnificadas, con una nueva vivienda adaptada al cambio climático que mejora sus condiciones de vida e impacta en la calidad de la misma.</p>
Agosto	<p>Gracias a las gestiones adelantadas desde los diferentes equipos del sector Vivienda, se logró la entrega de las 11 VIP restantes del municipio de Colón, departamento de Nariño, con lo cual se llega al total de 30 nuevas soluciones de vivienda que permiten mejorar las condiciones de vida de igual número de familias afectadas por la ola invernal.</p> <p>En el mes de agosto, las gestiones adelantadas por el equipo de trabajo del sector Vivienda permitieron el reporte de la terminación y entrega de las 14 VIP contempladas contractualmente en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander. Así se impacta de manera positiva la calidad de vida de igual número de familias, que en su momento se vieron afectadas por la ola invernal, pero que ahora, gracias al gobierno nacional a través del Fondo Adaptación, tienen una nueva oportunidad.</p> <p>En el mes agosto se realizó el reporte final de la entrega de 1 VIP en el municipio de Puracé, departamento del Cauca, con lo cual el sector Vivienda en el marco del contrato 178 de 2016, llegó a 19 VIP entregadas en el municipio beneficiando a igual número de familias de la región.</p> <p>En el mes de agosto el sector Vivienda gracias a las gestiones de sus diferentes equipos de trabajo realizó la entrega de 7 VIP en el municipio de Tenerife, departamento de Magdalena, para llegar a un total de 304 VIP entregadas en este municipio en el marco del contrato 213 de 2016, mejorando significativamente la calidad de vida de sus habitantes y de todas estas familias afectada por la ola invernal.</p>
Septiembre	<p>Con la terminación y entrega en el mes de septiembre de 50 VIP en el municipio de Sabanalarga, departamento del Atlántico, se llega a un total de 80 VIP terminadas y entregadas en el marco del contrato 232 de 2021, con lo cual se beneficia a igual número de familias de esta zona, impactando positivamente su calidad de vida y mejorando las condiciones sociales de la región.</p> <p>Con la terminación y entrega en el mes de septiembre de 32 VIP en el municipio de Ospina, departamento de Nariño en el marco del contrato 098 de 2019, se benefician</p>


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>a igual número de familias damnificadas por el fenómeno la niña 2020-2011 en esta zona, impactando positivamente su calidad de vida y mejorando las condiciones sociales de la región.</p> <p>Con la entrega en el mes de septiembre de 25 VIP en el municipio de Matanza, departamento de Santander en el marco del contrato 080 de 2019, se benefician a igual número de familias damnificadas por el fenómeno la niña 2020-2011 en esta zona, impactando positivamente su calidad de vida y mejorando las condiciones sociales de la región.</p>

Seguimiento al Plan de Acción regionalizado y por Subgerencia

Subgerencia de Riesgos

La Subgerencia de Riesgos, adicional al macroproyecto La Mojana, Canal del Dique y Río Fonce, lidera la ejecución de proyectos y de soluciones de vivienda en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca.

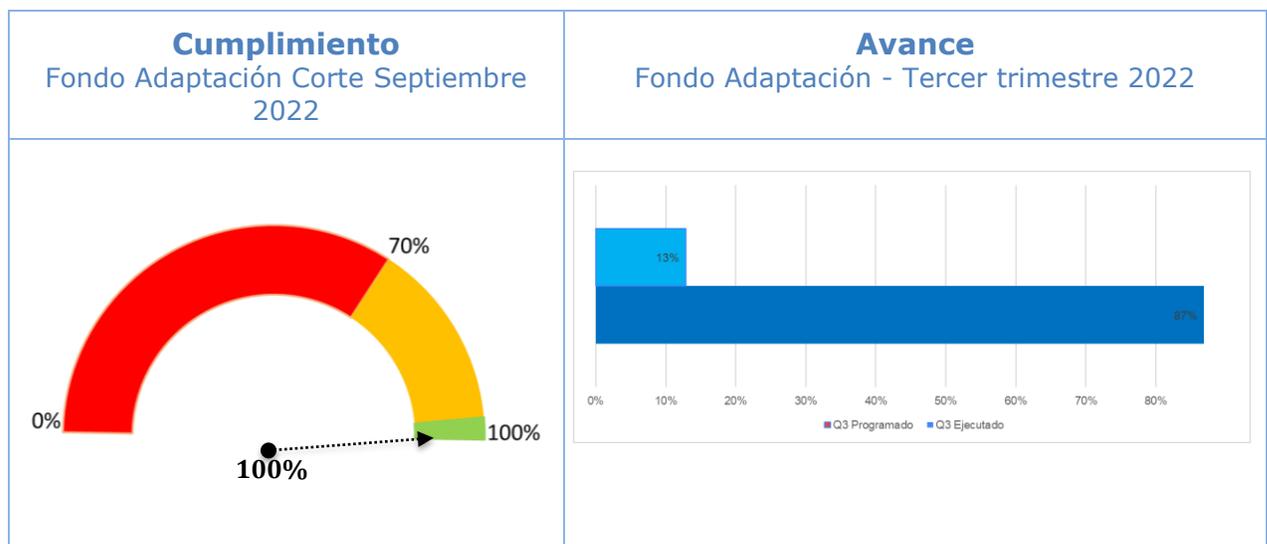

Las metas en términos de intervenciones en cada uno de los departamentos que lidera esta Subgerencia en contratación, terminación y entrega son las siguientes:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Proyectos

Departamento	Fase	Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Atlántico	Contratar						N.A.
	Terminar	3		2		1	0
	Entregar	2			2		1*
Bolívar	Contratar	2		1	1		1
	Terminar	5	2	2	1		5
	Entregar	8		5	3		2
Nariño	Contratar						N.A.
	Terminar	1		1			0
	Entregar	2		1	1		1
Sucre	Contratar	1	1				1
	Terminar	6	1	1	4		2
	Entregar	6		1	2	3	2
TOTAL	Contratar	3	1	1	1	0	2
	Terminar	15	3	6	5	1	7
	Entregar	18	0	7	8	3	6

*Meta adelantada del 2023 correspondiente a la entrega formal del Alcantarillado de Santa Lucía- Atlántico.

Durante el tercer trimestre se logró la entrega de centro educativo de Regencia ubicado en Montecristo – Bolívar y del acueducto de Samaniego – Nariño, así mismo para el Macroproyecto de la Mojana se terminaron y entregaron los diseños de obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar).

Soluciones de Vivienda

Departamento		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Atlántico	Contratar	60	60				70
	Terminar	130				130	145
	Entregar	131	1			130	208
Bolívar	Contratar	78	61		17	0	61
	Terminar	491			1	490	137
	Entregar	497				497	143
Córdoba	Contratar						N.A.
	Terminar						N.A.
	Entregar	3	2			1	3
Nariño	Contratar	58			58		47


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

	Terminar	525	45	327	105	48	224
	Entregar	616	126	337	105	48	331
Sucre	Contratar						N.A.
	Terminar	648	39		280	329	39
	Entregar	378	39		280	59	39
Valle del Cauca	Contratar	1			1		1
	Terminar	1				1	1
	Entregar	1				1	1
TOTAL	Contratar	197	121		76		179
	Terminar	1795	84	327	386	998	546
	Entregar	1626	168	337	385	736	725

En relación con las soluciones de vivienda, en el tercer trimestre de la vigencia se terminaron 246 y entregaron 257 inmuebles ubicados en 5 municipios de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Nariño.

Subgerencia de Proyectos

La Subgerencia de Proyectos lidera las gestiones asociadas a la ejecución de proyectos y de soluciones de vivienda en los departamentos de Antioquia, Arauca, Casanare, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Santander, Norte de Santander y Risaralda.

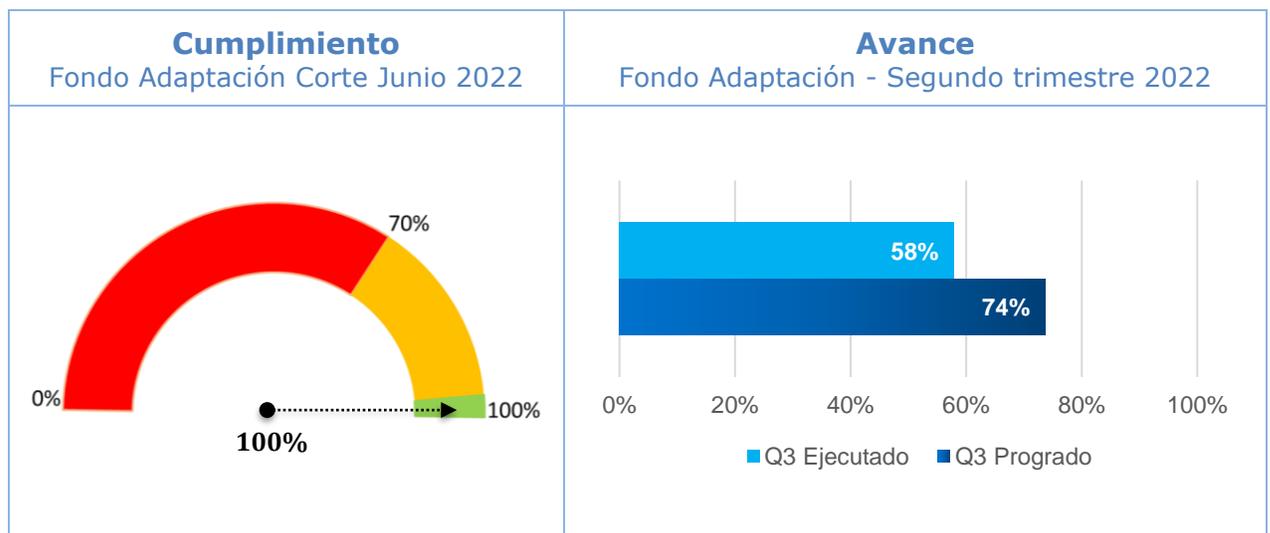

Las metas y avances en términos de intervenciones en cada uno de los departamentos que lidera esta Subgerencia en contratación, terminación y entrega son las siguientes:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Proyectos

Departamento	Fase	Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Antioquia	Contratar						N.A.
	Terminar	1			1		0
	Entregar	1				1	N.A.
Arauca	Contratar						N.A.
	Terminar	1		1			1
	Entregar	1		1			0
Casanare	Contratar						N.A.
	Terminar	1			1		1
	Entregar	1				1	1
Cauca	Contratar						N.A.
	Terminar	2		2			2
	Entregar	4	2	2			4
Norte Santander de	Contratar						N.A.
	Terminar	1			1		N.A.
	Entregar	4	1	1		2	2
Santander	Contratar						N.A.
	Terminar	1			1		0
	Entregar	4				4	N.A.
TOTAL	Contratar	0	0	0	0	0	N.A.
	Terminar	7	0	3	4	0	4
	Entregar	15	3	4	1	8	7

Durante el tercer trimestre del año se logró la terminación de la obra de infraestructura de un hospital correspondiente al Hospital Nivel I de la Vega-ESE Suroriente – y la terminación y entrega del hospital del Cincuentenario Nivel I-ESE NORTE 3 en el Departamento del Cauca.

Soluciones de Vivienda

Departamento		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Antioquia	Contratar	65	16	0	49	0	36
	Terminar	161	21	0	16	124	26
	Entregar	169	10	19	0	140	34
Boyacá	Contratar						N.A.
	Terminar	15				15	N.A.
	Entregar	15				15	N.A.
Cauca	Contratar	101	100		1		100
	Terminar	3	2		1		46
	Entregar	46		45		1	113

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Cundinamarca	Contratar	1			1		N.A.
	Terminar	65			1	64	N.A.
	Entregar	65				65	N.A.
La Guajira	Contratar						N.A.
	Terminar	881		59	625	197	72
	Entregar	881		59	52	770	72
Meta	Contratar	1			1		N.A.
	Terminar	1				1	N.A.
	Entregar	1				1	N.A.
Norte de Santander	Contratar						N.A.
	Terminar	114				114	N.A.
	Entregar	114				114	N.A.
Risaralda	Contratar						N.A.
	Terminar	20			20		20
	Entregar	20			20		20
Santander	Contratar	65			65		N.A.
	Terminar	97	32		35	30	58
	Entregar	97	32		9	56	57
TOTAL	Contratar	233	116		117		136
	Terminar	1357	55	59	698	545	222
	Entregar	1408	42	123	81	1162	296

Respecto a las soluciones de vivienda, en el tercer trimestre de la vigencia se terminaron 46 y entregaron 46 inmuebles ubicados en 3 municipios de los departamentos de Cauca, Risaralda y Santander.

Subgerencia de Estructuración

Esta Subgerencia lidera la ejecución de proyectos y de soluciones de vivienda en los departamentos de Amazonas, Caldas, Cesar, Chocó, Magdalena, Huila y Tolima.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

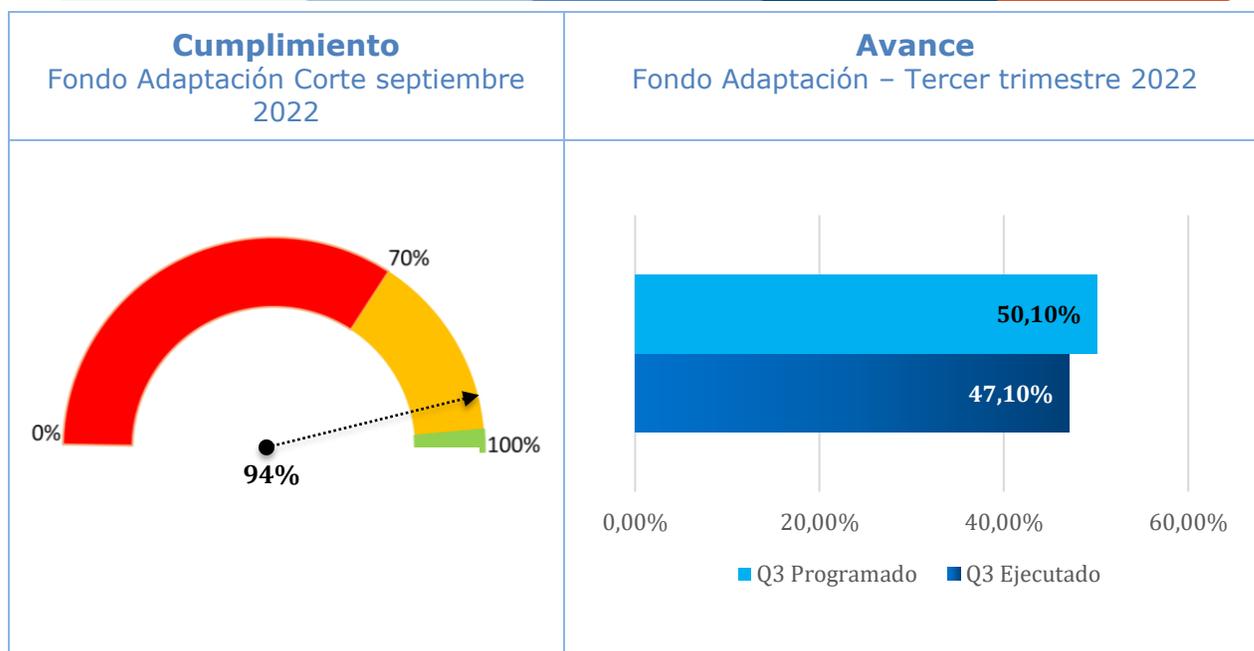

Las metas y avances de las intervenciones en cada uno de los departamentos que lidera esta Subgerencia, en contratación, terminación y entrega, son las siguientes:

Proyectos

Departamento	Fase	Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Cesar	Contratar						N.A.
	Terminar	4	2		2		3
	Entregar	4		2		2	0
Chocó	Contratar						N.A.
	Terminar	2				2	N.A.
	Entregar						N.A.
Magdalena	Contratar						N.A.
	Terminar	2			2		0
	Entregar	5	3			2	3
Tolima	Contratar						N.A.
	Terminar	1				1	N.A.
	Entregar	2		1		1	0
TOTAL	Contratar						N.A.
	Terminar	9	2		4	3	3
	Entregar	11	3	3		5	3

Durante el segundo trimestre del año se logró la terminación del acueducto y PTAP en el municipio de Aguachica en el departamento del Cesar y la entrega de la Sede Educativa EUM Darío Vásquez Caballero ubicada en Remolino – Magdalena.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Soluciones de Vivienda

Departamento		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Amazonas	Contratar						N.A.
	Terminar	64			64		N.A.
	Entregar	64			64		N.A.
Caldas	Contratar	12			12		N.A.
	Terminar	1			1		N.A.
	Entregar	1				1	N.A.
Cesar	Contratar						N.A.
	Terminar	53		33	20	0	33
	Entregar	53		33		20	33
Huila	Contratar						N.A.
	Terminar	50				50	N.A.
	Entregar	50				50	N.A.
Magdalena	Contratar						5
	Terminar	287	0	151	10	126	157
	Entregar	288	1	151	10	126	158
Tolima	Contratar	39	39				39
	Terminar	80				80	N.A.
	Entregar	80				80	N.A.
TOTAL	Contratar	51	39	0	12	0	44
	Terminar	535	0	184	95	256	190
	Entregar	536	1	184	74	277	191

Frente a las soluciones de vivienda, en el tercer trimestre de la vigencia se terminaron y entregaron 157 inmuebles ubicados en los municipios de Fundación y Tenerife.

Adicionalmente, en esta Subgerencia, como su nombre lo indica, se gestionan las acciones relacionadas con la estructuración técnica y financiera de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. En este sentido sus indicadores no regionalizables para la vigencia 2022 son:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Objetivo Estratégico 2018-2022 #1 Identificar, Estructurar Y Ejecutar Grandes Proyectos Integrales Y Sostenibles De Reducción Del Riesgo Ante El Cambio Climático

Objetivo Estratégico 2018-2022 #2 Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades /Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Estructurar el 100% de los estudios de sector y mercado de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y macroproyectos	Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	100%	25%	25%	25%	25%	75%
Evaluación técnica, financiera y económica de las diferentes modalidades de contratación de la Entidad.	Procesos evaluados técnica y financ./Evaluaciones designadas por SG	100%	25%	25%	25%	25%	75%
Identificar y / o establecer y/o actualizar políticas y lineamientos, para la priorización y/o estructuración de los proyectos desfinanciados y/o nuevos proyectos de la Entidad	Proyectos o lineamientos identificados o analizados/Proyectos o lineamientos nuevos o desfinanciados	100%	25%	25%	25%	25%	75%
Revisión ítems o APU's contractuales adicionales / no previstos de los contratos en ejecución	Revisión ítems o APU's contratos/Modificaciones contractuales	100%	25%	25%	25%	25%	75%

Mes	Avance Cualitativo
Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	
Enero	<p>Durante el mes de enero, se estructuraron los siguientes estudios de sector de acuerdo con las necesidades técnicas radicadas en la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 384-41123, ubicado en corregimiento de Ceilán, Municipio de Bugalagrande, departamento de Valle del Cauca, para dar cumplimiento al fallo judicial 2020-00134-00 sentencia No. 077 a favor del señor Lisímaco Mesías López. • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Antioquia, municipio Valparaíso. • Proveer soluciones de vivienda en el departamento del atlántico • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Tolima, municipio Casabianca. • Proveer soluciones de vivienda en el departamento del bolívar. • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Antioquia, municipio la pintada. • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Cauca • Prestar los servicios de soporte, mantenimiento y administración del Software SGD - INFODOC Gestión de Correspondencia para el Fondo Adaptación. • Aunar esfuerzos entre el FONDO ADAPTACIÓN y LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN para brindar seguridad y protección integral a la Gerente del Fondo Adaptación, de acuerdo con el trámite de emergencia dictado y/o el resultado que arroje el estudio de nivel de riesgo. • Prestar servicios profesionales de asesoría jurídica especializada y de representación judicial del Fondo Adaptación en casos en donde sea parte la entidad y que se presenten

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	controversias, incluyendo todos los actos procesales vinculados al mandato otorgado en cada caso, a efectos de garantizar la mejor defensa de los intereses litigiosos de la entidad, así como en mecanismos de arreglo directo y prevención del daño antijurídico.
Febrero	<p>Durante el mes de febrero, se estructuraron los siguientes estudios de sector de acuerdo con la necesidades técnicas radicadas en la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar los estudios de patología estructural y constructiva, análisis de vulnerabilidad sísmica y diseños de reforzamiento estructural del puente vehicular Hisgaura ubicado en el Departamento de Santander – carretera Málaga – los Curos. • Construcción, terminación y entrega de las viviendas, del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote en el departamento de Norte de Santander. • Prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada de las viviendas y de las obras sin entregar a los beneficiarios en el municipio de gramalote – norte de Santander
Marzo	<p>Durante el mes de marzo, se estructuraron los siguientes estudios de sector de acuerdo con la necesidades técnicas radicadas en la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestar los servicios de monitoreo de medios para hacer seguimiento, sistematización y análisis de las informaciones que se registran en radio, prensa, televisión, revistas, páginas web y redes sociales que hagan referencia directa o indirecta al Fondo Adaptación y/o sus temas de interés. • Suministro de tiquetes aéreos para el desplazamiento de funcionarios y colaboradores del Fondo Adaptación.
Abril	<p>Durante el mes de abril, se estructuraron los siguientes estudios de sector:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestar servicios profesionales de perito, en el marco de la acción de controversias contractuales ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA promovido por el Fondo Adaptación en contra de PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S, Constructora A & C, Confianza y Liberty Seguros S.A. • Realizar el diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali. • Elaboración de avalúos comerciales de predios a nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación.
Mayo	<p>Durante el mes de mayo, se estructuraron los siguientes estudios de sector:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar la interventoría integral al diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali. Proceso publicado en el sistema SECOP II el 20 de mayo. • Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar. Proceso publicado en el sistema SECOP II el 20 de mayo. • Prestar servicios profesionales de perito, en el marco de la controversia contractual suscitada entre la UNIÓN TEMPORAL NUEVO GRAMALOTE y el Fondo Adaptación con ocasión de la ejecución del contrato 165 de 2015. • Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para la IPS empresa social del estado hospital local de Mahates ubicada en el municipio de Mahates.
Junio	Durante este mes, se realizó los respectivos estudios de sector y mercado de los procesos definidos en el PAA de acuerdo con los insumos recibidos:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> •Contratar los productos y servicios de Google G - SUITE para el Fondo Adaptación, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-139-IAD-2020, y en la orden de compra respectiva. •Prestar el servicio de vigilancia para la infraestructura y equipos del hospital local de Mahates ubicada en el municipio de Mahates (Bolívar) del Fondo Adaptación.
Julio	<p>Durante el mes de julio se publicaron los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Gramalote – Obra •Contrato de Correo Certificado de la Entidad <p>Se elaboró y entregó el modelo final de análisis de sector y mercado, que será utilizado para las compraventas de vivienda en el II semestre de 2022. Finalmente se realizó proceso de contratación de Felipe Ortiz, quien ingresó como contratista a la Subgerencia de Estructuración, para hacer apoyos administrativos entre otras tareas.</p>
Agosto	<p>En agosto se elaboró y entregaron estudios de sector y mercado, se apoyó la elaboración de estudios previos para: adquisición de viviendas en el proyecto Urbanización Castillos del Norte del municipio de San Lorenzo-Nariño. Postulante: TAYKA Colombia S.A.S. Estudio de sector y mercado y documentos de estudios previos entregados el 31 de agosto. Interventoría para las viviendas faltantes en el municipio de Gramalote, Norte de Santander. Prestación del servicio de vigilancia para la infraestructura del Hospital Local del municipio de Mahates, Bolívar. Acompañamiento socioeconómico a las familias beneficiarias del municipio de Achí, Bolívar.</p>
Septiembre	<p>En septiembre se elaboró y entregaron para revisión final varios análisis de sector y estudios previos que aún se encuentran en revisión final por parte del equipo contractual. Tan pronto se reciban observaciones o ajustes requeridos se elaborará la versión final, se firmarán los documentos y se radicarán, momento en el cual se notificará el producto final como resultado que sumaría a la meta.</p> <p>Los dos análisis de sector y mercado que están ya elaborados y próximos a radicarse son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Adquisición de viviendas en el proyecto Urbanización Los Molinitos del municipio de Dosquebradas-Risaralda. Postulante: CIVILCOL S.A.S. Estudio de sector y mercado y documentos de estudios previos en revisión final por parte del equipo contractual desde el 28 de septiembre. •Adquisición de vivienda usada en el municipio de Chinchiná - Caldas. Estudio de sector y mercado y documentos de estudios previos en revisión final por parte del equipo contractual desde el 28 de septiembre.
Procesos evaluados técnica y financ./Evaluaciones designadas por SG	
Enero	<p>Durante el mes de enero, se asignó a la Subgerencia de Estructuración la evaluación financiera de los procesos: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para las IPS empresa social del estado suroriente E.S.E del municipio de la vega y empresa social del estado norte 3 – ese del municipio de puerto tejada en el departamento del cauca, centro de salud Saul Quiñones E.S.E. del municipio de Magui Payan en el departamento de Nariño y hospital San Vicente de Paul del municipio de Gramalote en el departamento de Norte de Santander</p>
Febrero	<p>Durante el mes de febrero, se designó la evaluación financiera y económica a la Subgerencia de Estructuración del siguiente proceso: Realizar acompañamiento socioeconómico a las familias beneficiarias del programa de vivienda del Fondo Adaptación en la modalidad de reubicación en la zona de la Mojana mediante la estructuración, implementación y asistencia técnica de las medidas tendientes a la recuperación de las redes económicas y sociales de la población.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	<p>Durante el mes de marzo, a la Subgerencia de Estructuración se le designaron las siguientes evaluaciones financieras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suministro de tiquetes aéreos para el desplazamiento de funcionarios y colaboradores del Fondo Adaptación. • Verificación de la cesión de los requisitos financieros del proyecto: construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011, en los departamentos de magdalena y cesar.
Abril	<p>Durante el mes de abril, se designó la evaluación financiera de la siguiente cesión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción del Centro De Salud Saul Quiñonez En El Municipio De Magüi Payan - Departamento De Nariño de acuerdo con estudios y diseños, planos de construcción, especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto, anexos a estos Estudios Previos.
Mayo	<p>Durante el mes de mayo, no se le designo la evaluación financiera y económica de procesos</p>
Junio	<p>Durante este mes, se evaluó financiera y económicamente los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar el diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali. • Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para la IPS empresa social del estado hospital local de Mahates ubicada en el municipio de Mahates (Bolívar). • Elaboración de avalúos comerciales de predios a nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación.
Julio	<p>Se hicieron las siguientes cinco (5) unidades de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viabilidad financiera para la adición de quince (15) viviendas al contrato FA-CD-I-S-230-2021 de Cauca-Antioquia. Concepto entregado el 8 de julio. • Viabilidad financiera para la adición de diez (10) viviendas al contrato FA-CD-I-S-232-2021 de Sabanalarga-Atlántico. Concepto entregado el 11 de julio. • Viabilidad financiera para la adición de cinco (5) viviendas al contrato FA-CD-I-S-227-2021 de Fundación-Magdalena. Concepto entregado el 14 de julio. • Viabilidad financiera de la postulación del proyecto Urbanización 10 de mayo del municipio de Simití-Bolívar. Postulante: U.T. Consorcio Viviendas Simití 2022. Análisis de información entregado con correo electrónico del 22 de julio. • Viabilidad financiera de la postulación del proyecto Urbanización Castillos del Norte del municipio de San Lorenzo-Nariño. Postulante: TAYKA Colombia S.A.S. Análisis de información entregado con correo electrónico del 25 de julio.
Agosto	<p>Para el mes de agosto se hicieron las siguientes evaluaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viabilidad financiera para la adquisición de veinte (20) viviendas en el proyecto Urbanización Molinitos-Torre3 de Dosquebradas-Risaralda, concepto entregado el 17 de agosto. • Viabilidad financiera para la adquisición de seis (6) viviendas en el proyecto Urbanización Altos de La Playa de San Pablo-Nariño, concepto entregado el 17 de agosto. • Viabilidad financiera para la cesión de derechos y reconfiguración de los integrantes del contrato de compraventa de vivienda 177-2022 de Popayán-Cauca, concepto entregado el 4 de agosto. • Revisión de adición de presupuesto de obra para infraestructura educativa de Santa Ana (Magdalena) y Chimichagua (Cesar). • Revisión costos de adición y prórroga por mayor permanencia del contrato de interventoría No. 061 de 2017 en Manatí (Atlántico).

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> •Revisión costos de adición y prórroga por mayor permanencia del contrato de interventoría No. FA-CMA-I-S-001-2020, en el municipio de Turbo Antioquia. Verificación financiera de cesión Consorcio Tolima 2019.
Septiembre	<p>Una (1) unidad de avance que corresponden a la Evaluación financiera y económica para el proceso de contratación de mínima cuantía FA-MC-F-S-010-2022 para "Adquisición de certificado digital para los usuarios del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación". Informe de evaluación entregado el 16 de septiembre.</p> <p>También se elaboró y entregó viabilidad financiera preliminar para la adquisición de veintiocho (28) viviendas en el municipio de Yondó-Antioquia. Concepto entregado el 2 de septiembre. Se espera que en el mes de octubre la madurez del proceso permita la generación del concepto de viabilidad financiera definitiva, momento en el cual se notificará el resultado y se sumará a la meta.</p>
Proyectos o lineamientos identificados o analizados/Proyectos o lineamientos nuevos o desfinanciados	
Enero	Durante este mes, no se requirió la actualización de lineamientos ni manuales en la entidad.
Febrero	Durante el mes de febrero, se realizó la actualización del Anexo Técnico de vivienda: donde se establecen las condiciones y especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los proyectos de vivienda financiados por el Fondo Adaptación en sus diferentes modalidades
Marzo	Durante este mes, no se requirió la actualización de lineamientos ni manuales en la entidad.
Abril	Durante este mes, no se requirió la actualización de lineamientos ni manuales en la entidad.
Mayo	Durante este mes, no se requirió la actualización de lineamientos ni manuales en la entidad.
Junio	Durante este mes, no se requirió la actualización de lineamientos ni manuales en la entidad.
Julio	En el plan de mejoramiento de la Contraloría se debió cumplir con una acción de mejora, que requería generar un lineamiento donde en la asesoría del proceso de estructuración del proyecto, se debía incluir una certificación suscrita por la Entidad Local competente, de no ejecución de obra por parte de otras entidades y un concepto favorable de la Entidad Territorial correspondiente, sobre el valor y los requerimientos técnicos de la obra que pretenda adelantar el FONDO, según las responsabilidades definidas en la ley 715 de 2021. Para hacer cumplimiento a esta acción de mejora se creó un oficio con radicado número I-2022-023455 del 19 de julio de 2022, el cual fue enviado a la Gerencia, Secretaría General, Subgerentes, Jefes de Oficina y Líderes Sectoriales, esto con el fin de mantenerlos informados del nuevo lineamiento. Cabe aclarar que para el mes de agosto se hará la comunicación oficial por medio del correo interno de la Entidad.
Agosto	De acuerdo con el lineamiento enviado a la gerencia, subgerentes y líderes sectoriales, con radicado número I-2022-023455 del 19 de julio de 2022, se hizo comunicación interna con la circular 013 del 29 de agosto de 2022, mediante correo electrónico enviado a toda la entidad, el 30 de agosto de 2022.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
Septiembre	Con el fin de mantener la mejora continua en la Entidad, se creó lineamiento con número de radicado I-2022-023455, el cual contempla requisitos iniciales al momento de estructurar proyectos de infraestructura. También se realizó la circular #013 la cual fue divulgada mediante comunicación interna. Esto en cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría.
Revisión ítems o APU's contratos/Modificaciones contractuales	
Enero	Durante este periodo, se asignaron a la subgerencia de estructuración la revisión de las siguientes modificaciones contractuales y APUS: <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los costos para el suministro e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales contrato de obra no. 076 de 2015, celebrado entre el fondo adaptación y la unión temporal infraestructura hospitalaria 2017 porti -jv 2017. proyecto: construcción de la ips saul quiñones del municipio de maguá payán, departamento de Nariño. • Revisión de los costos de adición por mayor permanencia contrato de interventoría no. 082 de 2015, celebrado entre el fondo adaptación y g.o.c. sucursal Colombia, que tiene como objeto "realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental, sobre el contrato de obra para la construcción de la ips saúl quiñones del municipio de maguá payan, Nariño.
Febrero	Durante el mes de febrero, no se le asigno a la Subgerencia de Estructuración la revisión de APUS y adiciones por partes de los sectores y macroproyectos.
Marzo	Durante el mes de marzo, la Subgerencia de Estructuración realizo la revisión de los siguientes apus e ítems no previstos de acuerdo con lo solicitado: <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de obra NO. FA-LP-I-S-003-2021, cuyo objeto es "reconstrucción de redes de alcantarillado en la avenida la paz del casco urbano del municipio de cimitarra – Santander" • Contrato de obra pública NO. FA-IC-I-S-151-2020, cuyo objeto es "rehabilitación sistema tratamiento de aguas residuales municipio de candelaria - atlántico".
Abril	Durante el mes de abril, no se le asignó la revisión de APUS y adiciones por partes de los sectores y macroproyectos
Mayo	Durante el mes de mayo, se realizó la revisión del Contrato de obra NO. FA-LP-I-S-001-2021, cuyo objeto es "rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y Juntas de Tamaná, municipio de Nóvita – departamento del Choco.
Junio	Durante este mes, se solicitó la revisión del contrato de obra no. fa-lp-i-s-001-2021, cuyo objeto es "rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y juntas de Tamaná, municipio de Nóvita – departamento del choco".
Julio	Se adelantaron revisiones relacionadas con una posible adición al contrato de Diseño y Construcción del Centro de Salud de Majagual. Se está a la espera de entrega de información complementaria por parte de la interventoría para poder avanzar en las revisiones.
Agosto	Se adelantaron revisiones relacionadas con una posible adición al contrato de diseño y construcción del Centro de Salud de Majagual, con la modificación al contrato FA-LP-I-S-003-2020 de Construcción del Tramo VI del Jarillón de Cali. Se está a la espera de entrega de información complementaria y aclaraciones por parte de las interventorías para poder finalizar las revisiones.
Septiembre	Una (1) unidad de avance que corresponde a:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Entrega de informe de APU's contractuales adicionales / no previstos y sustentación del resultado a la modificación al contrato FA-LP-I-S-003-2020 de Construcción del Tramo VI del Jarillón de Cali.</p> <p>Adicionalmente, se adelantaron revisiones y una primera entrega de informe sobre la posible adición al contrato FA-IC-I-S-0109-2020 de Diseño y Construcción del Centro de Salud de Majagual. Se está a la espera de entrega de información complementaria y aclaraciones por parte de la supervisión y la interventoría para poder finalizar las revisiones. Cuando se terminen y validen todas las revisiones se reportará como producto final de revisión para que se sume a la meta.</p>

Gerencia

Conforme a la Resolución 200 de 2022 y con la finalidad de "garantizar una Entidad con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de los ciudadanos y cumplir con los objetivos estratégicos", la Gerencia lidera para el año 2022 las acciones integrales de los macroproyectos Jarillón de Cali y Gramalote; así, como las soluciones de vivienda que en el marco de estos macroproyectos se encuentran programadas para ser contratadas, terminadas o entregadas en los departamentos de Valle del Cauca y Norte de Santander.

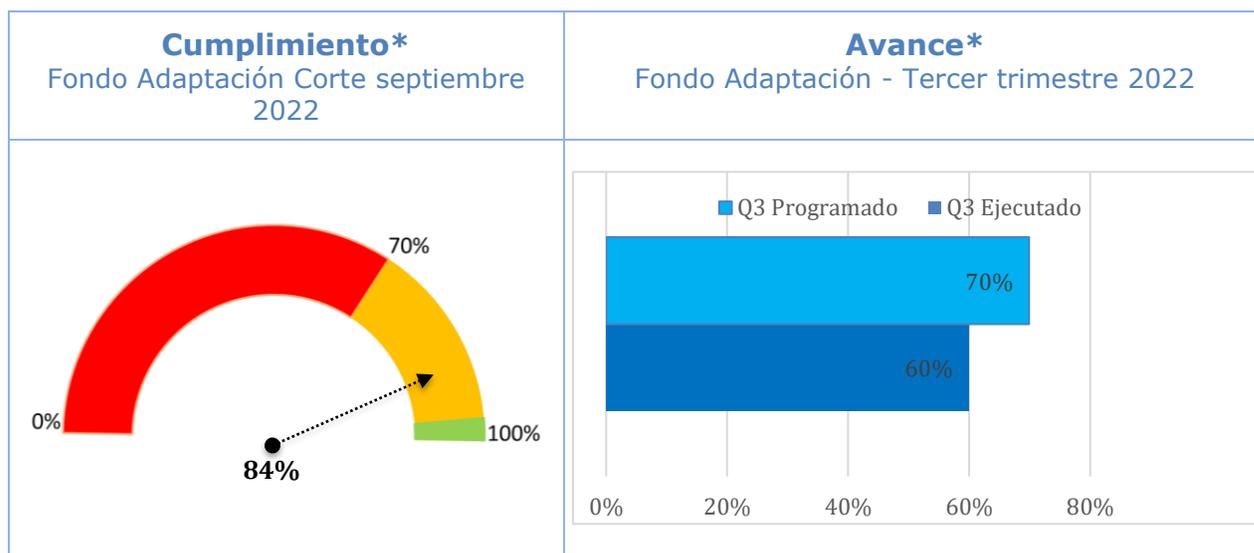

*Incluye los indicadores de comunicaciones, que corresponden a objetivos estratégicos transversales.

Las metas y avances en términos de intervenciones en cada uno de los macroproyectos y departamentos que lidera la Gerencia son las siguientes:

Proyectos

Macroproyecto	Fase	Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Valle del Cauca - Jarillón de Cali	Contratar	1		1			0
	Terminar	5	1	2	1	1	1
	Entregar	6		1	3	2	1

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Macroproyecto	Fase	Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Norte de Santander Gramalote	Contratar						N.A.
	Terminar	1	1				1
	Entregar	2	2				2
TOTAL	Contratar	1	0	1	0	0	0
	Terminar	6	2	2	1	1	2
	Entregar	8	2	1	3	2	3

Avanzando en el cumplimiento de las metas, al tercer trimestre del año se ha entregado al municipio de Cali 11,39 kilómetros de Jarillón reforzado, en el Valle del Cauca; asimismo, se le entregaron el Municipio de Gramalote en Norte de Santander, la Casa de la Cultura y la Casa del Campesino.

Soluciones de Vivienda

Departamento		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Valle del Cauca	Contratar	800	0	400	400	0	720
	Terminar	400	0	380	0	20	200
	Entregar	400	0	0	0	400	202
Norte de Santander (Gramalote)	Contratar	128	0	128	0	0	0
	Terminar	72	0	0	0	72	N.A.
	Entregar	67	0	0	0	67	N.A.
TOTAL	Contratar	928	0	528	400	0	720
	Terminar	472	0	380	0	92	200
	Entregar	467	0	0	0	467	202

Durante el tercer trimestre se terminaron 80 soluciones de vivienda para los beneficiarios focalizados por el Macroproyecto Jarillón de Cali, en el departamento del Valle del Cauca y se entregaron 62 inmuebles.

3. 2. Objetivos Estratégicos Transversales

En concordancia con el ejercicio de perspectiva de planeación 2022 y los objetivos estratégicos institucionales, en este aparte se hace seguimiento a las acciones estratégicas desde la perspectiva interna, las cuales contemplan los resultados del cliente interno.

En consecuencia, a continuación, se ilustra el seguimiento a 44 indicadores y metas relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva interna, la cual incluye específicamente los objetivos estratégicos 5 y 6 con algunos resultados clasificados en los objetivos 3 (Acciones de Gestión del Conocimiento) y 4 (Acciones de Gestión Social).


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Las acciones para el logro de estas metas son ejecutadas por la Subgerencia de Regiones, la Oficina de Comunicaciones, la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría General.

- Área Subgerencia de Regiones

En la Subgerencia de Regiones se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Política Institucional de Gestión Social de los Proyectos, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Política de Gestión y Desempeño de PARTICIPACIÓN CIUDADANA la cual hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

Esta intervención se ejecuta por intermedio de un equipo social involucrado en los proyectos, los cuales actúan a través de las estrategias de: (i) Auditorías Visibles, (ii) Comités Regionales De Seguimiento – CORES y, (iii) Acompañamiento Social.

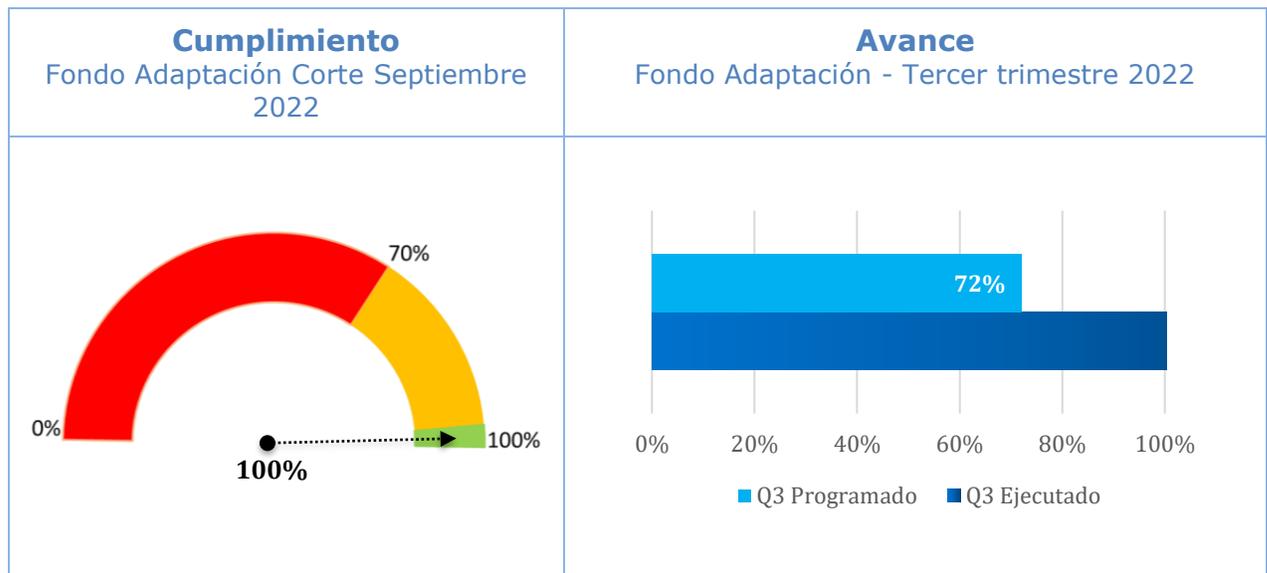

A continuación, se detallan los indicadores, metas y distribución trimestral de metas de la Subgerencia de Regiones para el año 2022:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN SOCIAL**

Gerente de Meta: Subgerente de Regiones

Objetivo Estratégico 2018-2022 #4		Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población					
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades /Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES) PAAC-2022	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES), implementada	152	25	30	49	48	241
Implementar la Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social* (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales) PAAC-2022	Política de Interacción y Sostenibilidad Social (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales), implementada	186	40	48	50	48	245
Realizar seguimientos a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana	Seguimientos a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, realizados	12	3	3	3	3	9

PAAC-2022: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2022 (Decreto 612/2018).
 (*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

Mes	Avance Cualitativo
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES), implementada	
Enero	<p>En el mes de enero para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -AV acompañadas: 9 en los sectores Vivienda, salud y Educación. -Fortalecimiento ELS/Comunidad/profesionales sociales: 5 en los sectores de Vivienda y Salud
Febrero	<p>Participación Ciudadana: 28</p> <p>En el mes de febrero para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AV acompañadas: 8 en los sectores de vivienda, salud, educación, y saneamiento y agua potable. • Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 18 Vivienda, salud, educación, saneamiento y agua potable y en la región de La Mojana. • CORES: 2 en vivienda y salud.
Marzo	<p>Participación Ciudadana: 41</p> <p>En el mes de marzo para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>- AV acompañadas: 12 en los sectores de vivienda, salud, educación, y saneamiento y agua potable.</p> <p>- Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 29 en los sectores de vivienda, salud y educación.</p> <p>En el repositorio de seguimiento al Plan de Acción se evidencia el detalle por cada una de las AV acompañadas, capacitaciones o CORES reportados, con fecha de realización.</p>
Abril	<p>Participación Ciudadana: En el mes de abril para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron 26 actividades, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AV acompañadas: 5 • Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 20 • Comités regionales de seguimiento – CORES: 1 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>VIVIENDA</p> <p>CORES 1</p> <p>1. 20/04/2022. Realización de CORES - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO y ALCALDÍA DE SANTA LUCÍA, para tratar tema de invasión proyecto en Santa Lucía - Atlántico.</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 2</p> <p>1. 21/04/2022. Mesa de Trabajo Comunitaria - Sorteo de vivienda Urbanización Bosques del Ciprés - Cto 242 de 2021, 50 viviendas en Neiva - Huila. - Mixta. Paola</p> <p>2. 24/04/2022. Socialización Comunitaria Sorteo de viviendas compraventa proyecto Urbanización Villa Yeimy - 20 viviendas - Cto. 228 de 2020 Tamalameque - Cesar.</p> <p>Capacitaciones Contratistas, ELS/ Comunidad: 16</p> <p>a. Capacitaciones Contratistas: 1</p> <p>1. 20/04/2022. Lineamientos Sociales para entrega de Proyectos de compraventa de Nariño.</p> <p>b. Capacitaciones ELS: 6</p> <p>1. 1/04/2022. Capacitación ELS - Cto. 105-2019 - Urbanización San Francisco Mallama, Nariño. Comunicación asertiva y liderazgo.</p> <p>2. 1/04/2022. Capacitación ELS - Cto.226-2018. - Urbanización San Francisco – Mallama – Nariño. - Comunicación asertiva y liderazgo.</p> <p>3. 18/04/2022. Capacitación ELS - Proyecto de vivienda Urbanización Sueños de Paz - Cto. 104-2020 - Los Andes Sotomayor, Nariño. - Plan de acción para la sostenibilidad.</p> <p>4. 18/04/2022. Capacitación ELS - Urbanización Sueños de Paz. Cto 226-2020 - Los Andes Sotomayor, Nariño. - Importancia del plan de acción para la sostenibilidad</p> <p>5. 26/04/2022. Capacitación ELS -Cto.080-2019 - Urbanización Nueva Esperanza - Matanza Santander. Funcionamiento Estatal - Parte 2. - Virtual</p> <p>6. 27/04/2022. Capacitación ELS 153-C-2017 - Urbanización Nuevo Achí -Achí, Bolívar. Mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>c. Capacitaciones Comunitarias: 9</p> <p>1. 6/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Los Ángeles - 2016-C-188 - San Marcos, Sucre. Taller de sostenibilidad y cuidado</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>2. 20/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Sueños de Paz - Cto. 104-2020 - Los Andes Sotomayor, Nariño. - Plan de acción para la sostenibilidad</p> <p>3. 9/04/2022. Capacitación Comunitaria - Proyecto Urbanización Villa Gloria - Cto 109-2019 - Ancuya, Nariño. - Decreto 1537 de 2021</p> <p>4. 6/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización San Francisco - Cto. 226-2018 Mallama Nariño. Deberes y derechos como usuarios de servicios públicos.</p> <p>5. 6/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización San Francisco - Cto. 105-2020 Mallama Nariño. Deberes y derechos como usuarios de servicios públicos.</p> <p>6. 20/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Sueños de Paz - Cto.226-2020 - Los Andes Sotomayor, Nariño - Conformación del plan de acción para la sostenibilidad</p> <p>7. 4/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Nuevo Achí - Cto. 153-C-2017 - Achí, Bolívar. Vivienda Saludable</p> <p>8. 5/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Nuevo Achí - Cto. 153-C-2017 - Achí, Bolívar - Vivienda Saludable</p> <p>9. 22/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Nueva Esperanza Cto. 080-2019, Matanza, Santander.</p> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 3</p> <p>1. 1 foro de 50% de avance Sede IE de Guaranda En Guaranda Sucre Contrato FA-IC-I-S-351-2019 Contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019.</p> <p>2.1 foro Final Sede Rubén Darío Vásquez Caballero En Remolino Magdalena Contrato FA-IC-I-S-113-2019 Contratista Consorcio Construir 21.</p> <p>3. 1 foro Final Sede ERM El Horno En San Zenón Magdalena Contrato FA-IC-I-S-210-2018 Contratista Consorcio ITTIEL</p> <p>Capacitaciones ELS/Comunitarias: 2</p> <p>1. capacitación Comunitaria Sede ERM Bellavista en Concordia Cuidado del Agua 20-04-2022</p> <p>2. capacitación ELS Sede ERM Bellavista en Concordia Cuidado del Agua 06-04-2022</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES</p> <p>Capacitaciones a contratistas: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento socioeconómico San Benito 01-04-2022 - Acompañamiento socioeconómico San Benito 25-04-2022
<p>Mayo</p>	<p>Participación Ciudadana: 29 actividades realizadas</p> <p>En el mes de mayo para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AV acompañadas: 16 • capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 13 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>SUBGERENCIA DE REGIONES</p> <p>Capacitaciones Contratistas: 3 En el marco de la implementación de la caja de herramientas social, que se encuentra diseñando la Subgerencia, en el mes de mayo</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>se realizaron las siguientes capacitaciones, a los profesionales sociales en campo, de manera virtual</p> <ul style="list-style-type: none"> •18-05-2022 Taller sociales en campo "Habilidades para la vida" •27-05-2022 Taller sociales en campo "Plan para la sostenibilidad" •31-05-2022 Taller sociales en campo "SAC y/o PSI - Seguimiento PQRSFD" <p>VIVIENDA</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 9</p> <ul style="list-style-type: none"> •03/05/2022 Foro 50% San Benito, Sucre Urbanización Los Corales •05/05/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional - alcalde de los Andes Sotomayor Contrato 104 de 2019- 35 viviendas y Cto 226 de 2018 •10/05/2022 Mesa de Trabajo interinstitucional Alcaldía Los Andes Sotomayor Contrato 104 de 2019- 35 viviendas y Cto 226 de 2018. •12/05/2022 mesa de gestión interinstitucional "Urbanización El Cedro - 54 Viviendas La Cruz, Nariño •17/05/2022 mesa de gestión interinstitucional Urbanización Vista Hermosa - 185 viviendas Alban, Nariño •10/05/2022. Sorteo proyecto de vivienda Compraventa Urbanización Molinitos 20 viviendas - Dosquebradas, Risaralda. •21/05/2022. Socialización Comunitaria inicio del Proyecto Compraventa Urbanización Maria Gracia en Popayán, Cauca. - Mixto •19/05/2022. Acompañamiento virtual a socialización del proyecto de compraventa Cto 226 de 2021, Prado -Tolima. 43 viviendas. •26/05/2022 Mesa de gestión interinstitucional Urbanización altos de la playa Contrato 226 de 2018 <p>Capacitaciones Contratistas, ELS/ Comunidad: 4</p> <p>a. Capacitaciones Contratistas: 1 Virtual</p> <ul style="list-style-type: none"> •12/05/2022. Capacitación Componente social Compraventa -Cto. 202-2021 Viotá - Cundinamarca. <p>b. Capacitaciones ELS: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •03/05/2022. Fortalecimiento ELS - Proyecto Urbanización Los Corales - 270 Viviendas San Benito Abad Cto 188 de 2016. Tema: Mecanismos de participación ciudadana. <p>c. Capacitaciones Comunitarias: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> •04/05/2022. Capacitación Comunitaria Proyecto Urbanización Los Corales -270 Viviendas San Benito Abad Cto 188 de 2016 - Sucre. Temas: Vivienda Saludable, Planes de vida familiar, Gestión del Riesgo, Convivencia Familiar y Resolución de Conflictos, Presupuesto Familiar y De la informalidad a la formalidad. •14/05/2022. Capacitación Comunitaria Urbanización Villa Gloria - 36 Viviendas - Cto. 109 -2019. Tema: Resolución pacífica de conflictos. <p>EDUCACIÓN</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> •Foro Final IE Promoción Social Sede Mixta No1: En Gamarra Cesar, Contrato No. 107 de 2013, Contratista Unión Temporal AB Construcciones 2014 e interventoría HMV •Foro Final IE Rafael Salazar Sede San Antonio: En Gamarra Cesar, Contrato No. 107 de 2013, Contratista Unión Temporal AB Construcciones 2014 e interventoría HMV

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> •Socialización Comunitaria Sede Nuestra Señora del Carmen – Sempegua: En Chimichagua Cesar Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Contratista R Y D construcciones e interventoría Consorcio Interventorías Civiles •Socialización Comunitaria IE Antonio Brujes Carmona – Jaraba: En Santa Ana Magdalena Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Contratista R Y D construcciones e interventoría Consorcio Interventorías Civiles <p>Capacitaciones ELS/Comunitarias 3</p> <ul style="list-style-type: none"> •Capacitación Comunitaria Sede ERM Bellavista en Concordia Gestión del Riesgo 04-05-2022 •Capacitación Comunitaria Sede ERM Bellavista en Concordia Cultura Tradicional 12-05-2022 •Capacitación Comunitaria Sede ERM Bellavista en Concordia Trabajo en Equipo 12-05-2022 <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> •25-05-2022 Reunión ELS ASE - San Benito Sucre •25-05-2022 Seguimiento SAC ASE - San Benito Sucre •3-05-2022 Acompañamiento Foro Inicial ASE San Benito <p>SALUD</p> <p>Capacitaciones ELS/Comunitarias 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •23/05/2022 IPS Centro de salud Don Bosco, en el corregimiento de Currulao Municipio de Turbo Antioquia – Habilidades para la vida <p>ACUEDUCTO</p> <p>Capacitaciones ELS/Comunitarias 2</p> <ul style="list-style-type: none"> •27/05/2022 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR - Gestión del recurso hídrico •23/05/2022 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA (CESAR) Gestión de las emociones
Junio	<p>Participación Ciudadana: 34</p> <p>En el mes de junio para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> •AV acompañadas: 22 •Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 13 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>SUBGERENCIA DE REGIONES</p> <p>Capacitación contratistas: 3</p> <p>1.06-06-2022: Taller de identidad profesionales sociales en campo 2.07-06-2022: Taller de atención preferencial e incluyente. presencial y Virtual a servidores Fondo Adaptación 3.16-06-2022: Taller de identidad profesionales sociales en campo</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>VIVIENDA</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 10 1.03/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional alcalde San Pablo - Nariño - Virtual 2.06/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional - Ocupación Ilegal - Proyecto Villa Sofía Santa Lucía Atlántico - Virtual 3.08/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional Alcaldía Los Andes Sotomayor - Nariño - Virtual. 4.13/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional alcalde San Pablo - Nariño - Virtual 5.16/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional alcalde San Pablo - Nariño - Virtual 6.16/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional alcaldía Los Andes Sotomayor- Nariño- Virtual 7.17/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional alcalde Mallama - Nariño - Virtual 8.30/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional Alcaldía de Colón- Génova, Nariño - Virtual. 9.09/06/2022. Mesa de Trabajo Comunitaria para sorteo de viviendas del proyecto de compraventa - Cto. 232-2021- Urbanización Marsella Real en Sabanalarga - Atlántico. - 70 Viviendas. Mixta 10.22/06/2022. Foro Final y entrega de 12 viviendas en el proyecto de vivienda en Guaca - Santander. Mixta.</p> <p>Capacitaciones Contratistas, ELS/ Comunidad: 7</p> <p>a. Capacitaciones ELS: 2 1.01/06/2022. Capacitación ELS - Gestión de Emociones - Cto 188 de 2016 Urbanización Los Corales-270 Viviendas San Benito Abad - Sucre 2.14/06/2022. Capacitación ELS - Gestión y articulación en relación con el proceso de reasentamiento o reconstrucción - Cto. 098-2019 Urbanización San Jorge 32 viviendas</p> <p>b. Capacitaciones Comunitarias: 5 1.08/06/2022. Capacitación Comunitaria - Gestión del Riesgo - Cto 188 de 2016 Urbanización Los Corales-270 Viviendas San Benito Abad - Sucre 2.08/06/2022. Capacitación Comunitaria - Talleres Formación Temas Básicos - Cto 188 de 2016 Urbanización Los Corales-270 Viviendas San Benito Abad - Sucre. 3.10/06/2022. Capacitación comunitaria: Presupuesto Familiar - C-153 DE 2017 - Proyecto Urbanización Nuevo Achí - Bolívar - 4.18/06/2022. Capacitación Comunitaria - Reciclaje Recreativo - Cto. 109-2019 - Urbanización Villa Gloria - 36 Viviendas - Ancuya - Nariño. 5.10/06/2022. Capacitación Comunitaria - Rutas de Atención Integral - Cto. 098-2019 - Urbanización San Jorge 32 viviendas - Ospina, Nariño.</p> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 2 1.14-06-2022: 1 Foro Final Sede Centro Educativo Básico Ampliado de Bomba: En Pedraza Magdalena, Contrato FA-IC-I-S-108 – 2019, Contratista Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena. 2.15-06-2022: Mesa de trabajo con Comunidad Sede ERM Bellavista: En Concordia Magdalena, Contrato FA-IC-I-S-108 – 2019, Contratista Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena.</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 1</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>1.Apropiación-Acompañamiento Reunión ELS ASE-28-06-2022-San Benito Sucre</p> <p>Capacitaciones comunitarias: 1 1.Apropiación-Capacitación Habilidades para la Vida-ASE-28-06-2022-San Benito Sucre</p> <p>SALUD</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 6 1.03-06-2022: Foro de seguimiento Hospital de Puerto Tejada: Contrato 251-2017, Contratista Consorcio Tadeo Ese Norte 3 e interventoría Gustavo Adolfo Torres Duarte. 2.16-06-2022: Mesa de Gestión Interinstitucional con Alcaldía IPS Don Bosco: En Currulao Turbo, Contrato FA-IC-I-S-107-2018, Contratista Lopeca SAS Ingenieros e interventoría Ingeniería Master 3.16-06-2022: Foro 50% de avance IPS Don Bosco: En Currulao Turbo, Contrato FA-IC-I-S-107-2018, Contratista Lopeca SAS Ingenieros e interventoría Ingeniería Master 4.04-06-2022 Foro Final Hospital Guaranda Guaranda Sucre 5.22-06-2022 mesa de gestión interinstitucional Hospital Mahates Bolívar 6.22-06-2022 Reunión ELS Hospital Mahates Bolívar</p> <p>Capacitaciones contratistas: 1 1.13-06-2022 Capacitación contratista Hospital Magüí Payán Nariño</p> <p>ACUEDUCTO</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 3 1.Foro inicial en el Municipio de Cimitarra. 2.Mesa De Gestión Interinstitucional: con Gobernación de Atlántico y Municipio de Candelaria, en virtud del proyecto de PTAR. Tema: situación de asentamiento en el AID.</p> <p>Capacitaciones Contratista 1 1.Capacitación en temas de gestión social a profesionales sociales del Proyecto Acueducto de Novita.</p>
Julio	<p>Participación Ciudadana: 23</p> <p>En el mes de julio para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●AV acompañadas: 15 ●Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 7 ●CORES: 1 <p>●MATRIZ SEGUIMIENTOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN: Además, se adjunta como soporte matriz de seguimiento a los espacios de participación realizados por contratistas durante el mes de JULIO</p> <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>SUBGERENCIA DE REGIONES</p> <p>Capacitación contratistas: 2</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>1.07/07/2022 Taller no. 6 cómo elaborar campañas de prevención y programas de intervención 2.21/07/2022 Taller no. 7 habilidades Ejecutivas como motor de logros</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 6</p> <p>1.07/07/2022. Mesa de Trabajo Comunitaria - Sorteo Viviendas Urbanización Shaddai II, en Fundación Magdalena - 10 viviendas. 2.22/07/2022. Reunión de seguimiento con ELS y recorrido por las viviendas del proyecto Nuevo Achí - Bolívar. 3.27/07/2022. Mesa de Trabajo Comunitaria - Entrega de 120 viviendas en Achí - Bolívar 4.27/07/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional con la Alcaldía de Tenerife, para entrega de viviendas en el proyecto Urbanización Villa Tiburón - 151 viviendas. 5.28/07/2022. Foro Final y entrega de 151 viviendas en la Urbanización de Villa Tiburón del municipio de Tenerife - Magdalena. 6.29/07/2022. Mesa de Trabajo Comunitaria, y entrega de 30 viviendas en Sabanalarga - Atlántico</p> <p>Capacitaciones Contratistas, ELS/ Comunidad: 5</p> <p>a. Capacitaciones ELS: 2 1.09/07/2022. Capacitación ELS - Gestión del Riesgo - Cto 080 -2019 Urbanización Nueva Esperanza Matanza Santander 2.14/07/2022 Fortalecimiento ELS - Urbanización Los Corales San Benito Abad C188-2016 - Gestión en crisis y mentalidad de crecimiento.</p> <p>b. Capacitaciones Comunitarias: 3 1.09/07/2022. Capacitación Comunitaria - Vulneración de Derechos - Cto 080 -2019 Urbanización Nueva Esperanza Matanza Santander 2.12/07/2022. Capacitación Comunitaria - Plan de Acción para la Sostenibilidad - Cto 079-2019 Urbanización San Francisco - Mallama Nariño 3.16/07/2022. Capacitación Comunitaria - Rutas de atención Cto 109 -2019 Urbanización Villa Gloria - Ancuya Nariño</p> <p>CORES: 1</p> <p>1.14/07/2022. Cores Cauca con los municipios de Sílvia, Timbio, Corinto, y Corporación Nassa Kiwe, con el objetivo de informar sobre la estrategia de adquisición de vivienda del Fondo Adaptación</p> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 3</p> <p>1.13-07-2022: Foro de 50% de avance IE Puerto Venecia En Achí Bolívar Contrato FA-IC-I-S-351-2019 del Consorcio Infraestructura Educativa 2019 FA-IC-I-S-108 - 2019, e interventoría DAIMCO 2.14-07-2022: Mesa de Trabajo con Comunidad de IE Puerto Venecia En Achí Bolívar Contrato FA-IC-I-S-351-2019 del Consorcio Infraestructura Educativa 2019 FA-IC-I-S-108 - 2019, e interventoría DAIMCO</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>3.14-07-2022: Mesa de trabajo con Comunidad Sede IE de Guaranda En Guaranda Sucre Contrato FA-IC-I-S-351-2019 del Consorcio Infraestructura Educativa 2019 FA-IC-I-S-108 – 2019, e interventoría DAIMCO</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 1</p> <p>1.25-07-2022 Reunión ELS San Benito, Sucre – Apropiación de capacidades</p> <p>SALUD</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 4</p> <p>1.12-07-2022: Mesa de Gestión Interinstitucional: Currulao Turbo, Contrato FA-IC-I-S-107-2018, Contratista Lopeca SAS Ingenieros e interventoría Ingeniería Master</p> <p>2.15- 07- 2022 Foro Final La Vega, Cauca – Hospital</p> <p>3.28-07-2022: Mesa de Gestión Interinstitucional con Alcaldía IPS Don Bosco En Currulao Turbo, Contrato FA-IC-I-S-107-2018, Contratista Lopeca SAS Ingenieros e interventoría Ingeniería Master</p> <p>4.19-07-2022 Mesa gestión interinstitucional Hospital Mahates Bolívar-Mahates Bolívar</p> <p>ACUEDUCTO</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 1</p> <p>08-07-2022 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Foro Final Samaniego (NAR)</p>
Agosto	<p>Participación Ciudadana: 18</p> <p>En el mes de agosto para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●AV acompañadas: 12 ●Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 5 ●CORES: 1 <p>●MATRIZ SEGUIMIENTOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN: Además, se adjunta como soporte matriz de seguimiento a los espacios de participación realizados por contratistas durante el mes de AGOSTO</p> <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>SUBGERENCIA DE REGIONES</p> <p>Capacitación contratistas: 1</p> <p>1. 24/08/2022 Taller no. 8 asociatividad y emprendimiento</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 3</p> <p>1. 08/08/2022. Mesa de Trabajo Comunitaria con Accionantes de Rosas Cauca en Popayán.</p> <p>2.25/08/2022. Mesa de Trabajo Comunitaria Urbanización Villa Campestre - Colón, Nariño - Beneficiarios Torre 8 - Convenio 012 de 2015.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>3. 26/08/2022. Socialización Comunitaria Urbanización Villa Campestre- Colón, Nariño - Entrega de 11 viviendas - Convenio 012 de 2015. Capacitaciones Contratistas, ELS/ Comunidad: 4</p> <p>a. Capacitaciones Contratistas.</p> <ul style="list-style-type: none"> •09/08/2022. Capacitación Política Social Fondo - Profesionales sociales del proyecto Urbanización Nuevo Achí – Bolívar <p>b. Capacitaciones ELS.</p> <ul style="list-style-type: none"> •20/08/2022. Capacitación ELS - Conformación ELS Cto 2017-C-153 Urb Nuevo Achí - Bolívar •24/08/2022. Capacitación ELS - Habilidades Ejecutivas como motor de Logros - C-188 DE 2016 Urb Corales - San Benito Abad - Sucre <p>c. Capacitación Comunitaria</p> <ul style="list-style-type: none"> •19/08/2022. Capacitación Comunitaria - Sostenibilidad Cto 079 -2019 Urb San Francisco Mallama <p>EDUCACIÓN</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> •08-08-2022: Socialización comunitaria Sede IE Compuertas de Manatí En manatí Atlántico, Contrato FA-IC-I-S-087-2019 con la firma Fernando Ramírez SAS. •16-08-2022: Socialización comunitaria Sede Comunal Agropecuario En el Banco Magdalena Contrato 107 de 2013, UT AB Construcciones 2014. •29-08-2022: Socialización comunitaria Sede IE Antonio Brujes Carmona En Santa Ana, contrato FA-IC-I-S-115-2019 con la nueva firma R y D Construcciones •29-08-2022: Socialización comunitaria Sede IE Nuestra Señora del Carmen Chimichagua Cesar, contrato FA-IC-I-S-115-2019 con la nueva firma R y D Construcciones <p>SALUD</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> •02-08-2022 Acompañamiento Foro Final Hospital Mahates Bolívar •03-08-2022: Mesa de Gestión Interinstitucional IPS Don Bosco- Virtual, Contrato FA-IC-I-S-107-2018, Contratista Lopeca SAS Ingenieros e interventoría Ingeniería Master. •19-08-2022: Mesa de Gestión Interinstitucional con Alcaldía IPS Don Bosco - Virtual, Contrato FA-IC-I-S-107-2018, Contratista Lopeca SAS Ingenieros e interventoría Ingeniería Master. •22-08-2022: Socialización Comunitaria Hospital de Puerto Tejada - En Puerto Tejada Cauca, Contrato 251 de 2017, Contratista Consorcio Tadeo ESE Norte 3 e interventoría Gustavo Adolfo Torres Duarte. •30-08-2022: Foro Final Hospital de Puerto Tejada - Virtual, Contrato 251 de 2017, Contratista Consorcio Tadeo ESE Norte 3 e interventoría Gustavo Adolfo Torres Duarte. <p>CORES: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •04-08-2022 Departamento: Nariño Hospital Magúí Payán
Septiembre	<p>Participación Ciudadana: 27</p> <p>En el mes de septiembre para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> ●AV acompañadas: 10 ●Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 17 <p>●MATRIZ SEGUIMIENTOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN: Además, se adjunta como soporte matriz de seguimiento a los espacios de participación realizados por contratistas durante el mes de SEPTIEMBRE</p> <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ●09/09/2022. Mesa de trabajo Comunitaria Urb San Jorge Ospina, Nariño ●08/09/2022. Reunión seguimiento ELS Urb San Jorge Ospina, Nariño ●30/09/2022. Mesa de Gestión Interinstitucional Alcaldía de Popayán y Veedores ciudadanos- Proyecto Urbanización Villa Gracia. <p>Capacitaciones Contratistas, ELS/ Comunidad: 5</p> <p>a. Capacitaciones Contratistas. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ●27/09/2022. Capacitación Profesionales Sociales - Plan de Acción para la Sostenibilidad <p>b. Capacitaciones ELS. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ●23/09/2022 capacitación – Economía Solidaria Urbanización Los Corales – San Benito Abad – Sucre Cto 188-2019 <p>c. Capacitación Comunitaria. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ●21/09/2022 capacitación Comunitaria Urbanización Nuevo Achí – Bolívar - Encuentro con mis vecinos ●16/09/2022 capacitación Comunitaria Urbanización Nuevo Achí – Bolívar - Plan de vida familiar ●02/09/2022 capacitación Comunitaria Urbanización Nuevo Achí – Bolívar - Seguridad en casa
<p>Política de Interacción y Sostenibilidad Social (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales), implementada</p>	
<p>Enero</p>	<p>En el mes de enero para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comités de seguimiento: 10 - Acercamiento con comunidad/conceptos sociales: 1 - Cierres social acueducto: 1
<p>Febrero</p>	<p>En el mes de febrero para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Comités de seguimiento: 17 ● Acercamiento con comunidad/conceptos sociales: 2

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de gestión social – vivienda: 1
Marzo	<p>En el mes de marzo para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comités de seguimiento: 20 - Acercamiento con comunidad/conceptos sociales: 8 - Plan de gestión social – salud: 1 - Cierres Sociales sector vivienda: 2 - Cierres Sociales sector educación: 3 <p>En el repositorio de seguimiento al Plan de Acción se evidencia el detalle por cada uno de los comités o acercamientos con la comunidad de los sectores o macroproyectos, realizados.</p>
Abril	<p>Política de Gestión Social: En el mes de ABRIL para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron: 29 ACTIVIDADES, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comités de seguimiento: 20 • Plan de gestión social – educación: 1 • Plan de gestión social – acueducto: 1 • Cierres Sociales sector vivienda: 5 • Cierres Sociales sector – acueducto: 2 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>VIVIENDA Comités de Seguimiento: 14 Cierres sociales - vivienda: 5</p> <p>SALUD Comité de seguimiento social: 1</p> <p>MOJANA Comité de seguimiento social: 2</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES Comités de seguimiento: 2</p> <p>EDUCACIÓN Comité de seguimiento social: 1 Plan de Gestión social: 1</p> <p>ACUEDUCTO Plan de gestión social: 1 Cierres sociales: 2</p> <p>En el repositorio de seguimiento al Plan de Acción se evidencia el detalle por cada uno de los comités o acercamientos con la comunidad, de los sectores o macroproyectos, realizados.</p>
Mayo	Política de Gestión Social: 44

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>En el mes de MAYO para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizó el cumplimiento de las siguientes metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comités de seguimiento: 24 • Plan de gestión social – apropiación: 1 • Plan de gestión social – salud: 1 • Plan de gestión social – acueducto: 1 • Cierres Sociales sector vivienda: 16 • Cierres Sociales sector – educación: 1 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>VIVIENDA Comités de Seguimiento: 15 Cierre de Gestión Social: 16</p> <p>COMFAGUAJIRA (3), COMFENALCO SANTANDER (10) y COMFACESAR (3)</p> <p>SALUD Comités de seguimiento social: 7 Planes De Gestión Social: 1</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES Comités de seguimiento social: 1 Planes De Gestión Social: 1</p> <p>EDUCACIÓN Cierres Sociales: 1</p> <p>ACUEDUCTO Comités de seguimiento social: 1 Planes De Gestión Social: 1</p> <p>En el repositorio de seguimiento al Plan de Acción se evidencia el detalle por cada uno de los comités o acercamientos con la comunidad, de los sectores o macroproyectos, realizados.</p>
Junio	<p>Política de Gestión Social: 31</p> <p>En el mes de JUNIO para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comités de seguimiento: 18 • Acercamiento con comunidad: 1 • Cierres Sociales sector – educación: 4 • Cierres sociales sector – vivienda: 7 • Cierre sociales sector – Jarillón: 1 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>VIVIENDA Comités de Seguimiento: 10 Acercamiento con comunidad: 1 Cierre de Gestión Social: 7 (Comfenalco Santander: 3, Proyectos Compraventa: 4)</p> <p>SALUD Comités de seguimiento social: 5</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES Comités de seguimiento social: 1</p> <p>EDUCACIÓN Comités de Seguimiento Social: 2</p> <p>JARILLON Cierre social: 1</p> <p>En el repositorio de seguimiento al Plan de Acción se evidencia el detalle por cada uno de los comités o acercamientos con la comunidad, de los sectores o macroproyectos, realizados.</p>
Julio	<p>Política de Gestión Social: 17</p> <p>En el mes de JULIO para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Comités de seguimiento: 13 ●Cierres Sociales sector – acueducto: 1 ●Cierres Sociales sector – vivienda: 2 ●Plan de gestión social – salud: 1 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Comités de Seguimiento: 8 reuniones virtuales</p> <p>1.01/07/2022. Seguimiento social a proyecto de vivienda de compraventa Cto.152-2021 del municipio de Uribia - Guajira. 2.07/07/2022. Seguimiento Gestión Social Proyectos Sector Vivienda en Nariño, Sucre, Santander y Achí. 3.07/07/2022. Seguimiento Gestión Social Proyectos Sector Vivienda en Sucre 4.07/07/2022. Seguimiento Gestión Social Proyectos Sector Vivienda en Achí - Bolívar 5.14/07/2022. Seguimiento Gestión Social Proyectos Sector Vivienda en Nariño. 6.15/07/2022. Seguimiento Gestión Social Proyectos Sector Vivienda en Sucre. 7.19/07/2022. Seguimiento Entrega de viviendas Urbanización Villa Tiburón en Tenerife - Magdalena 8.25/07/2022. Seguimiento Técnico y social proyecto contrato 176 de 2022 Urbanización Villa Gracia en Popayán - Cauca 100 viviendas.</p> <p>Cierre de Gestión Social: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Comfenalco Santander 187-0748-VIVIENDA CUCUTA-ESTORAQUES-001 – 280 Beneficiarios ●Comfenalco Santander San Fernando del Rodeo 002, Cúcuta. <p>SALUD</p> <p>Comités de seguimiento social: 4</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> •2 comités de seguimiento Social con los profesionales de Contratista e interventoría del proyecto, Contrato FA-IC-I-S-107-2019 IPS Don Bosco 06-07-2022 y el 25-07-2022 •2 comités de Seguimiento Social con las profesionales Sociales de Contratista e interventoría Contrato 251 de 2017 Hospital de Puerto Tejada 18-07-2022 y 26-07-2022 <p>Plan de gestión social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •25/07/2022 Hospital Magüí Payán Nariño – aprobación plan de gestión social <p>EDUCACIÓN</p> <p>Comités de Seguimiento Social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •27-07-2022: Comité de Seguimiento Social IE de Guaranda en Sucre e IE Puerto Venecia en Achí Bolívar, Contrato FA-IC-I-S-351-2019 Contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e Interventoría DAIMCO. <p>ACUEDUCTO</p> <p>Cierre Social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Samaniego (NAR)
Agosto	<p>Política de Gestión Social: 38</p> <p>En el mes de AGOSTO para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comités de seguimiento: 18 • Cierres Sociales sector – educación: 1 • Cierres Sociales sector – vivienda: 16 • Cierres Sociales sector – salud: 1 • Plan de gestión social – acueducto: 2 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES</p> <p>Comités de seguimiento social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •05-08-2022 Acompañamiento socioeconómico San Benito, Sucre <p>VIVIENDA</p> <p>Comités de Seguimiento: 11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 04/08/2022. Seguimiento técnico y social a proyectos de vivienda en Nariño 2. 04/08/2022. Seguimiento técnico y social a proyectos de vivienda en Achí - Bolívar 3. 05/08/2022. Seguimiento social al proyecto de Linares - Nariño Cto 067 de 2019. 4. 11/08/2022. Seguimiento social a proyectos de vivienda en Sucre 5. 11/08/2022. Seguimiento social y técnico proyectos de compraventa Nariño Cto. 067 de 2020 - UT Techos Nariño. 6. 11/08/2022. Seguimiento social y técnico proyectos de Ospina y Ancuya 7. 16/08/2022. Seguimiento social Proyecto Ospina Cto 098/2019 8. 18/08/2022. Seguimiento social a proyectos de vivienda en Nariño 9. 18/08/2022. Seguimiento social a proyectos de vivienda en Sucre

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>10.19/08/2022. Seguimiento social Proyecto Ospina Cto 098/2019 11.25/08/2022. Seguimiento al contrato 107 del 2021- Popayán, Cauca. Proyecto María Gracia</p> <p>Cierre de Gestión Social: 16</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 8-187-1-0709-002-VIVIENDA-LINARES-Urbanización-Nuevo-Amanecer - 88 Viviendas - 05/08/2022. - COMFENALCO VALLE 2. 8-187-1-0726-001 - SAN ANDRÉS DE TUMACO-Senderos de la Ceiba - Etapa I y II - 170 Viviendas - 05/08/2022. - COMFENALCO VALLE 3. PI 187-0623-VIVIENDA URIBIA-RECONSTRUCCIÓN EN SITIO IRRAIPIA-016 - 90 Viviendas. -10/08/2022 - COMFAGUAJIRA 4. 187-0619-VIVIENDA MAICAO-BRISAS DEL PARRANTIAL-004 - 95 Viviendas. - 10/08/2022 - COMFAGUAJIRA 5. 8-187-1-0176 VIVIENDA CALAMAR VILLA ALICIA 002 - 43 Viviendas -16/08/2022 - COMFENALCO CARTAGENA 6. 187-0176-VIVIENDA CALAMAR - RECONSTRUCCIÓN CALAMAR 02 001- 41 Viviendas- 16/08/2022 - COMFENALCO CARTAGENA 7.INTERVENCIÓN DIRECTA - CALDAS - CTO. 175 DE 2016 - FEDETABACO - Pensilvania, Caldas 8.INTERVENCIÓN DIRECTA - CALDAS - CTO. 175 DE 2016 - FEDETABACO - Villamaría, Caldas 9.INTERVENCIÓN DIRECTA - CALDAS - CTO. 175 DE 2016 - FEDETABACO - Supía, Caldas 10.INTERVENCIÓN DIRECTA - CALDAS - CTO. 175 DE 2016 - FEDETABACO - Aguadas, Caldas 11.INTERVENCIÓN DIRECTA - CALDAS - CTO. 175 DE 2016 - FEDETABACO - Aranzazu, Caldas 12.CONTRATO 2016-C-0227 - San Marcos - Sucre -26 viviendas 13.CONTRATO 2016-C-0227 - Caimito Sucre - 19 viviendas. 14.CONTRATO 2016-C-0227 - San Benito - Sucre - 270 viviendas. 15. CONTRATO Compraventa 2019-C-329 - Coello Tolima Urbanización Villa Paz 16. CONTRATO Compraventa 2020-C-177 - Dosquebradas Caldas - Urbanización Molinitos I - 20 viviendas. <p>SALUD</p> <p>Comités de seguimiento social: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> •2 comités de seguimiento Social con los profesionales de Contratista e interventoría del proyecto, Contrato FA-IC-I-S-107-2019 IPS Don Bosco 02-08-2022 y el 11-08-2022 •2 comités de Seguimiento Social con las profesionales Sociales de Contratista e interventoría Contrato 251 de 2017 Hospital de Puerto Tejada 03-08-2022 y 10-08-2022 <p>Cierre Social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •31-08-2022: Cierre social y paz y salvo del Centro de Salud de Guaranda, en Guaranda Sucre, Contrato 092 de 2017, Contratista OME 3A SAS e interventoría Grupo ARCA. <p>EDUCACIÓN</p> <p>Comités de Seguimiento Social: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> •11-08-2022: Comité de Seguimiento Social IE de Guaranda en Sucre e IE Puerto Venecia en Achí Bolívar, Contrato FA-IC-I-S-351-2019 Contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e Interventoría DAIMCO.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> •16-08-2022: Comité de Seguimiento Social IE Luz Marina Caballero Sede ERM Bellavista, en Concordia Magdalena Contrato FA-IC-I-S-108-2019 Contratista Fernando Ramírez SAS e interventoría Consorcio Intermagdalena. <p>Cierre Social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •31-08-2022: Cierre social y paz y salvo de la Sede Centro Educativo Básico Ampliado de Bomba, en Pedraza Magdalena, Contrato FA-IC-I-S-108-2019 Contratista Fernando Ramírez SAS e interventoría Consorcio Intermagdalena. <p>ACUEDUCTO</p> <p>Plan de gestión social: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> •31/08/2022 acueducto - Curundó (Chocó) C 001 - 2021 •31/08/2022 acueducto - Juntas de Tamaná (Chocó) C 001 - 2021
Septiembre	<p>Política de Gestión Social: 20</p> <p>En el mes de SEPTIEMBRE para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comités de seguimiento: 14 • Cierres Sociales sector - vivienda: 4 • Acercamiento con comunidad: 2 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES</p> <p>Comités de seguimiento social: 1</p> <p>-26-09-2022 ASE --San Benito Sucre</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Comités de Seguimiento: 9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.01092022. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Achí Bolívar 2.01092022.Reunión seguimiento Social Sector Vivienda Nariño 3.01092022. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda Sucre 4.15092022. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Achí Bolívar 5.15092022. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda Nariño 6.15092022. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda Sucre 7.08092022. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Boavita Boyacá 8.22092022. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Achí Bolívar 9.29092022. Reunión seguimiento Social Sector Vivienda - Achí Bolívar <p>Cierre de Gestión Social: 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cierre de Gestión Social y Paz y salvo Villas de San Pablo II Barranquilla 2. Cierre de Gestión Social y Paz y salvo Reconstrucción en sitio Candelaria 3. Cierre de Gestión Social y Paz y salvo Soledad - Urbanización Nueva Esperanza 4. Cierre de Gestión Social y Paz y salvo Urbanización Nueva Ilusión Malambo <p>Acercamiento con la Comunidad: 2</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>1.07092022. Mesa de gestión interinstitucional y comunitaria Montecristo, Bolívar. - Mixta.</p> <p>2.30092022. Mesa de Gestión Interinstitucional Alcaldía de Popayán y Veedores ciudadanos- Proyecto Urbanización Villa Gracia. - Presencial</p> <p>SALUD</p> <p>Comités de seguimiento social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ●08-09-2022 Hospital Magüí Payán Nariño <p>EDUCACIÓN</p> <p>Comités de Seguimiento Social: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ●19-09-2022: Comité de Seguimiento Social IE Antonio Brujes Carmona, en Santa Ana Magdalena y la IE Nuestra Señora del Carmen, en Chimichagua Cesar, del Contrato FA-IC-I-S-108-2019 Contratista R y D Construcciones e interventoría Consorcio Interventorías Civiles. ●19-09-2022: Comité de Seguimiento Social IE de Guaranda en Sucre e IE Puerto Venecia en Achí Bolívar, Contrato FA-IC-I-S-351-2019 Contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019 e Interventoría DAIMCO. <p>ACUEDUCTO</p> <p>Comités de Seguimiento Social: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ●03/09/2022 Consorcio Nóvita 2021
<p>Seguimientos a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, realizados</p>	
<p>Enero</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – enero 2022- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en dos foros finales de auditorías visibles del sector educación. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación comunitaria, capacitación ELS, foro final, foro seguimiento, mesas de gestión interinstitucional, mesa de trabajo con comunidad, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 22 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
<p>Febrero</p>	<p>En esta oportunidad – febrero 2022- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en un foro inicial de auditorías visibles del macroproyecto Jarillion. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>participación como:</p> <p>Capacitación comunitaria, capacitación ELS, foro seguimiento, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 33 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
Marzo	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – MARZO 2022- se cuenta con 17 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Educación, Salud, Acueducto y Vivienda. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación comunitaria, capacitación ELS, foro seguimiento, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 89 espacios de participación donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p> <p>La relación de las temáticas sobre las que se han realizado sugerencias o recomendaciones se encuentran disponibles en el repositorio de seguimiento al Plan de Acción.</p>
Abril	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – ABRIL 2022- se cuenta con 20 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Educación, Salud, Vivienda y Macroproyecto La Mojana. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación comunitaria, capacitación ELS, foro seguimiento, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 37 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación, dentro de las que se encuentran. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
Mayo	<p>Para el mes de mayo se cuenta con 9 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Educación, Salud, Vivienda, Apropiación de capacidades y Agua. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>participación como capacitación comunitaria, capacitación ELS, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 37 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación, donde se destaca la reiteración frente a la importancia de socializar con anticipación las fechas de entrega de las obras o los cambios de fecha cuando un proyecto no se puede entregar a tiempo. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
Junio	<p>En esta oportunidad – JUNIO 2022- se cuenta con 11 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Educación, Acueducto, Salud, Vivienda. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como capacitación comunitaria, capacitación ELS, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 19 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
Julio	<p>OPORTUNIDADES DE MEJORA - En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – JULIO 2022- se cuenta con 117 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Educación, Salud y Macroproyecto Jarillón de Cali. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación comunitaria, capacitación ELS, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 16 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación, dentro de las que cabe resaltar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informar a los beneficiarios y la comunidad en general cómo va el avance de las obras • Continuar las capacitaciones con temas de interés para la comunidad para fortalecer más los conocimientos y ponerlos en práctica en su comunidad. • Recordar en todos los talleres la importancia del buzón de PQRSFD con el fin de mantener activa a la comunidad • Involucrar a los estudiantes de las instituciones en más actividades comunitarias relacionadas con la obra.
Agosto	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – AGOSTO 2022- se cuenta con 321 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Vivienda, Educación, Salud, Acueducto y Macroproyecto</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Jarillón de Cali. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación comunitaria, capacitación ELS, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 44 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación, dentro de las que cabe resaltar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los talleres de la caja de herramientas han sido bien recibidos por las comunidades siendo reiterativo el comentario de darle continuidad a los talleres ya que estos fortalecen las comunidades desde su cuerpo educativo y comunitario, por ejemplo: "Los asistentes a la capacitación mostraron su agradecimiento y empatía durante el desarrollo del tema, ya que el tema le resulto muy dinámico e importante para aprender a conocer y manejar las emociones que experimentan cuando se enfrenta algún conflicto." • Revisar el funcionamiento de los ELS y si las personas han estado acompañando realmente a las comunidades desde su liderazgo, por otro lado, es clave que los ELS se queden con una copia de las actas de los espacios de participación realizados. • Dar respuesta sobre qué va a hacer el FA con las casas deshabitadas y los proyectos que no han cumplido en el pago de trabajadores, se solicita informar avances de la obra oportunamente, seguir manteniendo los canales de información. • Realizar seguimiento a los compromisos sobre el acuerdo de pago con EPM, atender de manera oportuna las solicitudes de pago de la ciudadanía que prestó labores al interior del proyecto. / Brindar solución ante las quejas o peticiones de la comunidad. • Revisar el manejo de los residuos de las construcciones. • Terminar los proyectos en los tiempos estipulados, contar con buenos profesionales y mejorar la presencia de las profesionales sociales en campo, que el contratista le pague a las personas puntual.
Septiembre	<p>OPORTUNIDADES DE MEJORA - En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – SEPTIEMBRE 2022- se cuenta con 392 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Vivienda, Educación, Salud, Apropiación. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación comunitaria, foros. capacitación ELS, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 32 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación, dentro de las que cabe resaltar:</p> <p>Se evidencia que en el sector educación se ha estado implementando la caja de herramientas diseñada por la Subgerencia de Regiones, y esto ha creado vínculos con la comunidad educativa, pero además las profesionales sociales en campo se sienten muy motivadas a trabajar, los comentarios recogidos en las sugerencias de la comunidad son positivos solicitando más espacios de formación para fortalecer los conocimientos de la ciudadanía</p> <p>IE Sede Nuestra Señora del Carmen</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Convocar una reunión con el señor alcalde de Chimichagua, para tratar de buscar solución a la situación del puente, por parte de las firmas contratistas y la comunidad.</p> <p>La comunidad sugiere que el proceso de selección del personal se realice a través de sorteos, con las hojas de vida que cumplan el perfil requerido por el contratista. Para tener más transparencia en el proceso.</p> <p>IE Sede Antonio Brujes Carmona</p> <p>Ser transparentes en los procesos de contratación. Cumplir con los acuerdos que se establezcan con la comunidad y el personal en obra.</p> <p>1. Que se mantengan informados a los integrantes del ELS de las actividades o acciones a desarrollar en el proyecto, así mismo las novedades. 2. Que la apertura de cuentas bancarias a los trabajadores y proveedores de la obra, sean con bancos que tengan sucursales cercanas a la zona de Jaraba, para evitar que tengan que trasladarse hasta municipios o ciudades lejanas y así evitar situaciones de riesgos que se puedan presentar.</p> <p>Construcción Hospital de Magüí Payán Nariño - Incrementar el personal de obra</p> <p>Macroproyecto Jarillón de Cali</p> <p>En el Servicio de Energía Eléctrica - Celsia: la integrante del equipo Francisca Alvarado, manifiesta que los recibos aún aparecen con estrato 3, por lo que solicita nuevamente se avise a la constructora y a la empresa prestadora del servicio, que se haga seguimiento a la facturación, ya que, de acuerdo a lo manifestado por el municipio en la resolución de estratificación, al mes siguiente de su expedición, es decir JULIO, deberían quedar todos los servicios con tarifas estrato 1.</p> <p>Convivencia: las asistentes miembros del ELS, ponen en conocimiento que se vienen presentando diferentes conflictos que afectan la sana convivencia entre los vecinos. Por lo que solicitan al equipo de la UT, reforzar la sensibilización en las jornadas y mesas de trabajo, frente a los temas como el uso de las zonas comunes, el uso adecuado de la unidad de almacenamiento de basuras, arrojar basura desde pisos superiores y música a niveles muy altos, entre otros.</p>

- Área Gerencia – Equipo de Comunicaciones

A través del Equipo de Comunicaciones se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Comunicaciones, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS y PARTICIPACIÓN CIUDADANA las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

Esta intervención se ejecuta a través de las estrategias de: (i) Comunicaciones externas, (ii) Comunicaciones externas y, (iii) Transparencia activa. Los indicadores, metas y distribución trimestral de metas de Comunicaciones se detallan a continuación:

Portafolio/Programa/Proyecto: **COMUNICACIONES**

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Gerente de Meta: Asesor Equipo Comunicaciones

Objetivo Estratégico 2018-2022 #5		Fortalecer La Capacidad De Gestión, Uso Y Apropiación De La Información Institucional					
Acciones Estratégicas 2022 Programas/Proyectos/Actividades/Hitos	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Participar en la celebración del día de la transparencia, de acuerdo con el cronograma establecido por el líder sectorial	Participación en la celebración del día de la transparencia	1	-	-	-	1	N.A.
Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas 365 de la Entidad	Índice de rendición de cuentas la gestión Pública, espacios virtuales y presenciales de diálogo con la ciudadanía	6	-	-	3	3	0
Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación	Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa	2916	729	729	729	729	6.128
Fortalecer la estrategia de comunicación interna para satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y potencializar el trabajo en equipo	Acciones, contenidos y productos desarrollados en la estrategia de comunicación interna de la entidad	1008	252	252	252	252	762
Ejecutar institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 2015	12	3	3	3	3	9

PAAC-2022: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2022 (Decreto 612/2018).
 PES-2022: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2022" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Mes	Avance Cualitativo
Participación en la celebración del día de la transparencia	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte
Índice de rendición de cuentas la gestión Pública, espacios virtuales y presenciales de diálogo con la ciudadanía	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No existe registro para el periodo
Agosto	No existe registro para el periodo
Septiembre	No existe registro para el periodo
Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa	
Enero	<p>Durante el mes de enero se diseñaron y publicaron 46 piezas informativas para mantener informados a los colaboradores de temas como: socialización del Plan de Acción 2022, formatos para pagos, circulares, plazos de radicación y capacitaciones, entre otros.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 33 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones, 2 piezas de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos" y la realización de 2 videos internos.</p> <p>Así mismo, y como parte de la estrategia que busca fortalecer los canales internos, durante esta vigencia, se realizaron acciones de mejora para actualizar y modernizar la intranet AdaptaNET, además se publicaron 3 slides y 3 notas informativas.</p>
Febrero	<p>Durante el mes de febrero el Equipo de Trabajo de Comunicaciones diseñó y publicó, a través de los diferentes canales internos, 89 piezas informativas, como parte de la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo mantener informados a los colaboradores en temas como: circulares, resoluciones, actualización de formatos, plazos de radicación y capacitaciones, entre otros.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 52 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones, 5 piezas de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos", la realización de 4 videos internos y 3 contenidos generales para pantallas.</p> <p>Así mismo, y como parte de la estrategia que busca fortalecer los canales internos, durante esta vigencia, se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación de 6 slides y 7 notas informativas. Adicionalmente, se realizó el lanzamiento del boletín quincenal "El Fondo en los Medios" del que se socializó la primera edición (1) en el mes de febrero. Se tomaron fotografías de (4) actividades internas y se realizaron (7) acciones de mejora en la intranet.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral, durante el mes de marzo el E. T. de Comunicaciones diseñó y publicó, a través de los diferentes canales internos, 120 piezas informativas, para la divulgación de: circulares, resoluciones, actualización de formatos, plazos de radicación y capacitaciones, entre otros.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 66 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones, 2 piezas de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos", la realización de 2 videos internos y 5 contenidos para la actualización de pantallas.</p> <p>Durante esta vigencia, se continuó trabajando en el fortalecimiento de canales internos, por esta razón se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación de 8 slides y 15 notas informativas. Adicionalmente, se enviaron (2) boletines quincenales "El Fondo en los Medios". Se tomaron fotografías de (4) actividades internas, se realizaron (6) acciones de mejora en la intranet y se realizó apoyo gráfico en el ajuste de (10) presentaciones para gerencia.</p>
Abril	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación externa que busca socializar con la ciudadanía los avances de la gestión de la Entidad, en el mes de abril, se redactaron y publicaron nueve (9) comunicados de prensa y (192) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (214) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron dos (2) galerías fotográficas y se realizaron cuatro (4) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de los públicos de interés.</p>
Mayo	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación externa de la entidad, durante el mes de mayo se redactó y publicó seis (6) comunicados de prensa y (163) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (390) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron once (11) galerías fotográficas y se realizaron (18) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de los públicos de interés.</p>
Junio	<p>Durante el mes de junio, se redactó y publicó diez (10) comunicados de prensa y (191) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (498) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron ocho (8) galerías fotográficas y se realizaron nueve (9) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de los públicos de interés.</p>
Julio	<p>En el mes de julio, se redactó y publicó en la página web de la Entidad (10) comunicados de prensa y (171) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (1.004) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron ocho (8) galerías fotográficas y se realizaron quince (15) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.</p>
Agosto	<p>En agosto, se alcanzó un avance de 1.266 unidades en el indicador de comunicación externa, a partir de la ejecución de cinco acciones enfocadas a la divulgación de información relacionada con los avances y la gestión que realiza la entidad. Es así como durante esta vigencia se redactaron y publicaron en la página web cinco (5) comunicados de prensa y (133) mensajes en redes sociales. Esa información noticiosa</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (1.121) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron tres (3) galerías fotográficas y se realizaron (4) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.
Septiembre	En el mes de septiembre, se redactó y publicó en la página web de la Entidad dos (2) comunicados de prensa y (95) mensajes en redes sociales del Fondo con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés, esa información noticiosa también fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (1.000) noticias positivas y neutras.
Acciones, contenidos y productos desarrollados en la estrategia de comunicación interna de la entidad	
Enero	<p>La estrategia de comunicación externa tiene como objetivo mantener informados a los beneficiarios y a la comunidad en general respecto a los avances de los proyectos y la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto.</p> <p>Las acciones ejecutadas durante el mes de enero corresponden a la redacción y publicación de seis (6) comunicados de prensa y (138) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (93) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron cuatro (4) galerías fotográficas y se realizaron siete (7) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.</p>
Febrero	Las acciones ejecutadas durante el mes de febrero corresponden a la redacción y publicación de diez (10) comunicados de prensa y (254) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (126) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron seis (6) galerías fotográficas y se realizaron ocho (8) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.
Marzo	Las acciones ejecutadas en marzo, como parte de la estrategia de comunicación externa de la entidad, corresponden a la redacción y publicación de (6) comunicados de prensa y (111) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (56) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron (2) galerías fotográficas y se realizaron (5) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.
Abril	<p>Durante esta vigencia se realizaron varias actividades de socialización de contenidos internos con el propósito de mantener informados a los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral. En ese sentido, en abril se diseñaron y publicaron, a través de los diferentes canales internos (mail institucional, pantallas digitales e intranet), 73 piezas informativas, para la divulgación de: circulares, resoluciones, actualización de formatos, plazos de radicación y capacitaciones, entre otros.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 38 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones, 2 piezas de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos", la realización de 1 video interno y 4 contenidos para la actualización de pantallas.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Así mismo, se continuó trabajando en el fortalecimiento de la intranet AdaptaNET con la publicación de contenido relevante y noticioso a través de: 6 slides y 11 notas informativas. Adicionalmente, se enviaron a los correos de los colaboradores (2) boletines quincenales "El Fondo en los Medios". Se tomaron fotografías de (1) actividad interna, se realizaron (2) acciones de mejora en la intranet, se realizó el apoyo de (6) slides en presentaciones para gerencia y se realizó el apoyo en la difusión de dos (2) campañas a nivel interno.</p>
<p>Mayo</p>	<p>Como parte de la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral, en mayo se diseñó y publicó, a través de los diferentes canales internos, 90 piezas informativas, para la divulgación de: circulares, resoluciones, actualización de formatos, plazos de radicación y capacitaciones, entre otros.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 53 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones, 1 pieza de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos", la realización de 1 video interno y 4 contenidos para la actualización de pantallas.</p> <p>Durante esta vigencia, se continuó trabajando en el fortalecimiento de canales internos, por esta razón se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación de 7 slides y 11 notas informativas. Adicionalmente, se enviaron (2) boletines quincenales "El Fondo en los Medios". Se tomaron fotografías de (3) actividades internas, se realizó (1) acción de mejora en la intranet, se realizó el apoyo en el ajuste de (6) slides en presentaciones para gerencia y se realizó el apoyo en la difusión de una (1) campaña a nivel interno.</p>
<p>Junio</p>	<p>Durante la vigencia del 1 al 30 de junio se diseñó y publicó, a través de los diferentes canales internos, 70 piezas informativas como parte de la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 41 mailings para socializar circulares, lineamientos, circulares, resoluciones, formatos y capacitaciones, entre otros. Así mismo, se elaboraron 1 pieza de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos", 1 video interno y 3 contenidos para la actualización de pantallas. En junio, se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación de 6 slides y 12 notas informativas. Adicionalmente, se envió (1) boletín de "El Fondo en los Medios". Se realizaron (2) acciones de mejora en la intranet. Se realiza el ajuste a nivel de diseño de (2) dos presentaciones para gerencia.</p>
<p>Julio</p>	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación interna, durante el mes de julio se diseñó y publicó 76 piezas gráficas para mantener informados a los colaboradores de temas como: el informe de gestión 2018-2022, la campaña de expectativa Data Fondo, circulares, plazos de radicación y capacitaciones en el gestor documental, entre otros. El material gráfico corresponde a: 40 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones; 2 piezas de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos" y la realización de 2 videos internos.</p> <p>Así mismo, y como parte de la estrategia que busca fortalecer los canales internos, durante esta vigencia, se realizó 1 acción de mejora para actualizar y modernizar la intranet AdaptaNET, se publicaron 7 slides, 9 notas informativas, 3 pantallas internas semanales, 3 álbumes internos de fotografías, 3 mailings con las principales noticias del Fondo Adaptación y 5 ajustes a presentaciones internas.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	Adicionalmente, la oficina de comunicaciones apoyó de manera transversal al área de Gestión Documental en la definición del nombre, imagen y estrategia de divulgación del nuevo gestor de contenido Data Fondo.
Agosto	<p>Como parte de la estrategia de comunicación interna, en agosto se diseñó y publicó 100 piezas informativas para mantener informados a los colaboradores de temas como: instructivo para utilizar Data Fondo, circulares, plazos de radicación y capacitaciones en el gestor documental, entre otros.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 52 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones; 2 piezas de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos" y la realización de 2 videos internos.</p> <p>Para fortalecer los canales internos, se realizaron 2 acciones de mejora en la intranet AdaptaNET, se publicaron 8 slides, 21 notas informativas, 4 actualizaciones de pantallas (Carteleras Digitales), se apoyó en la toma de fotografías en 2 actividades internas y se socialización 2 boletines semanales con noticias de la Entidad (Entérate).</p> <p>La oficina de comunicaciones apoyó de manera transversal a las áreas de Gestión Documental y Tecnologías para el desarrollo editorial en cuanto a la divulgación y pedagogía del nuevo gestor de contenido Data Fondo, elaboración de los fondos de pantalla para los equipos de los colaboradores y campaña de seguridad informática.</p>
Septiembre	<p>Durante la vigencia del 1 al 30 de septiembre se diseñó y publicó, a través de los diferentes canales internos, 96 piezas informativas como parte de la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 51 mailings para socializar circulares, lineamientos, circulares, resoluciones, formatos y capacitaciones, entre otros. Así mismo, se elaboró 1 pieza de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos", 7 videos internos y 4 contenidos para la actualización de pantallas.</p> <p>Además, se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación de 4 slides y 14 notas informativas, se tomaron fotografías de 5 actividades internas y se realizaron 2 acciones de mejora en la intranet. Se realizó el ajuste y actualización de 8 presentaciones internas y se realizó el apoyo a una campaña de divulgación referente a la Semana de la Salud.</p>
Realizar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015	
Enero	Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de enero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).
Febrero	Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de febrero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de marzo se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p>
Abril	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de abril se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de abril se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sqB5j0. El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de abril se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3NF0neR</p>
Mayo	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de mayo se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de mayo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sqB5j0 . El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de mayo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3M8obHv</p>
Junio	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de junio se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de junio se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sqB5j0 El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de junio se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3yIeNXz .</p>
Julio	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de julio se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de julio se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sqB5j0</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de julio se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3d8HK72</p>


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Agosto	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de agosto se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de agosto se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sqB5J0</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de agosto se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3BgGA2D</p>
Septiembre	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de septiembre se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de septiembre se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sqB5J0</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de septiembre se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3yfdjDE</p> <p>De igual forma se ajustaron espacios en la web en cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA de la Procuraduría, así como a los lineamientos dados en los Anexos de la Resolución 1519 de 2020.</p>

- Área Oficina de Planeación y Cumplimiento

La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Gestión del Conocimiento, Arquitectura Organizacional vista desde los procesos y la tecnología, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño, gestión del conocimiento y la innovación, fortalecimiento institucional y simplificación de procesos y gobierno digital, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública. Así mismo a través de este equipo se realiza la gestión y seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión y al presupuesto relacionado, se hace un seguimiento y acompaña a las áreas en todos los procesos de auditoría, tanto los realizados por la Contraloría General de la República, como el acompañamiento a la ejecución de la Auditoría Técnica Integral y Preventiva – ATIP.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

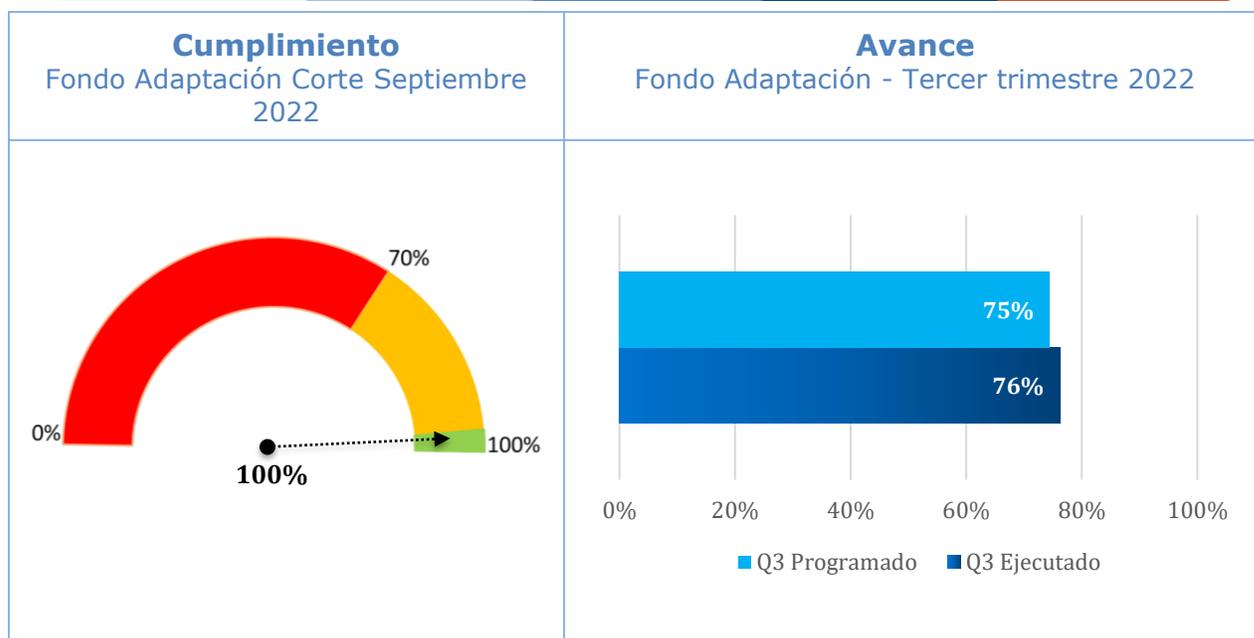

Portafolio/Programa/Proyecto: **PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Gerente de Meta: Jefe de la Oficina de Planeación y Cumplimiento

Objetivo Estratégico 2018-2022 #3	Generar, Gestionar Y Transferir Conocimiento Técnico, Orientado A Reducir La Vulnerabilidad De La Nación Y De Los Países De La Región, Ante Riesgos De Cambio Climático						
Objetivo Estratégico 2018-2022 #6	Modernizar Y Fortalecer El Funcionamiento Del Fondo Adaptación Con Visión De Largo Plazo						
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar la Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG)*	Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG), ejecutada	100%	20%	20%	30%	30%	65
Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del FURAG de la vigencia 2021 PES-2022	Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021 en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	1	-	-	-	1	1
Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación PES-2022	Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación	1	-	-	-	1	1
Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad	Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado	100%	20%	20%	30%	30%	70

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Ejecutar la Estrategia de Gestión de Riesgos PAAC-2022	Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada	100%	25%	25%	25%	25%	70
Participar en la cuarta semana de gestión del conocimiento y la Innovación organizada por el Ministerio de Hacienda. (PES-2022)	Sesión cuarta semana de gestión del conocimiento y la innovación	1	0	0	0	1	N.A.
Generar dos hipótesis de investigación acorde al objeto misional de la Entidad PES-2022	Hipótesis de investigación acorde al objeto misional de la Entidad	2	0	1	0	1	0.5

PAAC-2022: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2022 (Decreto 612/2018).
 PES-2022: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2022" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Mes	Avance Cualitativo
Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG), ejecutada	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	El avance programado a primer trimestre en la estrategia de gestión del conocimiento corresponde principalmente a la consolidación y análisis del estado de las postulaciones relacionadas en el documento Conpes 3776 de 2013. Se realizó un registro del total de postulaciones, metas financiadas, avance por fase (contratado, terminado, entregado), por sector y macroproyecto. Adicionalmente se efectuó, el día 1 de abril de 2022, la capacitación para el cargue de información y evidencias en la Herramienta destinada al Seguimiento del Plan de Acción, un repositorio que permite copilar el conocimiento y la información generada en la ejecución de la programación anual.
Abril	Se publicó el primer informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción de la vigencia, el conocimiento y las evidencias que soportan el mismo se encuentran consolidadas en un repositorio virtual de Planeación y Cumplimiento.
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	<p>Como parte del proceso de empalme de cambio de gobierno se adelantaron las siguientes acciones en el marco de la Gestión del Conocimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión 2018 – 2022. El documento que se encuentra disponible, tanto en la web del Fondo Adaptación, como en el "Datálogo" del Departamento Nacional de Planeación, contiene (i) los antecedentes de la creación, estructura y organización de la entidad; (ii) el balance por sector y macroproyecto, incluyendo las postulaciones del CONPES 3776 de 2013, las metas financiadas, los proyectos no financiados, los proyectos ejecutados por otras entidades y los técnicos o jurídicamente inviables; así como el detalle de las intervenciones adelantadas en el cuatrienio y las entregas que se encuentran en proceso de contratación o ejecución; (iii) el estado de la situación financiera incluyendo los recursos en fiducia y la solicitud de recursos para el anteproyecto de presupuesto 2023; y, (iv) los temas prioritarios técnicos que se le sugieren a la administración entrante. <p>Este documento cuenta inicialmente con 34 anexos que incluyen el detalle de cada uno de los productos contratados y entregados en la historia de la entidad</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>y documentos técnicos que buscan brindar elementos para el análisis del alcance del Fondo hacia el futuro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación con el resumen del informe de gestión e infografía de respaldo para facilitar compartir la información con diversos grupos de interés. • Se creó el micrositio https://www.fondoadaptacion.gov.co/gestion20182022/ pensado en la ciudadanía, el cual busca compartir en un lenguaje sencillo el balance de la Entidad por sector y macroproyecto. • Se creó un repositorio que contiene los soportes de la totalidad de las entregas realizadas en el periodo agosto 2018 – mayo 2022; este se debe continuar actualizando mensualmente, el enlace es compartido con Presidencia de la República.
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	<p>Adicional a los informes, anexos y presentaciones generados en el marco del proceso de empalme de cambio de gobierno, se actualizó un balance por sector y macroproyecto, incluyendo las postulaciones del CONPES 3776 de 2013, las metas financiadas, los proyectos no financiados, los proyectos ejecutados por otras entidades y los técnica o jurídicamente inviables; así como el detalle de las intervenciones adelantadas en el cuatrienio y las entregas que se encuentran en proceso de contratación o ejecución. Asimismo, se consolidó la presentación por Subgerencias y balance regionalizado.</p> <p>Por otra parte, se trabaja en la revisión del alcance de la intervención integral de la región de La Mojana.</p>
Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021 en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	El 22 de marzo de 2022, se certificó el diligenciamiento de la información del año 2021 del Fondo Adaptación cargado en la herramienta destinada por la Función pública. A la espera de los resultados de la medición para su análisis.
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	<p>El día 13 de mayo se participó en el Duodécimo Encuentro del Equipo Transversal de Planeación, donde el Departamento Administrativo de la Función Pública presentó los resultados del Índice de Desempeño Institucional. Tras analizar los resultados obtenidos, se generó el comunicado de Prensa "Fondo Adaptación consigue la tasa de crecimiento más alta en la calificación del Índice de Desempeño Institucional 2021" que a su vez destacó el obtener el cuarto lugar en los resultados de la medición del desempeño del Sistema de Control Interno (SIC).</p> <p>Posteriormente, para Comité de Gerencia y Consejo Directivo se preparó la</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	presentación con el análisis de los resultados por dimensión y política.
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	En respuesta al análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG, de la gestión 2021, se formuló de manera conjunta con los Equipos de Trabajo involucrados, un plan de mejoramiento para el cierre de brechas, el cual a su vez se compartió con el Ministerio de Hacienda como cabeza del sector. El Plan con 25 acciones, suscrito en el mes de septiembre con Control Interno, será objeto de seguimiento periódico para promover que los resultados se sigan fortaleciendo.
Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	Si bien no se han programado reuniones sectoriales en el periodo, el Fondo Adaptación participó en el Cuarto Encuentro de Equipo Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación, convocado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Función Pública y la ESAP, el día 15 de marzo de 2022.
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	Si bien no se han programado reuniones sectoriales en el periodo, el Fondo Adaptación participó en la primera Cátedra Permanente de la Escuela de Formadores en Gestión del Conocimiento y la Innovación, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, realizada el día 11 de mayo de 2022.
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	Se asiste a la mesa sectorial de gestión de conocimiento
Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	los elementos del Sistema a que haya lugar. Para el presente corte se incorporan varios documentos al SGC entre registros y documentos (lineamientos, manuales y guías). El resultado de la gestión por procesos para todo el trimestre se consolidará en el mes de marzo. De la misma manera se ha venido trabajando en las acciones suscritas en el plan de mejora a procesos enviado a la OCI.
Marzo	El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. Para el presente trimestre y por solicitud de los líderes de procesos la OAP ha incluido y/o actualizado un total de 26 documentos que obedecen a los cinco tipos en el Sistema de Gestión de Calidad (4 Políticas, 1 Lineamiento, 7 Manuales/Guías y 14 Formatos). De la misma manera se ha venido trabajando en las acciones suscritas en el plan de mejora a procesos enviado a la Oficina de Control Interno.
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	Para el presente corte se incorporan las actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos de gestión jurídica. El resultado de la gestión por procesos para todo el trimestre arroja 20 tipos documentales actualizados entre registros, documentos (lineamientos, manuales y guías), caracterizaciones, flujogramas, normogramas e indicadores.
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	<p>El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina Asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar.</p> <p>Para el presente corte se incorporan varios documentos al SGC entre registros y documentos (lineamientos, manuales y guías). El resultado de la gestión por procesos para todo el trimestre arroja 65 tipos documentales actualizados entre registros, documentos (lineamientos, manuales y guías), caracterizaciones, flujogramas, normogramas e indicadores. De la misma manera se presentan las acciones suscritas en el plan de mejora a procesos enviado a la OCI entre las cuales se destacan la actualización de la Política de calidad, así como el rediseño del listado maestro de documentos y la puesta en marcha de software para la actualización de flujogramas en notación BPMN.</p>
Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada	
Enero	No existe reporte para el periodo

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Febrero	El 8 de febrero se realizó la charla informativa de gestión de riesgos a los colaboradores del FA.
Marzo	Se ha brindado acompañamiento a las dependencias para que al cierre del primer trimestre informen sobre la necesidad de actualización de los riesgos y diligencien las herramientas de valoración.
Abril	No existe reporte para el periodo
Mayo	Se actualizó y publicó en la página web de la entidad el Informe de Seguimiento al Avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, así como el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al mes de abril.
Junio	No existe reporte para el periodo
Julio	No existe reporte para el periodo
Agosto	No existe reporte para el periodo
Septiembre	Se actualizó y publicó en la página web de la entidad el Informe de Seguimiento al Avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2022, así como el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al mes de agosto. Iniciando el tercer cuatrimestre la Oficina Asesora de Planeación, en conjunto con los líderes de áreas, diligencian la herramienta de seguimiento a riesgos de la Entidad, y con cuyas respuestas se realizará un análisis a presentarse al Comité de Control Interno para ver la pertinencia de la actualización de la Política de Riesgos, así como su matriz institucional de riesgos, teniendo en cuenta las orientaciones de la nueva administración, y en alineación con la ruta del cambio de gobierno.
Sesión cuarta semana de gestión del conocimiento y la innovación	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte
Hipótesis de investigación acorde al objeto misional de la Entidad	
Enero	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	<p>Considerando el cambio de gobierno, se incorporó en el Informe de Gestión cuatro temáticas prioritarias que se le entregan a la administración entrante como recomendaciones para tener en cuenta y para adelantar, en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, las hipótesis de investigación. Se sugirieron como temas de análisis:</p> <ul style="list-style-type: none">• Las alternativas para desarrollar proyectos con viabilidad técnica y jurídica priorizados por el CONPES 3776 de 2013 pero que continúan desfinanciados.• La estrategia judicial asociada a los procesos a favor de la entidad.• La integralidad del Macroproyecto La Mojana y las intervenciones en esa región, partiendo del impacto de los Muros de protección para San Marcos y Magangué.• La posible transformación del Fondo Adaptación para la identificación y ejecución de proyectos integrales de mitigación y adaptación al cambio climático.
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	Las hipótesis se están definiendo conforme a las metas que se definirán para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El primer estudio corresponde al alcance de la intervención integral de la Región de La Mojana.

- Equipo Tecnología

Este equipo es el encargado de ejecutar las acciones asociadas con los Plan Estratégico de Tecnología – PETIC y el Plan de Seguridad Digital de la entidad, que hacen parte integral como anexos del Plan de Acción 2022.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Portafolio/Programa/Proyecto: **TECNOLOGÍA**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Tecnología

Objetivo estratégico 2018-2022 #5	Fortalecer la capacidad de gestión, uso y apropiación de la información institucional						
Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades/hit os)	Indicador	Meta 2022	Programación trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad*	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado	100%	20%	30%	30%	20%	78
Ejecutar Plan de Seguridad Digital (MIPG)*	Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado	100%	20%	30%	30%	20%	65.47

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

Mes	Avance Cualitativo
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado	
Enero	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>a. Implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo SGDEA. Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inició la implementación y puesta en marcha del SGDEA. - Reuniones de explicación y de seguimiento para el llenado de las matrices de datos maestros o datos básicos y tablas de mantenimiento en FOREST. - Contratación de la infraestructura en la nube de Oracle para alojar la aplicación FOREST y todos sus datos. Se adjunta Orden de compra de Oracle. - Reuniones para la explicación con respecto a los datos a migrar desde INFODOC al nuevo sistema FOREST. <p>b. Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información. Con respecto a esta iniciativa fue aprobado el Plan Estratégico de TI y el Plan de Seguridad Digital en el comité de Gestión y Desempeño del 27 de enero de 2022.</p> <p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <p>Sistema SIFA: modificación el formulario de terceros para solicitar nuevos datos de banco para pago por compensaciones. Nueva parametrización de tres grupos de central de cuentas para revisión y causación de radicados.</p> <p>Sistema PSA: Se realizó el otrosí al contrato del sistema PSA con Price. Contrato FA-CDO-I-S-003-2020.</p> <p>El Avance del PETI al término del mes de enero de 2022 es de 5%</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Febrero	<p>En el mes de febrero con respecto a la acción de "Ejecutar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones –PETI en la Entidad", se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <p>a. Implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo SGDEA: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes actividades en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatización, configuración y parametrización en el entorno de pruebas: 90% • Capacitación usuario final y técnicos: 2% • Instalación licencias: 90% • Migración de información: 20% <p>En general el proyecto tiene un avance del 43%.</p> <p>b. Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información. Con respecto a esta iniciativa se impartieron capacitaciones a los colaboradores en el sistema SIFA.</p> <p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <p>Sistema SIFA: En el mes de febrero se trabajaron principalmente los siguientes requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró una nueva forma de generar el reporte de ejecución por CDRs (reporte CRO) en archivo plano, ya que el Excel está generando más de 65.000 filas. - Se creó una opción para cargar soportes o documentos a solicitudes de CDR - Se construyó la entidad documentos para el manejo de documentos de tesorería: reintegro de anticipos, reintegro de aportes, compensaciones. - Nueva funcionalidad para la expedición del certificado de cumplimiento para pago de contratos de prestación de servicios de personas naturales. - Se realizó una modificación para que los radicados por viáticos sean revisados y causados por un grupo exclusivo de central de cuentas, diferente al grupo de pago masivo y de cuentas de personas jurídicas. <p>Sistema PSA: En el mes de febrero se construyó la hoja de vida de un nuevo sector para el proyecto de Reactivación de Yati-Bodega. Además, se crearon 3 intervenciones que pertenecen a este nuevo sector.</p>
Marzo	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI: En el mes de marzo con respecto a la acción de "Ejecutar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones –PETI en la Entidad", se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <p>a. Implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo SGDEA: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes actividades en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatización, configuración y parametrización en el entorno de pruebas: 100% • Capacitación usuario final y técnicos: 5% • Instalación licencias: 100% • Migración de información: 50% • Instalación entorno de pruebas: 100% • Instalación entorno de producción: 5% • Soporte técnico proactivo y reactivo: 5%

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>En general el proyecto tiene un avance del 52%.</p> <p>b. Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información. Con respecto a esta iniciativa se impartieron capacitaciones a los colaboradores en el sistema SIFA, en especial en el certificado de cumplimiento para pago que se genera desde el sistema. Se adjunta la lista de asistencia. También se impartieron charlas en el sistema SIFA y PSA al personal de la empresa Deloitte y al personal de la Contraloría General quienes hacen las respectivas auditorías en la Entidad.</p> <p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <p>Sistema SIFA: En el mes de marzo se trabajaron principalmente los siguientes requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se diseñó e implementó la nueva funcionalidad para que los contratistas personas naturales de prestación de servicios puedan hacer el certificado de cumplimiento para pago a través del sistema. - Se diseñó y desarrolló la lista de chequeo para contratos liquidados, con el fin de hacer seguimiento de las actividades post-liquidación de un contrato. - Se realizó un cambio en la instrucción de giro para que muestre los usuarios que hicieron la revisión, causación y visado en el sistema. <p>El Avance del PETI al término del mes de marzo de 2022 es de 45%</p>
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	<p>Al 30 de junio respecto a la ejecución del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones –PETI en la Entidad, se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <p>a. Implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo SGDEA: Actualmente se viene avanzando en diferentes frentes para cumplir con la fecha pactada para la salida a producción la primera semana de agosto. Dentro de las tareas realizadas, se encuentran la entrega de licencias, la implementación del entorno de pruebas, las pruebas funcionales de la herramienta y las capacitaciones para administradores.</p> <p>Las actividades en proceso a la fecha son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del módulo de expedientes • Capacitación de los usuarios VIP, incluyendo el módulo de expedientes • Generación del certificado SSL para sitio web • Relación de expedientes digitales para su vinculación con los registros de expedientes en la herramienta • Iniciar proceso de recolección de firmas mecánicas y certificadas • Definir proceso de carga de expedientes digitales <p>A corte 30 de junio, se va cumpliendo con el cronograma estipulado según la adición realizada al contrato para la inclusión del desarrollo del módulo de expedientes. El proyecto presenta un avance del 90%.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <p>Sistemas SIFA</p> <p>A 30 de Junio en SIFA se ha construido software nuevo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separación de listas de chequeo de autorizaciones de gasto y viáticos • Construcción de programa para Certificado de Cumplimiento para pagos, el cual ayuda a los contratistas a elaborar el Excel presentado en las cuentas, está conectado con el módulo de contratación de manera que presenta los históricos de pagos. • Construcción de programas y reportes para unificar criterios de impresión de los nuevos documentos de reintegros, compensaciones y anticipos • Construcción de programa para modificar radicados, solo se permiten aquellos radicados que tengan un estado determinado • Creación de equivalente producto1 y producto2 para carga de PAC, con distribución de porcentajes • Construcción de programa de seguimiento de liquidaciones <p>Sistema PSA</p> <p>En el mes de Junio se trabajó con la firma PWH en el desarrollo de las siguientes funcionalidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esquema de alertas a supervisores e interventores que incluyó la definición del alcance, el desarrollo de la funcionalidad en la herramienta, la verificación de notificaciones a los supervisores e interventores de las alertas que llegarán a sus correos electrónicos y las alertas a los supervisores e interventores para actualización oportuna de cronogramas. 2. Un Tablero de control de alertas de desviaciones en los cronogramas con dos componentes: <ul style="list-style-type: none"> • Dashboard seguimiento PSA: • Dashboard de actualización de proyectos PSA: <p>En el mes de junio se avanzó en definición del alcance de la herramienta y elaboración de los reportes y en el desarrollo del web dashboard de seguimiento estado de proyectos en el PSA. Para el mes de julio se tiene previsto la puesta en marcha y operación de las dos funcionalidades.</p> <p>El Avance general del PETI 2022 al término del mes de junio es de 60%.</p>
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	<p>Al 30 de septiembre respecto a la ejecución del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones –PETI en la Entidad, se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <p>a. Implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo SGDEA: Actualmente se viene avanzando en diferentes frentes para cumplir con la fecha pactada para la salida a producción la primera semana de agosto. Dentro</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>de las tareas realizadas, se encuentran la entrega de licencias, la implementación del entorno de pruebas, las pruebas funcionales de la herramienta y las capacitaciones para administradores.</p> <p>Las actividades en proceso a la fecha son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información de datos para migrar Progreso • Pruebas funcionales entorno pruebas FADAP Finalizada • Configuración de seguridad entornos protocolo seguro https Finalizada • Capacitación grupo administradores En progreso (índice electrónico y foliación electrónica) • Subir información Disco duro a file system (Método) Finalizado • Levantar información de firmas digitales Finalizada • Levantamiento firmas mecánicas Pendiente algunas firmas • Cargue de firmas al sistema Producción Pendiente últimas firmas • Entrega para cargue de expedientes En progreso (pendiente total 31 julio) • Entrega registros infodoc En progreso (pendiente total 31 julio) • Capacitación Archivo administradores En progreso • Explicación índice electrónico En progreso • Enviar correo sugerencia muestreo archivo adjuntos Realizado • Capacitación usuarios VIP Finalizada • Cambio nombre aplicativo de SISDOFA A DATAFONDO Finalizada • Configuración autenticación DATAFONDO contra LDAP progreso • Salida a producción 1 de agosto. Realizada • Aclaración de dudas archivo 7 septiembre • Reunión de seguimiento 9 septiembre • Reunión de seguimiento 13 septiembre • Capacitaciones archivo 14, 15 ,19 y 20 de septiembre • Reunión con proveedor 472 correo certificado 20 de septiembre • Reunión de seguimiento 29 septiembre • Atención tareas redMine (36 tareas reportadas durante el mes de septiembre) • Entrega desarrollo Control de cambios 154338 RADICADOS RECIBIDOS- GENERAR RESPUESTA ENVIADOS O INTERNOS • Entrega desarrollo Control de cambios 156429 - FLUJO DOCUMENTAL RADICADOS • MIGRADOS DE INFODOC A DATAFONDO • Entrega desarrollo Control de cambios 154427 - Registrar el asunto en la • Notificación de respuesta de radicado <p>A corte 30 de septiembre, se va cumpliendo con el cronograma. Avance en tiempo del contrato: 75% Avance Financiero del contrato: 93,87%</p> <p>b. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <p>Sistemas SIFA</p> <p>A 30 de septiembre en SIFA se ha construido software nuevo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización de versión de Java en el servidor de pruebas y producción, recompilacion de los aplicativos completos, actualización de librerías necesarias para poder en funcionamiento el Java 11 • Actualización de algoritmos para obtención de reportes de presupuesto, mejorando rendimiento y presentación de los informes: listados de disponibilidades, CRO. Y solicitudes de disponibilidades • Construcción de opción cambiar usuario técnico • Modificación del programa que reasigna usuarios en técnica para que puedan decidir si se reemplaza o no las listas de chequeo del gestor, delegado y líder de manera separada • Actualización de programas de generación de PAC a producto2

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de programa que genera archivo plano con destino a PWC, listados de IG separados por el signo • Construcción de opción para modificar el ordenador de gasto de una IG. • Construcción de opción para modificar el estado de una ig y permitir su reasignación de beneficiario. La opción queda ubicada en Financiero -Central de cuentas – Reasignar beneficiario: • Modificación de programa de reasignación de usuario técnica para que pregunte que tipo de usuario desea regenerar lista. • Construcción de programa para presentar listados de IG con catalogo 2 de productos <p>Avance en tiempo del contrato: 73.76% Avance Financiero del contrato: 73.76%</p> <p>Sistema PSA En el mes de septiembre se trabajó con la firma PWH en el desarrollo de las siguientes funcionalidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se adquieren 15 licencias de Project Plan 3. Se extiende la duración de uso de las licencias hasta el 31 de julio del 2023. 2. Integración del Sistema PSA y Sistema SIFA – módulo de informes de pagos <p>Enlace con todos los informes: https://drive.google.com/drive/folders/17dF3H8sNIky3tzGDFo2MrEnzKIB9SvZL Avance en tiempo del contrato es del 86.75% Avance financiero es del 80.95%.</p> <p>El Avance general del PETI 2022 al término del mes de septiembre es de 78%.</p>
Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado	
Enero	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de enero de 2022 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se construyó el plan de seguridad digital 2022, el cual fue aprobado en Comité de Gestión y Desempeño del 27 de enero 2022. 2. Se contrato al Oficial de Seguridad. 3. Se construyó el Plan de cultura y sensibilización en seguridad para el 2022. 4. Se socializó a través de correo electrónico un video con el procedimiento de reporte de incidentes de seguridad digital. <p>El avance del plan de seguridad digital al término del mes de enero de 2022 es del 5%</p>
Febrero	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de febrero de 2022 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la gestión de Incidentes de Seguridad Digital de manera permanente. 2. Se logró la aprobación y publicación del plan de Cultura y sensibilización en Seguridad. 3. Se realizó el reporte de avances de Seguridad Digital para FURAG. 4. Se gestionó la publicación de cápsulas de seguridad a todo el Fondo. 5. Se elaboró encuesta de Cultura en Seguridad Digital para difundir por medio de correo electrónico.
Marzo	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de marzo de 2022 fueron las siguientes:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó Gestión de Incidentes de Seguridad Digital de manera permanente. 2. Se aplicó el instrumento de autodiagnóstico del MSPI a los controles de tipo Técnico. 3. Se realizo carga de evidencias para dar respuesta a formulario de FURAG 4. Se gestionó la publicación de cápsulas de seguridad a todo el Fondo. 5. Se envió a toda la Entidad la encuesta de cultura y apropiación en Seguridad. 6. Se llevo a cabo la Capacitación de Activos de información y riesgos digitales a toda la Entidad. 7. Se elaboró matriz para recopilar la información solicitada en la Resolución 1519-2020 Anexo3. 8. Se elaboró el documento en borrador de desarrollo seguro.
Abril	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de abril de 2022 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó Gestión de Incidentes de Seguridad Digital de manera permanente. 2. Se gestiono la publicación de capsulas de seguridad a todo el Fondo. 3. Se realizo el reenvió de encuesta de cultura y apropiación en Seguridad con nueva configuración de accesibilidad. 4. Se elaboró documento en borrador de desarrollo seguro. 5. Presentación de línea de tiempo de los avances de MSPI en Comité de Gestión 6. Se presentó propuesta para implementar fondos de pantalla con tips de seguridad. 7. Se realizó una revisión preliminar de plan de continuidad del negocio. 8. Se realizaron sesiones de trabajo para integrar la gestión de riesgos Digitales.
Mayo	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de mayo de 2022 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó Gestión de Incidentes de Seguridad Digital de manera permanente. 2. Se gestiono la publicación de capsulas de seguridad a todo el Fondo. 3. Se configuro y probó herramienta para prueba de phishing. 4. Se lanzó campaña de sensibilización por medio de un correo falso y se generó informe con resultados. 5. Se presentó propuesta para implementar fondos de pantalla con tips de seguridad. 6. Se realizó visita en las instalaciones para revisión de controles de Seguridad. 7. Se realizó revisión del plan de continuidad del negocio. 8. Se elaboró y presentó el alcance de la auditoria en seguridad de la información. 9. Se solicitó un ejercicio de análisis de vulnerabilidades. 10. Se solicitó información referente a los lideres de proceso con el fin de iniciar el proceso de revisión de activos de información.
Junio	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de junio de 2022 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Se realizó Gestión de Incidentes de Seguridad Digital de manera permanente. 10. Se gestiono la publicación de capsulas de seguridad a todo el Fondo. 11. Se realizó Charla #2 sobre Políticas de Seguridad de la Información 12. Definición de alcance para auditoria SGSI y Pruebas de Vulnerabilidades 13. Se realizo verificación aleatoria de controles de acceso en sitio 14. Se realizaron reuniones con diferentes lideres de procesos para actualizar la matriz de Activos de Información.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>15. Se realizó retroalimentación del ejercicio de Phishing realizado en el mes de mayo.</p> <p>El avance del plan de seguridad digital al término del mes de junio de 2022 es del 49%.</p>
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de septiembre de 2022 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó Gestión de Incidentes de Seguridad Digital de manera permanente. 2. Se gestionó la publicación de cápsulas de seguridad a todo el Fondo. 3. Se realizó Charla #3 sobre Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. 4. Se realizaron sesiones de revisión de Riesgos de seguridad Digital con el área de control Interno. 5. Se realizó revisión de autodiagnóstico del MSPI con la oficina de Control interno 6. Seguimiento a actividades relacionadas con el Plan de Seguridad Digital 2022. <p>Las evidencias de las actividades anteriormente mencionadas se pueden encontrar en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/open?id=1AAxWvZ25b7Ff4s5FISvZfEcyALOKS_M4&authuser=segurinfo%40fondoadaptacion.gov.co&usp=drive_fs</p> <p>El avance del plan de seguridad digital al término del mes de septiembre de 2022 es del 65,42%, como el resultado del avance acumulado (que incluye el tercer trimestre del año), así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de sensibilización y apropiación de Seguridad de la información 11,09% - Autodiagnóstico del instrumento de evaluación del MSPI 5,00% - Seguimiento y actualización de Riesgos de Seguridad Digital 7,50% - Seguimiento y actualización de Activos de información 15,00% - Implementación del procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad 8,33% - Análisis de vulnerabilidades 5,00% - Auditoría interna SGSI 6,67% - Gestión de la Continuidad del Negocio 2,50% - Desarrollo Seguro de Software 1,00% - Cumplimiento MIPG - FURAG 3,33%


- Área Secretaría General

La Secretaría General y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Arquitectura Organizacional vista desde las personas y su actuación en los procesos que generan impacto interno (BACK-OFFICE) a partir de los requisitos y atributos de calidad demandados por los ciudadanos.

Los resultados que produce la Secretaría General se articulan con el alcance de las Políticas de Gestión y Desempeño de TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD, ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTIÓN PRESUPUESTAL (COMPRAS PÚBLICAS)

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

y DEFENSA JURÍDICA, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

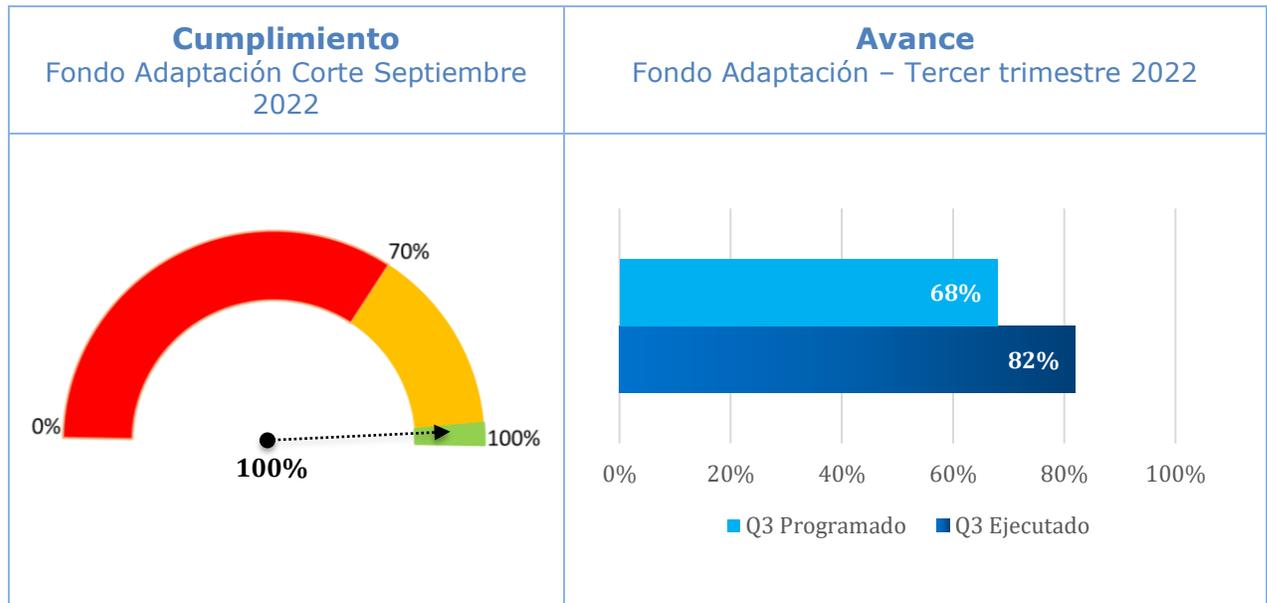

- Equipo Talento Humano y Servicios

A través de este equipo se ejecuta el portafolio de proyectos relacionado con Talento Humano, Atención al Ciudadano, servicios y Gestión Documental. Como parte integral del Plan de Acción 2022, se suman el Plan Estratégico de Talento Humano (PETH), el Plan Institucional de Archivos (PINAR) y el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).

Portafolio/Programa/Proyecto: **TALENTO HUMANO**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Talento Humano y Servicios

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6	Modernizar Y Fortalecer El Funcionamiento Del Fondo Adaptación Con Visión De Largo Plazo								
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta		
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4		
Ejecutar Plan de Previsión conforme con el PAC mensual solicitado	Plan de previsión ejecutado conforme con el PAC mensual solicitado	100%	25%	25%	25%	25%	73		
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador			Programación Trimestral					
		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta		

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Alcanzar la cobertura de personas capacitadas a través del Plan Institucional de Capacitación	Porcentaje de personas capacitadas a través del Plan institucional de capacitación	95%	25%	25%	25%	20%	88
Ejecutar el Plan de trabajo del SG-SST	Plan de trabajo del SG-SST ejecutado	100%	21%	25%	25%	29%	71
Alcanzar el 93% de favorabilidad en la medición de clima y cultura organizacional	Porcentaje de la encuesta de medición de clima y cultura organizacional en nivel alto de favorabilidad	93%	0%	0%	0%	93%	N.A.
Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano PES-2022	Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	100%	0%	0%	0%	100%	N.A.
Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano PES-2022	Sesiones de capacitaciones sectoriales de la Política de Talento Humano	100%	0%	0%	0%	100%	N.A.
Analizar los resultados de la política de Talento Humano en la medición del FURAG de la vigencia 2021 PES-2022	Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021 en relación con la política de Talento Humano	100%	0%	0%	0%	100%	N.A.

PES-2022: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2022" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Mes	Avance Cualitativo
Plan de previsión ejecutado conforme con el PAC mensual solicitado	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	Se presenta un avance en ejecución presupuestal del 24% teniendo en cuenta los recursos asignados.
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	Para el segundo trimestre de la vigencia 2022 se dio cumplimiento a la meta establecida, llegando al 25% de cumplimiento
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	Se presenta un avance en ejecución de PAC de 24% para el tercer trimestre de la vigencia 2022, para un acumulado de 73%
Porcentaje de personas capacitadas a través del Plan institucional de capacitación	
Enero	En el mes de enero se realizó 1 evento de entrenamiento en el marco del PIC, con la participación de 154 colaboradores. Esta jornada fue divulgada por mailing e invitada

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	por Google Calendar, logrando un 55% de cobertura frente al 100% de la población actual.
Febrero	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de febrero se realizaron o participaron en 15 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 136* colaboradores.
Marzo	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se realizaron o participaron en 12 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 152* colaboradores.
Abril	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se realizaron o participaron en 11 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 117* colaboradores.
Mayo	No existe reporte para el periodo
Junio	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de junio se realizaron o participaron en 8 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 111* colaboradores.
Julio	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de julio se realizaron o participaron en 8 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de más de 100* colaboradores.
Agosto	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de agosto se realizaron o participaron en 5 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 40* colaboradores.
Septiembre	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de septiembre se realizaron o participaron en 7 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 111* colaboradores.
Plan de trabajo del SG-SST ejecutado	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	Conforme a las evidencias del informe del Plan de Acción para el primer trimestre, informe de accidentalidad y el Plan de mejora de ARL Positiva, el porcentaje de cumplimiento es el 100% de la metra del trimestre (21%)
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Junio	Teniendo en cuenta que el siguiente reporte corresponde al segundo trimestre de la vigencia 2022, la Meta Q2 con un valor porcentual de 25% de la Meta programada se cumple al 100%. Ahora bien respecto al cumplimiento acumulado, se reporta un avance total acumulado del 46% correspondiente a la suma de las Metas Q1 y Q2 sobre el valor porcentual asignado para cada una.
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	Teniendo en cuenta que el siguiente reporte corresponde al tercer trimestre de la vigencia 2022, la Meta Q2 con un valor porcentual de 25% de la Meta programada se cumple al 100%. Ahora bien respecto al cumplimiento acumulado, se reporta un avance total acumulado del 71% correspondiente a la suma de las Metas Q1, Q2 y Q3 sobre el valor porcentual asignado para cada una.
Porcentaje de la encuesta de medición de clima y cultura organizacional en nivel alto de favorabilidad	
Enero	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de enero se realizó 1 actividad programada de bienestar e incentivos con la participación de 5 colaboradores.
Febrero	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de febrero se realizaron 9 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 62 servidores públicos y otros colaboradores.
Marzo	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se realizaron 18 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 140 servidores públicos y colaboradores.
Abril	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de abril se realizaron 11 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 24 servidores públicos y colaboradores.
Mayo	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de mayo se realizaron o participaron en 11 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 88 colaboradores aproximadamente.
Junio	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de junio se realizaron 6 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 50 servidores públicos y colaboradores.
Julio	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de julio se realizaron 10 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de más de 60 servidores públicos y colaboradores.
Agosto	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de Agosto se realizaron 8 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 12 servidores públicos y colaboradores.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Septiembre	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de Septiembre se realizaron 10 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 160 servidores públicos y colaboradores.
Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte
Sesiones de capacitaciones sectoriales de la Política de Talento Humano	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte
Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021 en relación con la política de Talento Humano	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte

Portafolio/Programa/Proyecto: **SERVICIOS**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Talento Humano y Servicios

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6	Modernizar Y Fortalecer El Funcionamiento Del Fondo Adaptación Con Visión De Largo Plazo						
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado	100%	25%	25%	25%	25%	75

Mes	Avance Cualitativo
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado	
Enero	Se realizo medición de los 8 indicadores correspondientes al periodo de enero 2022 de acuerdo a los compromisos del plan de acción 2022.
Febrero	Plan de acción de Febrero 2022 "Introducción al sistema de gestión ambiental del Fondo Adaptación" Durante el mes de febrero se llevaron a cabo actividades relacionadas a los aspectos ambientales de la entidad como el consumo de agua, energía y papel y la generación de residuos sólidos; los cuales tienen una relación directa con el plan de acción planeado durante la vigencia 2021. Como cumplimiento del mismo, se relacionan las siguientes actividades para el mes: 1) Capacitación del Sistema de gestión ambiental, 2) Campaña de "Tips y datos ecológicos", 3) Seguimiento al consumo de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	agua y papel. 4) Recomendaciones para el equipo de servicio de aseo y cafetería acerca del manejo de los residuos sólidos del Fondo Adaptación.
Marzo	Se realizaron las actividades internas correspondientes al periodo de marzo con grandes logros como el acercamiento y participación con la Secretaría de Ambiente,
Abril	Frente al cumplimiento ambiental se realizaron las actividades pertinentes al periodo abril 2022, se destaca el mejoramiento en la clasificación de los residuos sólidos, como también la disminución de los residuos generados y el consumo de agua y por otro lado la dificultad de la lectura del consumo de energía.
Mayo	En colaboración del gestor ambiental de la localidad de Santa fé-Promoambiental se instruyó a los funcionarios y colaboradores en todo el tema de residuos sólidos, para continuar con el cumplimiento de la codificación de las bolsas por colores según la resolución 2184 de 2019, pero también se tuvo la dificultad del seguimiento de consumo de energía por parte del arrendador del inmueble, sede actual de las instalaciones del Fondo Adaptación
Junio	Las actividades ejecutadas están siempre en proceso permanente y continuo, orientadas a administrar la información y los recursos relacionados con la Política Ambiental del Fondo Adaptación a fin de alcanzar una mejor calidad de vida dentro de la entidad. Dificultades en el proceso, es la medición del consumo de energía por la falta de la instalación de los medidores o contadores por parte del operador de la subestación de energía a cargo del Banco Davivienda, se resaltan logros en la adquisición de hojas de seguridad de sustancia químicas y su respectivo tratamiento ambiental.
Julio	No se registra avance cualitativo para el periodo.
Agosto	Dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) del Fondo Adaptación, como instrumento de seguimiento de la planeación ambiental, el área administrativa, hace mensualmente el análisis descriptivo e interpretativo detallado, donde se revisan las situaciones ambientales internas de la entidad como de su infraestructura física, siempre velando el día a día por un entorno mejor, realizando acciones que estén encaminadas a gestionarse de una manera adecuada, sostenible y amigable con todos los usuarios del Fondo. En el mes de agosto de la vigencia 2022 revisando los resultados en los temas ambientales como el control de los activos, arrojan excelentes resultados que demuestran que con entusiasmo y dedicación se pueden hacer muchas cosas en pro del planeta.
Septiembre	En el mes de septiembre se realizaron varias actividades, entre esas la capacitación acerca de residuos sólidos y su impacto al medio ambiente y la salud, en ella se mencionó las maneras en que el medio ambiente se ve afectado por las acciones humanadas y por la inadecuada disposición final de los residuos. Así mismo, se buscó sensibilizar a las subcontratistas de aseo y cafetería, acerca de la importancia de su labor en evitar problemas de salud pública y medio ambiente dentro y fuera de la entidad.

Portafolio/Programa/Proyecto: **ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Gerente de Meta: **Asesor Equipo Talento Humano y Servicios**

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Objetivo estratégico 2018-2022 #6		Modernizar y fortalecer el funcionamiento del fondo adaptación con visión de largo plazo					
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido	Porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido	100%	100	100	100	100	90
Participar en las mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano, coordinadas por el MHCP	Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	100%	-	-	-	100%	N.A.
Participar en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA (suministro y análisis de información).	Sesión de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA	1	-	-	-	1	N.A.
De acuerdo a la misionalidad de la entidad actualizar el portafolio de productos y servicios, y gestionar la publicación en los diferentes canales de comunicación, con el fin de orientar a los grupos de valor, y que tenga criterios de accesibilidad, lenguaje claro y gobierno abierto.	Actualizar el portafolio de servicios	100%	-	-	-	100%	N.A.

Mes	Avance Cualitativo
Porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido	
Enero	<p>Para la vigencia 2022 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSDF recibidas mensualmente en la entidad: Para el mes de enero de 2022 se recibieron 194 PQRSDF, de las cuales 65 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 129 PQRSDF se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte a 31 de enero de 2022 el indicador se cumplió al 100%, toda vez que no hubo respuestas extemporáneas. 2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano. En el periodo a reportar se socializó: Enero 17 de 2022 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSDF durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSDF.
Febrero	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSDF recibidas mensualmente en la entidad: Para el mes de febrero de 2022 se recibieron 247 PQRSDF, de las cuales 62 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 2 extemporáneamente, para un total de 64 respuestas gestionadas durante febrero, así mismo 183 PQRSDF se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte a 28 de febrero de 2022 el indicador se cumplió al 99%.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano. En el periodo a reportar se socializó: Febrero 14 de 2022 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD. Febrero 14 de 2022 – En intranet se socializó la importancia de responder PQRSFD oportunamente.</p>
Marzo	<p>1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas en la entidad: Para el primer trimestre de 2022 se recibieron 746 PQRSFD, de las cuales 478 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 9 extemporáneamente, para un total de 487 respuestas gestionadas durante el 01 de enero a 31 de marzo de 2022, así mismo 259 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte a 31 de marzo de 2022 el indicador se cumplió en un 98%.</p> <p>2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia 2022 temas para la atención al ciudadano. En el periodo a reportar se socializó: Marzo 14 de 2022 – En intranet se socializó la importancia de emplear un lenguaje claro y sencillo como servidores públicos. Marzo 28 de 2022 – En intranet se socializó ¿Qué permite el lenguaje claro?</p>
Abril	<p>1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas en la entidad: Para el mes de abril de 2022 se recibieron 221 PQRSFD, de las cuales, a 30 de abril de 2022, 40 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 181 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte al mes de abril el indicador se cumplió al 100%, toda vez que no hubo respuestas extemporáneas.</p> <p>2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia 2022 temas para la atención al ciudadano.</p> <p>En el periodo a reportar se socializó:</p> <p>Abril 11 de 2022 – En intranet se socializó Aspectos generales de la atención al ciudadano.</p> <p>Abril 19 de 2022 – Cambio en los términos de respuesta a las PQRSFD según Ley 1755 de 2015. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>Abril 25 de 2022 – En intranet se socializó Recomendaciones generales para atención en situaciones difíciles.</p>
Mayo	<p>Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia 2022 temas para la atención al ciudadano. En el periodo a reportar se socializó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayo 9 de 2022- En intranet se socializó ¿Qué hacer cuando las peticiones de los ciudadanos llegan incompletas? • Mayo 23 de 2022 – En intranet se socializó Para saber aplicación del traslado por competencia.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Junio	<p>1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas en la entidad: Para el segundo trimestre de 2022 se recibieron 798 PQRSFD, de las cuales 623 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley, 30 extemporáneamente y 145 peticiones en trámite de respuesta; sin embargo, con corte al 30 de junio de 2022 están dentro del tiempo de ley y es necesario contar con el cierre del trámite a fin de indicar el cumplimiento del indicador. Por lo anterior el cumplimiento de respuestas a PQRSFD generadas oportunamente en el segundo trimestre de la actual vigencia con corte al 30 de junio corresponde al 95%.</p> <p>* Nota aclaratoria primer trimestre (Q1):</p> <p>Se actualiza la información del reporte del Q1, teniendo en cuenta que con la ampliación de términos a las respuestas a los derechos de petición hasta después del 16 de mayo de 2022 vencían los tiempos para consolidar la gestión de las PQRSFD recibidas durante el primer trimestre. Los datos definitivos son: Para el primer trimestre de 2022 se recibieron 746 PQRSFD, de las cuales 727 fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley, 18 extemporáneamente y 1 petición incompleta pendiente de elaboración de auto de desistimiento tácito para el cierre final. Por lo anterior el cumplimiento de respuestas a PQRSFD generadas oportunamente en el primer trimestre de la actual vigencia corresponde al 98%.</p> <p>2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia 2022 temas para la atención al ciudadano.</p> <p>En el periodo a reportar se socializó:</p> <p>Junio 6 de 2022 – En intranet se socializó ¿Qué hacer con las peticiones reiterativas ya resueltas?</p> <p>Junio 7 de 2022 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD según Ley 1755 de 2015. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD</p> <p>Junio 21 de 2022 – En intranet se socializó ¿Qué hacer con el rechazo de peticiones de información por motivos de reserva?</p>
Julio	No existe reporte para el periodo
Agosto	No existe reporte para el periodo
Septiembre	<p>Para el tercer trimestre de 2022 se recibieron 634 PQRSFD, de las cuales 504 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley, 53 extemporáneamente y 77 peticiones en trámite de respuesta; sin embargo, con corte al 30 de julio de 2022 están dentro del tiempo de ley y es necesario contar con el cierre del trámite a fin de indicar el cumplimiento del indicador. Por lo anterior el cumplimiento de respuestas a PQRSFD generadas oportunamente en el tercer trimestre de la actual vigencia con corte al 30 de julio corresponde al 90%.</p> <p>2. En la actividad de socializar en los canales internos piezas claves dentro de la vigencia 2022 temas para la atención al ciudadano, se ejecutaron 8 piezas y en total al corte llevamos 21 piezas socializadas.</p>
Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Enero	Durante el mes de enero de 2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó mesa sectorial, así como tampoco realizó requerimiento alguno sobre el tema. Es importante indicar que el avance de esta actividad depende directamente del MHCP, como cabeza y organizador de las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano.
Febrero	Durante el mes de febrero de 2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó mesa sectorial, así como tampoco realizó requerimiento alguno sobre el tema.
Marzo	El 2 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m. por Microsoft Teams, se realizó la primera mesa sectorial de servicio al ciudadano citada por el Ministerio de Hacienda, tema: Oficina de Relación con el Ciudadano (Art 17 Ley 2052 de 2020).
Abril	Para el mes de abril Ministerio de Hacienda no realizó agendamiento de mesa sectorial
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No hubo convocatoria de mesa de trabajo por parte del Ministerio de Hacienda
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte
Sesión de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte
Actualizar el portafolio de servicios	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte

Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN DOCUMENTAL**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Talento Humano y Servicios

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6		MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO					Avance Meta
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado	100%	25%	25%	25%	25%	75
Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP PES-2022	Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	100%	-	-	-	100%	5

PES-2022: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2022" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.
 (*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

Mes	Avance Cualitativo
Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	<p>Para el mes de febrero se adelantaron las siguientes actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar las respectivas inserciones del archivo de gestión en orden cronológico. 2. Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario. <p>Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 5 transferencias externas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente. Información que corresponde a un total 0.66 Metros Lineales. 4. Clasificar por serie y subserie documental. Durante el periodo evaluado se han adelantado las siguientes actividades de clasificación por parte del E.T Sección Gestión Documental sobre la serie comunicaciones oficiales de la vigencia 2012,2013,2014.2015,2016,2017,2018,2019 y 2020 correspondiente a un total de 6 metros lineales de información.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>5. Realizar la completitud del expediente e incluir la documentación en orden cronológico.</p> <p>6. Realizar seguimiento a la convalidación de TRD Se realizó la reunión de apertura del proceso de convalidación de las TRD el pasado 22 de febrero, con participación del Archivo General de la Nación.</p> <p>7. Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA Se realizaron mesas de trabajo con el contratista Forest en la cual se trabajaron la matrices de información correspondientes, para realizar las configuraciones correspondientes de la nueva herramienta con el ánimo de iniciar pruebas de la misma, para lo anterior se han adelantado un total de 10 mesas de trabajo con la participación de los Equipos de Trabajo de Tecnologías de la Información y la Sección Gestión Documental en conjunto con los colaboradores de Forest BPMS Macroproyectos.</p>
Marzo	<p>Meta 1. Actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR – Plan Institucional de Archivos 2022.</p> <p>Actividad 1. Realizar las respectivas inserciones del archivo de gestión en orden cronológico. Desarrollo: Se han realizado las actividades de Inserción, correspondientes a la Serie HISTORIAS LABORALES 0.25 metros de información correspondientes a entregas de tarjeta de proximidad, planes de capacitación. Serie RESOLUCIONES Vigencia 2019 correspondiente a 0.25 metros lineales de información</p> <p>Actividad 2. Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario. Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 3 transferencias externas, para un total 44.75 Metros lineales de información.</p> <p>Actividad 3. Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente.</p> <p>Actividad 4. Clasificar por serie y subserie documental.</p> <p>Actividad 5. Realizar la completitud del expediente e incluir la documentación en orden cronológico. Se ha realizado la completitud de información perteneciente a la Serie CONTRATOS con la inserción de 0,70 metros lineales, correspondientes a las concertaciones y evaluaciones de los funcionarios de la Entidad.</p> <p>Actividad 6. Elaboración y actualización de Instrumentos archivísticos, y documentación que apoyen el proceso de Gestión Documental. Desarrollo: Proyección de los siguientes documentos: 1. Programa de Gestión Documental (PGD) 2. Guía para la Organización y Transferencia de Documentos Físicos 3. Guía para la Organización y Transferencia de Documentos electrónicos Aplicando la Tabla de Retención Documental.</p> <p>Actividad 7. Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA. Se realizaron mesas de trabajo con el contratista Macroproyectos para la implementación de su herramienta Forest, en la cual se trabajaron la matrices de información correspondientes, para realizar las configuraciones correspondientes de la nueva herramienta con el ánimo de iniciar pruebas de la misma, para lo anterior se han adelantado un total de 10 mesas de trabajo con la participación de los Equipos de Trabajo de Tecnologías de la Información y la Sección Gestión Documental, Sección Atención al ciudadano en conjunto con los colaboradores de Forest BPMS Macroproyectos, en donde se adelantó la fase de transferencia de conocimiento a los administradores de la herramienta.</p> <p>Meta 2. Mesas Sectoriales – Ministerio de Hacienda Durante el periodo evaluado se participó en las actividades de elaboración y formulación de la Guía para la elaboración del Plan de Preservación Digital. Así mismo en la reunión de entrega y socialización de esta.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Abril	<p>Para el mes de abril se adelantaron las siguientes actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR 2022.</p> <p>Realizar las respectivas inserciones del archivo de gestión en orden cronológico.</p> <p>Se han realizado las actividades de Inserción, correspondientes a la serie Control Interno De Gestión, una (1) carpeta equivalente a 0.0085 metros lineales de información correspondientes a entregas de informes de gestión. Serie Contratos dos (2) cajas equivalentes a 0.71 metros lineales</p> <p>Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario.</p> <p>Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente.</p> <p>Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas internas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> E.T Sector Vivienda – 11 Inserciones E.T Sector Transporte – 3 inserciones E.T Reactivación Económica – 12 Inserciones E.T Sector Educación – 38 Inserciones E.T Macroproyecto El Gramalotes 4 Inserciones y 3 Carpetas E.T gestión Contractual – 277 Inserciones Control Interno de Gestión – 6 inserciones E.T Macroproyecto Canal del Dique 2 cajas 0.50 metros lineales <p>Clasificar por serie y subserie documental.</p> <p>Durante el periodo evaluado se han adelantado las siguientes actividades de clasificación y organización por parte del operador de organización sobre la serie proyectos - contrato 094 de 2012 Comfama correspondiente a un total de 120 cajas, equivalentes a 30 metros lineales de información.</p> <p>Proyección de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajustes al borrador del documento de actualización del Programa de Gestión Documental Elaboración del Diagnostico Integral de Archivos de la Entidad <p>Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA Se realizaron mesas de trabajo con el contratista Forest en la cual se trabajaron la matrices de información correspondientes, para realizar las configuraciones correspondientes de la nueva herramienta con el ánimo de iniciar pruebas de la misma, para lo anterior se han adelantado un total de 7 mesas de trabajo con la participación de los Equipos de Trabajo de Tecnologías de la Información y la Sección Gestión Documental en conjunto con los colaboradores de Forest BPMS Macroproyectos en la cual se realizaron actividades de transferencia de conocimiento, adicional se adelantaron actividades de parametrización del módulo de radicación del SGDEA, para lo anterior se realizó la depuración de base de datos de terceros la cual inicialmente contaba con 29.300 registros, se retiraron registros duplicados y se finalizó con 17.973 registros .</p>
Mayo	<p>Actividad 1. Realizar las respectivas inserciones del archivo de gestión en orden cronológico.</p> <p>Desarrollo: Serie CONTRATOS Vigencia 2012 A 2019 correspondiente a 0.51 metros lineales de información</p> <p>Actividad 2. Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 2 transferencias externas, discriminadas de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato 2019-C-0358 Ingeniero Gustavo Adolfo Torres Duarte 5 Cajas X-200 2. Contrato 2015-C-0171 Interventoría Restrepo y Uribe S.A.S 19 Cajas X-200 3. Contrato 2017-C-0179 Corpacero 10 Cajas X-200 <p>Para un total 8.5 Metros lineales de información.</p> <p>Actividad 3. Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente.</p> <p>Desarrollo: Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas internas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretaría General – Resoluciones-6 Carpetas 2. Reactivación Económica – 4 Folios <p>Información que corresponde a un total 0.25 Metros Lineales de información.</p> <p>Actividad 4. Clasificar por serie y subserie documental.</p> <p>Desarrollo: Durante el periodo evaluado se han adelantado las siguientes actividades de clasificación por parte del E.T Sección Gestión Documental sobre la Serie CONTRATOS y PROYECTOS de las vigencias 2012 y 2013 correspondiente a un total de 509 cajas, equivalentes a 124 metros lineales de información.</p> <p>Actividad 5. Realizar la completitud del expediente e incluir la documentación en orden cronológico.</p> <p>Desarrollo: Se ha realizado la completitud de información perteneciente a la Serie Resoluciones con la inserción de 0,25 metros lineales, correspondientes a las Resoluciones de vigencia 2020 de la Entidad.</p> <p>Actividad 6. Elaboración y actualización de Instrumentos archivísticos, y documentación que apoyen el proceso de Gestión Documental.</p> <p>Desarrollo: Proyección de los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Circular 008 de 11 de mayo de 2022 2. Resolución 367 de 2 de mayo de 2022 <p>Actividad 7. Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA.</p> <p>Desarrollo: Se realizaron mesas de trabajo con el contratista Macroproyectos para la implementación de su herramienta Forest, en la cual se trabajaron la matrices de información correspondientes, para realizar las configuraciones correspondientes de la nueva herramienta con el ánimo de iniciar pruebas de la misma, para lo anterior se han adelantado un total de 10 mesas de trabajo con la participación de los Equipos de Trabajo de Tecnologías de la Información y la Sección Gestión Documental, Sección Atención al ciudadano en conjunto con los colaboradores de Forest BPMS Macroproyectos, en donde se adelantó la fase de transferencia de conocimiento a los administradores de la herramienta y se solicitan bases de datos a informática Documental para continuar con los procesos de migración correspondiente.</p>
Junio	<p>Meta 1. Actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR – Plan Institucional de Archivos 2022.</p> <p>Actividad 1. Realizar el control de calidad respectivo del archivo de gestión.</p> <p>Desarrollo: Se llevó a cabo las actividades de control de calidad, a las Series:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HISTORIAS LABORALES INACTIVAS a un total de (8) ocho metros de información. • RESOLUCIONES Vigencia 2011-2020 a un total de (4) cuatro metros lineales de información.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> • PQRSDF a un total de (30.50) treinta puntos cincuenta metros lineales de información. • INFORMES DE COMISIÓN a un total de (3.25) tres puntos veinticinco metros lineales. • CONTRATOS 2012 a un total de (3.25) tres puntos veinticinco metros lineales. <p>Para un total de (49) cuarenta y nueve metros lineales.</p> <p>Actividad 2. Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario. Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 11 transferencias externas, discriminadas de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato 2013-C-0050 Corporación Minuto De Dios, 32 Cajas X200 2. Contrato 2019-C-0113 Construir 21, 23 Cajas X200 3. Contrato 2018-C-0210 Consorcio Itiel, 15 Cajas X200 4. Contrato 2020-C-0223 Unexalog Sas, 3 Cajas X200 5. Contrato 2012-C-0088 Comfandi, 5 Cajas X200 6. Contrato 2016-C-0237 Consorcio Obra Vip Sucre, 30 Cajas X200 7. Contrato 2014-C-0292 Pomcas-Rio Cali, 12 Cajas X200 8. Contrato 2012-C-0096 Operador Zonal Colsubsidio, 91 Cajas X200 9. Contrato 2020-C-0064 Consorcio Wa-Gramalote, 12 Cajas X200 10. Contrato 2020-C-0070 Interventoría Restrepo Y Uribe S.A.S, 1 Cajas X200 11. Contrato 2013-C-0242 Comfachocó, 14 Cajas X200 <p>Para un total (59,5) cincuenta y nueve coma cinco metros lineales de información.</p> <p>Actividad 3. Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente. Desarrollo: Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas internas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.E.T. Sector Gestión Financiera – Sección Presupuesto – Comunicaciones Solicitud de expedición y modificación de CDR – 2 carpetas. 2.E.T. Control Interno Disciplinario – Informes de Seguimiento y Control, Actas De Comité Institucional e Informes A Entidades De Estado – 1 Carpeta. 3.E.T. Gestión del Talento Humano – Evaluaciones del Desempeño Laboral y tipologías varias de Historias Laborales - 2 carpetas. 4.Secretaría General – Resoluciones – Vigencia 2020 - 1 Caja X200 <p>Información que corresponde a un total 0.50 metros lineales de información.</p> <p>Actividad 4. Clasificar por serie y subserie documental. Desarrollo: Durante el periodo evaluado se han adelantado las siguientes actividades de clasificación por parte del E.T. Sección Gestión Documental sobre las siguientes series:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.RESOLUCIONES Vigencia 2011-2020 a un total de (4) cuatro metros lineales de información. 2.PQRSDF a un total de (30.50) treinta punto cincuenta metros lineales de información. 3.INFORMES DE COMISIÓN a un total de (3.25) tres punto veinticinco metros lineales. 4. CONTRATOS 2012 a un total de (3.25) tres punto veinticinco metros lineales. Para un total de (49) cuarenta y nueve metros lineales. <p>Información que corresponde a un total 41 metros lineales de información.</p> <p>Actividad 5. Realizar la completitud del expediente e incluir la documentación en orden cronológico. Desarrollo: Se ha realizado la completitud de información perteneciente a las series:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>1. ACTAS - Actas De Comité De Coordinación Del Sistema De Control Interno. 2. INFORMES - Informes De Seguimiento Y Control -2022. 3. CONTRATOS.</p> <p>Correspondiente a 0,09 metros lineales de inserciones de información.</p> <p>Actividad 6. Elaboración y actualización de Instrumentos archivísticos, y documentación que apoyen el proceso de Gestión Documental. Desarrollo: Proyección de los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostico integral de archivos 2. Programa de Archivos Descentralizados 3. Programa de Reprografía 4. Programa de Documentos Vitales 5. Tablas de Control De Acceso <p>Actividad 7. Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA. Desarrollo: Se realizaron mesas de trabajo con el contratista Macroproyectos para la implementación de su herramienta Forest, para la cual se programaron 5 días de capacitación para administradores en lapsos de 4 horas diarias, capacitaciones que se realizaron los días 13,14,15,16 y el 21 de junio.</p>
Julio	<p>Meta 1. Actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR – Plan Institucional de Archivos 2022.</p> <p>Actividad 1. Realizar el control de calidad respectivo del archivo de gestión. Desarrollo: Se llevó a cabo las actividades de control de calidad, a las Series:</p> <p>HISTORIAS LABORALES ACTIVAS. A esta serie se les incluyeron documentos para un total de (0,24) cero coma veinticuatro metros lineales de información y se le realizaron actividades adicionales de foliación, digitalización, actualización de FUID e inclusión de hoja de control física.</p> <p>HISTORIAS LABORALES INACTIVAS. A esta serie se les incluyeron documentos para un total de (0,03) cero coma tres metros lineales de información y se le realizaron actividades adicionales de foliación, digitalización, actualización de FUID e inclusión de hoja de control física.</p> <p>CONTRATOS. A esta serie se les incluyo (14) catorce metros lineales de documentos, pertenecientes a (542) quinientos cuarenta y dos contratos y/o convenios; en total se intervinieron un total de (373) trescientos setenta y tres cajas y (585) quinientos ochenta y cinco carpetas.</p> <p>Para un total de (14,27) catorce coma veintisiete metros lineales.</p> <p>Actividad 2. Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario. Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 03 transferencias externas, discriminadas de la siguiente forma:</p> <p>CONSORCIO LA MOJANA 2017 2017-C-0279 18 cajas X200 MANATÍ PRIMERO ETAPA 3 2020-C-0186 8 cajas X200 COMFENALCO CARTAGENA 2013-C-004 219 cajas X200 MEDIOS MAGNÉTICOS, se levantó inventario de los medios magnéticos del contratista POMCAS y se le realizó el testigo documental a cada uno de ellos, además, se diligencio el Formato Único de Inventario Documental - FUID para el contrato 2014-C-0292 y se registraron los medios magnéticos de las transferencias internas y externas. 6 cajas X200</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Para un total de (62,75) sesenta y dos coma setenta y cinco metros lineales de información.</p> <p>Actividad 3. Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente. Desarrollo: Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo:</p> <p>E.T. Sector Gestión Financiera – Sección Presupuesto – documentos de contratos – (16) dieciséis folios. E.T. Control Interno Disciplinario – Informes de Seguimiento y Control (28) folios. Contratos (534) quinientos treinta y cuatro folios.</p> <p>Información que corresponde a un total de (0,08) cero coma cero siete metros lineales de información.</p> <p>Para la conformación de expedientes electrónicos adelantaron mesas de trabajo, con el ánimo de realizar la conformación de los expedientes electrónicos del E.T Gestión Financiera, para lo cual se verificaron la información producida por sección presupuesto, tesorería y contabilidad. asimismo se crearon los expedientes electrónicos correspondientes a Consecutivo de Comunicaciones Enviadas, Banco Terminológico, Inventarios Documentales, Tablas de Retención Documental.</p> <p>Actividad 4. Clasificar por serie y subserie documental. Desarrollo: Durante el periodo evaluado se han adelantado las siguientes actividades de clasificación por parte del E.T. Sección Gestión Documental sobre las siguientes series:</p> <p>Para el mes de julio, se inició la clasificación de los documentos entregados por las áreas ante el cambio de sede realizado el pasado mes de noviembre, para la clasificación de los documentos mencionados se adelantó la actividad con el apoyo de la profesional en gestión documental de la sección, se aplicó la clasificación a un total de (1,66) uno coma sesenta y seis metros lineales de información.</p> <p>Actividad 5. Elaboración y actualización de Instrumentos archivísticos, y documentación que apoyen el proceso de Gestión Documental. Desarrollo: Proyección de los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización Plan de Conservación Documental 2. Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 3. Armonización Sistema Integrado de Conservación. <p>Actividad 6. Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA. Desarrollo: Se realizaron reuniones de capacitaciones en mesas de trabajo para la cual se dividieron los participantes en 5 grupos los cuales recibieron 4 sesiones de 2 horas diarias de capacitación en compañía del contratista Macroproyectos para la implementación de su herramienta Forest, en la cual se tuvo participación de 101 personas.</p>
Agosto	<p>Meta 1. Actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR – Plan Institucional de Archivos 2022.</p> <p>Actividad 1. Realizar el control de calidad respectivo del archivo de gestión. Desarrollo: Se llevó a cabo las actividades de control de calidad, a las Series: HISTORIAS LABORALES ACTIVAS. A esta serie se realizó el proceso de inserción de hoja de control digital al expediente para un total de 93 carpetas que equivale a 3.87 metros lineales.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>HISTORIAS LABORALES INACTIVAS. A esta serie se realizó el proceso de inserción de hoja de control digital al expediente para un total de 279 carpetas que equivale a 11.62 metros lineales.</p> <p>CONTRATOS. A esta serie se le realizó el proceso de inserción digital a los contratos y/o convenios de las vigencias 2012-2019 para un total de folios 4120 que equivale a 0,75 metros lineales.</p> <p>Actividad 2. Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario. Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 04 transferencias externas, discriminadas de la siguiente forma: SAMADIEGO 2019 2017-C-92 de 1 cajas X-200 CONSORCIO TTU-CGB 2013-CV-0107 de 1 cajas X-200 CONSTRUCTORA CIVICOL 2020-C-177 de 5 cajas X-200 FEDETABACO 2016-C-0175 de 7 Cajas X-200 MEDIOS MAGNÉTICOS, inicialmente estos medios reposaban en 1 caja x-300 y se levantó inventario de los medios magnéticos del contratista POMCAS y se le realizó el testigo documental a cada uno de ellos, además, se diligencio el Formato Único de Inventario Documental - FUID para el contrato 2014-C-0292 y se registraron los medios magnéticos de las transferencias internas y externas. 6 cajas X-200, Para un total de 5 metros lineales</p> <p>Actividad 3. Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente. Desarrollo: Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Control interno de Gestión- informes de seguimiento de 5 folios -Subgerencia de estructuración- canal del Dique- contrato 185 -2015 de 1 caja x-200 con 7 carpetas <p>Actividad 4. Clasificar por serie y subserie documental. Desarrollo: se clasificó de la unidad financiera – presupuesto – tesorería las siguientes series contables:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nóminas y planes 2016 -2019 1 caja x-200 -Certificaciones 1 caja x-200 -Vigencias futuras 2016-2020 1 caja x-200 -Cajas menores 2016-2019 – 2 cajas x-200 -Órdenes de pago – 1 caja x-200 -Informes -3 cajas x-200 <p>Para un total de cajas 9 x-200 que equivalen a 2.25 metros lineales</p> <p>Actividad 5. Elaboración y actualización de Instrumentos archivísticos, y documentación que apoyen el proceso de Gestión Documental. Desarrollo: Proyección de los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Propuesta Actualización caracterización gestión documental del SGC 2. Manual de gestión documental. <p>Actividad 6. Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA. Desarrollo: Se da la implementación del nuevo SGDEA - DATAFONDO, el 01 agosto del 2022. Para lo cual se realiza el respectivo acompañamiento a la implementación por parte de la empresa Macroproyectos (2 personas, 1 persona Virtual y 1 de manera presencial) y también por parte de la Sección Gestión Documental. Dando soporte a 74 requerimientos generados por todas las áreas frente a dudas que se presenten frente al funcionamiento del Sistema.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Septiembre	<p>Meta 1. Actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR – Plan Institucional de Archivos 2022.</p> <p>Actividad 1. Se realizó el proceso de aplicación de Tabla de Retención Documental a la serie Proyectos -Contrato 227 de 2016 para un total de 35 cajas que equivalen a 8.75 ML CONTRATOS. A esta serie se le realizó el proceso de inserción digital a los contratos y/o convenios de las vigencias 2012-2020 para un total de folios 4523 que equivale a 0,94 ML CONTRATOS. A esta serie se realizó el proceso de inserción digital al nuevo gestor electrónico DATAFONDO. Se realizo la inserción de 5136 Hojas de control a los expedientes virtuales de los contratos de vigencias 2013 y 2014</p> <p>Actividad 2. Recepción de cajas de transferencias externas Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 11 transferencias externas, discriminadas de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> •CONSORCIO AGUAS NORMALIZAR - 2019-C-0226 de 1 caja x200 •COMFAGUAJIRA -2013-C-0010 de 129 cajas X200 •COORPORACIÓN MINUTO DE DIOS -2013-C-0050 de 124 X200 •CONSORCIO INTERGABARRA-2013-CV-0046 de 7 cajas X200 •COMFACESAR -2013-C-0002 de 124 cajas X200 •COMFANDI-2012-C-0088 de 5 cajas X200 •JARILLON DE CALI-2013-C-0076 de 33 cajas x200 •JARILLON DE CALI- Derivado J2013-C-0181 de 9 cajas x200 •JARILLON DE CALI-Derivado 2013-C-0181 -18-J0410 de 8 cajas x200 •JARILLON DE CALI- Derivado 2013-C-0181 -16J0302 de 1 caja x200 •COMFANDI - 2013-C-0181 de 2 cajas x200 <p>Para un total de 444 cajas x200 que equivalen a 111 ML</p> <p>Actividad 3. Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente. Desarrollo: Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Control interno de Gestión- informes de seguimiento de 68 folios •Gerencia de 444 folios •Secretaria General de 401 folios •Sector de Vivienda – contratos de los diferentes operadores de 344 folios •Sección Gestión Documental - FA-CDO-F-S-001-2021 de 5 folios •Sección de presupuesto-entrega de comunicaciones solicitud CDR de 420 folios – se realizó esta transferencia electrónica. •Gestión Contractual – Contratos de 1286 folios •Sección Gestión Documental –PQRSDF de 1257 folios. <p>En esta actividad fue el total de folios de 4225 folios que equivale a 0,88 ML</p> <p>Actividad 5. Elaboración y actualización de Instrumentos archivísticos, y documentación que apoyen el proceso de Gestión Documental. Desarrollo de mesas de trabajo con la oficina de planeación para la actualización de la caracterización del proceso de gestión documental y la actualización de los flujogramas Mesa de trabajo con el grupo de evaluadores del Archivo General de Nación y ajuste definitivo de las trd previo a Comité evaluador</p> <p>Actividad 6. Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA. Desarrollo: Se sigue realizando el acompañamiento a los colaboradores de la entidad con la implementación del nuevo SGDEA – DATAFONDO.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	Para lo cual se realiza el respectivo acompañamiento a la implementación por parte de la empresa Macroproyectos (1 persona Virtual y manera presencial) y también por parte de la Sección Gestión Documental. Dando soporte a todas las dudas que se presenten frente al funcionamiento del Sistema.
Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	Para el mes de febrero, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no programó mesas sectoriales de los equipos de gestión documental del sector, por tal razón no se presenta avances durante este periodo.
Marzo	Se participó en la mesa sectorial realizada el pasado 31 de marzo en la cuales se compartieron los siguientes temas: Avances y logros alcanzados a la fecha por la mesa, entre los cuales se encuentran el diagnóstico inicial realizado en 2019 y como ha incrementado el puntaje desde la primera medición. Se presentó el estado del proyecto de Guía Elaboración Plan de Preservación Digital, con base en los avances de las mesas desde su formulación en 2020, hasta la generación del producto final. Así mismo, se relacionó en la sesión acerca de la guía generada por el AGN y como desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público buscamos articular nuestra guía con esta. Se socializó a la mesa el desarrollo de la nueva metodología de diagnóstico, la cual estará orientada principalmente bajo el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos V.2020 del AGN.
Abril	Para el mes de abril, no se programaron reuniones de la Mesa Sectorial de Gestión Documental del Sector Hacienda.
Mayo	Durante el periodo evaluado no se presentaron actividades de la mesa sectorial.
Junio	Durante el periodo evaluado se participó en las actividades del 1RA SESIÓN DE EXPERIENCIAS realizada el día 29 de junio de 2022.
Julio	Durante el periodo evaluado no se generaron reuniones de las mesas sectoriales de Gestión Documental del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Agosto	Se participo en la mesa sectorial realizada el día 19/08/2022
Septiembre	Se participó en la reunión de la mesa técnica sectorial del sector hacienda realizada el pasado 15 de septiembre cuyo tema fue "Modelos de Administración de Archivos Físicos Operación Tercerizada"

- Equipo Gestión Contractual

Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN CONTRACTUAL**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Gestión Contractual

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6	Modernizar Y Fortalecer El Funcionamiento Del Fondo Adaptación Con Visión De Largo Plazo			
Acciones Estratégicas 2022	Indicador	Meta	Programación Trimestral	Avance Meta

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)		2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Realizar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Procesos de contratación tramitados de forma adecuada y oportuna en los términos de ley.	100%	100	100	100	100	100
Gestionar de forma adecuada y oportuna las actas o informes radicados según Plan de liquidaciones 2022	Actas o informes radicados según Plan de Liquidaciones 2022 sobre actas o informes gestionados en un término máximo de 30 días calendario desde su radicación.	100%	100	100	100	100	100
Realizar modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas	Modificaciones, cesiones, terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas.	100%	100	100	100	100	100

Mes	Avance Cualitativo
Procesos de contratación tramitados de forma adecuada y oportuna en los términos de ley.	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	Durante el primer trimestre de 2022, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades solicitaron la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de 2 órdenes de compra las cuales se tramitaron oportunamente. Adicionalmente, requirieron adelantar el trámite para 190 procesos de contratación llevados a cabo electrónicamente a través de SECOP II, de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Abril	Durante el mes de abril de 2022, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades no requirieron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Adicionalmente, requieren adelantar el trámite para 1 proceso de contratación llevado a cabo electrónicamente a través de SECOP II, de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Mayo	Durante el mes de mayo de 2022 las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 1 orden de compra la cual se tramitó oportunamente. Adicionalmente, requieren adelantar el trámite para 3 procesos de contratación llevado a cabo electrónicamente a través de SECOP II de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Junio	<p>En junio de la presente vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 25 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 25 solicitudes, 4 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p> <p>Se concluye que, durante el segundo trimestre de 2022 las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo con sus necesidades solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de 4 órdenes de compra, las cuales se tramitaron oportunamente. Adicionalmente, requirieron adelantar el trámite para 7 procesos de contratación llevado a cabo electrónicamente a través del SECOP II de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
Julio	Durante el mes de julio de 2022 las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo con sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado. Adicionalmente, si requirió adelantar el trámite para 25 procesos de contratación llevados a cabo electrónicamente a través de Secop II, de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Agosto	Durante el mes de agosto de 2022 las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo con sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado. Adicionalmente, se requirió adelantar el trámite para 12 procesos de contratación llevado a cabo electrónicamente a través de Secop II, de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Septiembre	Durante el tercer trimestre de 2022 las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo con sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado. Sin embargo, si requirieron adelantar el trámite para 41 procesos de contratación llevados a cabo electrónicamente a través de la plataforma Secop II, de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el tercer trimestre reportado fue el 100%.
Actas o informes radicados según Plan de Liquidaciones 2022 sobre actas o informes gestionados en un término máximo de 30 días calendario desde su radicación.	
Enero	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	El avance consolidado del Plan de Liquidaciones 2022 para el primer Q1 con corte 31/03/2022 es el siguiente: Total radicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022:166 trámites con el siguiente estado: a)Contratos/Convenios liquidados: 76; b)Cierres de expediente tramitados: 4; c)Trámites devueltos para ajustes de Sectores, Macroproyectos y Equipos:19; d)En revisión equipo gestión contractual - liquidaciones: 8 recibidos el 31/3/2022; e)En trámite de firma: 6; f)No objeto de Liquidación: 52; g)En liquidación judicial: 1.
Abril	Entre el 1º y el 30 de abril de 2022 se radicaron 26 trámites. El estado actual de esos 26 trámites es el siguiente: 4 actas de liquidación suscritas; 8 trámites devueltos para ajustes; 4 actas en firma; 7 trámites en revisión, radicados entre el 28 y el 29 de abril; 3 contratos con reporte no objeto de liquidación. Adicionalmente a los 3 contratos no objeto de liquidación relacionados en el Plan de Liquidaciones 2022, en el marco de la depuración de la herramienta SIFA conforme a las actividades de mejora del Plan de Mejoramiento de la Secretaría General -Informe de Seguimiento al Macroproceso de Gestión Contractual, los Sectores, Macroproyectos y demás Equipos de Trabajo reportaron en el mes de febrero, 12 contratos no objeto de liquidación.
Mayo	No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un reporte trimestral (Q1, Q2, Q3) en atención al plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General. Sin embargo, se reporta que entre el 1º y el 31 de mayo de 2022 se radicaron 47 trámites para revisión del Equipo de Gestión Contractual - Liquidaciones. El estado actual de esos 47 trámites es el siguiente: 5 actas de liquidación suscritas; 6 informes de cierre de expediente tramitados; 1 informe de cierre en revisión del Equipo de Gestión Financiera; 6 trámites devueltos para ajustes; 9 trámites en revisión del Equipo de Gestión contractual; y 20 contratos con reporte no objeto de liquidación.
Junio	El avance del Plan de Liquidaciones 2022 - Q2 con corte 30/6/2022, es el siguiente: Total 119 trámites con el siguiente estado: a) Contratos/Convenios liquidados: 22; b) Cierres de expediente tramitados: 16; c)Trámites devueltos para ajustes de Sectores, Macroproyectos y Equipos: 19; d)En revisión equipo gestión contractual - liquidaciones: 52; e)En trámite de firma: 1; f)No objeto de Liquidación: 7; g) En revisión financiera: 2. TOTAL: 119
Julio	Entre el 1º y el 31 de julio de 2022 se radicaron 11 trámites para revisión del Equipo de Gestión Contractual. El estado actual de esos 11 trámites es el siguiente: 1 acta de liquidación suscrita; 1 cierre de expediente suscrito, 2 trámites devueltos para ajustes; 1 acta en firma del contratista; y 6 actas en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones recibidas entre el 28 y el 29 de julio. Adicionalmente se reportó el contrato 2013-C-0002 suscrito con Comfacesar, cuya liquidación definitiva se tramitará vía judicial.
Agosto	En el mes de agosto de 2022 se reportaron 25 trámites con el siguiente estado: un (1) contrato liquidado, un (1) contrato con informe de cierre de expediente, cuatro (4) actas de liquidación devueltas a los Sectores, Macroproyectos y demás Equipos de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	Trabajo para ajustes, dos (2) contratos derivados de Operador Zonal remitidos a liquidación judicial dentro del contrato marco del Fondo Adaptación, dos (2) actas de liquidación en revisión del E. T. Gestión Contractual y quince (15) contratos no objeto de liquidación.
Septiembre	Para el reporte del Q3 (julio-agosto-septiembre) se reporta un total de 47 trámites radicados conforme el Plan de Liquidaciones 2022, con el siguiente estado. a) Dieciocho (18) contratos/convenios con estado liquidado, b) Seis (6) Informes de cierre de expediente suscritos, c) Dos (2) trámites en liquidación judicial, d) Trece (13) trámites en revisión del Equipo de Gestión Contractual - radicados el 29 de septiembre de 2022, e) Cinco (5) trámites devueltos para ajustes de los Sectores, f) Tres (3) trámites en revisión del E.T Gestión Financiera. Asimismo entre julio y septiembre de 2002 se identificaron y gestionaron en SIFA y SECOP ciento quince (115) contratos no objeto de liquidación, y se suscribieron cinco (5) actas de terminación anticipada y liquidación.
Modificaciones, cesiones, terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas.	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	En el primer trimestre de 2022, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 50 requerimientos, los cuales, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 50 solicitudes, 2 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Abril	En abril de presente vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 12 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 12 solicitudes, 1 requirió mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Mayo	En mayo de presente vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 17 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 17 solicitudes, 4 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Junio	<p>Durante el mes de junio de 2022 las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo con sus necesidades, solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de 3 órdenes de compra, las cuales se tramitaron oportunamente. Adicionalmente, requirieron adelantar el trámite para 3 procesos de contratación llevado a cabo electrónicamente a través de Secop II de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p> <p>En conclusión, en el segundo trimestre de vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 54 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 54 solicitudes, 4 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
Julio	<p>En julio de la presente vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 33 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 33 solicitudes, 2 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
Agosto	<p>En agosto de presente vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 13 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 13 solicitudes, 2 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100 %</p>
Septiembre	<p>En el tercer trimestre de presente vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 59 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 59 solicitudes, 1 requirió mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el tercer trimestre reportado fue el 100%.</p>

- Equipo Defensa Judicial

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

En Defensa Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo, se desarrollan y consolidan las acciones para lograr una mejor defensa de los intereses de la Entidad. Las acciones planteadas buscan alinearse con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa del Estado y fortalecer los resultados y desempeño en la política de Defensa Judicial en el Índice de Desempeño Institucional.

Portafolio/Programa/Proyecto: **DEFENSA JUDICIAL**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Defensa Judicial

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6		Modernizar Y Fortalecer El Funcionamiento Del Fondo Adaptación Con Visión De Largo Plazo					
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran.	Reporte de índice de condenas diligenciado y socializado al Comité de Conciliación de la Entidad.	1	-	-	-	1	1
Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda	Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	2	-	-	-	2	N.a.
Realizar la verificación semestral de aquellos contratistas que incumplan su deber legal del pago de salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores, así como, de honorarios a sus contratistas	Reporte sobre el pago de contratistas, Realizado.	1	-	1	-	2	0
Medir las tasas de éxito del Fondo durante la vigencia inmediatamente anterior en los procesos judiciales en los que es demandado, recibiendo, gestionando y haciendo seguimiento a los procesos judiciales entablados en su contra	Medir tasas de éxito procesal de conformidad con el indicador implementado en el Sistema de Gestión de Calidad del FA.	1	1	-	-	1	1

Mes	Avance Cualitativo
Reporte de índice de condenas diligenciado y socializado al Comité de Conciliación de la Entidad.	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	Se construyó el reporte del índice de condenas, resaltando los aciertos de la defensa adelantada en el caso objeto de estudio frente a la causa de Ilegalidad del Acto Administrativo que Ordena el Retiro Forzoso, proceso que resulto favorable a los intereses litigiosos de la entidad y que constituye un precedente para los futuros procesos que sobre la misma causa se surtan al interior de la entidad.
Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte
Septiembre	No aplica para el periodo del reporte
Reporte sobre el pago de contratistas, Realizado.	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	Se han presentado dificultades en la unicidad de criterios a reportar en atención a la multiplicidad de contrataciones que realiza la entidad para el adecuado seguimiento de pagos de aportes a seguridad social efectuados por los empleadores a sus trabajadores. Se espera generar el reporte en el tercer trimestre, una vez se unifiquen los criterios.
Julio	No aplica para el periodo del reporte
Agosto	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Septiembre	No aplica para el periodo del reporte
Medir tasas de éxito procesal de conformidad con el indicador implementado en el Sistema de Gestión de Calidad del FA.	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	Se construyó el reporte del indicador denominado defensa judicial, cuyo objetivo es medir las tasas de éxito del Fondo en los procesos judiciales en los que es demandado, recibiendo, gestionando y haciendo seguimiento a los procesos judiciales entablados en su contra, mismo que arrojó como resultado una tasa de éxito del 80% de las decisiones ejecutoriadas durante la vigencia 2021. A la fecha se encuentra pendiente la publicación de dicho indicador en el proceso 10. Defensa Judicial conforme al Kit Documental incorporado en el Sistema de Gestión de Calidad para tal fin.
Abril	Meta para el periodo cumplida
Mayo	Meta para el periodo cumplida
Junio	Meta para el periodo cumplida
Julio	Meta para el periodo cumplida
Agosto	Meta para el periodo cumplida
Septiembre	Meta para el periodo cumplida

- Equipo Control Interno Disciplinario

Portafolio/Programa/Proyecto: **CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

Gerente de Meta: Asesor Control Interno Disciplinario

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6	MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO						
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades /Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Gestionar las actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente	Número de requerimientos tramitados en el término establecido / Número de requerimientos asignados.	100%	100%	100%	100%	100%	100
Capacitar a funcionarios de la entidad en la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias.	Realizar actividades de capacitación para la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares.	4	-	-	-	4	4

Mes	Avance Cualitativo
Número de requerimientos tramitados en el término establecido / Número de requerimientos asignados.	
Enero	<p>Durante el mes de Enero de 2022, se analizó uno a uno el estado de expedientes a cargo del equipo de trabajo de control interno disciplinario, en especial los aspectos relacionados con vencimiento de términos procesales, buscando prevenir riesgos relacionados con estos aspectos dentro de la legislación vigente. Así mismo se socializó el Plan de Acción Integrado 2022 publicado en la pagina web de la entidad, en cuya página 44, punto 4.5.4. se indica las acciones estratégicas dispuestas para nuestro equipo de trabajo de control interno disciplinario, junto con sus indicadores de metas y programación de las mismas dentro del año 2022. Por su parte, se estructuró el cronograma y temáticas a abordar para las sensibilizaciones o capacitaciones en promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, dispuesto como meta en el presente año, la cual se informará oportunamente para efecto de la convocatoria. Dado el cambio de normatividad disciplinaria, durante el mes de enero se elaboró con el equipo de trabajo el proyecto de modificación de la ficha de caracterización, normograma, manual de funciones y organización de planta de personal dispuesto para el equipo de trabajo de control interno disciplinario, así como para la secretaria general y gerencia del fondo, a fin de ajustar, dentro del proceso disciplinario, las etapas de instrucción y juzgamiento exigidas por la Ley 1952 de 2019, la cual entrará en vigencia el próximo 29 de marzo. Por último, el pasado 31 de enero se asistió a la Primera Sesión del año 2022 del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda, en el cual abordaron los temas de Balance Día de la Transparencia 2021, realizado el pasado 29 de noviembre, el cual contó con la participación de funcionarios y contratistas del fondo.</p>
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> Durante el mes de Febrero de 2022, se realizó seguimiento al avance de los procesos disciplinarios de cada uno a uno de los expedientes a cargo del equipo de trabajo de control interno disciplinario, en especial lo relacionado con vencimiento de términos procesales, buscando prevenir riesgos relacionados con estos aspectos y la prescripción de la acción disciplinaria. Dado el cambio de normatividad disciplinaria, durante el mes de febrero se elaboró y remitió una solicitud de concepto dirigido a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, con el propósito de tener claridad sobre los términos procesales a aplicar en las actuaciones disciplinarias activas a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 el próximo 29 de marzo. Así mismo, se consultó sobre la estructura disciplinaria de la entidad, en aras de obtener certeza operacional en el trámite de las etapas de instrucción y juzgamiento del nuevo proceso disciplinario.
Marzo	El porcentaje de avance de esta meta establecida para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2022, es de un 100%.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Abril	Frente al avance en la gestión de actuaciones disciplinarias, se destaca el cumplimiento a los términos en todos y cada uno de los procesos disciplinarios a cargo del equipo de trabajo, atendiendo los diferentes requerimientos dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.
Mayo	Frente al avance en la gestión de actuaciones disciplinarias, destaca que se ha dado cumplimiento a los términos en todos y cada uno de los procesos disciplinarios a cargo del equipo de trabajo, atendiendo los diferentes requerimientos dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente. En materia de seguimiento al avance de los procesos disciplinarios en cada uno de los expedientes a cargo del equipo de trabajo de control interno disciplinario, con miras a prevenir vencimiento de términos procesales, y riesgos relacionados con la prescripción de la acción disciplinaria, se efectúa control permanente sobre los mismos, lo que ha arrojado como consecuencia el cumplimiento pleno de las metas y términos establecidos.
Junio	El porcentaje de avance de esta meta establecida para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2022, es de un 100%.
Julio	En materia de seguimiento al avance de los procesos disciplinarios en cada uno de los expedientes a cargo del equipo de trabajo de control interno disciplinario, con miras a prevenir vencimiento de términos procesales, y riesgos relacionados con la prescripción de la acción disciplinaria, se revisó el cuadro de control de expedientes disciplinarios a corte 31/07/2022, destacando que se ha dado cumplimiento a los términos en todos y cada uno de los procesos disciplinarios y requerimientos remitidos a cargo de este equipo de trabajo, dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.
Agosto	En materia de seguimiento al avance de los procesos disciplinarios en cada uno de los expedientes a cargo del equipo de trabajo de control interno disciplinario, con miras a prevenir vencimiento de términos procesales, y riesgos relacionados con la prescripción de la acción disciplinaria, se revisó el cuadro de control de expedientes disciplinarios a corte 31/08/2022, destacando que se ha dado cumplimiento a los términos en todos y cada uno de los procesos disciplinarios y requerimientos remitidos a cargo de este equipo de trabajo, dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente. Durante el presente mes de agosto se efectuaron un total de 17 actuaciones disciplinarias definitivas y de trámite.
Septiembre	El porcentaje de avance de esta meta establecida para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, para el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2022, es de un 100%.
Realizar actividades de capacitación para la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares.	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	En atención a las actividades a desarrollar en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC para la vigencia 2022, en especial la definida dentro Eje 2: Creación de valor público conforme al Plan Nacional de Formación y Capacitación - PNFC 2020-2030, denominada como Capacitación en el Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019, y en consideración al Plan de Acción Integrado 2022, dentro del cual se dispuso, como acción estratégica para con nuestro Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, la realización de cuatro (4) sensibilizaciones o capacitaciones encaminadas a la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, como parte del plan estratégico de sensibilización para el

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>presente año, para el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, se efectuaron un total de tres (3) capacitaciones, las cuales se desarrollaron de la siguiente manera:</p> <p>25/02/2022. Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019 / "Prevención en materia de faltas disciplinarias por presunta participación o intervención en política". Total:117 personas.</p>
Marzo	<p>En atención a las actividades a desarrollar en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC para la vigencia 2022, en especial la definida dentro Eje 2: Creación de valor público conforme al Plan Nacional de Formación y Capacitación - PNFC 2020-2030, denominada como Capacitación en el Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019, y en consideración al Plan de Acción Integrado 2022, dentro del cual se dispuso, como acción estratégica para con nuestro Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, la realización de cuatro (4) sensibilizaciones o capacitaciones encaminadas a la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, como parte del plan estratégico de sensibilización para el presente año, para el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, se efectuaron un total de tres (3) capacitaciones, las cuales se desarrollaron de la siguiente manera:</p> <p>16/03/2022. Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019 / "Inhabilidades e incompatibilidades en la contratación estatal", "Faltas disciplinarias en la liquidación y supervisión de contratos", y "profundización de la Ley 1952 de 2019". Total: 19 personas (Líderes de equipo)</p> <p>29/03/2022. Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019. Total 125 personas.</p>
Abril	<p>De la meta anual dispuesta definida en cuatro (4) sensibilizaciones o capacitaciones a realizar, encaminadas a la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, para el mes de abril se llevó a cabo la cuarta y última de ellas, con lo cual se da cumplimiento cabal a la meta dispuesta definida en el Plan de Acción Integrado 2022 del Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, así como al Plan Institucional de Capacitación - PIC para la vigencia 2022, en lo que respecta a la meta definida dentro del Eje 2: Creación de valor público conforme al Plan Nacional de Formación y Capacitación - PNFC 2020-2030, denominada como Capacitación en el Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019.</p>
Mayo	<p>El avance de esta meta establecida para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, es muy significativo, en la medida que, a corte del mes de abril, fueron efectuadas el total de las cuatro (4) capacitaciones programadas para todo el año 2022 dentro del plan de acción dispuesto.</p>
Junio	<p>El avance de esta meta establecida para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022, es muy significativo, dado que se efectuó un total de cuatro (4) capacitaciones, correspondientes al total de las capacitaciones programadas para todo el año 2022 dentro del plan de acción dispuesto para este equipo de trabajo, con un total de asistencia en las 4 capacitaciones de 368 personas.</p>
Julio	<p>La meta anual definida en cuatro (4) sensibilizaciones o capacitaciones encaminadas a la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, fue cumplida en su totalidad para el mes de abril del presente año, con un total de asistencia en las 4 capacitaciones de 368 personas, dando de esta manera cabal cumplimiento al Plan de Acción Integrado 2022 del Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, así como al Plan Institucional de Capacitación - PIC para la</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	vigencia 2022, en lo que respecta a la meta definida dentro del Eje 2: Creación de valor público conforme al Plan Nacional de Formación y Capacitación - PNFC 2020-2030, denominada como Capacitación en el Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019. Corolario a lo anterior, desde el pasado mes de mayo del presente año, junto con el Equipo de Trabajo de Comunicaciones se elaboraron unas capsulas informativas que fueron divulgadas durante los meses de mayo y junio, vía correo electrónico institucional, en las cuales se expusieron algunas conductas constitutivas de faltas disciplinarias en el nuevo código disciplinario, con lo que complementamos la finalidad de la actividad pedagógica propuesta dentro del plan de acción para el presente año.
Agosto	Esta meta se encuentra cumplida en su TOTALIDAD desde el pasado mes de abril.
Septiembre	El avance de esta meta establecida para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, se encuentra TOTALMENTE CUMPLIDA dentro del plan de acción 2022 dispuesto para este equipo de trabajo.

- Indicadores Plan de Acción de Alcance Institucional

Los siguientes indicadores miden la ejecución presupuestal de la entidad; sus resultados derivan de la gestión y logros tanto de las áreas misionales como de los grupos de trabajo de procesos de apoyo. Por su importancia, su resultado se mide a nivel institucional.

Portafolio/Programa/Proyecto: **FONDO ADAPTACIÓN**

Gerente de Meta: Institucional – Reporta Asesor Equipo Gestión Financiera

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6							
MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO							
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades /Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecución presupuestal	Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	95%				95%	98
Ejecución presupuestal	Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	95%				95%	65
Ejecución presupuestal	Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	100%				100%	99
Ejecución presupuestal	Ejecución PAC Total	100%				100%	47,27

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	
Enero	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de enero de 2022 es del 1,18%.
Febrero	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de Febrero de 2022 es del 1,44%. presentando un incremento del 0,26% respecto al mes de Enero de 2022.
Marzo	El avance de la ejecución total en compromisos, de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de marzo de 2022 es de 1,71%, que en comparación con el mes de febrero presenta un incremento del 0,27%.
Abril	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos en SIIF Nación al mes de abril de 2022 es del 2,01%, presentando un incremento del 0,30% respecto al mes de marzo de 2022.
Mayo	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de mayo de 2022 es del 93,99%, presentando un incremento del 91,98%.
Junio	El avance de ejecución total en compromisos de recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de junio de 2022, es del 97,33%, presentando un incremento del 3,34%.
Julio	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de Julio 2022 es de 97,71%, presentando un incremento del 0,38%.
Agosto	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de Agosto de 2022 es del 98,04%, presentando un incremento del 0,33%.
Septiembre	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de septiembre de 2022 es del 98,32%, presentando un incremento del 0,28%.
Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	
Enero	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de enero de 2022 es del 13,54%.
Febrero	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de Febrero de 2022 es del 18,99%. presentando un incremento del 5,45% respecto al mes de Enero de 2022.
Marzo	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de marzo de 2022 es del 24,41%, que en comparación con el mes de febrero de 2022 se presenta un incremento del 5,42%.
Abril	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de abril de 2022 es del 30,80%, presentando un incremento del 6,39% respecto al mes de marzo de 2022.
Mayo	El avance de ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de mayo de 2022 es del 36,92%, presentando un incremento del 6,12%.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Junio	El avance de ejecución en compromisos de recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de junio de 2022, es del 44,59%, presentando un incremento del 7,67%.
Julio	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de Julio de 2022 es del 52,44%, presentando un incremento del 7,85%.
Agosto	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de Agosto de 2022 es del 59,26%, presentando un incremento del 6,82%.
Septiembre	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de septiembre de 2022, es del 65,07%, presentando un incremento del 5,81%.
Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	
Enero	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de enero de 2022 es del 0,56%.
Febrero	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de Febrero de 2022 es del 0,56%. No se presenta incremento respecto al mes de Enero de 2022.
Marzo	Al mes de marzo de 2022 no se presenta avance en la ejecución de recursos de inversión, toda vez que no se ha realizado el levantamiento previo concepto - DNP para poder comprometer los recursos.
Abril	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de abril de 2022 es del 0,56%, sin presentar movimiento respecto al mes de marzo de 2022.
Mayo	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de mayo de 2022 es del 96,87%, presentando un incremento del 96,31%.
Junio	El avance de ejecución en compromisos de recursos de inversión en SIIF Nación al mes de junio de 2022, es del 99,99%, presentando un incremento del 3,12%.
Julio	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de julio de 2022 es del 99,99%. No se presenta avance.
Agosto	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de Agosto de 2022 es del 99,99%.
Septiembre	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de septiembre de 2022, es del 99,99%.
Ejecución PAC Total	
Enero	En enero de 2022 se efectuaron pagos por \$ 2,620 millones de acuerdo con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago en funcionamiento e inversión la ejecución del mes frente a la proyección de PAC que realizaron las áreas fue de un 63% y se alcanzó el 0,31% con respecto a la meta anual, teniendo en cuenta que el porcentaje esperado para el mes de enero era del 0,5%
Febrero	En febrero de 2022 se efectuaron pagos por \$ 13,785 millones de acuerdo con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, lo que corresponde a un 86% del valor proyectado en PAC.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	Teniendo en cuenta que la meta establecida para el mes de FEBRERO es del 4,12%, de lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 4,43%.
Marzo	En el mes de Marzo de 2022 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos por \$ 21,854 millones, valor que frente al valor proyectado del PAC para este mes por valor de \$17,694 millones, evidencia una sobre ejecución del 124%. Por lo anterior para el mes de marzo se alcanzó la meta en un 6,79% frente al porcentaje asignado para el cumplimiento de la meta anual para este mismo mes es del 5,5%. De lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 11,22%.
Abril	En el mes de Abril de 2022 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos por \$ 22,507 millones, resultado que frente al valor proyectado del PAC para este mes por \$26,232 millones, se evidencia una ejecución del 86%. Por lo anterior para el mes de abril se obtuvo un 8,84%, quedando por debajo frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mismo mes, el cual es del 10,3%. De lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 20,06%
Mayo	En el mes de MAYO de 2022 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos por \$ 13.822 millones, resultado que frente al valor proyectado del PAC para este mes por \$26,072 millones, se evidencia una ejecución del 53%. Por lo anterior para el mes de mayo se obtuvo un 5,78%, quedando por debajo frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mismo mes, el cual es del 10,9%. De lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 25,86%
Junio	En el mes de JUNIO de 2022 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos por \$ 24.795 millones, resultado que frente al valor proyectado del PAC para este mes por \$20.733 millones, se evidencia una sobre-ejecución del 120%. Por lo anterior para el mes de junio se obtuvo un 7,89%, quedando por encima frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mismo mes, el cual es del 6,6%. De lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 33,75%
Julio	En el mes de JULIO de 2022 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos por \$ 12.928 millones, resultado que frente al valor proyectado del PAC para este mes por \$22.805 millones, se evidencia una ejecución del 57%. Por lo anterior para el mes de Julio se obtuvo un 2,49%, quedando por debajo frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mismo mes, el cual era del 4,4%. De lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 36,24%.
Agosto	En el mes de AGOSTO de 2022 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos por \$ 15.451 millones, resultado que frente al valor proyectado del PAC para este mes por \$34.589 millones, se evidencia una ejecución del 45%. Por lo anterior para el mes de Agosto se obtuvo un 4,60%, quedando por debajo frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mismo mes, el cual era del 10,3%. De lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 40,84%.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Septiembre	En el mes de SEPTIEMBRE de 2022 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos por \$ 18.320 millones, resultado que frente al valor proyectado del PAC para este mes por \$20.259 millones, se evidencia una ejecución del 90%. Por lo anterior para el mes de Septiembre se obtuvo un 6,42%, quedando por debajo frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mismo mes, el cual era del 7,1%. De lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 47,27%.
