

INFORME SECTOR SALUD

INFORME SECTOR SALUD

**Informe de seguimiento a la
reconstrucción de Instituciones
Prestadoras de Servicios de salud
afectadas por el Fenómeno de La
Niña 2010 – 2011, con corte a
agosto 31 de 2014**



POSTULACIONES REALIZADAS POR EL MSPS:

Septiembre /2011:

13 IPS Departamento
Atlántico.

Aprobada por el Consejo
Directivo del Fondo en
sesión No. 4

(29 septiembre de 2011)

\$ 48.336.350





Febrero /2012:
241 IPS a nivel nacional.
Aprobada por el Consejo
Directivo del Fondo en sesión
No. 4 (2 febrero de 2012)
\$ 275.533.000.000

Total Aprobado por
Consejo Directivo
\$ 323.869.635.310



POSTULACIÓN FINAL MSPS



(Julio 11 del 2012)

Construcción y Dotación de 233 IPS.

Son asignados, por el Consejo Directivo, para la construcción y dotación de las IPS afectadas, recursos por valor total de **\$ 323.869.635.310**

165 IPS, por un valor estimado de \$280 mm, no tienen financiación.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 081 DE 2012
FA-MSPS

Objeto: Colaboración y coordinación de las actividades que soportan la ejecución del proyecto de reconstrucción de IPS afectadas por el Fenómeno de La Niña.

Principales objetivos del convenio:

- ✓ Agilizar la definición y aprobación de los requerimientos funcionales de cada IPS.
- ✓ Entregar los programas médico arquitectónicos.
- ✓ Validar y aprobar el diseño arquitectónico y la pertinencia del proyecto con relación a la red del departamento.
- ✓ Validar y aprobar el proyecto de dotación de equipos biomédicos, industriales y de mobiliario hospitalario.
- ✓ Apoyar al Fondo en materia de las competencias del MSPS.

FASES DE LA INTERVENCIÓN

- **FASE 1:** Construcción y dotación de 20 IPS cuyos proyectos contaban con diseños elaborados por las Direcciones Territoriales de Salud de los departamentos.
- **FASE 2:** Construcción y dotación de 48 IPS, desde el diseño hasta la construcción y dotación a cargo del Fondo. (A la fecha han salido 6 en el proceso de validación)

Observación: 165 IPS de las 233 postuladas por el Ministerio, no cuentan con recursos del Fondo para su ejecución.

EQUIPO DE TRABAJO - SALUD

ASESOR SECTORIAL III - (Jaime Rodrigo Vélez Cervantes)
Líder Sector

ARQ. ESPECIALIZADO (Álvaro Linares López)
Proyectos Fase I.


ARQ. ESPECIALIZADA (María Cecilia de los Ángeles González)
Proyectos Diseño Fase II

ING. CIVIL ESPECIALIZADO (Oscar Hernando Bernal Ovalle)
Convenios descentralizados y asistencia técnica proyectos

ARQ. ESPECIALIZADO (Andrés González Herrera)
Proyectos 1ª Fase - Nariño.

ING. ELECTRÓNICO ESPECIALIZADO (Julio César Luna Mosquera)
Proyectos Dotación

EJECUCIÓN RECURSOS

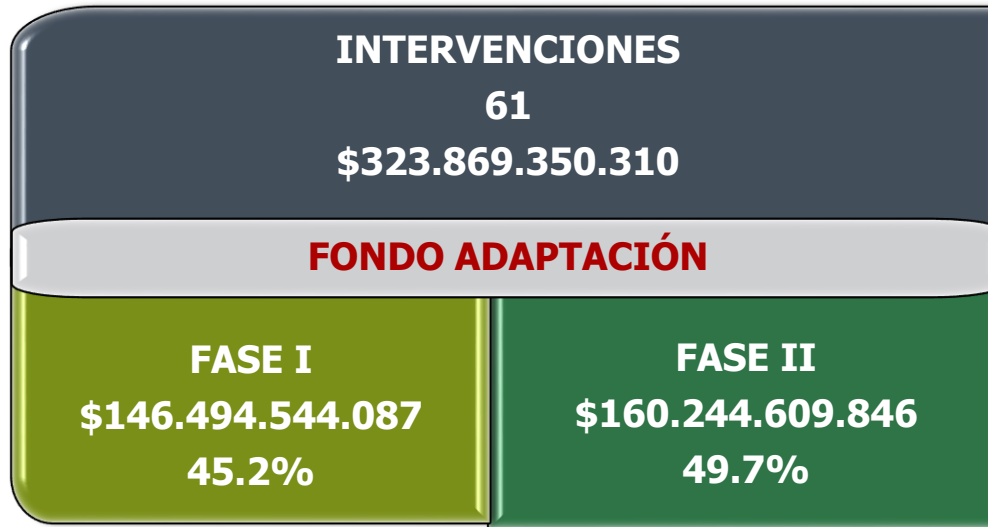


SECTOR SALUD

■ FASE I ■ FASE II ■ GESTIÓN

Recursos de gestión : \$ 16.590.034.662
5.1%

- Gerencia Comfamiliar Nariño
- Gerencia A. Nariñense de Ingenieros.
- Sociedad Colombiana de Ing.
- Gerencia General Salud.
- Gerencia UNOPS
- Gerencia Antioquia
- Recursos humanos de apoyo



FASE I DE INTERVENCIÓN DEL SECTOR SALUD

20 IPS en ejecución, con inicio en abril de 2013 y entrega entre 2014 y 2015

- **ATLÁNTICO (6)**
- **BOYACÁ (2)**
- **NARIÑO (12)**



IPS

- Depto. de Nariño, Construcción y dotación de las IPS:

Hospital San Antonio Mpio Barbacoas.
Centro de salud Camilo Hurtado de Mpio Olaya Herrera.
Centro de Salud Saúl Quiñones Mpio de Magui Payán.
Hospital Sagrado Corazón del Mpio del Charco.
Hospital Divino Niño Mpio de Tumaco.
Centro de Salud Señor del Mar Mpio Francisco Pizarro.
Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen Mpio de La Tola.
Hospital local Las Mercedes Mpio Roberto Payán.
Centro de Salud San Francisco Mpio de Mosquera.
Centro de Salud Mpio de Ricaurte.
Centro de Salud Mpio de San José de Albán.
Centro de Salud Mpio el Peñol.


-Depto. de Boyacá, Construcción y dotación de las IPS:

Hospital San Francisco Mpio de Villa de Leyva.
Centro de Salud Mpio de Corrales.

-Depto. De Atlántico, construcción y dotación:


Centro de Salud Mpio de Santa Lucía.
Centro de Salud Mpio de Arroyo de Piedra.
Centro de Salud Mpio de Bohórquez.
Puesto de Salud Mpio Las Compuertas.
Puesto de Salud Mpio Algodonal.

INTERVENCIÓN (EN SEDES)

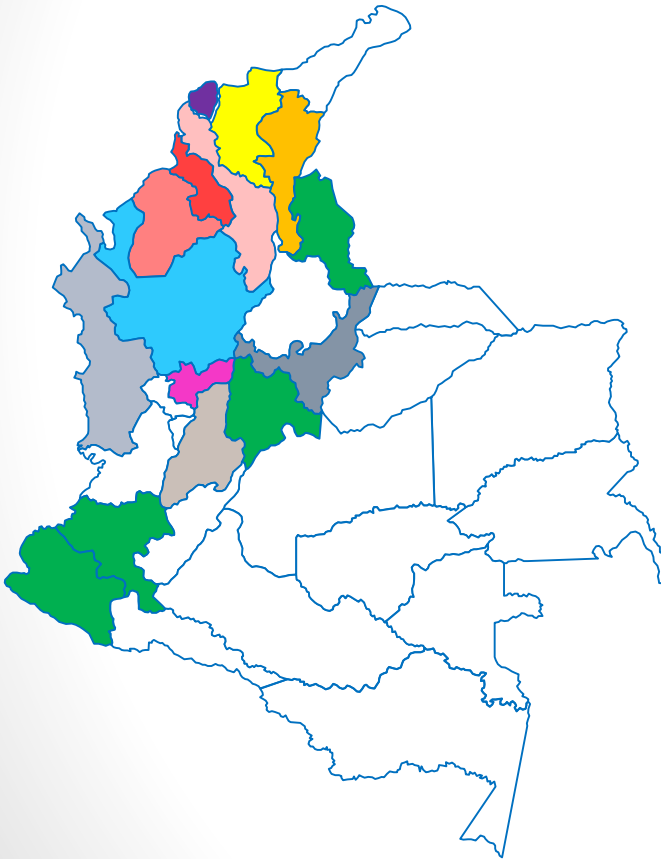


No	Departamento	Sedes objeto		Grupo 1		Grupo 2	
		Cantidad	Descentr alizadas	Cantidad	Descentr alizadas	Cantidad	Descentr alizadas
1	NARIÑO	11	0	11	0	0	0
2	ATLÁNTICO	6	0	6	0	0	0
3	BOYACÁ	3	1	2	0	1	1
4	AMAZONAS	0	0	0	0	0	0
5	CESAR	1	1	0	0	1	1
6	CAUCA	4	0	0	0	4	0
7	TOLIMA	1	0	0	0	1	0
8	CÓRDOBA	3	3	0	0	3	3
9	CUNDINAMRACA	1	1	0	0	1	1
10	NORTE DE SANTANDER	4	3	0	0	4	3
11	SUCRE	5	3	0	0	5	3
12	MAGDALENA	4	3	0	0	4	3
13	CHOCÓ	3	0	0	0	3	0
14	BOLÍVAR	9	7	0	0	9	7
15	ANTIOQUIA	6	0	0	0	6	0
	TOTALES	61	22	19	0	42	22

DESCENTRALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN (SEDES)

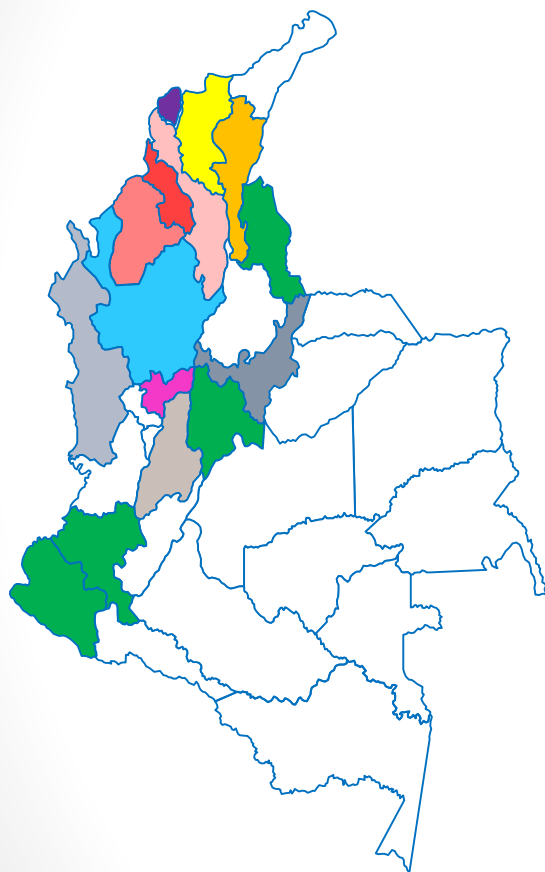


Departamento	No. Intervenciones	Descentraliza das	Fondo Adaptación
ATLÁNTICO	6	0	6
BOYACÁ	3	1	2
NARIÑO	11	0	11
CUNDINAMARCA	1	1	0
NORTE DE SANTANDER	4	3	1
SUCRE	5	3	2
CÓRDOBA	3	3	0
MAGDALENA	4	3	1
CAUCA	4	0	4
CHOCÓ	3	0	3
BOLÍVAR	9	7	2
CESAR	1	1	0
ANTIOQUIA	6	0	6
TOLIMA	1	0	1
TOTAL	61	22	39

DESCENTRALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN (RECURSOS)

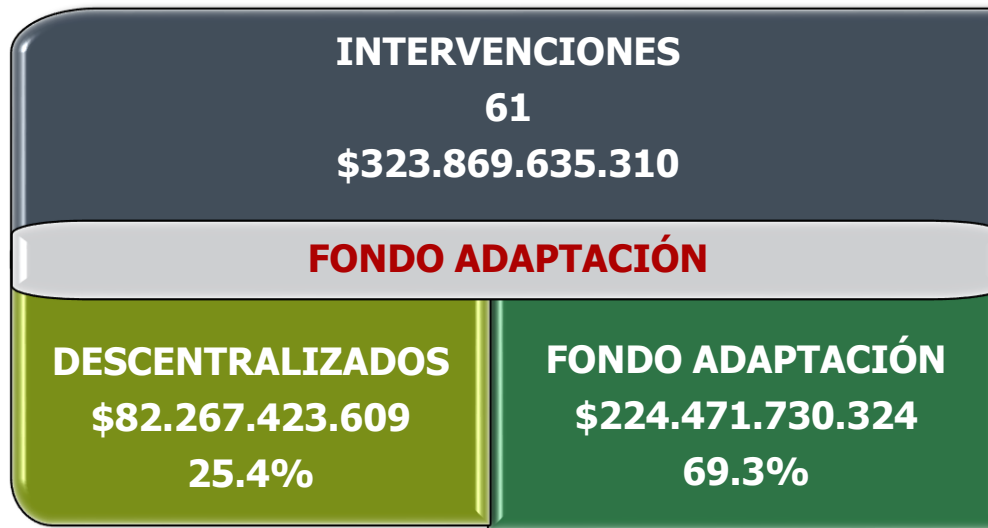

Descentralización de la Inversión

■ DESCENTRALIZADOS ■ NO DESCENTRALIZADOS

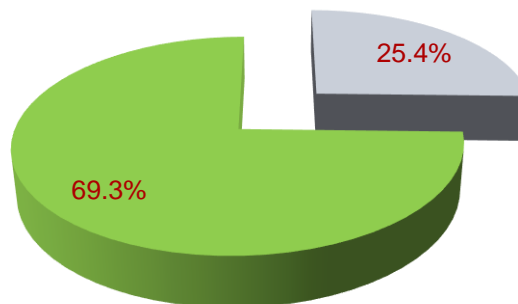


CONSOLIDADO EJECUCIÓN POR SEDES




COSOLIDADO EJECUCIÓN EN SEDES

■ Obras Entregadas ■ Obras en Ejecución ■ Obras por inciar ■ Diseños en ejecución

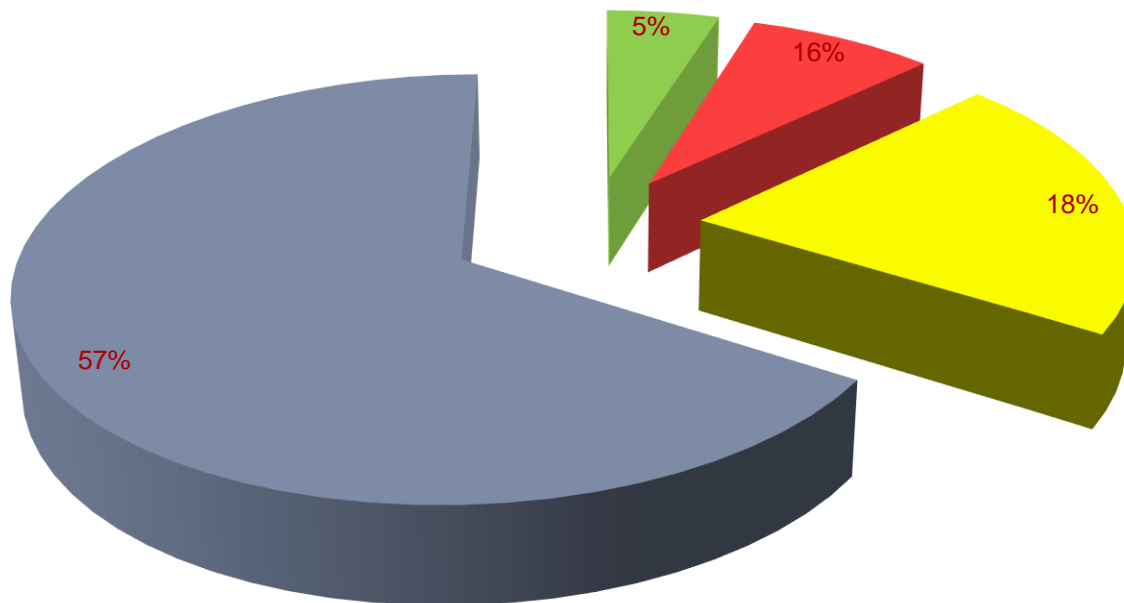

ESTADO EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

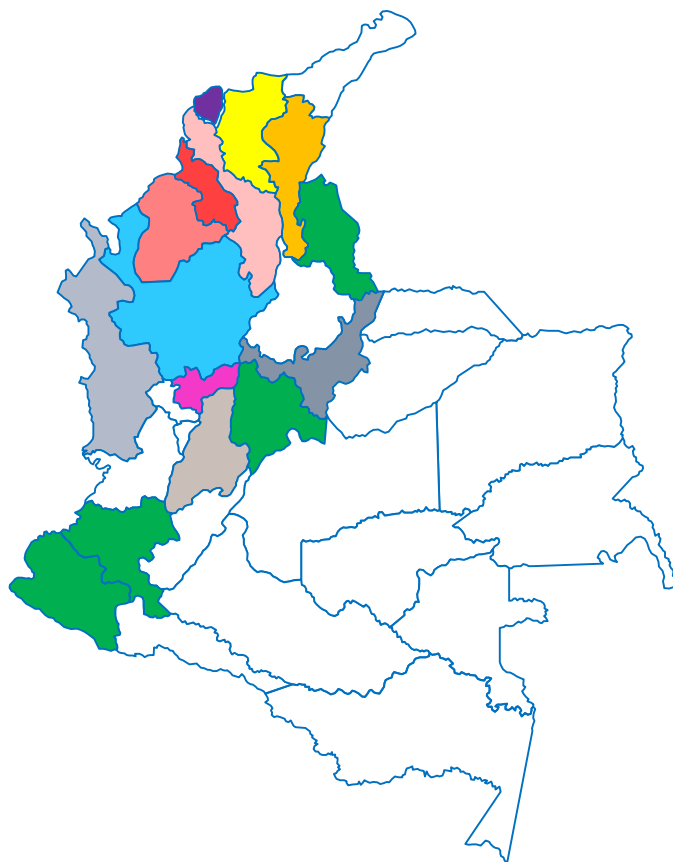



ATLÁNTICO

	Municipio	Institución	Fecha de entrega de obra	Inversión	Estado
1	SANTA LUCIA	ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA	Dic 2014	5.503.298.655	En ejecución - 70%
2	LURUACO	CENTRO DE SALUD ARROYO DE PIEDRA	Abril 2014	1.025.315.175	Entregado y dotado
3	CAMPO DE LA CRUZ	CENTRO DE SALUD BOHÓRQUEZ	Abril 2014	1.028.282.339	Entregado y dotado
4	MANATÍ	PUESTO DE SALUD LAS COMPUERTAS	Abril 2014	1.039.051.893	Entregado y dotado
5	SANTA LUCIA	PUESTO DE SALUD ALGODONAL	Dic 2014	1.546.997.194	En Ejecución - 85%
6	BARRANQUILLA	CAMINO LA CHINITA	Enero 2015	6.602.541.617	En Ejecución - 55%

ATLÁNTICO



Proyectos entregados	3
Proyectos en ejecución	3
Total proyectos	6

\$ 18.674.047.357



ATLÁNTICO – 3 PUESTOS DE SALUD EN SERVICIO



Puesto de Salud Las Compuertas



Puesto de Salud Bohórquez



Puesto de Salud Arroyo de Piedra



ATLÁNTICO - PUESTO SALUD ALGODONAL Y ESE SANTA LUCIA



ESE Santa Lucia



**Puesto de Salud
Algodonal**





ATLÁNTICO - PUESTO SALUD LA CHINITA (Distrito de Barranquilla)



**Centro de salud
Paso C “ La Chinita”**



BOYACÁ

Estado Proyectos

Tipo de Producto	Nombre Proyecto	Valor Estimado	Fecha de Entrega	Estado
Hospitales	Hospital San Francisco de Villa de Leyva	\$ 5.601.794.586	30/02/2015 Construido y dotado	Terminada etapa 1-En proceso de construcción etapa 2. 30%
	ESE centro de salud de Corrales	\$ 2.135.679.281	30/02/2015 Construido y dotado	En proceso de construcción. 15 %
	Hospital de Miraflores ESE	\$ 6.738.633.000	30/10/2014 Diseños	Aprobado por el Ministerio. Entrega de diseños a la Gobernación en Noviembre de 2014 para contratación obras



BOYACA – HOSPITAL DE VILLA DE LEYVA



**Hospital San
Francisco ESE**



BOYACA – HOSPITAL DE CORRALES




ESE Centro de Salud de Corrales

NARIÑO

Construcción y Dotación de 12 IPS en el Departamento de Nariño.

Se firmó convenio No 009 del 2013 con la Gobernación de Nariño para la construcción, en dos etapas, de 12 IPS, y el contrato No 058 del 2013 con COMFAMILIAR Nariño para la construcción de las primeras 6 IPS. Se firmó el contrato No 034 del 2014 con La ASOCIACION NARIÑENSE DE INGENIEROS de Ingenieros para la construcción del Grupo 2 de 6 IPS.

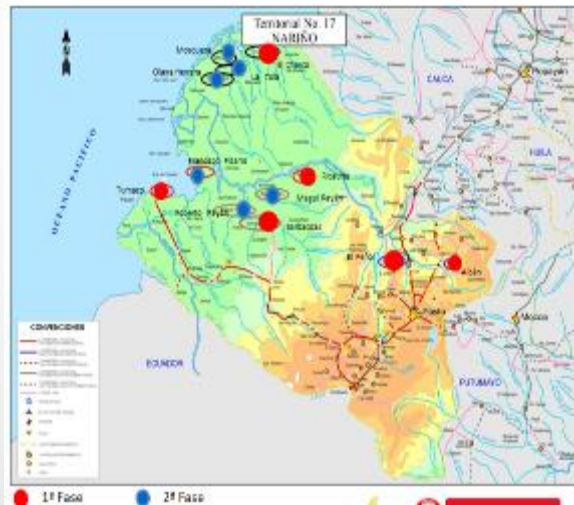

GRUPO 1

Institución	Municipio	Área del Proyecto	Población beneficiada
1. Hospital Sagrado Corazón de Jesús	El Charco	3.716	33.085
2. Hospital San Antonio de Barbacoas	Barbacoas	3.716	35.406
3. Hospital Divino Niño	Tumaco	3.716	187.084
4. Centro de Salud San José de Albán	San José de Albán	2.670	21.270
5. Centro de Salud De Ricaurte	Ricaurte	2.567	17.475
6. Centro de salud san Isidro	El Peñol	2.511	6.616

GRUPO 2

7. Centro de salud camilo hurtado Cifuentes	Olaya Herrera	2.567	30.081
8. Centro hospital señor del mar	Francisco Pizarro	2.511	13.723
9. Centro de salud nuestra señora del Carmen	La Tola	2.511	11.130
10. Centro de salud Saúl Quiñonez	Magui Payan	2.511	20.435
11. Centro de salud Las Mercedes	Roberto Payan	2.511	20.725
12. Centro de salud San Francisco	Mosquera	2.511	14.874

POBLACION BENEFICIADA			411.904
------------------------------	--	--	----------------



NARIÑO – COMFAMILIAR

Estado Proyectos

Tipo de Producto	Nombre Proyecto	Valor Estimado	Fecha estimada de Entrega	Estado
Hospitales	HOSPITAL LOCAL DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE BARBACOAS (Contratista de obra: Consorcio Constructores del Sur)	12.114.507.815	Marzo 2015 Obra y dotación	En ejecución fase de pre construcción. En ejecución mejoramiento del terreno por parte del Municipio .
	HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ESE MUNICIPIO DE EL CHARCO (Contratista de obra: PSI)	13.657.458.396	Junio 2015 Obra y dotación	Obras por iniciar. Pendiente accesibilidad al lote por parte de la Alcaldía y ajuste de diseño cota de inundación.
	HOSPITAL LOCAL DIVINO NIÑO MUNICIPIO TUMACO (Contratista obra: Consorcio Nueva Era Hospitalaria de Nariño)	12.912.562.007	Marzo 2015 Obra y dotación	En ejecución etapa de pre construcción fabricación Pilotaje - ajuste de diseño de la cimentación por elevación de nivel.



NARIÑO - COMFAMILIAR

Estado Proyectos

Tipo de Producto	Nombre Proyecto	Valor Estimado	Fecha estimada de Entrega	Estado
Hospitales	CENTRO DE SALUD DE RICAURTE MUNICIPIO DE RICAURTE	7.889.848.718	Abril 2015 Obra y dotación	Inicio fase de pre construcción
	CENTRO DE SALUD EL PEÑOL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	7.259.991.756	Junio 2015 Obra y dotación	Obra por iniciar, Se efectuó cambio de predio por solicitud y propuesta del Municipio de mejor alternativa.



NARIÑO – IPS TUMACO



**Hospital Local
Divino Niño
(Tumaco)**



NARIÑO – IPS BARBACOAS



**Hospital Local San
Antonio ESE**



NARIÑO – ASOCIACIÓN NARIÑENSE DE INGENIEROS

Proyecto	Municipio	Valor Estimado	Fecha Entrega	Estado
CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIFUENTES ESE	OLAYA HERRERA	\$8.482.240.983	Oct-2015	En proceso de contratación de obra e interventoría.
CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES ESE	MAGUI PAYAN	\$8.324.449.449	Oct-2015	En proceso de contratación de obra e interventoría.
CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	LA TOLA	\$8.684.166.505	Oct-2015	En proceso de contratación de obra e interventoría.
ESE LAS MERCEDES	ROBERTO PAYAN	\$8.533.703.251	Oct-2015	En proceso de contratación de obra e interventoría.
ESE CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO	MOSQUERA	\$8.599.372.653	Oct-2015	En proceso de contratación de obra e interventoría.
CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE ALBAN	SAN JOSE DE ALBAN	\$5.909.562.148	Oct-2015	En proceso de contratación de obra e interventoría.



NARIÑO – MODELO HOSPITALES NARIÑO



BOLÍVAR

Estado Proyectos

Nombre Proyecto	Municipio	Valor Estimado	Fecha de entrega Diseños
Hospital Local Manuela Pabuenta	ARENAL	\$ 4.372.851.949	30/11/2014 Diseños
ESE Hospital Local de Cicuco (Descentralizado con la Gobernación)	CICUCO	NO FUE AFECTADA POR FENOMENO DE LA NIÑA 2010 - 2011	
ESE Hospital Local de Mahates	MAHATES	\$ 6.134.935.506	30/11/2014 Diseños
ESE Centro de Salud Francisco Javier de Margarita (Descentralizado con la Gobernación)	MARGARITA	\$ 2.167.696.859	30/11/2014 Diseños
ESE Salud con Camas de Montecristo (Descentralizado con la Gobernación)	MONTECRISTO	\$ 4.443.823.459	30/11/2014 Diseños
ESE Hospital Regional de Bolívar U.O.L. Vol San Roque de San Cristóbal. (Descentralizado con la Gobernación)	SAN CRISTÓBAL	\$ 2.617.388.022	30/11/2014 Diseños
ESE Hospital San Martín de Loba (Descentralizado con la Gobernación)	SAN MARTÍN DE LOBA	\$ 4.002.108.005	30/11/2014 Diseños
ESE Hospital Local Santa Rosa De Lima	SANTA ROSA	\$ 5.496.105.072	30/11/2014 Diseños
ESE Centro de Salud con Camas Vitalio Sara C. (Descentralizado con la Gobernación)	SOPLAVIENTO	\$ 1.882.367.250	30/11/2014 Diseños
Centro de Salud de Tiquisio Nuevo (Descentralizado con el municipio)	TIQUISIO (Puerto Rico)	\$ 4.686.050.563	30/11/2014 Diseños



CAUCA

Estado Proyectos			
Nombre Proyecto	Valor Estimado	Fecha estimada de Entrega	Estado
Hospital del Cincuentenario Nivel I-ESE Norte 3-Puerto Tejada.	\$ 10.395.000.000	30/08/2015 Obra y dotación	En diseños
Hospital Nivel I de la Vega-ESE Suroriente --La Vega	\$ 10.395.000.000	30/08/2015 Obra y dotación	
Centro de Salud Noanamito-ESE Occidente --López de Micay	\$ 518.400.000	30/12/2014 Obra y dotación	En ejecución contrato de diseño y obra
Puesto de Salud Limones-ESE Guapi-Guapi	\$ 414.000.000	30/12/2014 Obra y dotación	



CÓRDOBA

Estado Proyectos

Nombre Proyecto	Municipio	Valor Total (MM)	Fecha de Entrega	Estado
Camu Canalete-Canalete. Descentralizado Gobernación.*	CANALETE	\$ 8.503.334.400	30/11/2014 Diseños	En diseño
Centro de Salud las Flores-Lorica. Descentralizado Municipio *	LORICA	\$ 1.015.416.000	30/11/ 2014 Diseños	
ESE Camu Santa Teresita-Lorica. Descentralizado Gobernación *	LORICA	\$ 2.500.000.000	30/11/2014 Diseños	En ajustes solicitados por el MSPS .

CHOCÓ

Estado Proyectos

Nombre Proyecto	Municipio	Valor Estimado	Fecha de Entrega	Estado
Centro de Salud de Curbarado	CARMEN DEL DARIÉN (Curbaradó)	\$ 1.157.544.000	Junio de 2015 Obra y dotación	No se afectó por ola invernal 2010-2011
Centro de Salud de Palestina	EL LITORAL DEL SAN JUAN	\$ 3.081.888.000		En diseño
Centro de Salud Bete	MEDIO ATRATO (Beté)	\$ 972.000.000		No se afectó por ola invernal 2010-2011
Centro de Salud de Andagoya	MEDIO SAN JUAN (Andagoya)	\$ 3.291.408.000		No se afectó por ola invernal 2010-2011
Hospital Local de Riosucio	RIOSUCIO	\$ 8.513.505.000		En diseño
Hospital Local de Unguia	UNGUÍA	\$ 4.446.981.000		En diseño
Centro de Salud Belén de Bajira	RIOSUCIO	\$ 2.865.888.000		No se ejecuta por falta de documentación



MAGDALENA

Estado Proyectos

Nombre Proyecto	Municipio	Valor Estimado	Fecha de Entrega	Estado
Hospital Santa Barbara De Pinto (Descentralizado con la Gobernación)	SANTA BARBARA DE PINTO	\$ 3.601.422.000	30/11/2014 Diseños	En diseño
ESE Hospital Local San José	PUEBLO VIEJO	\$ 8.529.840.000	30/11/2015 Obra y dotación	
ESE Hospital Local Cerro De San Antonio (Descentralizado con la Gobernación)	CERRO SAN ANTONIO	\$ 2.365.902.000	30/11/2014 Diseños	
ESE Hospital Local De Concordia (Descentralizado con la Gobernación)	CONCORDIA	\$ 2.843.775.000	30/11/2014 Diseños	



NORTE DE SANTANDER

Estado Proyectos

Nombre Proyecto	Municipio	Valor Estimado	Fecha de Entrega	Estado
IPS CENTRO DE SALUD DE LA GABARRA (Descentralizado municipio Tibú)	TIBÚ	\$ 2.376.000.000	30/11/2014 Diseños	En diseños
IPS CENTRO DE SALUD PUERTO SANTANDER (Descentralizado Gobernación de Norte de S)	PUERTO SANTANDER	\$ 4.125.580.800	30/11/2014 Diseños	
CENTRO DE SALUD DIVINO NIÑO DE CUCUTILLA (Descentralizado con la Gobernación de Norte de Santander)	CUCUTILLA	\$ 2.080.848.000	30/11/2014 Diseños	
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	GRAMALOTE	\$ 1.716.363.000	30/11/2014 Diseños	



SUCRE

Estado Proyectos

Nombre Proyecto	Valor Estimado	Fecha de entrega	Estado
Hospital Santa Catalina de Sena-Sucre	\$ 10.626.897.600	Julio 20015 Obra y dotación	En diseños
Centro de Salud de Majagual-Majagual	\$ 8.640.984.000	Julio 20015 Obra y dotación	
Centro de Salud de Guaranda-Guaranda (Descentralizado Gobernación)	\$ 7.090.406.400	30/11/2014 Diseños	
Centro de Salud Coveñas-Coveñas (Descentralizado Gobernación)	\$ 5.420.236.800	30/11/2014 Diseños	
Centro de Salud el Roble-El Roble (Descentralizado municipio)	\$ 4.308.480.000	30/11/2014 Diseños	



TOLIMA

Estado Proyectos				
Nombre Proyecto	Municipio	Valor Estimado	Fecha de entrega	Estado
Obra de mitigación del Hospital San Francisco de Ibagué	IBAGUÉ	\$ 650.000.000	Diciembre de 2014 Obra	En proceso de contratación obra.

ANTIOQUIA

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN	ESTIMADO INVERSIÓN	Fecha de Entrega	ESTADO
MURINDO	ESE HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ	5,049'433,163	Por definir	En anteproyecto
NECHI	HOSPITAL LA MISERICORDIA	9,868'683,243	Diciembre 2015 Obra y Dotación	En contratación elaboración diseños técnicos
TURBO	CENTRO DE SALUD DON BOSCO (Currulao)	3,482'525,968	Agosto 2015 Obra y dotación	En ajustes por solicitud Minsalud
TURBO	CENTRO DE SALUD MIGUEL A BUSTOS (Nueva Colonia)	3,574'926,826	Agosto 2015 Obra y dotación	En ajustes por solicitud Minsalud
ABEJORRAL	CENTRO DE SALUD PANTANILLO	924'945,417	Diciembre 2014 Obra y dotación	Aprobado Minsalud, en terminacion diseños técnicos e inicio de obra
ABEJORRAL	CENTRO DE SALUD GUAICO	816'441,383	Diciembre 2014 Obra y dotación	Aprobado Minsalud, en terminacion diseños técnicos e inicio de obra



ANTIOQUIA



**Centro de Salud Pantanillo -
Abejorral**




**Puesto Salud Guaico -
Abejorral**



Hospital Local – Nechí



ANTIOQUIA

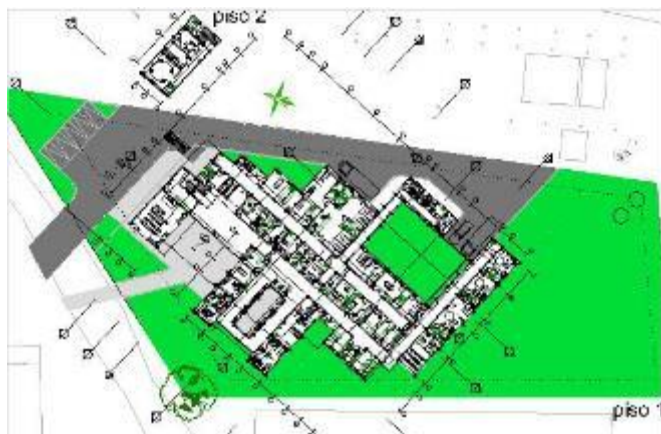

**Centro de salud Nueva
Colonia - Turbo**



Hospital Local Murindó



**Centro de Salud Currulao -
Turbo**



RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LAS 165 IPS FALTANTES.

ACTIVIDADES	VALOR UNITARIO	TOTALIDAD IPS 164	VALOR TOTAL
Validación afectación	\$ 700.000	\$ 114.800.000	\$ 114.800.000
Estudio de amenaza y riesgo	\$ 800.000	\$ 131.200.000	\$ 131.200.000
Levantamiento topográfico	\$ 1.500.000	\$ 246.000.000	\$ 246.000.000
Estudio de suelo	\$ 1.500.000	\$ 246.000.000	\$ 246.000.000
Diseños	\$ 22.000.000	\$ 3.608.000.000	\$ 3.608.000.000
Gestión documental	\$ 2.000.000	\$ 328.000.000	\$ 328.000.000
obra	\$ 1.000.000.000	\$ 164.000.000.000	\$ 164.000.000.000
Interventoria de obra (7%)	\$ 70.000.000	\$ 11.480.000.000	\$ 11.480.000.000
Dotación	\$ 400.000.000	\$ 65.600.000.000	\$ 65.600.000.000
Supervisión a la dotación	\$ 60.000.000	\$ 9.840.000.000	\$ 9.840.000.000
Consultor diseños y estudios (gastos administrativos y de funcionamiento)	\$ 30.000.000	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000
Interventor diseños (gastos administrativos y de funcionamiento)	\$ 2.300.000.000	\$ 23.000.000.000	\$ 23.000.000.000
TOTAL			\$ 278.894.000.000

DIFICULTADES

- ✓ Con los recursos asignados se estima intervenir 61 IPS, aunque sólo cuando finalicen todos los diseños, se tendrá certeza respecto a los presupuestos que demanda cada sede.(Incremento aproximado del 25 a 30%)
- ✓ La deficiente calidad de los diseños presentados por las direcciones territoriales, ha ocasionado demoras por ajustes y validación de los mismos para la etapa de construcción.
- ✓ Las dificultades y demoras presentadas en la recolección de la información, en la gestión predial, han ocasionado retrasos en la contratación de las obras y ejecución de los proyectos.
- ✓ Las modificaciones en los requerimientos funcionales y ajustes a la red de prestación de servicios de cada departamento, ha ocasionado en cada proyecto retrasos en la ejecución de la fase de diseños y modificación en los presupuestos estimados.
- ✓ La modificación en la normativa del sector (normas de habilitación, Resoluciones 1043 de 2006, 1441 de 2013 y 2003 de 2014) ha ocasionado ajustes a los diseños.
- ✓ Los tiempos de aprobación por parte del Ministerio se ha tomado mas tiempo del programado.
- ✓ Se estima que en 2015 finalice la construcción y dotación de todas las sedes, con entregas graduales durante estas vigencias.

No. Contrato	Fecha	Contratista	Objeto	Fecha Inicio	Fecha final	Valor	Avance Financiero	Avance Físico
119 de 2012	19/11/12	Sociedad Colombia de Ingenieros	Prestar, de manera independiente y autónoma, los servicios de consultoría y apoyo integral en el proceso de contratación para la construcción y reconstrucción de la infraestructura de 20 IPS públicas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010 – 2011, en el marco de intervención de EL FONDO.	19/11/2012	7 /11/2013	\$ 1.782.663.726	86%	100%
058 de 2013	27/04/13	Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Nariño	Ejecutar la Gerencia Integral de la primera fase del proyecto de construcción y dotación de las IPS localizadas en el departamento de Nariño	23/05/2013	23/11/2014	\$ 1.975.201.730	45%	70%
132 de 2013	15/07/13	Sociedad de Inversiones y Construcciones Valencia Enciso SOCICON LTDA.	Construcción 3 IPS en Luruaco, Campo de la Cruz y Manatí en el departamento de Atlántico.	31/07/2013	31/12/2013	\$1.596.177.274	100%	100%
156 de 2013	16/08/13	C&P Licitaciones y Consultorías S.A.S.	Dotación del centro de Salud Gramalote	20/08/2013	19/09/2013	\$ 296.245.802	100%	100%
174 de 2013	16/09/13	UT Nueva Era Hospitalaria	Diseño de 18 IPS en los Departamentos de Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Magdalena	30/09/2013	28 /02/2014	\$2.530.365.316	11,5%	20%
177 de 2013	19/09/13	SRG Civil Eléctrico Telecomunicaciones e inversiones S.A.S.	Construcción centro de salud Paso la Chinita	10/10/2013	09/07/2014	\$4.910.164.635	20%	20%
178 de 2013	24/09/13	Heymocol S.A.S.	Construcción Hospital San Francisco Villa de Leyva	11/10/2013	10/07/2014	\$5.601.794.586	20%	10%
179 de 2013	25/09/13	Consorcio Salud Integral	Construcción centros de salud Algodonal y Santa Lucia	10/10/2013	09/07/2014	\$6.099.375.058	27%	22%

No. Contrato	Fecha	Contratista	Objeto	Fecha Inicio	Fecha final	Valor	Avance Financiero	Avance Físico
228 de 2013	14/11/13	Sociedad Colombia de Arquitectos secc. Atlántico	Interventoría construcción IPS La Chinita en el departamento de Atlántico	14/11/2013	13 /07/2013	\$ 270.153.292	13,3%	70%
229 de 2013	14/11/13	Sociedad Colombia de Arquitectos secc. Atlántico	Interventoría construcción IPS del sur del Atlántico	14/11/2013	13 /07/2013	\$ 270.153.292	67%	60%
233 de 2013	Abril de 2013	UNOPS	Gerencia integral de los proyectos en construcción	13/12/2013	12/12/2014	2.285.831.020	11,97%	22%
253 de 2013	Octubre 2013	Consorcio Sigma - Sergo	Diseño de 18 IPS en los Departamentos de Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Magdalena	27/11/13	26/04/2014	2.347.758.540	20%	20%
289 de 2013	24/01/2013	UCO S.A.	Construcción de IPS Corrales	14/02/14	13/02/2014	2.135.666.655	0	18%
290 de 2013	24/01/2013	Constructora A&C	Interventoría Corrales	14/02/14	13/02/2015	211.103.215	0	18%
005 de 2014	20/01/2014	Henessy Smart Business.	Construcción de 2 IPS en el municipio de Abejorral	10-2-14	24/09/2014	1.375.664.564	0	20%
033 de 2014		SOCICON LTDA	Construcción y diseños de 3 IPS (2cauca, 1 Cesar)			2.020.182.081	0	12%
034 de 2014	29/01/2014	ASOCIACION NARIÑENSE DE INGENIEROS	Gerencia Integral segundo grupo de proyectos del departamento de Nariño	29/01/2014	28/04/2015	1.885.748.623		29%
086 de 2013	11/01/2014	Sociedad Colombia de Ingenieros	Supervisión a 5 IPS	14/02/2014	13/01/2015	698.531.449	44%	55%
101 de 2014	14/02/2014	Constructora A&C	Interventoría contrat 033 de 2014	14/02/2014	13/12/2014	464.168.250	0	12%

CRONOGRAMA GENERAL

GR UP O	PROYECTOS	# Proy.	Año 212	Año 2013												Año 2014		Año 2015		2016		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - JUN	JUL - DIC			
1	Cuentan con diseños entregados por las Entidades Territoriales 1ª Etapa	5		Validación y ajustes Estudios y Diseños												Contratación de obras e interventoría	Ejecución de Obras e Interventoría		Seguimiento a la ejecución de Obras e Interventoría			
				Verificación y validación de campo																		
1	Cuentan con diseños entregados por las Entidades Territoriales 1ª Etapa	6		Estudios y diseños												Contratación de obras e interventoría	Ejecución de Obras e Interventoría		Seguimiento a la ejecución de Obras e Interventoría			
				Verificación y validación de campo																		
1	Cuentan con diseños entregados por las Entidades Territoriales 1ª Etapa	2		Estudios y diseños												Contratación de obras	Ejecución de Obras e Interventoría		Seguimiento a la ejecución de Obras e Interventoría			
				Verif/validación																		
1	Cuentan con diseños entregados por las Entidades Territoriales 1ª Etapa	6														diseños	Verifi valid	Contratación de obras	Ejecución de Obras e Interventoría		Seguimiento a la ejecución de Obras e Interventoría	
Total Proyectos etapa 1		19																Seguimiento a la ejecución de Obras e Interventoría				

[illegible]

[illegible]
