



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2022

Impulsando el desarrollo sostenible del país,
a través de la adaptación al cambio climático

Junio de 2022



Fondo Adaptación



Equipo Directivo Fondo Adaptación:

Raquel Garavito Chapaval
Gerente

Juan Carlos Escobar
Subgerente de Gestión Del Riesgo

Andrés Parra Beltrán
Subgerente de Estructuración

Helga Milena Hernández
Subgerente de Proyectos

Iliana Margarita Garzón
Subgerente de Regiones

Sandra Marcela Murcia
Secretaria General

Víctor Alejandro Venegas Mendoza
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

Equipo Técnico:

Claudia Díaz Hernández
Asesor I - Equipo de Trabajo Planeación y Cumplimiento

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	2022/07/29	Documento inicial segundo trimestre de 2022
2	2022/08/02	Actualización en el número de viviendas contratadas en el Departamento de Antioquia, en el cuadro de seguimiento a la ejecución de las metas regionalizadas de vivienda de la Subgerencia de Proyectos.

Informe de
ejecución del
Plan de Acción

2022

Contenido

Presentación

1. Introducción

2. Contexto de la Formulación y el Seguimiento del Plan de Acción 2022

2.1. Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2022

2.2. Criterios para la evaluación del Plan de Acción

2.3. Esquema de seguimiento

3. Ejecución del Plan de Acción 2022 por Objetivos Estratégicos

3.1. Objetivos Estratégicos Misionales

- Seguimiento al Plan de Acción por Macroproyecto
- Seguimiento al Plan de Acción por Sector
- Seguimiento al Plan de Acción regionalizado y por Subgerencia

3.2. Objetivos Estratégicos Transversales

- Área Subgerencia de Regiones
- Área Gerencia – Equipo de Comunicaciones
- Área Oficina de Planeación y Cumplimiento
- Área Secretaría General
- Indicadores Plan de Acción de Alcance Institucional

Presentación

El año 2022, reviste para el Fondo Adaptación (FA) una importancia particular. La Entidad se acerca a finalizar la tarea de concluir y entregar la mayoría de los proyectos con presupuesto asignado que, como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: El Fenómeno de “La Niña” 2010-2011”, fueron identificados, estructurados y gestionados para:

- (i) La recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, medio ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados.
- (ii) La implementación de acciones de recuperación económica y social, junto con comunidades y poblaciones.
- (iii) La ejecución de intervenciones integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático con un enfoque multisectorial y regional.
- (iv) El diseño de soluciones definitivas a problemas focalizados y recurrentes asociados al riesgo hidrometeorológico.

En el marco del Documento Conpes 3776 de 2013, la Entidad ha desarrollado cinco macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no tienen precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con innumerables aprendizajes que posicionan al FA como una entidad líder en la concepción, estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de largo plazo y con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático.

En el Plan de Acción de la vigencia 2022 se plantearon las metas para terminar y entregar la mayoría de los proyectos pendientes por culminar, además incluye metas transversales que dan cuenta del compromiso de la Entidad por convertirse en un referente de la administración pública y ser reconocida como institución líder en la ejecución de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en Latinoamérica.

El presente informe de seguimiento al Plan de Acción 2022 busca presentar y socializar a los grupos de interés del Fondo Adaptación, el estado de las acciones con un enfoque regional, sectorial y por macroproyecto; así como un balance de las actividades de apoyo que promueven las condiciones para el cumplimiento de las metas.

1. Introducción

En el Plan de Acción 2022 del Fondo Adaptación, se establecen las acciones y determinan las metas, e indicadores, que definen la hoja de ruta de la Entidad para impulsar el logro de los objetivos estratégicos y cumplir con su misionalidad durante la vigencia correspondiente.

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que establece que, cada uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán como fundamento para la evaluación de resultados.

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 74), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, y distribución presupuestal de los proyectos de inversión, ligados a los indicadores de gestión.

El Plan de Acción incluye elementos de los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Decreto 1499 de 2017 y las demás disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El propósito de este informe de ejecución postula como objetivo general informar a los diversos grupos de interés y a la ciudadanía, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2022 del Fondo Adaptación, y, como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados periódicos de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

El seguimiento al Plan de Acción 2022 se realiza de manera agregada y a su vez desagregado por: Objetivo estratégico, Sector, Macroproyecto, Subgerencia y Departamento; en el mismo sentido en que se formuló la planeación de la vigencia. En cada caso, por cada uno de los indicadores agregados se registra el avance cuantitativo, acompañado por el resumen cualitativo del estado de las intervenciones o actividades programadas.

2. Contexto de la Formulación y el Seguimiento del Plan de Acción 2022

2.1. Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción

Para facilitar la consulta del Informe de Seguimiento, este se encuentra alineado con la estructura del Plan de Acción 2022, que a su vez da cuenta de los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2022 y la organización de la planta de personal establecida en la Resolución 343 de 2021 y en la Resolución 200 de 2022.

En este sentido, el Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2022 contempla un esquema regionalizado de análisis de los avances, donde los Subgerentes de Riesgos, Proyectos y Estructuración lideran las acciones encaminadas a lograr los resultados contemplados para cada uno de los departamentos del país; a su vez, los líderes de equipo sectorial son los encargados de ejecutar las acciones específicas de un sector en todo el territorio nacional, y los líderes de macroproyecto son los encargados de la ejecución de las intervenciones integrales e intersectoriales en una zona geográfica específica; lo anterior, con el acompañamiento de la Subgerencia de Regiones, responsable de coordinar los intereses de las regiones y sus comunidades y servir como facilitador en su relación con el Fondo. Simultáneamente, los líderes de procesos transversales y de apoyo, son responsables de promover las condiciones administrativas requeridas para el avance exitoso de las intervenciones programadas y su seguimiento.

En consecuencia, el presente documento expone un seguimiento combinado entre gestiones sectoriales a cargo de cada líder sectorial y de macroproyecto y gestiones regionales lideradas por los subgerentes, lo que le busca dar una mayor contundencia a la gestión en términos de resultados.

2.2. Criterios para la evaluación del Plan de Acción

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI. El avance anual de las metas del PEI 2019-2022 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de cada vigencia.

La elaboración del Plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias (las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que contempla que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objeto de tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados).

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente:

Criterios	Validación
Claro. Preciso e inequívoco	Productos Tangibles
Relevante. Apropiado al tema en cuestión	Entregables del Proyecto
Económico. Disponible a un costo razonable	Meta Financiada
Medible. Abierto a validación independiente	Son sujeto de revisión bajo evidencia
Adecuado. Base para estimar resultados	Cuentan con Fuentes de información
Sensible. Se observan cambios en el tiempo	Avanzan en Períodos de Medición C/M/L

Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. La estimación de los resultados se hace con una ponderación importante de estas circunstancias, en la que juega un papel relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales eventos.

2.3. Esquema de seguimiento

El Plan de Acción del Fondo Adaptación permite medir periódicamente el ejercicio institucional desde diferentes perspectivas, con el fin de identificar brechas en la gestión y facilitar la toma de decisiones oportunas para la mejora continua.


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

El seguimiento al Plan de Acción de la Entidad permite hacer análisis cuantitativo y cualitativo para medir el desempeño de la siguiente estructura:


- 6 Objetivos Estratégicos (4 misionales y 2 transversales)
- 7 Áreas
- 25 Equipos
- 27 Gerentes / Líderes de meta
- 5 Macroproyectos y 7 sectores
- 24 Departamentos
- 86 Acciones estratégicas
- 93 indicadores con 363 metas periódicas (mensuales, trimestrales y anuales)

Para el Seguimiento al Plan de Acción se han establecido dos indicadores de control que se presentan gráficamente de la siguiente forma:

1. Indicador de Cumplimiento de Metas Consolidadas. Valoración de una acción estratégica, portafolio de intervenciones, o indicadores agrupados por proceso o área, identificando la relación entre el objetivo, el punto de partida o línea base y el fin o meta medible que se quiere alcanzar en el periodo específico de la medición. Como resultado se obtiene un análisis de cumplimiento o rezago de las metas en el periodo.

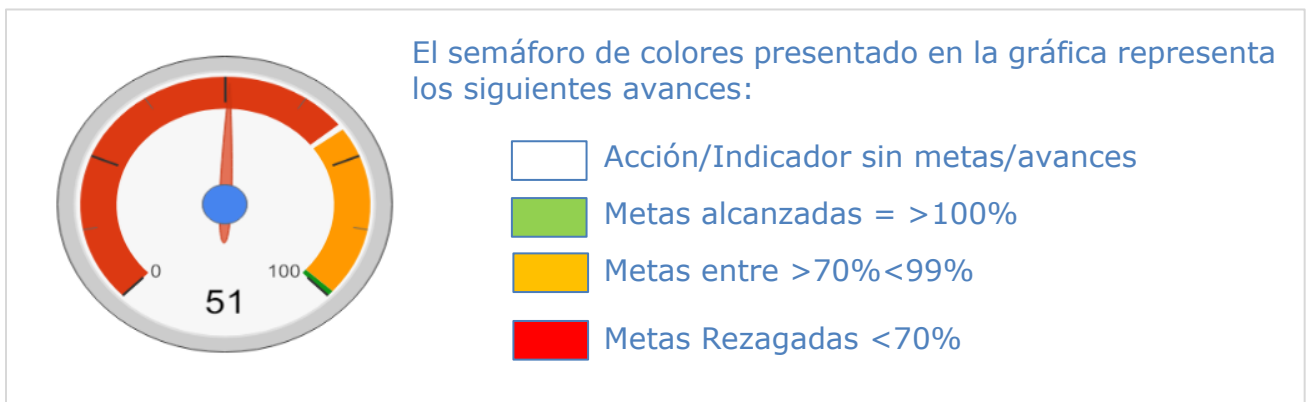

2. Indicador de Avance en el tiempo. Muestra el progreso porcentual de un objetivo en el tiempo, comparando lo programado en la vigencia versus lo ejecutado de manera periódica.

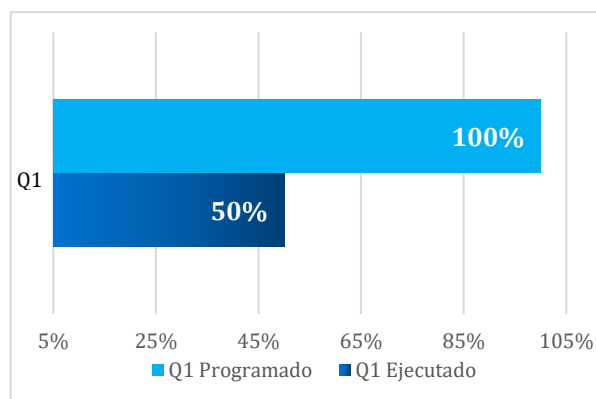

3. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos

La perspectiva de planeación es el punto de vista desde el cual se programa y hace seguimiento y análisis para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Institucional y el Plan de Acción.

El Fondo Adaptación contempla dos perspectivas en su planeación acordes con el perfil de los resultados a lograr en los objetivos estratégicos: la perspectiva externa, en la cual se contempla el punto de vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas por el Fondo (Misional), y la perspectiva interna, desde el que se contempla los resultados del cliente interno (Transversal). Los objetivos estratégicos por cada perspectiva son los siguientes:

Perspectiva externa

OE1. Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

OE2. Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

OE3. Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

OE4. Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población.

Perspectiva interna

OE5. Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

OE6. Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.


Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva

En este sentido, el Plan de Acción para la vigencia 2022, contiene un total de 93 indicadores con 363 metas asociadas, distribuidos en los 6 objetivos estratégicos en mención. A continuación, se expone el avance integral de la entidad, con base en los indicadores con metas programadas para el periodo con corte al 30 de junio:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

De un total de 128 indicadores con metas programadas para el segundo trimestre del año 2022, se identifican 75 indicadores con metas cumplidas al 100% o superior, 8 con un avance mayor al 70%, y 45 indicadores sin avance o con un avance menor al 70%.

Se concluye un cumplimiento total del 92% de la programación de la entidad para el mes de junio de 2022 y un avance del 33% versus el 36% esperado a la fecha de corte. Las metas rezagadas han sido evaluadas y cuentan con un esquema de seguimiento estricto que busca subsanar las dificultades en el menor tiempo posible.

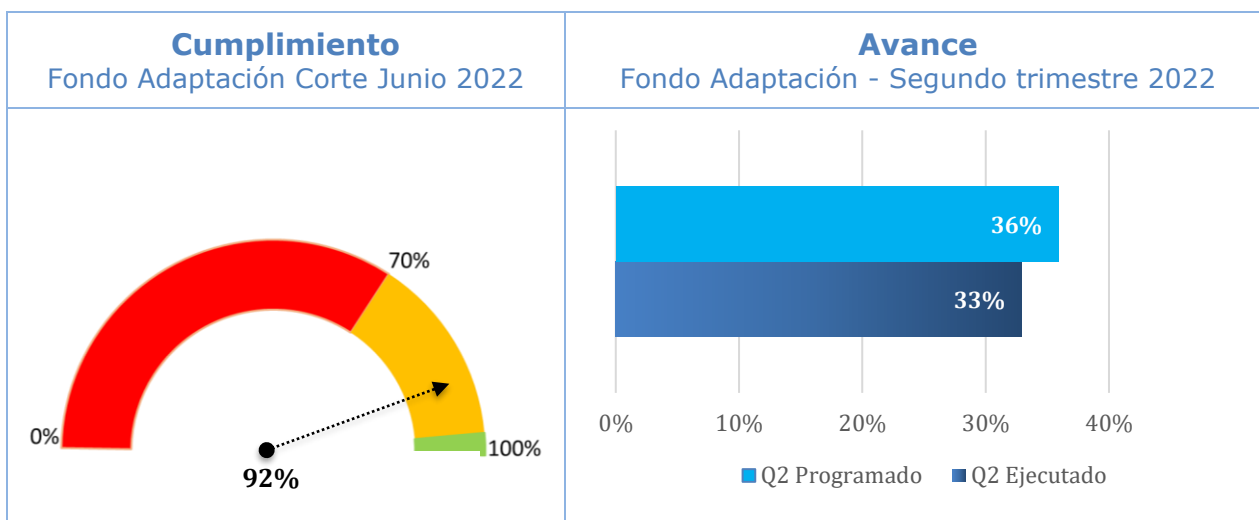


Indicadores con metas programadas para el periodo	
Indicadores con metas alcanzadas = >100%	75
Indicadores con metas entre >70%<99%	8
Indicadores con metas Rezagadas <70%	45

Al discriminar este análisis por objetivo estratégico, se obtienen los resultados que se exponen a continuación, en cumplimiento y avance agregado:

Objetivo Estratégico #1: Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.


Entre las metas cumplidas durante el segundo trimestre de la vigencia se destacan la entrega del proyecto Reactivar Panela Cauca, en El Tambo – Cauca, la entrega de la Casa del Campesino y la Casa de la Cultura al municipio de Gramalote en Norte de Santander, el avance al 92% de la Gestión predial del Macroproyecto Canal del Dique y la entrega de 11.39 kilómetros de Jarillón reforzado al municipio de Cali en el Valle del Cauca, acompañado de la entrega de 132 viviendas a igual número de familias focalizadas en el Macroproyecto Jarillón de Cali.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

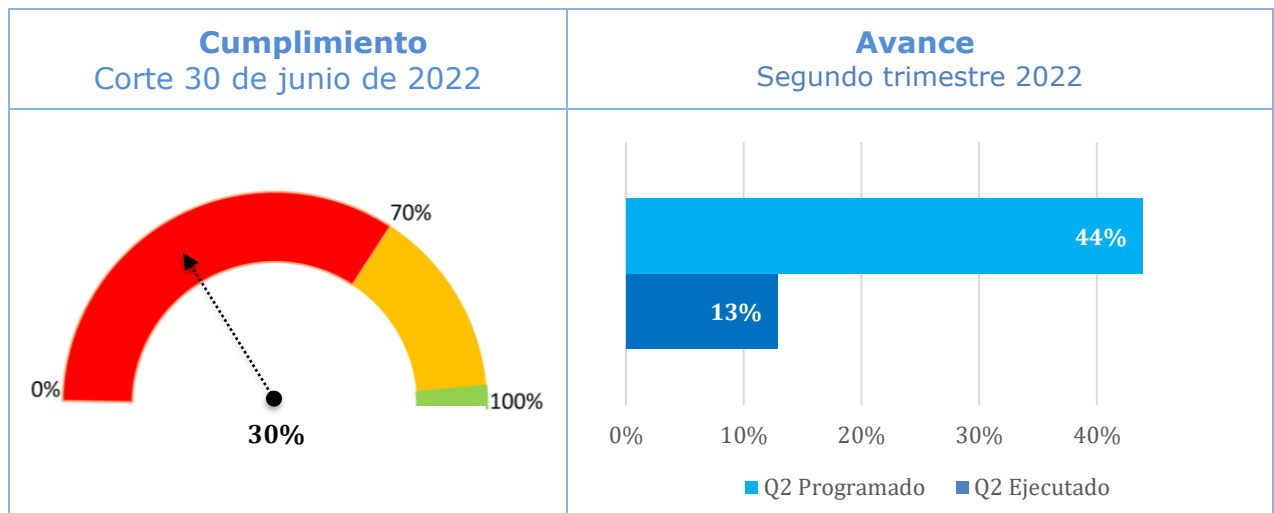

El principal rezago se asocia con la contratación de 128 soluciones de vivienda para el municipio de Gramalote en el departamento Norte de Santander y 400 soluciones de vivienda en el marco del Macroproyecto Jarillón de Cali. Ambos procesos se están adelantando con un control estricto para lograr la publicación en SECOP II en el mes de julio de 2022.

Objetivo Estratégico #2: Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

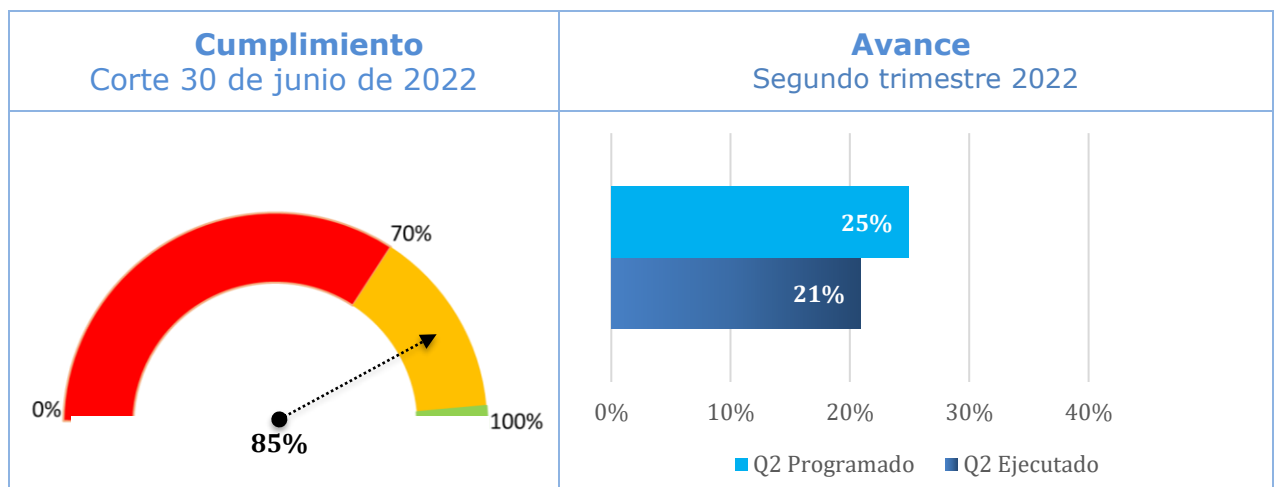

Entre las metas cumplidas alcanzadas durante el segundo trimestre del año 2022 se encuentran la terminación de 334 soluciones de vivienda y la entrega de 486 soluciones de vivienda adjudicadas a familias ubicadas en 54 municipios a lo largo de 12 departamentos. A lo anterior se suma:

- ✓ Terminación del acueducto y PTAP en el municipio de Aguachica – Cesar


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

- ✓ Terminación de la obra de infraestructura de sitios críticos correspondiente al Puente de La Colorada en el Departamento de Arauca
- ✓ Terminación del Hospital Nivel I de La Vega ESE Suroriente en Cauca
- ✓ Entrega de centro de salud en Guaranda – Sucre
- ✓ Entrega de la Sede Educativa EUM Darío Vásquez Caballero ubicada en Remolino – Magdalena.
- ✓ Entrega de una solución de alcantarillado en el municipio de Cúcuta – Norte de Santander.

El principal rezago en este objetivo estratégico se asocia con la terminación de cuatro sedes educativas en los departamentos del Cesar y Bolívar y la entrega de la sede ERM Del Horno en San Zenón – Magdalena; así como la entrega de tres IPS en Cauca y Nariño. En relación con las soluciones de vivienda el principal retraso en entregas se presenta en el departamento de Nariño.

A lo largo del documento y la descripción cualitativa de los indicadores, se detallan las gestiones que se adelantan a favor de avanzar con los logros por sector.

Objetivo Estratégico #3: Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

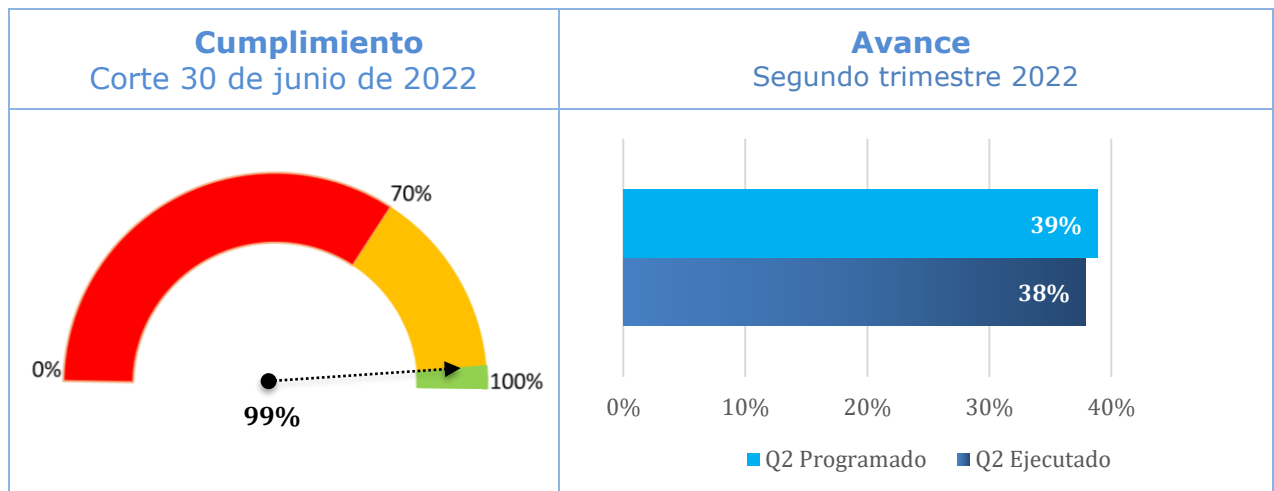


El avance programado a segundo trimestre en la estrategia de gestión del conocimiento corresponde principalmente a la consolidación de la información requerida para el proceso de empalme entre gobiernos, destacándose como producto el Informe de Gestión 2018 – 2022, y sus 34 anexos, que incluyen el balance por sector y macroproyecto, así como el detalle de cada uno de los productos contratados y entregados en la historia de la entidad y documentos técnicos que buscan brindar elementos para el análisis del alcance del Fondo hacia el futuro.

A esto se suma el avance en la herramienta tecnológica en ambiente web para la integración, gestión y análisis de información a favor de articular los procesos de ordenamiento ambiental, permitiéndole al IDEAM publicar los productos y servicios de información relacionados con el monitoreo de variables ambientales en Colombia, para

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


el fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y del Sistema de Información Ambiental para Colombia –SIAC.

Objetivo Estratégico #4: Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de su resiliencia de las regiones y de su población.

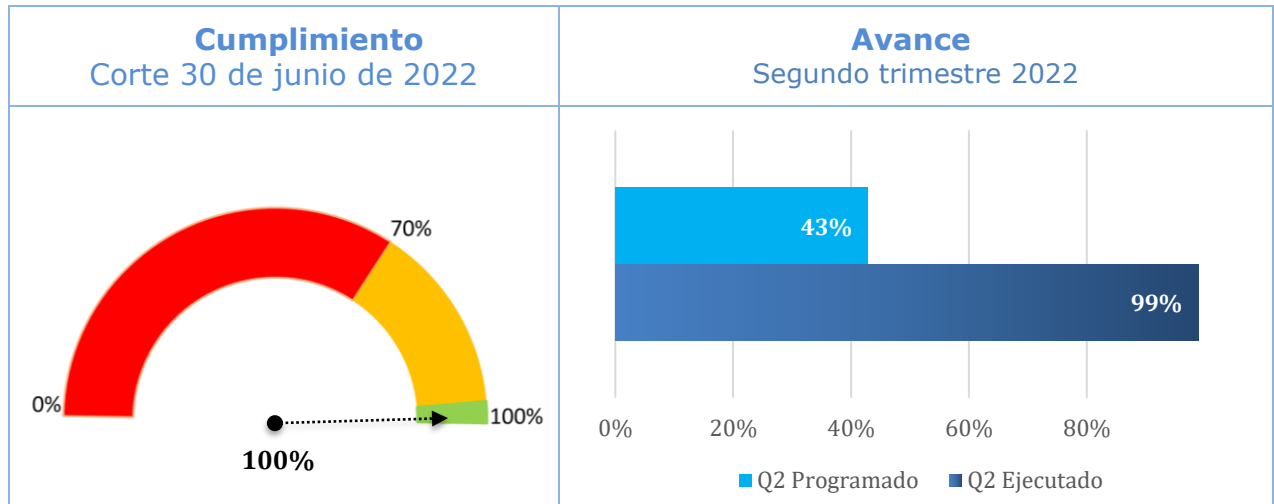

El avance en este objetivo estratégico refleja la importancia de la gestión social para el Fondo Adaptación, por lo que se ha promovido fuertemente los espacios que permiten la implementación de la Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social, así como la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.


Objetivo Estratégico #5: Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

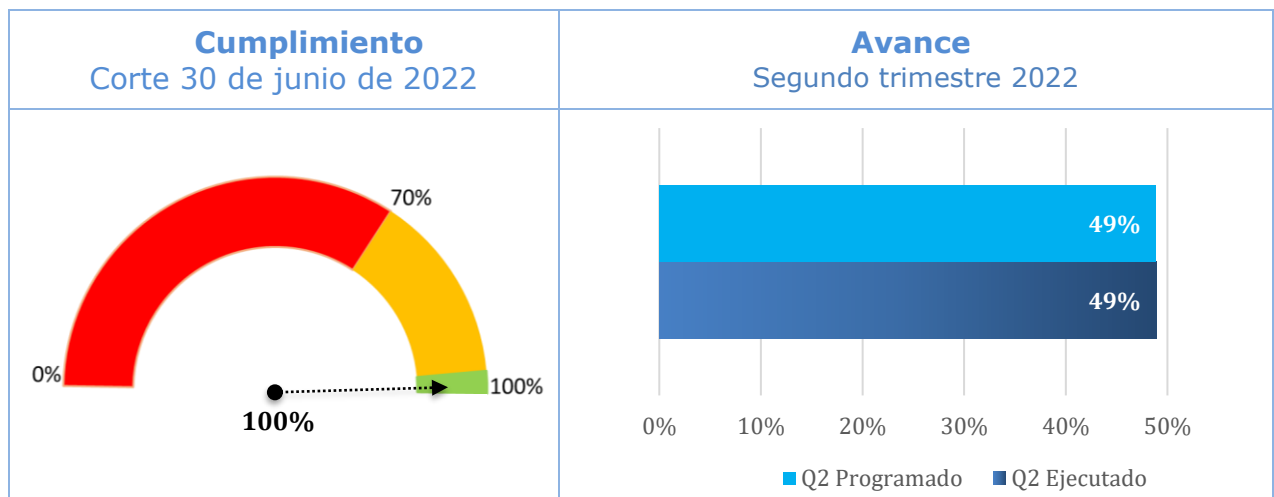

El avance y cumplimiento responden a las acciones realizadas en el marco de las estrategias de comunicaciones internas y externas, acompañado de un adelanto en la ejecución del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Objetivo Estratégico #6: Modernizar y fortalecer el Funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

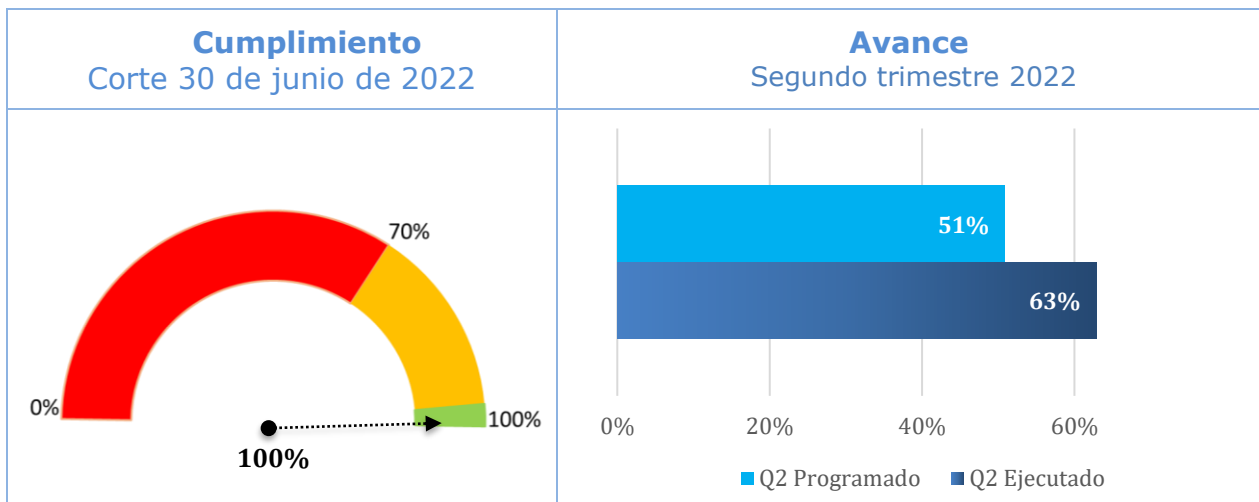

El avance y cumplimiento responden al alcance del Plan de Capacitación realizado en el periodo y la participación de los colaboradores del Fondo Adaptación; al igual que a la gestión que se evidencia en los procesos de contratación y gestión documental, entre otros.

3. 1. Objetivos Estratégicos Misionales

Seguimiento al Plan de Acción por Macroproyecto


El Plan de Acción 2022 contiene 49 indicadores para medir el cumplimiento de 320 metas de los macroproyectos y sectores, asociada cada una de ellas a las intervenciones programadas para la vigencia. Para este caso, los indicadores y sus metas responden al ciclo de vida del proyecto:

- La fase de estructuración culmina con la contratación y se verifica a través del acta de inicio;
- La fase de ejecución culmina con la terminación y se verifica con el acta de terminación;
- La fase de entrega culmina con la verificación de entrega final al beneficiario y se verifica con la firma por las partes del acta de entrega.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

De los indicadores relacionados con las metas de los macroproyectos y sectores el balance es el siguiente:

CANAL DEL DIQUE

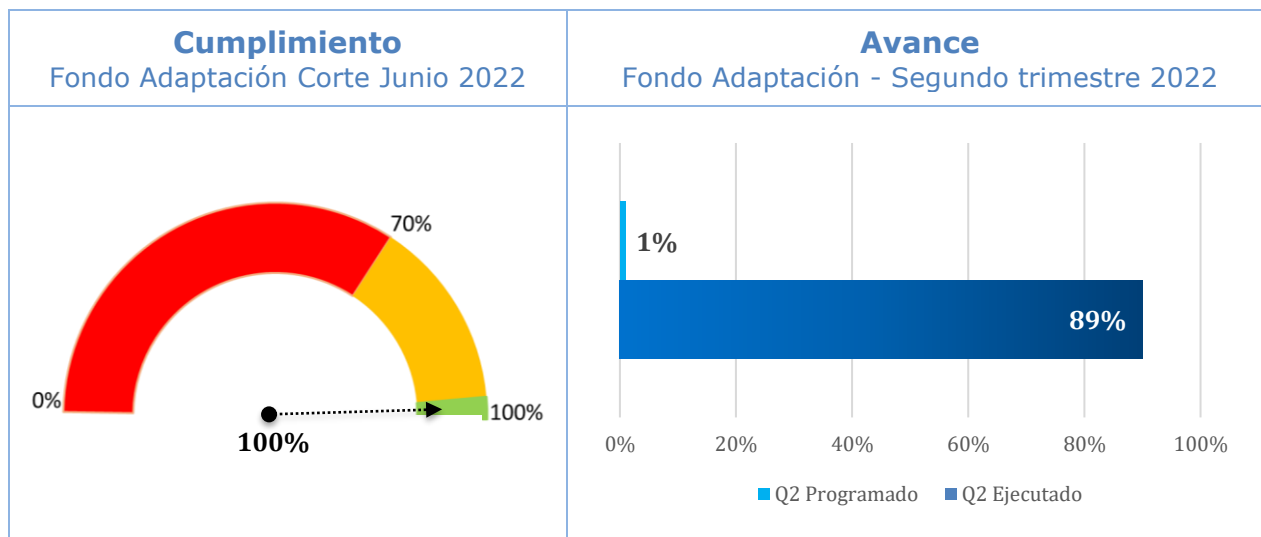

Portafolio/Programa/Proyecto:

CANAL DEL DIQUE

Gerente de Meta:

Asesor E.T Macroproyecto Canal del Dique

Objetivo Estratégico 2018-2022 #1		Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático					
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA01_Terminar proceso de selección de la APP del Canal del Dique	(AEA01)_Proceso de selección de la APP del Canal del Dique	1	-	-	-	1	N.A.
AEA02_Terminar los contratos de estructuración	(AEA02)_contratos de estructuración (BBI_GC), terminados	2	-	-	-	2	N.A.
AEA03_Elaborar gestión predial	(AEA03)_Gestión predial, elaborada	100%				100%	92

Mes	Avance Cualitativo
(AEA01)_Proceso de selección de la APP del Canal del Dique	
Enero	Mediante aviso modificatorio No. 1 del 24 de enero de 2022, para el proceso de licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021, emitido para la adjudicación de un contrato de concesión bajo el esquema APP al Proyecto de "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE", se comunicó la modificación

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	al cronograma de la licitación. Se continúa en la gestión del logro de las aprobaciones del proyecto ante las entidades gubernamentales.
Febrero	Mediante aviso modificatorio No. 3 del 28 de febrero de 2022, para el proceso de licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021, emitido para la adjudicación de un contrato de concesión bajo el esquema APP al Proyecto de "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE", se comunicó la modificación al cronograma de la licitación. Se avanza con la solicitud de distribución de recursos a través del CONFIS y la concertación de acuerdos en la totalidad de los procesos consultivos con las comunidades del Dique, luego de haber obtenido el aval del DNP para la ejecución del proyecto mediante el mecanismo de APP.
Marzo	Mediante resolución 20227030004215 del 25 de marzo de 2022, la vicepresidencia de estructuración de la ANI ordenó la apertura de la licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 para la adjudicación de un contrato de concesión bajo el esquema APP al Proyecto de "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE". Lo anterior, luego de que el mismo 25 de marzo el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, autorizara a la ANI comprometer el cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras en su presupuesto, por los montos del pliego de condiciones del proceso.
Abril	En abril se continuó con el recibo de las Observaciones realizadas por los interesados al Pliego Definitivo, estas observaciones vienen siendo atendidas con el apoyo de los estructuradores, para su posterior publicación en SECOP I.
Mayo	El 25 de mayo, se publicó la Adenda No. 1 al proceso de selección, con la cual se presentaron los ajustes a los apéndices técnicos y al borrador de la minuta de concesión, en atención a las observaciones del pliego definitivo. El cronograma del proceso también fue ajustado, ampliando el plazo para la presentación de ofertas hasta el 1 de julio de 2022.
Junio	El 15 de junio de 2022 se publicó la Adenda No. 3 al proceso de selección, con la cual se presentaron modificaciones a los apéndices técnicos 1 y 4 y al borrador de la minuta de concesión, en atención a las observaciones extemporáneas del pliego definitivo. El cronograma del proceso también fue ajustado según Adenda No. 2, ampliando el plazo para la presentación de ofertas hasta el 13 de julio de 2022.
(AEA02)_contratos de estructuración (BBI_GC), terminados	
Enero	Los dos (2) contratos de consultoría para la estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos continúan en la etapa de Acompañamiento al proceso de aprobaciones y cierre fiscal y contratación del proyecto "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE" a través del mecanismo de APP. Actualmente, se tramita solicitud de prórroga al contrato de consultoría FA-CD-I-S-242-2019, con fecha de terminación prevista para el 24 de octubre de 2022.
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	Los 2 contratos de consultoría para la estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos continúan en la etapa de Acompañamiento al proceso de aprobaciones y cierre fiscal y contratación del proyecto "RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE" a través del mecanismo de APP. Desde el 25 de marzo de 2022 los estructuradores atienden las observaciones al pliego definitivo que fue publicado por la ANI para el proceso de licitación pública de selección del futuro concesionario.


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Abril	Desde el 25 de marzo de 2022 los estructuradores atienden las observaciones al Pliego Definitivo, apoyan las peticiones allegadas a las entidades ANI, Cormagdalena y Fondo y continúan en la Promoción del Proyecto, con la participación en reuniones realizadas con potenciales interesados.
Mayo	Desde el 25 de marzo de 2022 los estructuradores atienden las observaciones al Pliego Definitivo en tiempo y extemporáneas, apoyan las peticiones allegadas a las entidades ANI, Cormagdalena y Fondo, y continúan en la Promoción del Proyecto, con la elaboración de presentaciones y participación en reuniones con potenciales interesados
Junio	Desde el 25 de marzo de 2022 los estructuradores atienden las observaciones al Pliego Definitivo en tiempo y extemporáneas, apoyan las peticiones allegadas a las entidades ANI, Cormagdalena y Fondo, y continúan en la Promoción del Proyecto, con la elaboración de presentaciones y participación en reuniones con potenciales interesados.
(AEA03)_Gestión predial, elaborada	
Enero	Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 81.92%, de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación. Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-097-2022 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el estudio previo de los avalúos comerciales se encuentra terminado en revisión jurídica para adelantar el proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía.
Febrero	Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 83%. Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-097-2022 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados el cual alcanzó un porcentaje de avance del 22%. El estudio previo de los avalúos comerciales se encuentra terminado en revisión jurídica, por parte del ET jurídico sectorial para adelantar el proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía.
Marzo	Al corte de este seguimiento, el avance acumulado asciende a un 90%. Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-003-2021 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos para radicar ante el IGAC con un avance del 36.17%. El estudio previo de los avalúos comerciales se encuentra terminado en revisión jurídica para adelantar el proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía.
Abril	Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 91%. Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-003-2021 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demás anexos para radicar ante el IGAC con un avance del 53.67%. El proceso de contratación para la elaboración de los avalúos comerciales por selección abreviada de menor cuantía se encuentra radicado para publicación.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Mayo	<p>Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 92%. Se encuentra en ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-003-2021 para la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con los levantamientos topográficos elaborados y demas anexos para radicar ante el IGAC con un avance del 63%.</p> <p>El proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto es "Elaboración de avalúos comerciales de predios A nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación" se encuentra en licitación con el pliego de condiciones definitivo y publicado.</p>
Junio	<p>Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se encuentra en un 92%. Respecto a la ejecución el contrato FA-SAMC-I-S-003-2021, el avance se mantiene en el 63%, dado que el IGAC se encuentra en revisión de los documentos entregados por el contratista.</p> <p>El proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto es "Elaboración de avalúos comerciales de predios A nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación" se encuentra en licitación listo para adjudicación; en respuesta a las observaciones presentadas por uno de los 9 proponentes.</p>

LA MOJANA

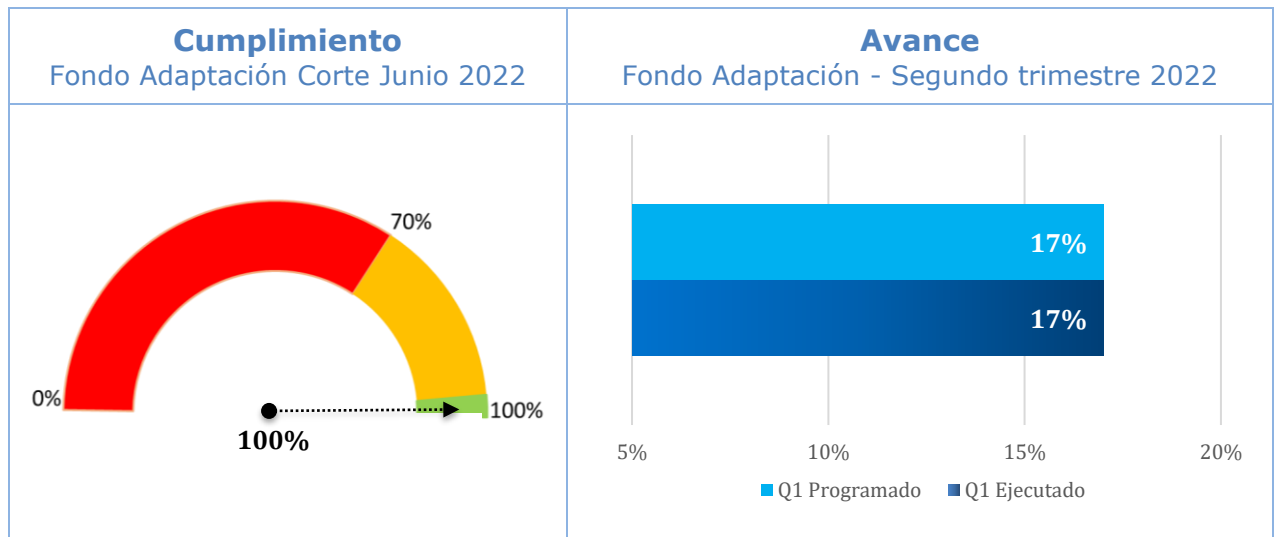

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022



Portafolio/Programa/Proyecto: **LA MOJANA**
Gerente de Meta: Asesor Macroproyecto La Mojana

Objetivo estratégico 2018-2022 #1 Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/ Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA08_Terminar y entregar diseños de obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEA08)_Diseños de obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), terminados y entregados	2			2		N.A.
AEA09_Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE	(AEA09) Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual	0.05%			0.05%		N.A.
AEA10_Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA10)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	2	1		1		1

Mes	Avance Cualitativo
(AEA08)_Diseños de obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), terminados y entregados	
Enero	<p>Se cuenta con los contratos vigentes nro. FA IC I F 140 de 2020 y su correspondiente interventoría nro. FA CD I F 146 de 2020. El proyecto cuenta con dos etapas, la etapa 1 corresponde a la culminación de los diseños de detalle que, a su turno contiene tres versiones a saber (versión P, versión A y versión 0), y la etapa 2 contiene a su turno una fase de preconstrucción y una fase de construcción. El contrato prevé la entrega de tres versiones en la etapa de diseños, la versión P fue aprobada por la interventoría el 16 de diciembre de 2020, posteriormente la versión A, que corresponde al informe de avance de ingeniería de detalle, fue aprobada 01 de julio de 2021.</p> <p>El 18 de enero de 2022 se reiniciaron los contratos que se encontraban suspendidos desde el mes de noviembre de 2021 y se suscribió la modificación que amplía el plazo de ejecución de la etapa 1 de diseños, hasta el 18 de abril de 2022.</p> <p>El porcentaje de avance de la etapa de diseños es de 85,52% para Magangué y 86.63% para San Marcos. Cabe anotar que los porcentajes de avance se mantienen respecto de reporte anterior, en el entendido que los nuevos cronogramas a partir de la modificación indicada anteriormente, a la fecha se encuentran en ajuste para su posterior aprobación por parte de la interventoría. Teniendo en cuenta lo anterior y a la luz del estado de ejecución del contrato, en la actualidad se encuentra en curso la versión 0 de la etapa 1 de diseño, en la cual el Contratista debe desarrollar los diseños a nivel de ingeniería de detalle para con ello dar paso al inicio de la etapa 2 del proyecto.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	<p>Se encuentra en elaboración la versión 0 de la etapa 1 de diseño, en la cual el Contratista debe desarrollar los diseños a nivel de ingeniería de detalle para con ello dar paso al inicio de la etapa 2 del proyecto.</p> <p>Con la firma del Otrosí No 5 del contrato de obra y Otrosí No 4 del contrato de interventoría, se prorroga la entrega de la versión 0 de estudios y diseños y culminación de la etapa 1 del proyecto.</p> <p>Con el objeto de analizar la pertinencia de la aplicación de la condición resolutoria en los términos establecidos contractualmente y teniendo en cuenta la actual situación que vive el país en relación con el fenómeno de "La Niña" la cual se encuentra afectando la zona en la que se debe ejecutar el proyecto, se define suscribir la suspensión No 4 del contrato de obra a partir del 18 de abril de 2022 por 15 días calendario, esperando su reinicio el 03 de mayo de 2022.</p>
Mayo	<p>Se encuentra en elaboración la versión 0 de la etapa 1 de diseño, en la cual el Contratista debe desarrollar los diseños a nivel de ingeniería de detalle para con ello dar paso al inicio de la etapa 2 del proyecto.</p> <p>Tras el reinicio del contrato de obra el 03 de mayo de 2022, dada la finalización de la suspensión No. 4, y con el objeto de avanzar en el cierre de la Versión 0 de estudios y diseños y culminación de la etapa 1 del proyecto, en el marco de la "solución de controversias" establecida en el contrato de obra, se adelantan mesas de trabajo técnicas entre el contratista, el interventor y el equipo técnico de la supervisión del Fondo Adaptación, con el fin de dirimir las diferencias en los diseños. Del resultado de las mesas de trabajo técnicas, se definirán las estrategias por cada uno de los componentes de diseño que permitan establecer un diseño costo eficiente y con ello establecer la hoja de ruta que propenda por el cumplimiento del objeto contractual y el interés público en la construcción de las obras para protección de la población.</p>
Junio	<p>Se encuentra en elaboración la versión 0 de la etapa 1 de diseño, en la cual el Contratista debe desarrollar los diseños a nivel de ingeniería de detalle para con ello dar paso al inicio de la etapa 2 del proyecto.</p> <p>Con respecto al avance de la ejecución de las obras de protección en los municipios de San Marcos y Magangué, el contratista solicitó la suspensión del contrato en el marco del mecanismo contractual de "solución de controversias" con el fin de adelantar mesas de trabajo técnicas entre el contratista, el interventor y el equipo técnico de la supervisión del Fondo Adaptación, con el fin de dirimir las diferencias en los productos de diseño que permitan la aprobación de la Etapa I. A la fecha de corte, el contratista entregó los productos de diseño ajustados conforme con los resultados de las mesas de trabajo y se encuentran en revisión por parte de la interventoría. De manera paralela se trabaja en la estructuración de una modificación contractual que permita la creación de una fase de priorización de obras, de acuerdo con los recursos disponibles.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEA09) Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual	
Enero	<p>El proyecto se desarrolla en el marco del convenio 018 de 2017, suscrito entre el SENA, la Agencia Nacional Inmobiliaria- ANIM y Fondo Adaptación, en el cual se establece que la ejecución será realizada por la ANIM. Así las cosas, la ANIM constituyó un patrimonio autónomo, a través del cual, por instrucciones de dicha Agencia, se realiza la contratación derivada para la ejecución del proyecto.</p> <p>Es preciso indicar que el proyecto cuenta con dos fases, la primera, financiada con el aporte del Fondo Adaptación, comprende los siguientes cuatro (4) ambientes de aprendizaje: Agroindustrial, Acuícola, Área Administrativa y Bienestar, así como los servicios asociados, esto es movimiento de tierras, tanque, PTAR, PTAP, redes externas y RCI; y la segunda fase, financiada con los aportes del SENA, incluye: Ras, Cancha deportiva, Urbanismo, Vía interna, Residuos sólidos, Piscina acuícolas, Quiosco, Pecuario, Conocimiento mecanizado, Aire Acondicionado, Red de Gas, Aula polivalente.</p> <p>Para la construcción de la fase I, se suscribió un contrato que finalizó por vencimiento de plazo (abril de 2020) sin el cumplimiento satisfactorio del alcance de este, para lo cual, la ANIM y la Fiduciaria Colpatria, adelantó el procedimiento correspondiente para la imposición de la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios al contratista CRAING Ltda. El contrato finalizó con un avance de ejecución del 41.9%. Luego de surtido un nuevo proceso de contratación para la culminación de las obras de la etapa I, es decir para la construcción del 58.1% faltante; es así como el 08 de abril de 2021, se dio inicio los contratos de obra e interventoría correspondientes, posteriormente el 13 de octubre de 2021, se suscribió una prórroga al contrato de obra, ampliando el plazo de ejecución en dos meses, es decir hasta el 13 de diciembre de 2021.</p> <p>El 16 de noviembre de 2021 se realizó la suscripción una nueva modificación al contrato de obra, ajustando las actividades con un balance de mayores y menores cantidades y la inclusión de ítems no previstos. Es importante resaltar, que el Fondo, requirió de manera reiterada a la ANIM que la culminación de la fase I, incluyera todas las actividades necesarias para poner en funcionamiento las áreas construidas una vez finalizaran. El 24 de noviembre de 2021, en comité operativo del convenio, la ANIM solicitó la aprobación de una modificación al convenio, con el fin de incluir las actividades para garantizar la puesta en funcionamiento de la fase I del proyecto, dentro del contrato de obra vigente.</p> <p>El 10 de diciembre de 2021, la ANIM remitió la solicitud de modificación sobre la cual, el Fondo requirió los soportes que fueron enviados el 13 de diciembre de 2021 y sobre ello se solicitaron aclaraciones y complementaciones que sustentaran la inversión total de los recursos aportados por la entidad en el entendido que varias de las actividades indicadas en el convenio para la fase I, no se habrían podido financiar con dichos recursos. Así las cosas, la ANIM informó la suspensión del contrato de obra para la revisión de la solicitud presentada al Fondo.</p> <p>Con base en el último informe semanal (No. 42) de interventoría de las obras de terminación de fase I, para fecha de corte 24 de enero de 2022, se reporta que el avance programado del contrato es de 96.93% de avance ejecutado sobre el 58.1% faltante para la culminación de la fase I del proyecto, acumulando en total un avance del 97.71% sobre la fase I, faltando 2.29% de avance para la culminación.</p>
Febrero	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	<p>El proyecto se desarrolla en el marco del convenio 018 de 2017, suscrito entre el SENA, el Fondo Adaptación y la Agencia Nacional Inmobiliaria- ANIM, quien funge como ejecutora de los contratos de obra (No. 17-002/2021) e interventoría (No. 17-001/2021), los cuales tuvieron inicio el 8 de abril de 2021 para la terminación de la Fase I. Teniendo en cuenta que el 8 de abril de 2022 se suscribió otrosí No. 7 al contrato de obra, prorrogándolo hasta el 30 de junio de 2022, la interventoría reportó un avance con corte al 30 de abril de 2022, programado del 69.61% y ejecutado del 68.47%.</p> <p>El 26 de abril se suscribió el otrosí No. 3 al convenio, que tiene por objetivo trasladar y apropiar recursos de la fase II a la Fase I para hacer operativa y funcional la Fase I; y apropiar recursos para la asistencia técnica de la ANIM. El 8 de abril se realizó visita de obra por parte del Fondo Adaptación, identificando que en la actualidad se vienen ejecutando obras que correspondían a la terminación de fase I en su alcance inicial y no han sido iniciadas las correspondientes a la Fase I operativa.</p>
Mayo	<p>El cierre financiero de la fase I de la obra de construcción del SENA - Majagual por \$8.000 millones, a cargo del Fondo Adaptación, fue realizado en diciembre de 2017.</p> <p>El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio, para lo cual se realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita por parte de Ingeniera de campo del FA a las obras, el 25/05/2022, en la cual se evidenció el avance físico reportado de 89,11%. - Comité operativo No. 28 el 31 de mayo de 2022, en el cual se solicitó información respecto a la dotación de la sede, a lo cual el SENA informó que se encuentra avanzando en el trámite con el proveedor. Así mismo, se reiteró el compromiso de terminación de las obras para el 30 de junio, se realizará nueva visita por parte del FA en junio para verificación del avance, y conjunta con la ANIM para verificación previa a la entrega.
Junio	<p>El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio, para lo cual se realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita por parte del Subgerente de Gestión del Riesgo a las obras, el 28/06/2022, para la cual, se contaba con un avance físico reportado de 95,93%. Se identificó que no se cumplirá con el plazo inicialmente establecido para la culminación de las obras (30-JUN-22). La ANIM informó que las obras serán terminadas el 10-JUL-2022. - Debido a las falencias identificadas en la visita realizada, en términos de: calidad de las obras, la ausencia de algunos elementos básicos para la operatividad y funcionalidad de la sede y el avance actual de las obras, se solicitó por parte del Fondo Adaptación, por medio de comunicación E-2022-013505 (del 30-JUN-22), se presente un plan de acción para la culminación satisfactoria de las obras, de tal manera que las obras entregadas sean funcionales y operativas de acuerdo con los establecido en el Otrosí No. 3 suscrito el 27/04/2022.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
(AEA10)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	
Enero	<p>ACHÍ: Con corte al 31 de enero de 2022 los documentos de los estudios previos, estudio de mercado, matriz de riesgos, oferta económica, presupuesto, anexo técnico, fueron remitidos a la Subgerencia de Estructuración para revisión y aprobación. El cumplimiento de esta meta está supeditado al desarrollo del contrato No. 153 de 2017 y la entrega de las 748 viviendas. Por tanto, desde el sector de Apropiación y Fortalecimiento de Capacidades se ha venido realizando un seguimiento y monitoreo semanal a la ejecución de dicho contrato.</p> <p>Documentos elaborados y remitidos a la Subgerencia de Estructuración, incluida la comunicación entre los dos sectores que evidencia el cronograma del sector Vivienda: Anexo 1. Estudios previos, Anexo 2. Estudio de mercado, Anexo 3. Matriz de riesgos, Anexo 4. Oferta económica, Anexo 5. Presupuesto, Anexo 6. Anexo técnico, Anexo 7. Comunicaciones entre los sectores de Apropiación y Vivienda.</p> <p>SAN BENITO: Una vez cumplida la meta al 100% de la fase de "versión final para concurso", se inicia la etapa de respuestas a las observaciones al Pliego de Condiciones (25/01/22), publicando la respectiva Adenda (31/01/22) e iniciando la etapa de Presentación de Ofertas (04/02/2022). La fecha para presentar el informe de evaluación de ofertas está fijada para el (10/02/22). Posterior a esta fecha se elaborará el informe de presentación de observaciones al informe de evaluación de las ofertas (15/02/22), y se realizará la expedición del acto de adjudicación o declaratoria desierta el (18/02/22).</p> <p>Mediante comunicación por parte del Equipo de Gestión Contractual, se envía al E.T. Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento soporte de publicación de Adenda el día (31-01-22).</p>
Febrero	<p>ACHÍ: Se cuenta con los documentos elaborados de los estudios previos, estudio de mercado, matriz de riesgos, oferta económica, presupuesto, anexo técnico, los cuales se remitieron a la Subgerencia de Estructuración para revisión y aprobación. Dichos documentos en su totalidad fueron devueltos con modificaciones el (05/02/2022). Posterior a ello, se tuvo reunión nuevamente con dicha Subgerencia, los días 18 y 21 de febrero de 2022, para continuar con los ajustes de los estudios previos y estudio de mercado.</p> <p>Actualmente, los documentos están en revisión interna del sector de Apropiación y Fortalecimiento de Capacidades. Posterior a ello, se pretende contar con una versión final para concurso de méritos; posteriormente, la etapa de contratación y la adjudicación se tiene estimada para mayo de 2022. Sin embargo, es de mencionar que el cumplimiento de esta meta ha estado supeditado al desarrollo del contrato No. 153 de 2017 y la entrega de las 748 viviendas; en la última comunicación del sector vivienda, del 8 de febrero de 2022, se reiteró que el cronograma de entrega se mantiene, acorde con la información suministrada por el mismo sector el 17 de noviembre de 2021.</p> <p>SAN BENITO: Actualmente, el proceso para la contratación de la consultoría modalidad concurso de méritos FA-CMA-I-S-006-2021, se encuentra en proceso y publicado en Secop II desde el 22 de diciembre de 2021, el cual tiene, conforme el cronograma, fecha estimada de firma en Marzo del 2022 por parte de la UNION TEMPORAL FORTALECER 2022, según Resolución 188 del 22 de Febrero del 2022.</p>
Marzo	<p>ACHÍ: Se cuenta con los documentos elaborados de los estudios previos, estudio de mercado, matriz de riesgos, oferta económica, presupuesto, anexo técnico, los</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>cuales se remitieron al área jurídica para revisión y aprobación el 8 de marzo de 2022. De los documentos enviados, el área jurídica hizo correcciones al Estudio previo y fueron remitidos al ET de Apropriación el 22 de marzo. Se procedió a la realización de las correcciones competentes el 25 de marzo; no obstante, se hizo necesario la remisión al área de Estructuración para un ajuste técnico de su parte. Actualmente, los documentos están en revisión nuevamente del área jurídica. Posterior a ello, se pretende contar con una versión final para concurso de méritos y se tiene estimada la etapa de contratación para mayo de 2022.</p> <p>No obstante, el cumplimiento de esta meta está supeditado al desarrollo del contrato No. 153 de 2017 y la entrega de las 748 viviendas. Por tanto, desde el sector de Apropriación y Fortalecimiento de Capacidades se ha venido realizando un seguimiento y monitoreo semanal a la ejecución de dicho contrato.</p> <p>SAN BENITO: Con el cumplimiento de los requisitos según el Anexo Generalidades del Pliego de Condiciones el día 10 de marzo se suscribió el contrato por parte de la UNION TEMPORAL FORTALECER 2022, y se informa al contratista los pasos previos a cumplir para la firma del acta de inicio según Estudio Previo del proceso, en el ítem 2.4.5. OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES. El 25 de marzo se le informa a la Unión Temporal por parte del Sector según MEMORANDO E-2022-001544, la aprobación de los perfiles y por consiguiente se cumple con los pasos previos a la firma del acta de inicio.</p>
Abril	<p>Las metas de contratación del proyecto socioeconómico, cuyo objeto es: "Realizar acompañamiento socioeconómico a las familias beneficiarias del programa de vivienda del Fondo Adaptación en la modalidad de reubicación en la zona de La Mojana", está condicionado a la entrega de las viviendas, lo cual tiene inicio programado entre junio y agosto de la actual vigencia.</p>
Mayo	<p>En mesas de trabajo contractual, sostenidas en el mes de mayo de 2022, se identificó que debido al cambio reciente al manual de contratación del F.A. se debía modificar la forma de pago contemplada en el proceso. Asimismo, se estableció que dicho proceso debe estructurarse por modalidad de licitación pública; lo anterior implica la necesidad de modificar los documentos adelantados.</p> <p>De otro lado, considerando que el cumplimiento de esta meta está supeditado al desarrollo del contrato No. 153 de 2017 y la entrega de las 748 viviendas, se hace permanentemente seguimiento a la programación de inicio de estas entregas. Se proyecta iniciar con la entrega de 120 viviendas en agosto de 2022.</p>
Junio	<p>Se trabajó en la estructuración de los documentos, (Estudio previo, estudio de mercado, matriz de riesgos, anexo técnico, etc.), para la futura contratación por licitación pública del acompañamiento socioeconómico de Achí.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

JARILLÓN DE CALI

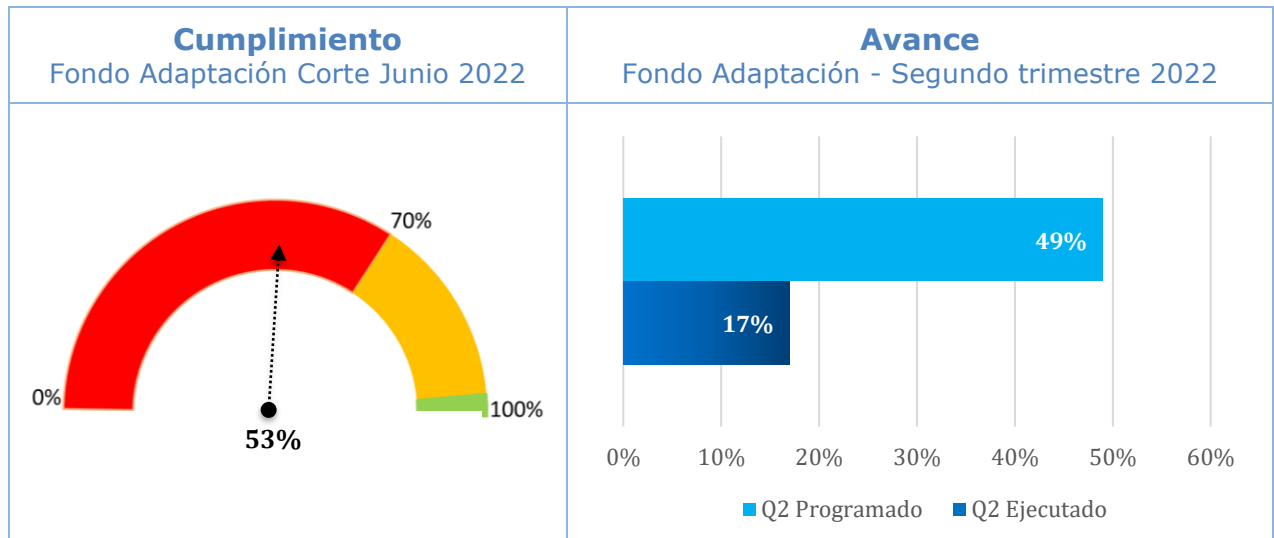

Portafolio/Programa/Proyecto: **JARILLÓN DE CALI**

Gerente de Meta: Asesor E.T. Macroproyecto Jarillón de Cali

Objetivo estratégico 2018-2022 #1

Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático

Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades/hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA11_Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA11)_Soluciones de vivienda, contratadas	800		400	400		0
AEA12_Terminar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	(AEA12)_Soluciones de vivienda, terminadas	400		380		20	120
AEA13_Entregar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA13)_Soluciones de vivienda, entregadas	400				400	140
AEA14_Contratar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA14)_Km de Jarillón, contratado	0,055		0,055			0
AEA15_Terminar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA15)_Km de Jarillón, terminado	1,5	0,65		0,08	0,77	0,712
AEA16_Entregar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA16)_Km de Jarillón, entregado	19,16		8,693	5,723	4,745	11,39
AEA17_Terminar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR)	(AEA17)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	2		2			0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades/hitos)	Indicador	Programación Trimestral					Avance Meta
		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA18_Entregar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)	(AEA18)_Obras infraestructura estratégica, entregadas (PTAR, PTAP)	2			2		N.A.

Mes	Avance Cualitativo
(AEA11)_Soluciones de vivienda, contratadas	
Enero	<p>En mesa de trabajo entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali se define que la contratación para 800 VIP se realizara bajo la modalidad de licitación. Por lo anterior, se debe adelantar la modificación del convenio 007-21 e iniciar la estructuración de la licitación.</p> <p>Ley de garantías para la definición de modalidad de contratación y Estructuración de nuevos proyectos habitacionales y obtención del plan de trabajo.</p>
Febrero	<p>Continua en proceso la modificación del convenio 007-21 para la inclusión del lote por parte del FEV en el proyecto Santa Elena y balancear los recursos conforme a los proyectos que se desarrollen a través del Convenio. Se inició la etapa precontractual (Estudios previos) de la licitación.</p> <p>El estudio de mercado arrojo que no es común salir a licitación pública en este tipo de proyecto y encontró que entidades han licitado hasta 100 VIP, pero no en el tamaño que buscamos las 800 VIP.</p>
Marzo	<p>El 15 de marzo 2022, se suscribe la modificación 01 al Convenio 007-21 para el aporte del lote del FEV por 7.400 millones de pesos y obligaciones asociadas a este aporte; además de reasignar los recursos del FA viabilizando el proyecto Altos de Santa Elena. El 30 de marzo 2022 finaliza la elaboración de los Estudios Previos, Análisis de Sector y Mercado, Anexo Técnico e información complementaria para los Prepliegos relacionados al proceso de licitación pública para el proyecto Altos de Santa Elena Fase II, que se encuentran en revisión final por parte del Fondo Adaptación. Se encuentran en análisis</p>
Abril	<p>Se definió la viabilidad para el desarrollo de 720 soluciones de vivienda para el proyecto habitacional Altos de Santa Elena Fase II. Se publicó en SECOP el 19 de abril de 2022, Prepliegos relacionados al proceso de licitación pública para el proyecto Altos de Santa Elena Fase II.</p> <p>El lote aportado por el Fondo Especial de Vivienda – FEV, permite el desarrollo de hasta 720 VIP y no 800 VIP como se tenía proyectado.</p>
Mayo	<p>Se publicó en SECOP el 19 de abril de 2022, Prepliegos relacionados al proceso de licitación pública de obra para el proyecto Altos de Santa Elena Fase II. En el proceso, se recibieron observaciones y el 26 de mayo 2022 se dieron alcance a las mismas.</p> <p>Se publicaron Prepliegos del proceso de Licitación Interventoría el 20 de mayo 2022.</p> <p>El proceso de licitación de obra se encuentra suspendido, debido a la solicitud de los proponentes para poder tramitar pólizas de seriedad de la oferta.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Junio	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de las Obras: Se publicó en SECOP el 19 de abril de 2022, Prepliegos relacionados al proceso de licitación pública de obra para el proyecto Altos de Santa Elena Fase II. En el proceso, se recibieron observaciones y el 26 de mayo 2022 se dieron alcance a las mismas. <p>El 6 de julio 2022 mediante Audiencia, se adjudicará el proyecto Obra Altos de Santa Elena Fase II, al consorcio Plan Jarillón de Cali.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Licitatorio interventoría: Se publicaron Prepliegos del proceso de Licitación Interventoría el 20 de mayo 2022. En el proceso, se recibieron observaciones hasta el 27 de mayo 2022 y se dio respuesta el 8 de junio 2022 a las mismas. <p>Dificultades: El lote aportado por el Fondo Especial de Vivienda – FEV, permite el desarrollo de hasta 720 VIP y no 800 VIP como se tenía proyectado.</p>
(AEA12)_Soluciones de vivienda, terminadas	
Enero	<ul style="list-style-type: none"> Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. El 26 de enero de 2022, se suscribió la modificación contractual No 13 en el cual se prorrogan las fechas de entregas a las familias beneficiarias de 140 VIP para 01 y 02 de marzo 2022. El contratista avanza en la construcción y acabados de las 380 VIP y del urbanismo. <p>Dificultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Torres de Alamadina: está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal y el cambio de la estratificación del proyecto. Se encuentra en revisión en Oficina de Registro Público. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.
Febrero	<p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. El 25 de febrero se suscribió modificación contractual N°14 en el cual COMFANDI apalancara el proyecto habitacional por un valor de \$5.360 millones. El contratista avanzó en la construcción y acabados de las 380 VIP proyectados para ser entregados en los meses de abril y julio de 2022. El contratista hizo entrega del registro de la propiedad horizontal del Sector 1. Carta cheque: Firma de promesa de compraventa e inventario de 1 carta - cheque No. contrato 2017-CV-0016-21-CP-0062</p> <p>Está pendiente por parte del contratista del proyecto Torres de Alamadina la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4, y el cambio de la estratificación del proyecto. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización. Carta - cheque: rezagos por parte del Municipio de Cali en la postulación y trámite de las compensaciones económicas a las familias beneficiarias del proyecto.</p>
Marzo	<p>Terminaciones: Corresponde a 60 certificados de habitabilidad de las torres A,D,E del proyecto habitacional Torres de Alamadina proyectados para ser entregados en el mes de abril 2022.</p> <p>Entrega y finalización de Vivienda – Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. El 11 de marzo de 2022, la interventoría suscribió y entrego los certificados de existencia y habitabilidad de 60 VIP correspondientes a las Torres A-D-E del sector 4.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>- El contratista inicio con el proceso del permiso de ocupación de las VIP del Sector 4, con la radicación ante la Secretaría de Planeación de Jamundí de la solicitud del Permiso de las primeras 60 VIP correspondientes a las Torres A-D-E del sector 4</p> <p>- En el presente mes, el contratista inició en la Notaría 14 el proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 1, para posterior revisión de la Supervisión y entrega a las familias beneficiarias.</p> <p>- Están finalizando actividades de acabados de obra en las VIP pendientes del sector 4, programadas para ser entregadas a las familias beneficiarias el 28 y 29 de abril de 2022.</p> <p>En el proyecto Torres de Alamadina esta pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación del cambio de estratificación del proyecto habitacional. Por parte del contratista está pendiente la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>
Abril	<p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. El contratista inicio con las obras de mitigación de inundabilidad en el Zanjón Villegas.</p> <p>El contratista continuo con el proceso del permiso de ocupación de las VIP del Sector 4, con la radicación ante la Secretaría de Planeación de Jamundí de la solicitud del Permiso de las 80 VIP pendientes correspondientes a las Torres B-C-F-G del sector 4.</p> <p>El equipo técnico de la secretaria de Planeación de Jamundí realizó visita a las 7 torres que componen el sector 4. Está pendiente la entrega del informe de esta visita. En el presente mes se encuentran revisadas y aprobadas 160 escrituras públicas de las viviendas del Sector 1, y en proceso de firma por parte de Alianza Fiduciaria</p>
Mayo	<p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución en el sector 3. Continúan en ejecución la construcción de la Vía V-3A la cual está programada finalizar en julio de 2022 y con la construcción el Box Coulver sobre el zanjón Villegas.</p> <p>Las torres que componen el Sector 4 se encuentran listas para ser entregadas a las familias beneficiarias, programado para junio de 2022.</p> <p>La Secretaría de Planeación de Jamundí mediante resolución N° 39-49-298 del 23 de mayo de 2022, resuelve aplicar estrato socioeconómico UNO a las viviendas del proyecto Multifamiliar abierto Torres de Alamadina, por ser viviendas de interés prioritario.</p> <p>El 19-05-2022, funcionarios de la secretaria de Planeación de Jamundí realizaron una visita técnica con el objeto de identificar los avances en las actividades del urbanismo general, del sector 4 y del sector 3.</p> <p>La Supervisión y Comfandi continúan realizando el seguimiento y control semanal de las actividades de obra del sector 3.</p>
Junio	<p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución en el sector 3 y en el urbanismo general. Continúan en ejecución la construcción el urbanismo la cual está programada finalizar en julio de 2022, incluyendo la construcción el Box Coulver y adecuación del zanjón Villegas.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>El 30 de junio, se realizó reunión con la Secretaría de Planeación con la participación del Artekton Constructora, Pri-Colombia (interventoría), COMFANDI (Promotor de vivienda), ProPacífico (Supervisión) y Fondo Adaptación, en el cual se revisaron los avances de las actividades de obra y de las obligaciones urbanísticas. Generando nuevos compromisos de entrega de dichas actividades. La Supervisión y Comfandi continúan realizando el seguimiento y control semanal de las actividades de obra del sector 3 y urbanismo.</p>
(AEA13)_Soluciones de vivienda, entregadas	
Enero	<p>El proyecto Torres de Alamadina se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. El 26 de enero de 2022, se suscribió la modificación contractual No 13 en el cual se prorrogan las fechas de entregas a las familias beneficiarias de 140 VIP para 01 y 02 de marzo 2022. El contratista avanza en la construcción y acabados de las 380 VIP y del urbanismo.</p> <p>Está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal y el cambio de la estratificación del proyecto. Se encuentra en revisión en Oficina de Registro Público. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>
Febrero	<p>Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. El 25 de febrero se suscribió modificación contractual N°14 en el cual COMFANDI apalancara el proyecto habitacional por un valor de \$5.360 millones. El contratista avanzó en la construcción y acabados de las 380 VIP. El contratista hizo entrega del registro de la propiedad horizontal del Sector 1.</p> <p>Carta - cheque : Pago efectivo de una (1) carta - cheque conforme al Convenio Derivado 0016 -2017 firmado entre el FA y el Municipio de Santiago de Cali.</p> <p>Continua pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4, y el cambio de la estratificación del proyecto. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización. Carta - cheque: rezagos por parte del Municipio de Cali en la postulación y trámite de las compensaciones económicas a las familias beneficiarias del proyecto.</p>
Marzo	<p>Avance: corresponde a siete (7) carta cheques efectivamente pagadas a los beneficiarios del Plan Jarillón de Cali, conforme al Convenio 016-2017 firmado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torres de Alamadina: El proyecto se encuentra en ejecución los sectores 3 y 4. - El 11 de marzo de 2022, la interventoría suscribió y entrego los certificados de existencia y habitabilidad de 60 VIP correspondientes a las Torres A-D-E del sector 4. - El contratista inicio con el proceso del permiso de ocupación de las VIP del Sector 4, con la radicación ante la Secretaría de Planeación de Jamundí de la solicitud del Permiso de las primeras 60 VIP correspondientes a las Torres A-D-E del sector 4 - El contratista inició en la Notaría 14 el proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 1, para posterior revisión de la Supervisión y entrega a las familias beneficiarias. - Están finalizando actividades de acabados de obra en las VIP pendientes del sector 4. <p>Esta Pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación del cambio de estratificación del proyecto habitacional. Por parte del contratista está pendiente la</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2. Continua pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.
Abril	<p>Torres de Alamadina: En el presente mes se encuentran revisadas y aprobadas 160 escrituras públicas de las viviendas del Sector 1, y en proceso de firma por parte de Alianza Fiduciaria.</p> <p>El contratista está finalizando actividades de acabados de obra en las VIP pendientes del sector 4. Sin embargo, este incumplió las fechas de entregas a las familias beneficiarias programadas para abril de 2022, ya que de las 140 VIP que componen el sector, 80 VIP no cuentan con los certificados de habitabilidad y 140 VIP no tienen el Permiso de Ocupación expedido por la Secretaría de Planeación de Jamundí.</p> <p>Pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación del cambio de estratificación del proyecto habitacional. Por parte del contratista está pendiente la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2.</p> <p>Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p> <p>Carta cheque: Durante abril del 2022 se registra el pago efectivo de siete (7) compensaciones económicas a las familias beneficiarias del proyecto Plan Jarillón de Cali, conforme a lo establecido en el Convenio 0016-2017 firmado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali:</p> <p>Meta compensaciones 2022: 20 Total bonificaciones 2022: 15 % de avance: 75%</p>
Mayo	<p>Torres de Alamadina: Las torres que componen el Sector 4 se encuentran listas para ser entregadas a las familias beneficiarias, programado para junio de 2022.</p> <p>La Secretaría de Planeación de Jamundí mediante resolución N° 39-49-298 del 23 de mayo de 2022, resuelve aplicar estrato socioeconómico UNO a las viviendas del proyecto Multifamiliar abierto Torres de Alamadina, por ser viviendas de interés prioritario.</p> <p>Está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>
Junio	<p>Torres de Alamadina: El 06 de junio se entregaron a las familias beneficiarias 120 VIP del sector 4. Quedando pendiente de entrega 260 VIP. El proyecto se encuentra en ejecución en el sector 3 y en el urbanismo general.</p> <p>Está pendiente la expedición de acto administrativo de la entidad ambiental CVC sobre la solicitud de "Concesión de aguas para reúso de aguas residuales de la PTAR". Está pendiente por parte del contratista la entrega del registro de la propiedad horizontal de los sectores 2, 3 y 4 y el inicio del proceso de escrituración de las 160 VIP del Sector 2. Está pendiente por parte del Municipio de Jamundí, la aprobación de la licencia de urbanismo en modalidad de reurbanización.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Carta Cheque: En el mes de junio de registra el pago efectivo por parte del FA de 5 compensaciones económicas para adquisición de vivienda usada a las familias beneficiarias del Plan Jarillón de Cali, conforme a lo establecido en el convenio interadministrativo 0016-2017 firmado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali.</p> <p>Meta compensaciones 2022: 20 Total bonificaciones 2022: 20 % de avance: 100%</p>
(AEA14)_Km de Jarillón, contratado	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	Eball Guadales: Teniendo en cuenta que el contrato de obra e interventoría no se alcanzó a adjudicar en el 2021, se pierde la figura de vigencia futura excepcional que se estimaba utilizar para esta contratación por parte de EMCALI, siendo necesario entonces actualizar el presupuesto del proyecto a la presente vigencia, y tramitar una nueva vigencia futura ordinaria.
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	<p>En proceso de contratación por parte de EMCALI.</p> <p>Teniendo en cuenta que el proyecto no se alcanzó a adjudicar por parte de EMCALI en el 2021, es necesario que la entidad tramite nueva vigencia futura, debiéndose surtir un proceso similar al del proyecto Paso del Comercio, para lo cual se deben actualizar las condiciones del proyecto Eball incluido el presupuesto estimado por EMCALI. En el comité de seguimiento, EMCALI informo que en el mes de junio de 2022 el presupuesto se encuentra revisado, y están adelantando el trámite de ajuste de la ficha de inversión para posterior solicitud de vigencias futuras.</p>
(AEA15)_Km de Jarillón, terminado	
Enero	<ul style="list-style-type: none"> - Tramo IV: obra finalizada y en proceso de liquidación por parte de la CVC. Está pendiente la revisión de la documentación del acta de liquidación del contrato de obra por parte de la Dirección Técnica Ambiental. - Tramo V: el 10 de enero de 2022 se reanudaron las actividades de obra, se finalizó el reforzamiento en los sectores I, II y III. Se adelantan mesas técnicas con la comunidad para que se permita el inicio de las actividades de refuerzo estático en Las Palmas. - Tramo VI. Contrato de obra suspendido hasta el 31 de marzo de 2022, el contratista de obra radicó en la ANLA la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal. Actualmente se está a la espera que la ANLA realice la revisión y presente las observaciones a la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal. - Tramo VII: el 4 de enero de 2022 se suscribió el otrosí No.8 al contrato de obra mediante el cual se amplió el plazo contractual por 3 meses y 2 días hasta el 6 de junio de 2022, incluyendo la etapa de recibo y entrega. Continúan las labores de hincado de tablestaca y construcción de anclajes. Se mantiene como ruta crítica la

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>actividad "Instalación de anclajes", el contratista debe ejecutar estas actividades con 3 frentes de obra en simultaneo.</p> <p>Corresponde al avance de reforzamiento de Jarillón del Rio Cauca: Obras Tramo V: 0,2998 kilómetros reforzados Obras Tramo VII: 0,0185 kilómetros reforzados Total Avance año 2022: 0,3183 kilómetros</p>
Febrero	<p>Tramo V: Las actividades de reforzamiento en los sectores I, II y III ya finalizaron. El contratista continúa reforzamiento en el sector Las Palmas, siendo este el ultimo frente de obra. Se mantienen las mesas técnicas en el sector Las Palmas para mantener buenas relaciones con la comunidad, atender sus solicitudes y evitar así cualquier afectación en el desarrollo del proyecto.</p> <p>Tramo VI. Contrato de obra suspendido hasta el 31 de marzo de 2022, el contratista de obra radicó en la ANLA la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal.</p> <p>Tramo VII: El contratista terminó el hincado de tablestaca, por otro lado, continúan las labores de construcción de anclajes.</p> <p>Dificultades: Tramo V: La actividad de reforzamiento con columnas suelo cemento en el sector Las Palmas presenta bajos rendimientos dado que no se puede dar continuidad en la ejecución, debido a la necesidad de hacer traslados de acometidas eléctricas que interfieren con los equipos en la corona del Jarillón.</p> <p>Tramo VI: Actualmente la ANLA, solicitó al Contratista el complemento de la información cartográfica. El contratista solicitó esta información a Bienes e Inmuebles de la Alcaldía. Actualmente está a la espera de esta información para poder radicar en la ANLA.</p> <p>Tramo VII: Se mantiene como ruta critica la actividad "Instalación de anclajes", el contratista debe mantener la ejecución de esta actividad con 3 frentes de obra en simultaneo para terminar en el periodo contractual.</p>
Marzo	<p>Avance: Corresponde a la finalización del reforzamiento del Jarillón del tramo V, equivalente a 317 metros - 0.712 km.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tramo V: Las actividades de reforzamiento en todos los frentes de tramo V finalizaron. En este sentido, el contrato de obra de tramo V terminó el pasado 27 de marzo de 2022, no obstante, quedaron unos pendientes menores tales como: foro final, reconstrucción de cancha y juegos y empradización de Las Palmas. - Tramo VI. Contrato de obra suspendido hasta el 02 de mayo de 2022, el contratista de obra radicó en la ANLA la información complementaria a principios del mes de marzo, la ANLA notificó al Contratista del auto de inicio del proceso el 24 de marzo de 2022 y el 31 de marzo de 2022 la ANLA realizó visita de verificación del inventario forestal. A partir de la notificación del Auto de Inicio del proceso para la obtención del permiso de aprovechamiento forestal, la ANLA tiene 30 días hábiles para adelantar la revisión técnica y jurídica del permiso. - Tramo VII: El contrato de obra se encuentra suspendido, por 30 días desde el 18 de marzo de 2022 hasta el 18 de abril de 2022. El contrato se encuentra suspendido por las fuertes lluvias que se presentan en la zona de la obra, afectando el desarrollo de la misma, toda vez que se han presentado inundaciones en la zona de construcción de anclajes, la cual está localizada al lado del canal interceptor sur.
Abril	<p>-Tramo V: El contrato de obra de tramo V terminó el pasado 27 de marzo de 2022, no obstante, quedaron unos pendientes por situaciones ajenas a la voluntad y capacidad del contratista, tales como: aumento del nivel del río cauca lo que dificulta la instalación de válvulas para el control de las aguas lluvias, retrasos en la llegada de insumos para finalización de la cancha y juegos infantiles. Para la finalización de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>estos pendientes, la interventoría, mediante ajuste al acta de terminación, aprobó una ampliación del plazo hasta el 20 de mayo de 2022.</p> <p>-Tramo VI. Se suscribió ampliación 1 a la suspensión del contrato de obra hasta el 01 de junio de 2022, el 31 de marzo de 2022 la ANLA realizó visita de verificación del inventario forestal. En el proceso de revisión interna en ANLA, ya se surtió la revisión Técnica, estando en revisión jurídica en este momento.</p> <p>A partir de la notificación del Auto de Inicio del proceso para la obtención del permiso de aprovechamiento forestal, la ANLA tiene 30 días hábiles para adelantar la revisión técnica y jurídica del permiso, por lo tanto. para mantener la dinámica de la gestión, es importante el trabajo conjunto entre el contratista de obra, el FA y la Supervisión de tal forma que facilite la resolución de observaciones.</p> <p>-Tramo VII: Se suscribió suspensión No.6 del contrato de obra por 30 días desde el 22 de abril de 2022 hasta el 23 de mayo de 2022; lo anterior, por las fuertes lluvias que se presentan en la zona de la obra, afectando el desarrollo de la misma, toda vez que se han presentado inundaciones en la zona de construcción de anclajes, la cual está localizada al lado del canal interceptor sur.</p>
Mayo	<p>Tramo V: El contrato de obra de tramo V terminó el pasado 27 de marzo de 2022, durante el mes de mayo se cerraron los pendientes de obra. El 20 de mayo de 2022 se firmó acta de entrega y recibo entre contratista e interventoría.</p> <p>Tramo VI. La ANLA emitió el permiso de aprovechamiento forestal, Los contratos de obra e interventoría se reinician el 02 de junio de 2022. Una vez se reinicien los contratos. El contratista de obra y la interventoría de obra deben gestionar la aprobación de los pendientes para la suscripción de la etapa de Construcción (validación diseños CVC, aprobación obras preliminares de obra, entre otros)</p> <p>Tramo VII: Se suscribió suspensión No.7 del contrato de obra por 20 días desde el 27 de mayo de 2022 hasta el 15 de junio de 2022. El contrato se encuentra suspendido por las fuertes lluvias que se presentan en la zona de la obra, afectando el desarrollo de la misma, la saturación del terreno afecta los accesos a la obra y la ejecución de las actividades constructivas con maquinaria pesada, por lo que no se pueden ejecutar actividades como retiro de material, rellenos, anclajes, etc.</p>
Junio	<p>Tramo V: El contrato de obra de tramo V terminó el pasado 27 de marzo de 2022, durante el mes de junio continuó el proceso de revisión de la unidad documental para la suscripción del acta de liquidación de obra.</p> <p>Tramo VI. Reiniciaron los contratos de obra e interventoría el 29 de junio de 2022 en la etapa de Construcción, sobre la necesidad del permiso de ocupación de Cauce, la CVC y el DAGMA informaron que no se requiere para la obra, La CVC emitió comunicado aprobando los diseños. El contratista de obra y la interventoría de obra deben gestionar la aprobación y suscripción de la modificación contractual para la inclusión de items nuevos que resultaron de la optimización de los diseños.</p> <p>Tramo VII: Se suscribió ampliación No.1 de la suspensión No.7 del contrato de obra por 15 días desde el 16 de junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2022. El contrato se encuentra suspendido por las fuertes lluvias que se presentan en la zona de la obra, afectando el desarrollo de la misma, la saturación del terreno afecta los accesos a la obra y la ejecución de las actividades constructivas con maquinaria pesada, por lo que no se pueden ejecutar actividades como retiro de material, rellenos, anclajes, etc.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEA16)_Km de Jarillón, entregado	
Enero	<p>Se encuentra en proceso de elaboración y radicación por parte de CVC las actas de entrega al Municipio de los tramos Tramo I, subtramos, Calimio Decepaz, Tramo III. Se encuentra en proceso de liquidación los proyectos Tramo IV y lote 6A, una vez estos proyectos se encuentren liquidados, se podrá surtir por parte de CVC el mismo proceso que con los tramos mencionados anteriormente.</p> <p>A considerar, que no se tiene certeza acerca de los tiempos que se pueda tomar el Municipio para la revisión y aprobación de la documentación necesaria para el recibo de las obras de reforzamiento que ya se encuentren terminadas y listas para su entrega, lo cual puede extender el plazo que se ha estimado para el recibo por parte del Municipio.</p>
Febrero	<p>Las actas de entrega de Tramo I, Tramo III, Calimio Desepaz, y subtramos fueron revisadas por la unidad de Bienes y Servicios y por la oficina de Plan Jarillón del Distrito, CVC se encuentra realizando ajustes para posterior radicación en el Departamento de Gestión Jurídica Pública, quienes avalarán las actas de entrega para firma del alcalde. Para el caso de Lote 6A, el día 16-02-2022 se suscribió acta de liquidación del contrato de obra. CVC se encuentra estructurando la minuta de acta de entrega para remitirla al Distrito con los documentos necesarios para el proceso de entrega de esta obra. En el caso de tramo IV, CVC adelanta el proceso de liquidación del contrato de obra e interventoría.</p> <p>Se mantiene la dificultad asociada a los tiempos que se pueda tomar el Municipio para la revisión y aprobación de la documentación necesaria para el recibo de las obras.</p>
Marzo	<p>Las actas de entrega de Tramo I, Tramo III, Calimio Desepaz, y subtramos fueron revisadas por la unidad de Bienes y Servicios y por la oficina de Plan Jarillón del Distrito, CVC radicó en el Departamento de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía para revisión, habiéndose efectuado observaciones por este organismo, las cuales actualmente se encuentran siendo atendidas por la CVC para una nueva radicación y aprobación.</p> <p>Para el caso de Lote 6A, el día 16-02-2022 se suscribió acta de liquidación del contrato de obra. CVC se encuentra estructurando la minuta de acta de entrega para remitirla al Distrito con los documentos necesarios para el proceso de entrega de esta obra.</p> <p>En el caso de tramo IV, el acta de liquidación fue suscrita el día 18 de marzo de 2022.</p> <p>Se mantiene la dificultad asociada a los tiempos que se pueda tomar el Municipio para la revisión y aprobación de la documentación necesaria para el recibo de las obras.</p>
Abril	<p>En ceremonia de entrega llevada a cabo entre Alcaldía, Fondo Adaptación, CVC, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Municipio, y Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, el día 06 de abril de 2022, se hizo el recibo por parte de la Alcaldía de las siguientes obras de reforzamiento del Jarillón del Río cauca:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tramo I (6,610 km) -Tramo III (2,465 km) -Tramo CaliMio Decepaz (0,080 km)

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>-Tramo Subtramos (2,0 km) -Lote 6A (0,23 Km)</p> <p>Para un total entregado de 11,39 Kilómetros</p> <p>En el caso de tramo IV, el acta de liquidación fue suscrita el día 18 de marzo de 2022. Se estima finalizar el proceso de entrega por parte de CVC en el mes de julio de 2022.</p> <p>En el caso de tramo V, el contrato de obra terminó el 27 de marzo de 2022. Actualmente se surte el proceso de liquidación de obra y posteriormente se adelantará el proceso de entrega y recibo al municipio programado para diciembre de 2022.</p> <p>De acuerdo con los procesos surtidos con la CVC y el Municipio, actualmente no se reportan dificultades para la elaboración y revisión de actas de recibo.</p>
Mayo	<p>Obras tramo IV, el acta de liquidación fue suscrita el día 18 de marzo de 2022. Se estima finalizar el proceso de entrega por parte de CVC en el mes de julio de 2022.</p> <p>Obras tramo V, el contrato de obra terminó el 27 de marzo de 2022. Actualmente se surte el proceso de liquidación de obra y posteriormente se adelantará el proceso de entrega y recibo al municipio programado para diciembre de 2022.</p>
Junio	<p>De acuerdo con los procesos surtidos con la CVC y el Municipio, hasta el momento se han presentado algunas inquietudes por parte de PJC Municipio sobre el cierre de tramo IV, por lo anterior desde la Supervisión de ProPacífico se solicitó una reunión entre las entidades para aclarar dudas y definir línea de trabajo que permita la entrega de este tramo para julio de 2022.</p>
(AEA17)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	
Enero	<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> _ El contrato de obra tuvo su reinicio automático el día 19/01/2022 con fecha de terminación del 08/02/2022. El contratista de obra solicitó una nueva suspensión por un periodo de 30 días, la cual se encuentra en estudio por parte del Fondo Adaptación. _ Se adelanta viabilidad de hacer entrega técnica y ante EMCALI de las obras PTAP las cuales se encuentran ejecutadas en un 100%. - El contratista de obra se encuentra adelantando ante las autoridades ambientales (DAGMA, CVC) el permiso de cierre de la PTAR Cañaveralejo, como labor previa para la instalación de las válvulas pico de pato. <p>Dificultades</p> <ul style="list-style-type: none"> _ El periodo restante del contrato de obra es reducido, lo cual implica que el contratista deba establecer procesos en paralelo para lograr culminar las labores pendientes de ejecución en la PTAR referidas al reforzamiento del canal de descarga y la instalación de las válvulas pico de pato. _ La gestión de aprobación del cierre de la PTAR, puede tomarse un tiempo considerable alterando el cronograma de ejecución del contrato de obra (Instalación, pruebas y recibo de válvulas pico de pato). Adicional a lo anterior, las condiciones de caudales para poder adelantar la maniobra de instalación son muy específicos y de no darse los mismos, puede causar alteraciones en el desarrollo de los trabajos.
Febrero	<p>Obra Ptar-Ptap: El contrato de obra se suspendió a partir del 02 de febrero de 2022 con fecha de reinicio del 19 de abril de 2022, lo anterior motivado por los altos niveles</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>presentados en el canal de descarga PTAR. Actualmente, el contratista de obra se encuentra adelantando ante las autoridades ambientales (DAGMA, CVC) el permiso de cierre de la PTAR Cañaveralejo, como labor previa para la instalación de las válvulas pico de pato.</p>
Marzo	<p>Actividades _ El contrato de obra se suspendió a partir del 02 de febrero de 2022 con fecha de reinicio del 19 de abril de 2022, lo anterior motivado por los altos niveles del Río Cauca presentados en el canal de descarga PTAR. Actualmente, el contratista de obra se encuentra adelantando ante las autoridades ambientales (DAGMA, CVC) el permiso de cierre de la PTAR Cañaveralejo, como labor previa para la instalación de las válvulas pico de pato, para lo cual ha venido atendiendo las observaciones efectuadas por las autoridades ambientales, teniéndose la última radicación del contratista al DAGMA el día 8 de marzo de 2022.</p> <p>Dificultades _ El periodo restante del contrato de obra es reducido, lo cual implica que el contratista deba establecer procesos en paralelo para lograr culminar las labores pendientes de ejecución en la PTAR referidas al reforzamiento del canal de descarga y la instalación de las válvulas pico de pato. De igual manera, el contratista debe definir y gestionar la estrategia que le permita cumplir con la totalidad de las obligaciones del contrato, solicitando si es del caso plazo adicional. _ La gestión de aprobación del cierre de la PTAR, puede tomarse un tiempo considerable alterando el cronograma de ejecución del contrato de obra (Instalación, pruebas y recibo de válvulas pico de pato). Adicional a lo anterior, las condiciones de caudales para poder adelantar la maniobra de instalación son muy específicos y de no darse los mismos, puede causar alteraciones en el desarrollo de los trabajos.</p>
Abril	<p>El contrato de obra se suspendió a partir del 02 de febrero de 2022 con fecha de reinicio actualizada del 03 de junio de 2022, de acuerdo a lo indicado en el acta de ampliación No 2 a la suspensión No 13, lo anterior motivado por los altos niveles del Río Cauca presentados en el canal de descarga PTAR.</p> <p>El 04 de abril 2022 el DAGMA emitió aprobación para el cierre de la PTAR Cañaveralejo, como labor previa para la instalación de las válvulas pico de pato.</p> <p>El periodo restante del contrato de obra es reducido, lo cual implica que el contratista deba establecer procesos en paralelo para lograr culminar las labores pendientes de ejecución en la PTAR referidas al reforzamiento del canal de descarga y la instalación de las válvulas pico de pato. De igual manera, el contratista debe definir y gestionar la estrategia que le permita cumplir con la totalidad de las obligaciones del contrato.</p> <p>Con la aprobación emitida por la entidad ambiental, el contratista debe valorar las actividades a ejecutar durante el cierre de la PTAR para posteriormente, si es el caso, gestionar recursos adicionales por parte de EMCALI.</p>
Mayo	<p>El contrato de obra se suspendió a partir del 02 de febrero de 2022 con fecha de reinicio actualizada del 19 de julio de 2022, de acuerdo a lo indicado en el acta de ampliación No 3 a la suspensión No 13, lo anterior motivado por los altos niveles del Río Cauca presentados en el canal de descarga PTAR.</p>
Junio	<p>El contrato de obra se suspendió a partir del 02 de febrero de 2022 con fecha de reinicio actualizada del 19 de julio de 2022, de acuerdo a lo indicado en el acta de ampliación No 3 a la suspensión No 13, lo anterior motivado por los altos niveles del Río Cauca presentados en el canal de descarga PTAR.</p>


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	Con la aprobación emitida por la entidad ambiental, el contratista debe valorar las actividades a ejecutar (APU's) correspondientes al monitoreo ambiental durante el cierre de la PTAR como sustento para posteriormente, si es del caso, EMCALI pueda adelantar la gestión de consecución de recursos adicionales.
(AEA18)_Obras infraestructura estratégica, entregadas (PTAR, PTAP)	
Enero	<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> _ El contrato de obra tuvo su reinicio automático el día 19/01/2022 con fecha de terminación del 08/02/2022. El contratista de obra solicitó una nueva suspensión por un periodo de 30 días, la cual se encuentra en estudio por parte del Fondo Adaptación. _ Se adelanta viabilidad de hacer entrega técnica y ante EMCALI de las obras PTAP las cuales se encuentran ejecutadas en un 100%. - El contratista de obra se encuentra adelantando ante las autoridades ambientales (DAGMA, CVC) el permiso de cierre de la PTAR Cañaveralejo, como labor previa para la instalación de las válvulas pico de pato. <p>Dificultades</p> <ul style="list-style-type: none"> _ El periodo restante del contrato de obra es reducido, lo cual implica que el contratista deba establecer procesos en paralelo para lograr culminar las labores pendientes de ejecución en la PTAR referidas al reforzamiento del canal de descarga y la instalación de las válvulas pico de pato. _ La gestión de aprobación del cierre de la PTAR, puede tomarse un tiempo considerable alterando el cronograma de ejecución del contrato de obra (Instalación, pruebas y recibo de válvulas pico de pato). Adicional a lo anterior, las condiciones de caudales para poder adelantar la maniobra de instalación son muy específicos y de no darse los mismos, puede causar alteraciones en el desarrollo de los trabajos. <p>ENTREGA OBRAS PTAR-PTAP A EMCALI _ ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI. Dificultad frente el cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras que tiene fecha de terminación actualizada de su contrato para el día 8 de febrero de 2022.
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	<p>Entrega Ptar-Ptap: EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI. Ante la consulta adelantada ante EMCALI acerca de la viabilidad de hacer entrega técnica parcial de las obras de la PTAP las cuales se encuentran ejecutadas en un 100%, esta entidad manifestó que no es viable hacer recibos parciales de obras, y que adicionalmente se requiere el acta de liquidación del contrato de obra.</p> <p>Dificultades: Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras que tiene fecha de terminación actualizada de su contrato para el día 23 de abril 2022.</p>
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Junio	<p>EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI, estimada para diciembre de 2022.</p> <p>Se identifica como dificultad que el cierre técnico de las actividades a cargo del contratista está definido con fecha de terminación para el día 23 de julio de 2022. Una vez se reactive el contrato el 19 de julio de 2022, el contrato tendría solo una duración restante de 5 días.</p>

GRAMALOTE

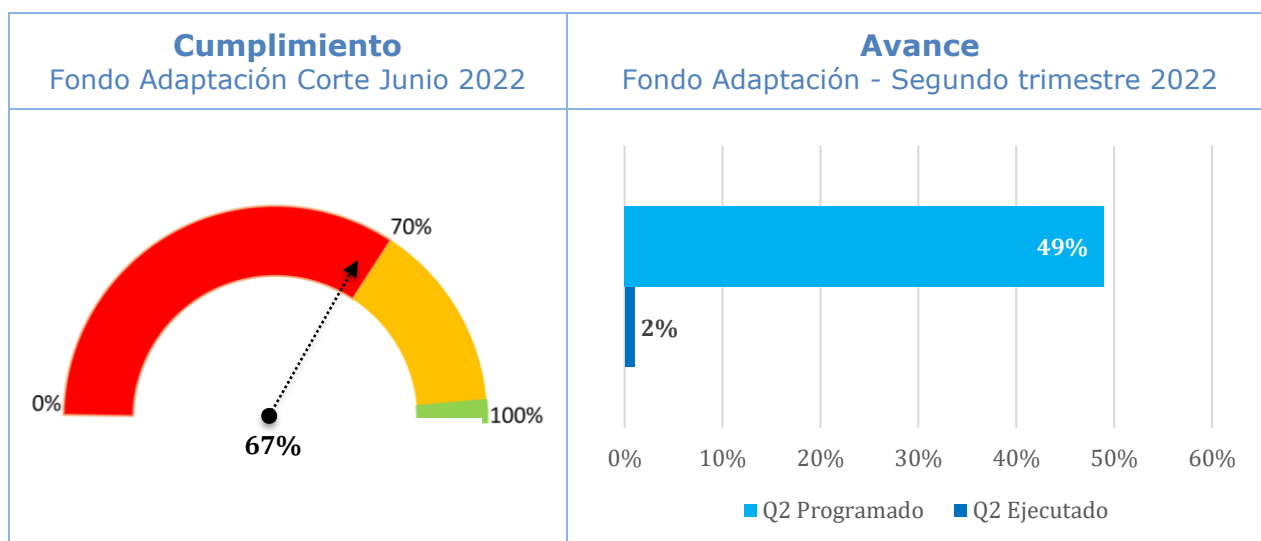

Portafolio/Programa/Proyecto: **GRAMALOTE**

Gerente de Meta: Asesor Macroproyecto Gramalote

Objetivo estratégico 2018-2022 #1

Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático

Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades /hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación trimestral				Avance meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA20_Terminar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento	(AEA20)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos terminados	1	1				1
Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades /hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación trimestral				Avance meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

AEA21_Entregar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento	(AEA21)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos entregados	2	2				2
AEA22_Contratar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA22)_Viviendas municipio gramalote, contratadas	128		128			0
AEA23_Terminar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA23)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	72				72	N.A.
AEA24_Entregar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA24)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	67				67	N.A.

Mes	Avance Cualitativo
(AEA20)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos terminados	
Enero	El pasado 31 de enero de 2022, se terminó el equipamiento Casa de la Cultura, adicionalmente, el 19 de marzo se realizó la socialización de los manuales de mantenimiento y el plan de sostenibilidad a los funcionarios de la alcaldía de Gramalote, así como el 23 del mismo mes se realizó el foro final del equipamiento a la comunidad gramalotera. Actualmente, el estado de la Casa de la Cultura se encuentra a la espera de la firma del acta de entrega por parte de la entidad territorial.
Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	La Casa del campesino se terminó el pasado 14 de diciembre de 2021, así mismo, el 11 de marzo se realizó el foro final del equipamiento y se encuentra a la espera de la firma del acta de entrega por parte de la entidad territorial.
Abril	El pasado 31 de enero de 2022, se terminó el equipamiento Casa de la Cultura, adicionalmente, el 19 de marzo se realizó la socialización de los manuales de mantenimiento y el plan de sostenibilidad a los funcionarios de la alcaldía de Gramalote. El acta de entrega a satisfacción de la Casa de la Cultura se firmó el 29 de abril de 2022
Mayo	Meta de la vigencia cumplida
Junio	Meta de la vigencia cumplida
(AEA21)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos entregados	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	Si bien, los dos equipamientos (C. Cultura y C. Campesino) se terminaron en diciembre de 2021 y enero de 2022, la entrega de dichos equipamientos se encuentra a la espera de la firma del alcalde como representante de la entidad territorial, en línea con este avance se ha gestionado la firma del alcalde en varios escenarios de seguimiento, sin embargo, no ha sido posible por agenda del mandatario municipal.


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Abril	El pasado 29 de abril la Entidad Territorial de Gramalote en cabeza de su alcalde, firmó el acta de entrega a satisfacción de los equipamientos Casa de la Cultura y Casa del Campesino cumpliendo así la entrega de 2 equipamientos al municipio.
Mayo	Meta de la vigencia cumplida
Junio	Meta de la vigencia cumplida
(AEA22)_Viviendas municipio gramalote, contratadas	
Enero	No aplica para el periodo de reporte
Febrero	No aplica para el periodo de reporte
Marzo	Se recibieron observaciones en el marco del proceso No. FA-LP-I-S-001-202 abierto en el mes de febrero y se modificó el cronograma de publicación de respuestas y fechas estimadas de contratación de las 128 viviendas. Así mismo, el PNUD presentó propuesta económica el pasado 15 de marzo, la cual se encuentra en análisis por parte del equipo del macroproyecto. El proceso fue retirado el 23 de marzo con el fin de ajustar el presupuesto del proceso y a la espera del análisis aplicado a la propuesta del PNUD.
Abril	El 5 de abril en el Consejo Directivo del Fondo Adaptación se aprobó la adición de recursos para continuar con la contratación de las 128 viviendas, en este sentido, se actualizaron los estudios previos tanto de la obra como de la interventoría. Paralelo a esta actividad se realizaron mesas de trabajo con el PNUD con el fin de definir el objetivo del acompañamiento que brindará esta entidad para lograr la terminación de las 128 viviendas en el municipio de Gramalote.
Mayo	El 27 de mayo se tomó la decisión de continuar a través de un convenio interadministrativo con el PNUD, la construcción terminación y entrega de las viviendas faltantes del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, por lo que se continúa con las mesas de trabajo con el PNUD, con el fin de definir las condiciones técnicas del convenio, el cual se estima ser suscrito en junio de 2022.
Junio	Durante el mes de junio de 2022 se aprobaron los recursos de la adición para la construcción de las 128 viviendas faltantes en el municipio de Gramalote, adicionalmente, el macroproyecto continúa realizando la actualización de los documentos económicos y estudios previos para el proceso de obra y de interventoría, ajustado de acuerdo a las nuevas condiciones del mercado.
(AEA23)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	
Enero	No aplica para el periodo de reporte
Febrero	No aplica para el periodo de reporte
Marzo	Durante el primer trimestre del presente año se hizo apertura de un proceso de licitación pública el 22 de febrero de 2022 el cual debió cerrarse el 23 de marzo, en la etapa de prepliegos por motivos de resolución de observaciones que conllevó a la elaboración de un nuevo estudio de mercado que arrojó como resultado la actualización del presupuesto estimado. A la fecha nos encontramos en aprobación y trámite de los recursos adicionales requeridos para el macroproyecto.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Abril	No aplica para el periodo de reporte
Mayo	No aplica para el periodo de reporte
Junio	No aplica para el periodo de reporte
(AEA24)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	
Enero	No aplica para el periodo de reporte
Febrero	No aplica para el periodo de reporte
Marzo	Durante el primer trimestre del presente año se hizo apertura de un proceso de licitación pública el 22 de febrero de 2022 el cual debió cerrarse el 23 de marzo, en la etapa de prepliegos por motivos de resolución de observaciones que conllevó a la elaboración de un nuevo estudio de mercado que arrojó como resultado la actualización del presupuesto estimado. A la fecha nos encontramos en aprobación y trámite de los recursos adicionales requeridos para el macroproyecto.
Abril	No aplica para el periodo de reporte
Mayo	No aplica para el periodo de reporte
Junio	No aplica para el periodo de reporte

RÍO FONCE



Portafolio/Programa/Proyecto:
Gerente de Meta:

RÍO FONCE

Asesor Proyecto Río Fonce (+ Sector Medio Ambiente)

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Objetivo estratégico 2018-2022 #1		IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO					AVANCE META
Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades /hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA19_ Entregar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES PEI)	(AEA19)_Obras de estabilización entregadas (INDICADOR PEI) [2 pte +1 obra estab]	3				3	N.A.


Mes	Avance Cualitativo
(AEA19)_Obras de estabilización entregadas (INDICADOR PEI) [2 pte +1 obra estab]	
Enero	No aplica para el periodo de reporte
Febrero	No aplica para el periodo de reporte
Marzo	<p>PINCHOTE: Los principales rezagos en Pinchote corresponden a la falta de la instalación de biomanto de fique para la finalización con la hidrosiembra, Limpieza del canal del vertedero, planos récord, manual de mantenimiento y buen uso de la obra y el acta de entrega de la obra. Avance: 99.9%+</p> <p>ONZAGA: Falta Colocar y compactar material rampa derecha del puente, segunda mano de pintura en barandas, resanar el hormigoneo que se encuentra bajo la viga, demolición de los soportes de formaleta, repello de gaviones, prueba de carga, planos récord, manual de mantenimiento y buen uso de la obra y el acta de entrega de la obra. Avance: 95%</p> <p>SAN JOAQUIN: Falta resanar el hormigoneo que se encuentra bajo la viga, cortar los alambres de amarre de formaleta de las vigas, prueba de carga, planos récord, manual de mantenimiento y buen uso de la obra y el acta de entrega de la obra. Avance: 99%</p> <p>El 03, 09 y 15 de marzo del 2022 el Fondo convocó y sostuvo reuniones con los directivos del Departamento de Santander, con el fin de que dicha entidad implemente las acciones necesarias para lograr terminar y entregar las obras. El 15 de marzo de 2022, el Departamento, remitió copia el informe de incumplimiento del contrato nro. 3553 de 2015 elaborado por de la interventoría, indicando en reunión que el informe debía ser complementado. Se espera que el Departamento avance en este proceso.</p>
Abril	Mediante oficio radicado nro. 20220067825 (R-2022-004445 del 8/4/2022) el Departamento de Santander presentó solicitud de ampliación del plazo del convenio. La solicitud no presenta las acciones a efectuar en el plazo adicional solicitado, incluyendo el plan de trabajo que pretende cumplir para lograr la terminación de las obras; por la anterior será requerido el Departamento por parte del Fondo.
Mayo	El día 26 de mayo se llevó a cabo la audiencia de declaratoria de incumplimiento realizada de manera virtual, con la participación de la Gobernación de Santander, Contratista de obra, Interventoría del contrato de obra y el Fondo Adaptación, donde según informe presentado por el contratista las 3 obras se encuentran terminadas. Se realizaron observaciones por parte de la Interventoría frente a la obra de la

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	Represa Las Lajas las cuales serán verificadas en el marco de las visitas programadas para la entrega a la Gobernación de Santander e Interventoría de los 3 frentes de obra los días 6 y 7 de junio.
Junio	<p>Se reprogramó audiencia de posible incumplimiento para el día 30 de junio de 2022 la cual se llevó a cabo de manera virtual por parte de la Gobernación de Santander con la participación del contratista de obra Consorcio Río Fonce, Interventoría del contrato de obra, aseguradora y el Fondo Adaptación, donde según informe presentado por el supervisor de la gobernación las 3 obras se encuentran con faltantes, incumpliendo los compromisos de entrega de las obras para los días 6 y 7 de junio como se había acordado en la audiencia del 26 de mayo de 2022.</p> <p>Se cito para dar continuación a la audiencia pública de posible incumplimiento y dar lectura al auto administrativo de la misma para el día 14 de julio de 2022.</p>

Seguimiento al Plan de Acción por Sector

MEDIO AMBIENTE

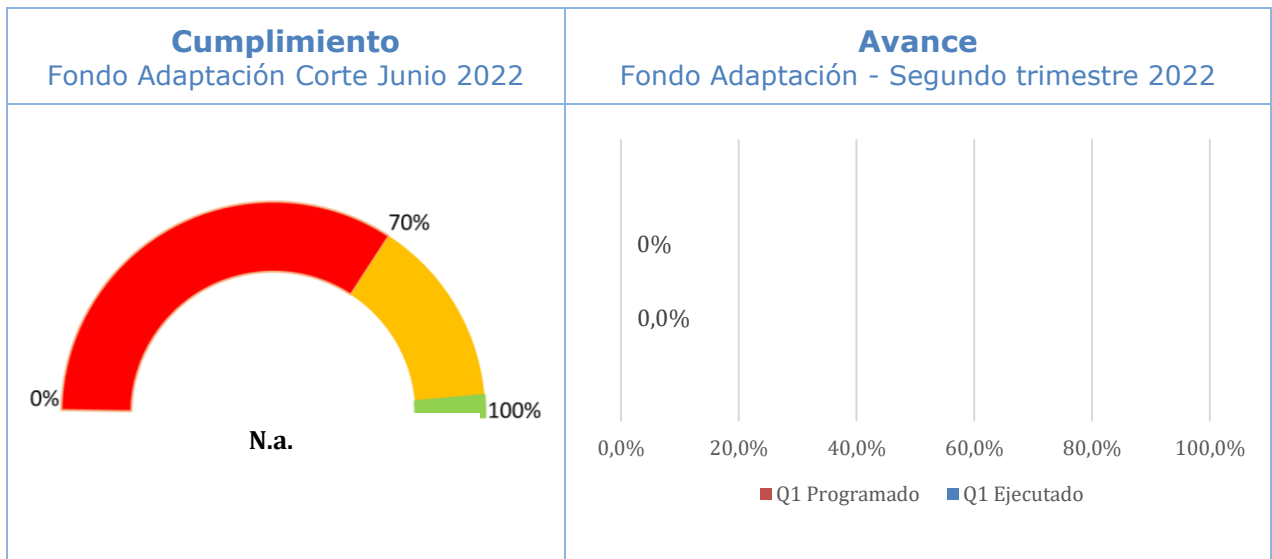

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022



Portafolio/Programa/Proyecto: **MEDIO AMBIENTE**
Gerente de Meta: Asesor Sector Medio Ambiente

Objetivo Estratégico 2018-2022 #3

Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA25_Entregar integración tecnológica	(AEA25)_Integración Tecnológica, terminada, entregada	1	-	-	1	-	N.A.


Mes	Avance Cualitativo
(AEA25)_Integración Tecnológica, terminada, entregada	
Enero	<p>Solución HPC: El proyecto se encuentra finalizado y aguarda firma de acta de cierre. Como resultado, se logró generar salidas de modelos meteorológicos en resoluciones sin precedentes en Colombia. En relación con la infraestructura HPC, BIOS accedió a mantener los accesos al IDEAM hasta el mes de marzo de 2022, siguiendo el mismo periodo contemplado en la prórroga realizada para el componente de Fábrica de Software. Es de resaltar que en la última semana de enero de 2022 se logró un incremento en la velocidad de descarga de datos por la red Renata pasando de 40 megabits por segundo a 250 megabits por segundo. Está pendiente realizar pruebas de interoperabilidad con el equipo del IDEAM.</p> <p>Fábrica de software: El equipo BIOS se encuentra avanzando en el desarrollo y mapeos de fuentes de datos, en reuniones con las diversas áreas del IDEAM, se encuentran en proceso de aprobación de los documentos de levantamiento de requisitos por parte del IDEAM. Los contratistas asociados al proyecto se vincularon nuevamente al IDEAM, por lo que se estima avanzar con las aprobaciones pendientes. Además, en cuanto a la infraestructura para los ambientes de pruebas, está ya se encuentra finalizada.</p> <p>Compra de equipos: El 27 de enero de 2022 se llevó a cabo una reunión entre el proveedor ADSUM y el IDEAM para validar los archivos del levantamiento de la información para la instalación y puesta en marcha de la solución. En este espacio ADSUM informó que los equipos adquiridos se encuentran en el proceso de envío a Colombia y nacionalización, para la posterior entrega al IDEAM. Se programó un espacio el 2 de febrero de 2022 en las instalaciones físicas del IDEAM, para conocer los espacios requeridos, conectividad, energía, enfriamiento en el data center para los equipos que se adquirieron mediante la negociación. Asimismo, se está gestionando la exclusión de IVA ante el ANLA, para una posible reinversión de recursos en equipos. El IDEAM avanzó internamente evaluando una posible adición de recursos al contrato de compra de equipos, debido a que se cuenta con un remanente proveniente de ahorros en el proceso adelantado con Bolsa Mercantil.</p> <p>Estado general: A 25 de enero, El proyecto presenta un avance planeado del 89% Vs 70% de ejecución. Esta diferencia porcentual está enmarcada en las aprobaciones de las historias de usuario, diseños y mockups, requeridas para afinar los entregables intermedios del alcance del proyecto. Se estima, nivelar el proyecto en los dos</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	próximos meses, paralelizando actividades y realizando iteraciones cortas para la aprobación de productos.
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	<p>Solución HPC: Componente finalizado, recibido y en proceso de validación de calidad. Fábrica de software: Componente finalizado, recibido y en proceso de validación de calidad. Compra de equipos: El IDEAM informa que recibió los equipos y está en proceso de validación de calidad.</p> <p>Estado general: A corte del 25 de marzo, El IDEAM reporta el 93% de avance vs. 99% proyectado, e indica que la diferencia del 8% se debe a que IDEAM se encuentra en validación de calidad de los entregables en sus hitos de: desarrollo, pruebas, documentación, despliegue y transferencia de conocimiento. El IDEAM espera que el contratista subsane las recomendaciones impartidas durante en la fase de liquidación.</p>
Abril	<p>La Herramienta WEB, en el mes de abril de 2022, conforme lo reportado por el IDEAM, tuvo el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solución HPC , mediante la cual se logró pasar de tener 1 nodo a tener 11 nodos, teniendo un aumento de 10000 % de la capacidad de procesamiento y almacenamiento de información generada por IDEAM (Oficina de Pronósticos) por diferentes fuentes de información (RADAR, Estaciones hidrometereológicas, entre otros), en tiempo real, de manera simultánea y bajo la velocidad necesaria para el funcionamiento de la herramienta WEB. Componente finalizado. • Fábrica de software: El equipo BIOS bajo la supervisión del IDEAM, avanzó en el desarrollo de módulos correspondientes a la visualización de datos y normalización de variables de la Herramienta Web. Componente finalizado, recibido y en proceso de estabilización. • Compra de equipos el IDEAM informa que recibió los equipos y está finalizando el proceso de validación de calidad. <p>Por todo la anterior, en mesa de seguimiento realizada el 22 de abril de 2022, El IDEAM reportó el 100% de avance vs. 100% proyectado.</p>
Mayo	<p>En el mes de mayo de 2022, en el marco del proyecto de la Herramienta WEB se avanzó en la estabilización y compatibilización de licencias en los equipos adquiridos en el marco del Contrato M0435 de 2021. Así mismo, se realizó el recibo a satisfacción por parte del IDEAM e ingreso a almacén de los ítems adquiridos bajo la ejecución del Contrato. Se tiene programada visita por parte del Fondo al IDEAM para la validación y verificación de los equipos y software entregados.</p>
Junio	<p>El día 3 de junio de 2022 se realizó mesa de seguimiento de la Herramienta WEB, con la participación del IDEAM y del Fondo Adaptación, donde el IDEAM realizó presentación sobre el convenio y el alcance para la consolidación de la herramienta web, así mismo se realizó prueba de funcionamiento de la Herramienta y visualización de las mejoras realizadas correspondientes al procesamiento de pronósticos, cargue de los POMCA con relación a la gestión del riesgo, cargue de capas en cuanto a clima, sensores, alertas, pronósticos, entre otros.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

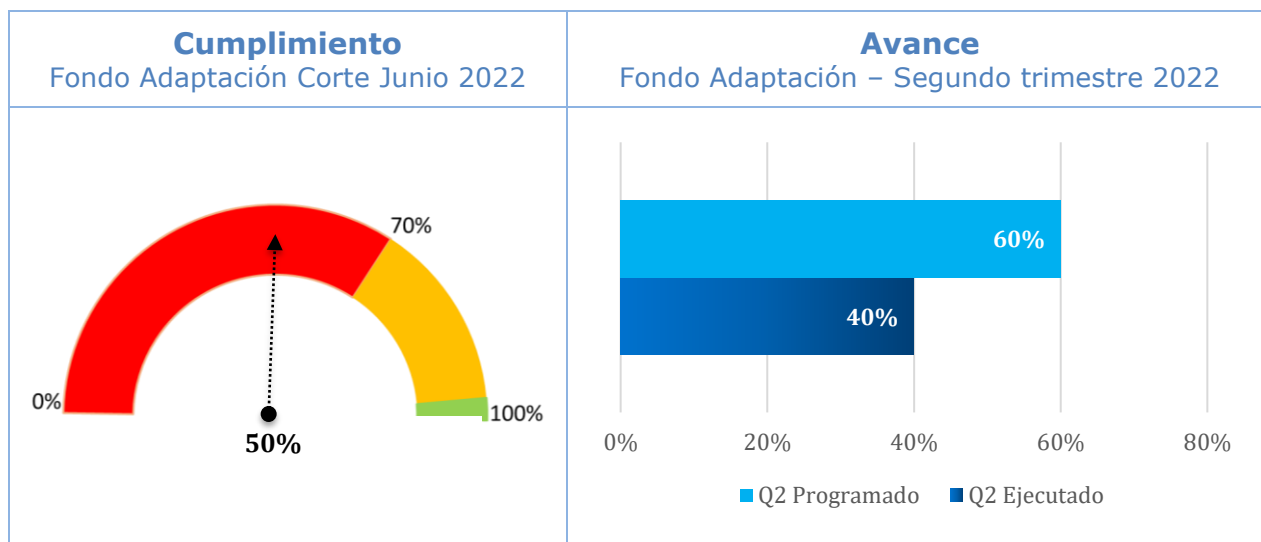

Portafolio/Programa/Proyecto: **REACTIVACIÓN ECONÓMICA**
Gerente de Meta: Asesor Apropiación de capacidades y fortalecimiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #1

Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2022
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)

Indicador

Meta
2022

Programación Trimestral

Meta
Q1

Meta
Q2

Meta
Q3

Meta
Q4

AVANCE
META

AEA04_Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos – Proyecto “Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yati – Bodega”	(AEA04)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, contratado	1	-	1	-	-	0
AEA05_Terminar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA05)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, terminado	1	-	-	1	-	N.A.
AEA06_Entregar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA06)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado	1	-	-	-	1	N.A.
AEA07_Entregar Proyectos Reactivar	(AEA07)_Proyectos Reactivar, entregados	2	2	-	-	-	2

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEA04)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, contratado	
Enero	Se realizó la contratación de los profesionales de apoyo y seguimiento al proyecto, también se ha avanzado con jurídica en la revisión de los estudios previos remitidos el 4 de enero de 2022 que permitirá hacer la convocatoria por concurso de méritos.
Febrero	Se avanzó en la elaboración de estudios previos. Se debe cambiar de modalidad de contratación, pasar de Concurso de Méritos a Licitación Pública, en ese sentido se adecuaron los estudios y se enviaron el 24 de febrero de 2022; por lo que se realizó nuevamente ajuste a los EP. El E.T Jurídico para los Sectores y el E.T de Gestión contractual convocó a mesa de trabajo el 02 de marzo de 2022 para nueva revisión.
Marzo	Se continua con la elaboración, revisión y ajuste de estudios previos: se cambió la forma de pago, se ajustó la matriz de riesgos, se hizo la presentación para consideración del Comité de Compras, se ajustaron los formatos. El documento se encuentra en proceso de ajuste.
Abril	<p>En el mes de Abril 2022 se continuó con la revisión y ajuste del pliego de condiciones, estudios previos y estudio del sector y se continúa con la finalización del estudio de Sector y de Mercado.</p> <p>En el mes de abril se han realizado ajustes en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio del sector en extenso • Revisión y actualización de códigos de Naciones Unidas • Actualización de requisitos habilitantes, según códigos UNSC • Consulta sobre matriz de riesgos a la luz del decreto 1860 • Inclusión de requisitos establecidos en el decreto 1860 • Actualización de cifras en estudio de mercado • Actualización de formatos financieros
Mayo	En el mes de mayo se aprobaron los estudios previos y el 13 de mayo mediante Acta de Comité de Contratación No 17 se aprobó proceder con la publicación de la Licitación Pública. El 20 de mayo 2022, se publicó Licitación pública en SECOP con el proceso No. FA-LP-I-S-003-2022.
Junio	<p>El proyecto para la "Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar", se encuentra en etapa de contratación en el marco del proceso de Licitación Pública FA-LP-I-S-003-2022 desde el 20 de mayo de 2022.</p> <p>La publicación del pliego de condiciones definitivo se realizó el 10 de junio y se tenía como plazo para presentación de ofertas el 30 de junio, se dio respuesta a las observaciones de los pliegos que presentaron entidades interesadas.</p> <p>Posteriormente, se recibieron observaciones de otras dos firmas (CONICA PROYECTOS SAS e INGENIERIA Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA SAS), mediante las cuales solicitaban ampliar el plazo para la presentación de las propuestas, teniendo en cuenta que no había sido posible obtener la garantía de seriedad de la oferta; por lo cual mediante Resolución N° 521 del 29 de junio de 2022 emitida por la Secretaría General del Fondo Adaptación, se suspendió el proceso licitatorio mientras se adelanta reunión con el sector asegurador para identificar y precisar las dificultades y poder darle viabilidad a la continuidad del proceso. En este momento el proceso está suspendido.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	(AEA05)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, terminado (AEA06)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregado
Enero	Con corte a 31 de enero de 2022 se tienen 140 ítems tipo A de acuerdo con la categoría establecida por la consultoría, la cual hace referencia a los productos esenciales para el desarrollo de la idea de negocio. Se tienen 82 beneficiarios en estado activo en el proceso de compras con un valor presupuestado de \$2.174.980.230. Sobre esta actividad, se ha realizado la solicitud de cotizaciones de 17 tipologías. Se llevó a cabo CIDEG presencial donde se presentaron 63 ideas de negocio sobre la segunda convocatoria y se acompañó el desarrollo de las actividades de manera presencial por parte de la supervisión.
Febrero	<p>Se cuenta con un total de 85 beneficiarios activos para compras, de los cuales se han beneficiado a 63 con la compra de 205 ítems por un valor de \$345.892.693. De igual manera, se llevó a cabo CIDEG de validación de ideas de negocio para completar la segunda convocatoria. Adicionalmente, se aprobó el avance reportado para el hito 10 del contrato que corresponde al pago N°7 correspondientes a los siguientes productos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración y publicación de línea base del proyecto en la herramienta PSA, 2. Informe de la socialización de criterios para la convocatoria Express para máximo 70 proyectos, 3. Informe de lanzamiento y cierre de la convocatoria, 4. cierre de la convocatoria con resultados preliminares, 5. Informe final consolidado de evaluación del 100% de las iniciativas presentadas por la comunidad, 6. Informe de realización de mesas de trabajo con miembros del CIDEG para la validación de la calificación de las ideas de negocio, que contenga: <ol style="list-style-type: none"> a. actas de aprobación, b. informe de evaluación de ideas de negocio, ajustadas por el consultor y validadas por la Interventoría, c. Informe de aprobación de hasta 70 ideas de negocio presentadas al CIDEG para pasar a la fase de Estructuración.
Marzo	<p>Acompañamiento Socioeconómico Gramalote (Terminar): Actualmente se cuenta con un total de 91 beneficiarios activos para compras, con un avance de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 planes entre el 61 y 100% • 17 planes entre el 41 y 60% • 28 planes entre el 11 y 40% • 30 planes entre el 0 y 10% <p>Sobre lo anterior, se adelantan gestiones para dar celeridad a las compras y se realizaron cambios al manual de compras para validar las cotizaciones acordes a la dinámica actual de mercado en la zona y los proveedores inscritos en el banco de proyectos.</p> <p>A corte 31 de marzo se cuenta con 67 tipologías que corresponden a 8.340 ítems y un total de compras por valor de \$657.228.917. Se continúan con las actividades de solicitud de cotizaciones para tipologías como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipos de cómputo, • equipos e instrumentos deportivos, • máquinas y equipos de confección, • muebles y enseres para exterior, • productos de belleza, • textiles

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> • artículos para el hogar, • equipos industriales, • muebles metálicos, • maquinaria especializada, • insumos y productos bisutería, • equipos e instrumentos médicos, • muebles decorativos para eventos, • electrodomésticos línea blanca, • electrodomésticos línea marrón, • pequeños electrodomésticos, • productos de papelería, • muebles de oficina y escritorio, • muebles escolares. <p>De igual manera, el 3 y 30 de marzo se llevaron a cabo CIDEG de validación de ideas de negocio estructuradas para proceder a la etapa de implementación de postulaciones de la segunda convocatoria acorde al otrosi N° 2 del contrato donde se atienden hasta 70 nuevos proyectos no priorizados en la primera convocatoria.</p>
Abril	<p>2. AEA 05 / ACOMPAÑAMIENTO SOCIOECONÓMICO GRAMALOTE:</p> <p>De la primera convocatoria de reactivación económica se cuenta con 117 beneficiarios de los cuales 91 están habilitados para compras. A corte abril 2022, se cuenta con el total de compras por \$1.181.898.518, se han realizado 51 visitas técnicas con el objetivo de revisar el uso de los productos entregados a los beneficiarios. El avance de los proyectos habilitados para compras se presenta de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 planes de negocios de 1% a 10% • 28 planes de negocios de 11 a 40% • 33 planes de negocios de 41 a 80% • 8 planes de negocios de 81 a 100% <p>De la segunda convocatoria se cuentan con 59 proyectos estructurados y aprobados en CIDEG, de igual manera se cuentan con las actas de compromiso firmadas por los proponentes de los proyectos y cartilla plan de negocio diligenciada por cada uno de los proponentes. De igual manera, se reporta radicación del hito 11 correspondiente al pago N°8 del contrato.</p>
Mayo	<p>De la primera convocatoria de Reactivación Económica se cuenta con 117 beneficiarios de los cuales 91 están habilitados para compras. Se cuenta con 164 proveedores inscritos con 84 tipologías de productos y se han socializado 3.039 ítems cotizados a los beneficiarios quienes han aprobado 2.499 ítems de los cuales han rechazado 540.</p> <p>Con corte 31 de mayo, se han realizado 93 órdenes y 9 en proceso de compra. Acorde a lo anterior, se cuenta con un total de compras por \$ 1.791.317.796 con avance promedio del 62%; El avance de los proyectos habilitados para compras se presenta de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 proyectos en 0%, • 33 entre el 1 y 30%, • 17 entre el 31 y 60%, • 18 entre 61 a 99% y • 24 proyectos en 100%.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>De la segunda convocatoria se cuentan con 59 proyectos estructurados y aprobados en CIDEG, de igual manera se cuentan con las actas de compromiso firmadas por los proponentes de los proyectos y cartilla plan de negocio diligenciada por cada uno de los proponentes.</p> <p>Para el componente de lotes comerciales, 19 beneficiarios cuentan con licencias de construcción de los 20 proponentes de la primera convocatoria. En el avance financiero del proyecto, se reporta radicación del hito 11 correspondiente al pago N°8 del contrato.</p>
Junio	<p>FA-CD-I-S-340-2019 / FA-CD-I-S-342-2019 Acompañamiento Socioeconómico Gramalote. De la primera convocatoria de reactivación económica se cuenta con 117 beneficiarios de los cuales 91 están habilitados para compras. Se cuenta con 164 proveedores inscritos en el banco de proveedores, 84 tipologías de productos se han socializado, 3.039 ítems cotizados a los beneficiarios quienes han aprobado 2.499 ítems y rechazado 540. Acorde a lo anterior, a la fecha se cuenta con un total de compras por \$2.022.438.199.</p>
(AEA07)_Proyectos Reactivar, entregados	
Enero	<p>Reactivar agrícola Cauca: Radicación del informe final consolidado, por parte del operador Vallenpaz, mediante radicado No. R-2020-001320, documento que permitirá preparar el informe de supervisión final y con los cuales se dará respuesta a solicitud de jurídica para continuar con el proceso de liquidación.</p> <p>Reactivar Panela Cauca: Remisión de memorando E-2022-000465 dirigido al contratista en el que se requirió en cumplimiento de sus obligaciones contractuales radicar la documentación exigida para continuar con el proceso de liquidación del contrato.</p>
Febrero	<p>Reactivar agrícola Cauca: 28 de febrero se radicó factura por el último pago de gerencia contra entrega de acta de liquidación. El acta de liquidación fue firmada el 25 de febrero de 2022 (R-2020-001852)</p> <p>Reactivar Panela Cauca El 15 de febrero se radicó factura por el 9o pago de gerencia con el código R-2022-009394. El 28 de febrero se radicó archivo físico del contrato en gestión documental (R-2022-002411) requerido para proceder con la liquidación del contrato.</p>
Marzo	<p>El Proyecto Reactivar Cauca Panela ya tiene gestionadas las actas de entrega correspondientes denominadas " 4-GPY-F-65 Acta entrega recibo proyecto productivo" y " 4-GPY-F-66 Acta validación proyectos productivo". Los documentos anteriores en efecto muestran la manifestación del recibo a satisfacción de la totalidad de insumos y servicios por cada beneficiario con su respectiva rúbrica. De igual forma el acta de liquidación se encuentra en gestión de firmas.</p>
Abril	<p>Proyecto Reactivar Cauca Panela, FA-CD-I-S-334-2019. Se firmó el acta de liquidación (se anexa) y se radicó último pago mediante radicado R-2022-005133.</p>
Mayo	<p>Meta de la vigencia cumplida.</p>
Junio	<p>Meta de la vigencia cumplida.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

TRANSPORTE

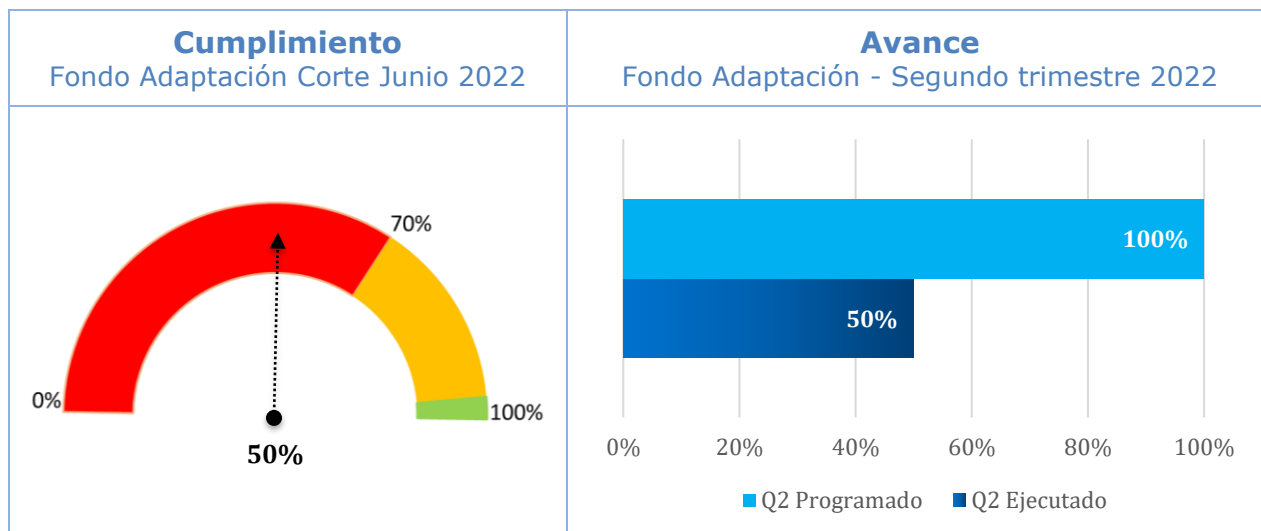

Portafolio/Programa/Proyecto: **TRANSPORTE**

Gerente de Meta: Asesor Sector Transporte

Objetivo Estratégico 2018-2022 #2

Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB01_Terminar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB01)_Sitios Críticos con Obras terminar	1	-	1	-	-	1
AEB02_Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB02)_Sitios Críticos con Obras entregar (INDICADOR PEI)	1	-	1	-	-	0


Mes	Avance Cualitativo
(AEB01)_Sitios Críticos con Obras terminar	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	El contrato se encuentra suspendido (No. 3), del periodo comprendido entre el 13 de enero de 2022 al 12 de marzo de 2022, sustentado en la situación de orden público que actualmente se presenta en el departamento de Arauca.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	El 9 de marzo de 2022, se generó la reactivación del contrato. Se realizó reunión presencial con contratistas de obra e interventoría en las instalaciones de la entidad, con el fin de fijar fecha de izaje de vigas, actividad a la que se dio cumplimiento el 30 y 31 de marzo de año en curso. Contractualmente el proyecto se encuentra en proceso de prórroga por un mes, para la culminación del mismo.
Abril	Actualmente se realiza el trámite para suscribir el Acta de Concertación de la medida de compensación entre el FONDO y CORPORINOQUIA. Se encuentra pendiente realizar actividades de compensación ambiental, ajuste y aprobación del Plan de Inversión Ambiental y Social. Con el fin de darle trámite y avance a lo anteriormente descrito, se desarrollan mesas de trabajo con los profesionales de CORPORINOQUIA, el Ministerio de Medio Ambiente y el INVIAS.
Mayo	El contrato finalizó el 05 de mayo de 2022, cuenta con acta de entrega y recibo en la que se registró "el proyecto se encuentra ubicado en el corredor la cabuya – Tame en el PR 20+940, teniendo como PR inicial K20+800 y PR final K21+092,4 el avance del proyecto a la fecha es de 93%, quedando pendientes, señalización horizontal y vertical, entrega de informe, resultados de ensayos de la MDC y la instalación del 10% faltante."
Junio	Proyecto del Puente La Colorada – Sácama - La Cabuya; La Cabuya – Saravena en el departamento de Arauca El proyecto cuenta con acta de entrega y recibo de Obra del 07 de junio de 2022, fecha de terminación en acta 05 de mayo de 2022.
(AEB02)_Sitios Críticos con Obras entregar (INDICADOR PEI)	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	De acuerdo con la suspensión No. 3 del contrato, se encuentra pendiente para la terminación y entrega, un porcentaje del 36% de ejecución.
Abril	La actividad de Izaje de las Vigas del puente se desarrollo los días 29 y 30 de abril de 2022, posteriormente se realizó la actividad de riostras carril derecho, Instalación de acero para tablero - costado derecho, Instalación de Steel deck costado derecho puente, Vaciado concreto tablero costado derecho y las demás actividades para la terminación del puente. Actualmente la obra cuenta con un avance del 78.01%.
Mayo	A 31 de mayo de 2022, se reporta avance del 99% del proyecto, el contratista se encuentra terminando la actividad de Pavimentación y Señalización para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Acta de Entrega y Recibo suscrita con el Interventor.
Junio	Proyecto del Puente La Colorada – Sácama - La Cabuya: Se encuentra pendiente suscripción de acta de entrega entre el Fondo Adaptación y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, pendiente culminar gestión de cierre ambiental y actualización de pólizas.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

EDUCACIÓN

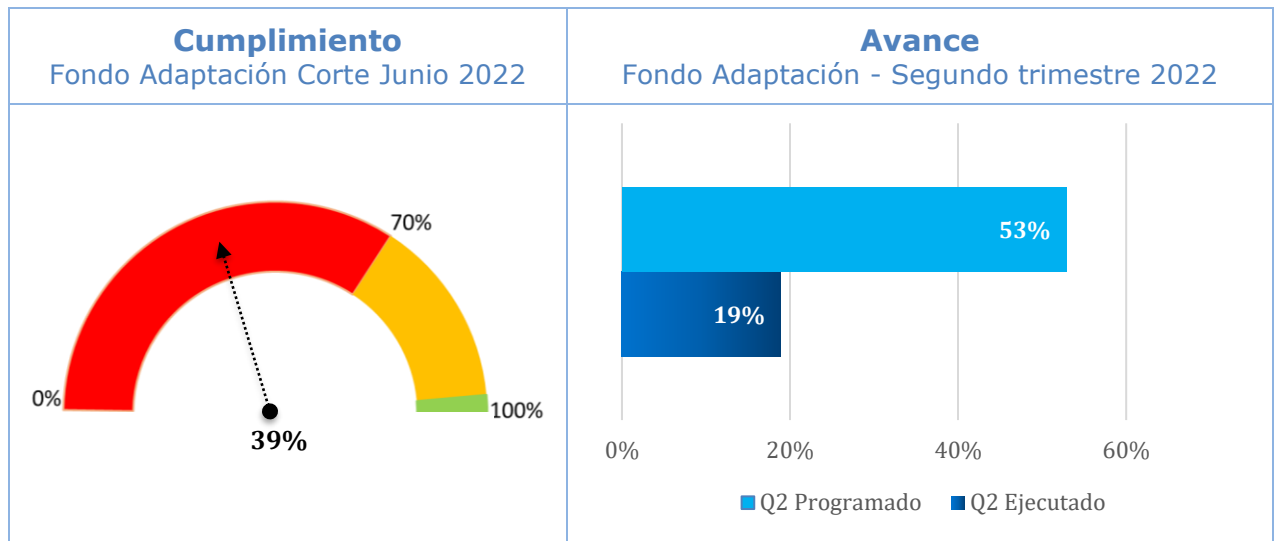

Educación

Portafolio/Programa/Proyecto: **EDUCACIÓN**
Gerente de Meta: Asesor Sector Educación

Objetivo Estratégico 2018-2022 #2

Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB03_Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB03)_Sedes Educativas, terminadas	13	4	3	6	-	4
AEB04_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB04)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	19	3	7	3	6	2

Mes	Avance Cualitativo
(AEB03)_Sedes Educativas, terminadas	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	Conforme a lo programado, el sector educación terminó las sedes Escuela Mixta No 1 y EUM San Antonio, en Gamarra Cesar; al igual que la terminación de las sedes CE JORGE ELIECER GAITAN, y la sede CE DE REGENCIA del departamento de Bolívar.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
Abril	Al respecto de la meta de terminaciones del mes de abril de 2022, el sector educación tenía programado la terminación de la sede IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA, del municipio de Achí del departamento de Bolívar, sin embargo, esta no fue posible teniendo en cuenta la situación de orden público presentada en la zona de influencia de los proyectos del contrato en referencia (paro armado), ocasionando un retraso en los rendimientos del personal operativo, y la llegada de materiales e insumos como cemento, materiales pétreos entre otros y que impidieron el buen funcionamiento de las actividades. Se suscribió el otrosí No 4 mediante el cual se realizó la prórroga por 58 días hasta el 20 de junio de 2022.
Mayo	Al respecto de la meta de terminaciones del mes de mayo de 2022 el sector tenía programado terminación de la SEDE COL COMUNAL AGROPECUARIO del municipio banco del Departamento de Magdalena, sin embargo, esto no fue Posible teniendo en cuenta que el proyecto está suspendido desde el 2-11-2021 y hasta el 21-06-2022, actualmente se encuentra en proceso de revisión de análisis de prórroga y adición por reconocimiento o ajuste de precios por afectación de pandemia, paro nacional y aumento del dólar. Igualmente, el sector tiene rezagada la terminación de la sede IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA, del municipio de Achí del departamento de Bolívar, que de acuerdo a la última suspensión por orden público tiene fecha de terminación para el 05-07-2022 por lo que se espera que para los próximos meses pueda realizarse el respectivo reporte.
Junio	Al respecto de la meta de terminaciones del mes de junio el sector tenía programado la terminación de Manatí (2 sedes), sin embargo, se encuentra en trámite la solicitud de cesión de la posición contractual que fue presentada al comité de modificaciones del 21-06-2022 la cual fue aprobada pero condicionada a que el contratista presente las cesiones de derechos económicos y las pólizas actualizadas; por lo anterior a la fecha no se ha podido reiniciar las obras, igualmente se presentan rezagos en las sedes de COL COMUNAL AGROPECUARIO del municipio Banco del Departamento de Magdalena teniendo en cuenta que el proyecto está suspendido desde el 2-11-2021 y hasta el 10-08-2022, actualmente se encuentra en proceso de revisión de análisis de prórroga y adición por reconocimiento o ajuste de precios por afectación de pandemia, paro nacional y aumento del dólar. Respecto la sede IE TECNICA AGROPECUARIA PUERTO DE VENECIA, del municipio de Achí del departamento de Bolívar, que de acuerdo con la última suspensión por orden público tiene fecha de terminación para el 05-09-2022 por lo que se espera que para los próximos meses pueda realizarse el respectivo reporte.
(AEB04)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	Para el mes de febrero de 2022, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del municipio de Pedraza y la SEDE EUM DARÍO VÁSQUEZ CABALLERO del municipio de Remolino. Sin embargo, se debió postergar su entrega debido a que la firma certificadora de RETIE no pudo realizar las visitas en las fechas inicialmente programadas, debido al paro armado en la zona. Finalmente, en ambos proyectos, a finales de mes se realizaron las visitas y se está a la espera de la expedición de los respectivos certificados. Una vez obtenidos los certificados, se continuará con el trámite ante el operador AIRE.
Marzo	Conforme a lo proyectado se reporta la entrega de la sedes CE ARTESANAL JOSÉ DE LA LUZ MARTINEZ SEDE ERM DEL HORNO, en San Zenón, Magdalena.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Sin embargo, se encuentra rezagada la entrega de las sedes de CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del municipio de Pedraza, que está en el proceso energización definitiva; el sector ha realizado seguimiento permanente al contratista y durante el mes de marzo el Certificador RETIE - CERTICAPITAL S.A.S, emitió nuevamente observaciones, las cuales fueron atendidas por el contratista el 15 de marzo. El sector Educación programó mesa de trabajo con el Certificador y contratista el 22 de marzo a fin de validar el estado del trámite. Actualmente se encuentra en el proceso de revisión, el Certificador solicitó varios documentos dentro de los cuales está el soporte de calidad de los equipos y accesorios instalados en la media tensión, los cuales fueron entregados en debida forma por parte del contratista el 4 de abril de 2022, por lo que se está a la espera de la validación final por parte del Certificador.</p> <p>Respecto la SEDE EUM DARÍO VÁSQUEZ CABALLERO del municipio de Remolino, se encuentra en proceso de energización definitiva y con seguimiento permanente del sector, durante el mes de marzo el Certificador RETIE - RTL CERTIFICATIONS S.A.S. emitió el certificado de uso final del proyecto. El municipio entregó documentación complementaria para trámite ante AIRE el 16 de marzo de 2022. El contratista radicó ante AIRE el 18 de marzo de 2022, la solicitud de visita y descargo de energización. AIRE realizó la visita el 4 de abril de 2022 por lo que el sector se encuentra a la espera del dictamen de la visita para continuar con el trámite respectivo.</p>
Abril	<p>El sector tenía rezagada la entrega de la sede EUM DARÍO VÁSQUEZ CABALLERO del municipio de Remolino en departamento del Magdalena, que fue entregada el 27 de abril del año en curso. De esta manera, queda únicamente en rezago la sede CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del municipio de Pedraza, que está en el proceso energización definitiva; la cual no se ha podido llevar a cabo teniendo en cuenta las observaciones que se han presentado durante el proceso de certificación Retie, para la expedición de uso final. Estas observaciones están relacionadas con los documentos de los equipos neumáticos de la red contra incendio que deben ser expedidos por el Proveedor con el respectivo aval del ministerio de minas ya que son equipos importados.</p>
Mayo	<p>El CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del municipio de Pedraza, continua en el proceso energización definitiva actividad fue aplazada por tres semanas por el operador del servicio Air-e justificado en el paro armado de comienzos del mes de mayo y posteriormente por la semana de elecciones presidenciales, razón por la cual la visita se aplaza para junio. Actualmente se está a la espera del dictamen de Air-e y su posterior energización; igualmente el sector se encuentra realizando las gestiones con respecto a pólizas y firma del acta de entrega de las sedes IE DE PROMOCION SOCIAL EUM NØ 1 y SEDE EUM SAN ANTONIO.</p>
Junio	<p>Para el mes de junio de 2022, el Sector educación tenía proyectada la entrega de SEDE CE JORGE ELIECER GAITAN, SEDE CE LA CHAPETONA, CE DE REGENCIA, IE DE ARMENIA PRINCIPAL, todos proyectos que hacen parte del convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra y que a la fecha tiene pendiente la suscripción del acta de recibo del beneficiario como ente contratante, y la entrega de las sedes IE DE PROMOCION SOCIAL EUM NØ 1 y SEDE EUM SAN ANTONIO de las cuales se está realizando las gestiones para la actualización de las pólizas y posterior firma del acta de entrega.</p> <p>El CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del municipio de Pedraza, continua en el proceso energización definitiva actividad fue aplazada y realizada hasta el 3 de junio y actualmente se está a la espera del dictamen de Air-e y su posterior energización, el sector se encuentra realizando las gestiones con respecto a pólizas y firma del acta de entrega.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO

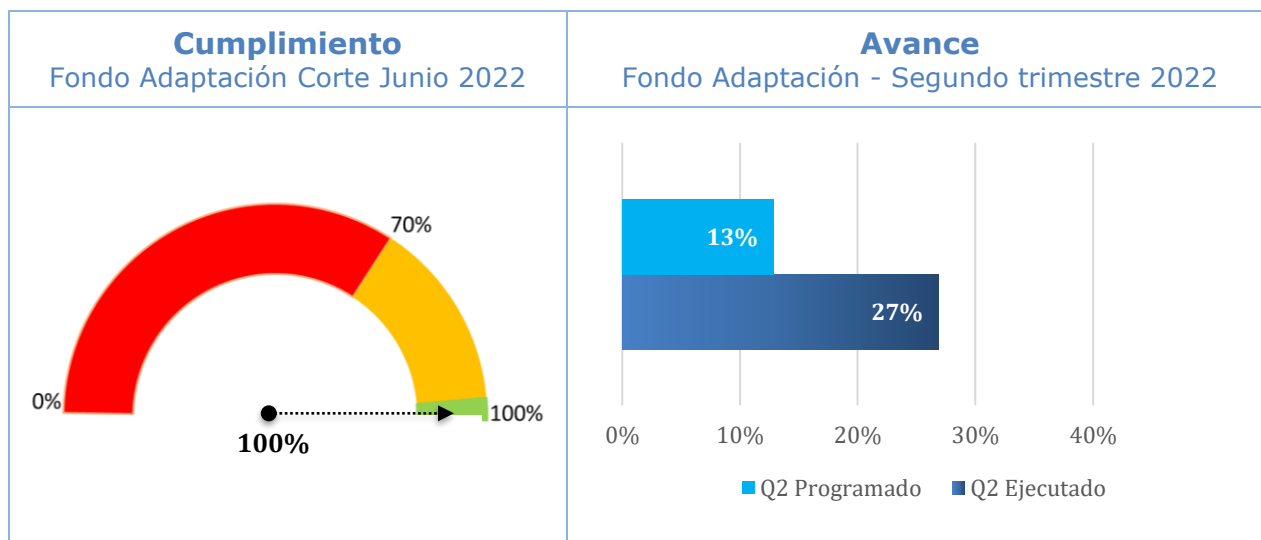

Portafolio/Programa/Proyecto: **ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO**
 Área: Subgerencia de Estructuración

Gerente de Meta: Asesor Sector Acueducto y Alcantarillado

Objetivo Estratégico 2018-2022 #2

Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB05_Terminar obras infraestructura de acueducto	(AEB05)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	5	-	-	2	3	2
AEB06_Terminar obras infraestructura de alcantarillado	(AEB06)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	2	-	-	1	1	N.A.
AEB07_Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AEB07)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	6	-	1	1	4	1
AEB08_Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	(AEB08)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	2	-	1	-	1	2

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
(AEB05)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	<p>Casanare – Yopal: El día 10 de febrero, se continuó con el comité de verificación de cumplimiento realizado el 27 de enero con las entidades condenadas en el fallo de la sentencia. El día 28 de febrero se realizó mesa de trabajo con las mismas entidades, en la cual Findeter informa que se tiene previsto realizar el alistamiento de las obras de integración para el 25 de marzo. El municipio manifestó que se deben garantizar los recursos para la funcionalidad del sistema de abastecimiento y planta de tratamiento de agua potable, por lo menos para los próximos tres meses. El tribunal administrativo de Casanare convocó audiencia pública de verificación el 02 de marzo de 2022 a las entidades condenadas y las partícipes del convenio 199 de 2014.</p> <p>Aguachica - Cesar: El proyecto reinició el 19 de febrero de 2022, luego de superar los motivos del estado de suspensión, los cuales fueron protocolizados con la suscripción de la modificación No. 1 al contrato de obra y Otrosí No. 12 del contrato de interventoría, suscritos el 21 de febrero, los cuales fueron adicionados en recursos y prorrogados en el término de tres (3) meses.</p> <p>Nóvita – Choco: El 11 de febrero la Corporación CODECHOCO emitió concepto de aprobación de los permisos ambientales y solicito al Municipio de Nóvita la entrega de las medidas ambientales de prevención y mitigación de la adecuación de la zona y obras a intervenir. El proyecto continúa suspendido hasta el 16 de marzo de 2022, debido a que el sector realizó observaciones al documento de justificación técnica, económica y jurídica, presentado por la interventoría de solicitud de costos adicionales por concepto de transporte fluvial y a lomo de mula para el proyecto de Juntas de Tamana.</p> <p>Murillo – Tolima: El 18 de febrero mediante oficio E-2022-000788, se enviaron al interventor las observaciones al informe de presunto incumplimiento contractual del proyecto "Rehabilitación sistema de acueducto vereda La Esperanza – municipio Murillo, departamento del Tolima". El 28 de febrero mediante comunicación CSB-123-714, el interventor envía al Fondo de Adaptación el "Informe de incumplimiento del proyecto VEREDA LA ESPERANZA – MUNICIPIO MURILLO". Resultado de la revisión del informe por parte del sector, se hace necesario el ajuste en la valoración de los perjuicios y observaciones menores, los cuales, para evitar más reprocesos, será ajustado el informe por el sector.</p>
Marzo	<p>Casanare – Yopal: El municipio de Yopal y la empresa EAAAY recibieron el sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable en óptimo funcionamiento, mediante Acta de Entrega y recibo al Municipio y el operador de gerencia de agua y saneamiento básico, suscrita el 23 de marzo de 2022 por parte de la Alcaldía Municipal, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY, la interventoría, el contratista y Findeter.</p> <p>Aguachica - Cesar: El 10 de marzo se realizó el Foro del 50% de avance de obra, con el objetivo de socializar ante la comunidad y el Municipio, el avance técnico y social en referencia al desarrollo de la obra. El 31 de marzo, se realizó visita de seguimiento a la ejecución del proyecto "Sistema de acueducto en el Municipio de Aguachica – Cesar", donde se evidenció el avance de la obra, encontrándose ejecutado el 74% de la ejecución física. Actualmente se encuentra en proceso las actividades de ejecución final (excavación en roca para perfilación de taludes e instalación de accesorios para el empalme del sistema).</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Nóvita – Choco: El 15 de marzo de 2022 mediante oficio E-2022-001354, se notificó a Seguros del Estado S.A, sobre la problemática presentada con la interventoría, por la falta de atención a satisfacción a los requerimientos efectuados por la Entidad, respecto a la solicitud de reconocimiento de costos adicionales de transporte. El 16 de marzo de 2022 se suscribió la ampliación No 03 de la suspensión No 01 para los contratos de obra e interventoría, quedando fecha pactada de reinicio el 17/05/2022.</p> <p>El 30 de marzo de 2022 mediante oficio E-2022-001694, se envían las observaciones respecto a la solicitud presentada por el contratista de obra, referente a un reconocimiento de transporte por kilometraje adicional, motivado por el cambio de ruta para llegar hasta el Corregimiento de Juntas de Tamana (condiciones de orden público y dificultad para la navegabilidad en el rio Ingara).</p> <p>Murillo – Tolima: El 11 de marzo de 2022 mediante comunicación CSB-123-717, el interventor envía al Fondo de Adaptación el ajuste al "Informe de incumplimiento del proyecto VEREDA LA ESPERANZA – MUNICIPIO MURILLO". El 24 de marzo de 2022 mediante memorando I-2022-001546 el sector remite a la Secretaría General el informe ajustado de acuerdo a los requerimientos recibidos. Mediante comunicados No. E-2022-001602 y E-2022-001603 del 25 de marzo de 2022 se citan al contratista y la aseguradora respectivamente a audiencia por el presunto incumplimiento del contrato FA-IC-I-S-353 de 2019 el día 13 de abril de 2022.</p>
Abril	<p>Aguachica – Cesar: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución física del 83,31%, desarrollando actividades finales para acondicionamiento de las obras, consistentes en perfilación de taludes, empalme de tuberías, instalación de accesorios y válvulas. Se tiene programada la terminación de las obras el 22 de mayo de 2022.</p> <p>Nóvita – Chocó: El día 20 de abril de 2022, se firman las actas de reinicio de los contratos FA-CMA-I-S-002-2021 interventoría y FA-LP-I-S-001-2021 obra, estableciendo como nueva fecha de terminación de los contratos el día 18 de diciembre de 2022, con el reinicio, se adelantan actividades preliminares de localización y replanteo en el sitio de las obras.</p> <p>El 29 de abril de 2022, mediante oficio E-2022-002239 se solicita a la interventoría el documento de ajuste de la justificación integral técnica, financiera y jurídica de las obras complementarias de los acueductos Juntas de Tamaná y Curundó, necesarios para adelantar la modificación en valor y plazo de los contratos, sin que esto imposibilite que el contratista continúe con la ejecución de la etapa de construcción.</p> <p>Murillo – Tolima: El día 25 de abril de 2022, se realizó la sesión de la audiencia en el marco del proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento, en desarrollo de la cual el contratista de obra presentó los descargos y manifestó nuevamente a la entidad y la compañía de seguros, la propuesta de culminar las actividades de la etapa II-construcción y lograr la entrega de un proyecto funcional, con las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prorrogar la ejecución de los contratos de obra e interventoría para la etapa II-construcción por el plazo de cinco (05) meses calendario. 2. Los mayores costos de la interventoría sean asumidos por el contratista de obra. <p>El 25 de abril de 2022, mediante comunicado No. CSB-123-746, la interventoría remitió al Fondo Adaptación el comunicado del contratista de obra No. FAD-05-2022 de la misma fecha, por el cual manifestó la ratificación de la terminación del proyecto SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDA LA ESPERANZA – MUNICIPIO MURILLO, la cual</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>se encuentra en análisis del Sector y en el evento de requerirse complementos serán solicitados a la Interventoría.</p> <p>El día 25 de abril de 2022, se suscriben las actas de suspensión total No 06, para los contratos de obra e interventoría, por el término de un (01) mes y quince (15) días calendario, hasta el 09 de junio de 2022.</p>
<p>Mayo</p>	<p>Aguachica – Cesar: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución física del 99,00%, los contratos de obra e interventoría terminaron el 22 de mayo de 2022. La interventoría se encuentra en el proceso de validación de las obras y pruebas de verificación con el contratista, que permita la suscripción del acta de recibo final de obras. Se socializará con el municipio y el prestador dichas actividades para que se apropien de la infraestructura.</p> <p>Nóvita – Chocó: El día 26 de mayo de 2022, la interventoría mediante oficio INT-FA-CMA-I-S-002-2021-048, presentó la justificación y análisis integral técnico, financiero y jurídico para el trámite de modificación contractual, para lo cual, el Sector se encuentra en la revisión de la ficha de modificación contractual por concepto de adición de recursos acorde al balance económico y solicitud de prórroga de dos meses.</p> <p>A la espera del aval de dichas fichas, para presentar ante comité de contratación la modificación contractual.</p> <p>Murillo – Tolima: Mediante oficio No. E-2022-002278 del 02 de mayo de 2022 el Fondo de Adaptación solicitó a la interventoría emitir el concepto técnico, económico y jurídico de la propuesta presentada por el contratista para culminar la ejecución del proyecto. En respuesta, se recibe de la interventoría el comunicado No. CSB-123-756 del 02 de mayo de 2022 donde presente el concepto solicitado, sin embargo, dicho concepto no respondió los requerimientos efectuados por ello se solicitó complementos.</p> <p>Mediante comunicado No. CSB-123-759 del 11 de mayo de 2022, la interventoría remite el concepto técnico, económico y jurídico de la propuesta presentada por el contratista para culminar la ejecución del proyecto, pero no se informó el costo por la mayor permanencia de la interventoría ni su argumentación. La interventoría mediante comunicado No. CSB-123-767 del 26 de mayo de 2022 remite el análisis del costeo solicitado y la argumentación solicitada.</p>
<p>Junio</p>	<p>Aguachica – Cesar: El día 21 de junio de 2022, se suscribió el acta de entrega y recibo final del objeto contractual “Reconstrucción del sistema de acueducto (bocatoma, aducción, tratamiento preliminar y obras adicionales) Municipio de Aguachica - Departamento de Cesar”, por parte del contratista Benjamín Obando Delgado y el interventor Consultoría Técnica Latinoamericana y del Caribe S.A.S, evidenciando un porcentaje de ejecución física del 100%. Por lo anterior, con la suscripción de esta acta se da cumplimiento a la meta de terminación del proyecto.</p> <p>Nóvita – Chocó: En el componente técnico se avanza en la ejecución, con mayor énfasis en la rehabilitación del sistema de acueducto del Corregimiento de Curundó realizando la intervención de la bocatoma y el sistema de tratamiento; en el sistema de acueducto de Juntas de Tamaná se avanza en transporte de materiales.</p> <p>El día 21 de junio de 2022, se presentó ante el comité de contratación la necesidad de adición y prórroga de los contratos de obra e interventoría. Actualmente se elabora el documento para la solicitud de elaboración de la novedad contractual y su respectiva suscripción. Mediante memorando E-2022-013398 del 23 de junio de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>2022, se solicitó al interventor el envío de un plan de contingencia por bajos rendimientos y avance en la ejecución de las obras objeto del contrato.</p> <p>Murillo – Tolima: Mediante comunicados No. CSB-123-769 y CSB-123-770 del 06 de junio de 2022, la interventoría remite la solicitud de prorrogar la suspensión de los contratos de obra e interventoría, con el fin de tener el tiempo necesario para culminar el análisis de la propuesta del contratista para lograr culminar la ejecución del proyecto.</p> <p>El 08 de junio de 2022, se suscribe la ampliación a la suspensión de los contratos de obra e interventoría por el término de dos (02) meses calendario, pactando reinicio el día 09 de agosto de 2022, por la necesidad de realizar la evaluación jurídica, técnica y financiera para la cesión de la participación del integrante inhabilitado que permita presentar en comité de contratación dicha cesión, así como la solicitud de prórroga al plazo de ejecución de los contratos de obra e interventoría.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-013317 del 17 de junio de 2022, el Fondo Adaptación reiteró la necesidad de recibir la documentación jurídica, técnica y financiera y cada integrante del consorcio y la persona natural o jurídica a la que se propone la cesión de la participación.</p>
(AEB06)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	<p>Candelaria – Atlántico: El 24 de febrero se realizó visita por parte del sector de agua y subgerencia de regiones para verificar el estado de avance de las obras y seguimiento a compromisos sociales.</p> <p>El 25 de febrero se presentó ante el comité de contratación novedad de adición al contrato de obra, la cual fue aprobada, razón por la cual se adelantan los trámites para el modificatorio del contrato, donde se tiene en cuenta mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos. El sector adelantó el trámite de CDR por valor \$ 486.707.270,39 para amparar presupuestalmente la adición de recursos.</p> <p>Cimitarra – Santander: Los días 9, 15 y 22 de febrero se adelantaron mesas técnicas, con el contratista de obra, la interventoría y el Fondo de Adaptación, encaminadas a concretar el planteamiento técnico de los ajustes de los diseños y cierre del presupuesto del proyecto.</p> <p>El 23 de febrero se adelantó mesa de trabajo virtual con la participación del contratista de obra, interventoría, Aseguradora solidaria SA y el Fondo de Adaptación, en la cual se expusieron las acciones adelantadas encaminadas a lograr la reactivación de las obras y estado actual del contrato. En dicha reunión se establecieron compromisos para la entrega de información técnica por parte del contratista, aprobación de la interventoría y demás trámites para la formalización de la modificación del contrato.</p>
Marzo	<p>Candelaria – Atlántico: El 03 de marzo de 2022, se expidió el CDR 6376 por valor de \$ 486.707.270,39, con el objeto de amparar presupuestalmente los recursos con cargo a fuente Fondo de Adaptación, requeridos para la adición del contrato de obra. El 25 de marzo de 2022 se realizó visita de seguimiento al proyecto donde se evidencia un avance de las obras del 19%, con el objetivo de realizar el foro de inicio, el cual se desarrolló con la participación de representantes del municipio y la</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>comunidad, allí se informó sobre la intervención actual, así mismo, fueron socializados algunos temas como la reubicación de ladrilleros que se encontraban localizados en el terreno donde se ejecutan las obras. De otro lado se identificó el avance de las obras, las cuales están centralizadas en la excavación para la construcción de la laguna facultativa, suministro e instalación de tuberías de ingreso y salida. Actualmente el sector en conjunto con la Secretaria General adelanta los trámites para lograr la suscripción de la novedad de adición al contrato de obra.</p> <p>Cimitarra – Santander: Mediante oficio E-2022-001284 del 14 de marzo del 2022, se remite a la interventoría el aval de los dos ítems no previstos adicionales; mediante oficio CMA-003-2021-15-03-22-113 del 15 de marzo del 2022, la interventoría envía la aprobación al ajuste final de diseño.</p> <p>Mediante oficio E-2022-001317 del 15 de marzo del 2022, se reitera al contratista de obra la necesidad de implementar el plan de contingencia para normalizar estado de ejecución de las obras contratadas.</p> <p>La interventoría mediante oficio CMA-003-2021-28-03-22-122 del 28 de marzo del 2022, recomendó al Fondo Adaptación realizar una prórroga por cinco (5) meses a la etapa de construcción del contrato No. FA-LP-I-S-003-2021 de obra, con el fin de compensar el tiempo adicional que requirió la actividad de ajuste del proyecto, y permitir culminar las obras para beneficio de la comunidad. Actualmente se adelanta la elaboración de los documentos para proceder con el modificatorio de prórroga del plazo contractual.</p>
Abril	<p>Candelaria – Atlántico: El 21 de abril de 2022, mediante memorando I-2022-001943 se solicita la modificación No. 01 del contrato de obra No. FA-IC-I-S-151-2020, con el objetivo de adicionar \$1.086.707.270, correspondientes a \$486.707.270,39 aportados por el Fondo de Adaptación y \$ 600.000.000 por el Departamento del Magdalena. La minuta proyectada por la Secretaria General fue remitida a la Secretaria de Agua y Saneamiento del Departamento del Atlántico el 27 de abril de 2022, para su revisión y aval de la forma de pago de los recursos aportados por el Departamento.</p> <p>Cimitarra – Santander: El 11 de abril de 2022, mediante memorando I-2022-001855 se solicitó la modificación No 01 del contrato de obra FA-LP-I-S-003-2021, la cual se suscribe el 26 de abril de 2022, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución por 5 meses y se ajustó el valor total del contrato, resultado del balance realizado, el cual dio como resultado una reducción del valor del contrato por \$105.642.460, con lo cual el valor actualizado del contrato es de \$3.678.200.768.</p> <p>De igual manera se adelantó la modificación contractual del contrato FA-CMA-I-S-003-2021, por concepto de prórroga del plazo de ejecución de 05 meses.</p>
Mayo	<p>Candelaria – Atlántico: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución física del 36,22%. Actualmente se encuentra acondicionada el área de la laguna facultativa y humedales, los cuales corresponden a las estructuras principales del proyecto, para la instalación de material filtrante e instalación de geomembrana.</p> <p>En el componente social se ha solicitado apoyo a la Gobernación del Atlántico de seguimiento a los compromisos con la comunidad de fabricación artesanal de ladrillos, a fin de que no afecte la ejecución de las obras. Se programará visita de seguimiento en el mes de junio de 2022.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Cimitarra – Santander: El 06 de mayo de 2022 la Contraloría General de la República mediante oficio 2023EE0077251, con radicado en el Fondo R-2022-00554, informó su decisión de iniciar seguimiento permanente al contrato de Obra FA-LP-I-S-003-2021, para lo cual citó a mesa de instalación el 17 de mayo de 2022, a la cual fueron convocados el contratista de obra e interventoría.</p> <p>El 17 de mayo de 2022 se adelantó instalación de mesa de seguimiento permanente citada por la Contraloría General de la República, como compromiso de la misma se remitió el 23 de mayo de 2022 información correspondiente al cronograma ajustado y los estudios y diseños ajustados del proyecto, soporte del ajuste del presupuesto y soporte otrosíes suscritos.</p> <p>El 19 de mayo de 2022 se realizó visita a las obras por parte del Fondo, en la cual se evidenció un bajo avance y se encontró falta de suministro de tubería, la cual es el ítem representativo del contrato. El 26 de mayo de 2022 se adelantó reunión presencial en las oficinas del Fondo Adaptación, con la participación de delegados del contratista de obra, interventoría y del Fondo de Adaptación, con el fin de realizar seguimiento al estado de ejecución de las obras del proyecto.</p>
Junio	<p>Candelaria – Atlántico: El proyecto presenta un porcentaje de ejecución físico del 32%; actualmente se ejecutan actividades de conformación de la laguna facultativa y humedales con el suministro e instalación de material filtrante e instalación de geomembrana y geotextil.</p> <p>El 10 de junio de 2022 se realizó visita de seguimiento al sitio del proyecto por parte del apoyo a la supervisión, allí se evidenció el avance físico de la ejecución y se adelantó reunión con representantes de la alcaldía municipal para reiterar la prioridad para atender los compromisos con la comunidad de ladrilleros, previniendo futuras afectaciones a la ejecución del proyecto por parte de estos.</p> <p>Cimitarra – Santander: Se adelantaron las mesas de seguimiento a la ejecución convocadas por la DIARI de la CGR los días 02, 17 y 21 de junio de 2022, que contaron con la participación del contratista de obra, interventoría, Fondo Adaptación y la CGR.</p> <p>El 9 de junio de 2022 se realizó visita a las obras por parte del Fondo, con el fin de realizar seguimiento al avance de las obras. Se constató el suministro de e instalación de tubería de diámetro 1242 mm y materiales granulares. También se evidencia disposición de material de excavación. Se evidencia desviación entre lo ejecutado y lo programado. Mediante oficio E-2022-013239 del 14 de junio de 2022, se atendió requerimiento realizado por la CGR en la mesa de seguimiento No. 2, remitiendo el informe mensual de interventoría con corte al 15 de mayo de 2022. El Fondo Adaptación mediante oficio E-2022-013417 del 23 de junio de 2022, reiteró a la interventoría cumplir con el compromiso establecido en la mesa de trabajo de 21 de junio de 2022, de que se remita el plan de contingencia para normalizar la desviación que presenta el contrato.</p>
(AEB07)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	
Enero	No existe reporte para el periodo

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Febrero	<p>Samaniego - Nariño: El 22 de febrero de 2022 mediante oficio E-2022-000849, se solicitó al contratista de obra continuar con las actividades de alistamiento y toma de muestra de calidad de agua, para la puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, que permita al Fondo de Adaptación realizar la entrega de la infraestructura al municipio. El 23 de febrero de 2022 se llevó a cabo reunión virtual con la participación del municipio, contratista de obra, interventoría y el Fondo de Adaptación, en la cual se reiteraron los compromisos y se informó que por las fuertes lluvias presentadas en el municipio, se imposibilitó el alistamiento de la planta y toma de muestras de calidad.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: Finalizando el mes de enero de 2022, se remitió oficio E-2022-000381 a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, con el fin de solicitar apoyo en el proceso de entrega y recibo de las obras de agua potable y saneamiento básico con el Municipio de Cúcuta. El 28 de febrero de 2022, se recibió comunicado de la Contraloría General de la República, en el cual informa al Fondo de Adaptación la necesidad de ampliar la comisión de seguimiento a la petición de apoyo para la entrega y recibo de las obras, debido a la complejidad de los asuntos a analizar.</p> <p>Dolores - Tolima: El 01 de febrero mediante oficio E-2022-000447, se reiteró la necesidad de la suscripción del acta de entrega de la infraestructura construida "Reconstrucción del sistema de acueducto vereda Llanitos – municipio de Dolores, departamento del Tolima". El 18 de febrero mediante oficio E-2022-000800, se envía al alcalde Municipal de Dolores, "Derecho de petición y reiteración de oficios previos del 2021 y 2022, con copia a los entes de control, PGN y CGR, con el objetivo de la suscripción Acta de entrega de la infraestructura "Reconstrucción del sistema de acueducto vereda Llanitos – municipio de Dolores, departamento del Tolima".</p>
Marzo	<p>Yopal – Casanare: El municipio y la empresa EAAAY recibieron el sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable en óptimo funcionamiento, mediante Acta de Entrega y recibo al Municipio y el operador de gerencia de agua y saneamiento básico, suscrita el 23 de marzo de 2022 por parte de la Alcaldía Municipal, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY, la interventoría, el contratista y Findeter.</p> <p>Samaniego - Nariño: La interventoría mediante comunicado CAN-123-174 del 25 de marzo de 2022, informa que el 16 de marzo de 2022, fueron tomadas las muestras de calidad del agua para remitir al laboratorio de EMPOPASTO S.A E.S.P., pruebas requeridas para el alistamiento final que permita la entrega de la infraestructura construida (plan de tratamiento de agua potable).</p> <p>El 31 de marzo de 2022, el Fondo Adaptación solicitó sea informado el resultado y conclusiones de las muestras de calidad, requeridas para el cierre de la fase puesta en marcha que permita la entrega de la infraestructura construida al ente territorial, para que se encargue de las actividades de operación y mantenimiento del sistema.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: El 8 de marzo de 2022 se adelantó reunión con delegados de la alta consejería de presidencia, coordinada por la subgerente de proyectos del Fondo, con el fin de requerir apoyo para lograr la entrega y recibo de las obras. Se encuentra en definición las acciones jurídicas se pueden adelantar frente al informe de trazabilidad de la problemática, en la entrega y recibo de las obras de estabilización de taludes sector "Canoítas – La Unión" línea de aducción, desarenador planta pórtico del sistema pamplonita en el municipio de Cúcuta- Norte de Santander".</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>En atención al requerimiento realizado por el Municipio de Cúcuta, en el cual informan del no recibo de las obras el Fondo de Adaptación mediante oficio E-2022-001462 del 22 de marzo, la Subgerencia de Proyectos informa nuevamente al Municipio las conclusiones del informe técnico presentado por la Interventoría, el cual a la fecha Aguas Capital no ha dado respuesta al mismo. El 25 de marzo de 2022, mediante comunicado 2022EE0051260, se recibió por parte de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental, Norte de Santander, respuesta al oficio E-2022-000381, mediante el cual el Fondo solicitó apoyo en el proceso de entrega y recibo de las obras de agua potable y saneamiento básico con el Municipio de Cúcuta. La Contraloría Departamental informó que no es posible acceder a la solicitud, debido a que las obras ya están terminadas desde febrero de 2020 e informa que se dio traslado al Grupo de Vigilancia Fiscal.</p> <p>Dolores - Tolima: El día del 15 de marzo de 2022 mediante comunicado No. SP-120-101, el alcalde municipal envía respuesta el derecho de petición radicado con número E-2022-000800 del 18 de febrero de 2022, solicitando se realice una visita a las obras, para verificar el estado físico de las mismas y el funcionamiento del sistema. Por lo anterior, se procede a programar visita de inspección para los días 31 de marzo y 01 de abril de 2022.</p>
Abril	<p>Samaniego - Nariño: La interventoría Consorcio Aguas Normalizar, el día 6 de abril de 2022, mediante comunicado No. CAN-123-176, remitió los resultados de análisis de calidad del agua, por lo anterior, mediante oficio E-2022-001804 del 6 de abril de 2022, se solicitó a la interventoría, emitir un concepto de interpretación, análisis de los resultados y conclusiones, que permita a la entidad programar mesa de trabajo con el municipio de Samaniego para coordinar la entrega de la infraestructura. La interventoría mediante comunicado No. CAN-123-177 del 11 de abril de 2022, remitió el concepto de interpretación, análisis y conclusiones de los resultados de laboratorio entregados por EMPOPASTO, los cuales mediante oficio No. E-2022-002063 del 20 de abril de 2022, se remiten al municipio de Samaniego.</p> <p>El 25 de abril de 2022, se realizó mesa de trabajo con el Municipio, contratistas de obra e interventoría y Fondo de Adaptación, donde el Municipio solicitó continuar con el acompañamiento técnico y operativo para culminar a satisfacción el proceso de calibración de los procesos de tratamiento y alistamiento de la planta de tratamiento para el recibo de la infraestructura. En este sentido, mediante oficio E-2022-002230 del 28 de abril de 2022, se solicitó a la interventoría coordinar con el contratista lo pertinente, para que se adelante un nuevo proceso de calibración de los procesos de tratamiento de la planta, se adelante nueva toma de muestras y análisis de calidad del agua tratada y se realice nueva capacitación al personal del municipio que estará a cargo de su operación.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: El 1 de abril de 2022 se adelantó una segunda mesa de trabajo con delegados de la Alta Consejería de la Presidencia, con el fin de informar adelantos referentes a la gestión para la entrega y recibo de la infraestructura. El 22 de abril de 2022 se adelantó mesa de trabajo entre la Secretaría General del Fondo Adaptación, Secretaría General y Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de infraestructura del municipio de Cúcuta, con el fin de establecer los acuerdos para la entrega y recibo de la infraestructura del proyecto de acueducto. Se está a la espera de que se confirme la fecha de la mesa de trabajo a realizar con el Municipio y el operador Aguas Kpital.</p> <p>Dolores - Tolima: El 08 de abril de 2022 mediante comunicado No. E-2022-001915 y conforme a visita de inspección del 01 de abril de 2022, se envía el informe del estado físico de las obras construidas y operativo del sistema de acueducto, mediante</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>el cual, se dejaron consignados los requerimientos a cargo del contratista Consorcio Tolima 2019, consistente en las reparaciones que debe realizar a las obras para subsanar las fallas de calidad y/o estabilidad de obras encontradas.</p> <p>El 26 de abril de 2022, mediante comunicado No. E-2022-002176 se reitera el comunicado mencionado anteriormente y se solicita que en calidad de interventoría se presente un informe de avance de estas reparaciones. El 29 de abril de 2022, mediante comunicado No. E-2022-002248, se convoca a mesa de trabajo presencial el día 03 de mayo de 2022, dado que las reparaciones del proyecto debieron culminarse el 29 de abril de 2022.</p>
Mayo	<p>Samaniego - Nariño: La interventoría mediante oficio CAN-123-181 del 04 de mayo de 2022, informó al Fondo respecto al nuevo plan de trabajo para el alistamiento y calibración de la planta, con actividades y fechas proyectadas para la entrega de esta, como compromiso de la mesa de trabajo realizada el 25 de abril de 2022, dado que los resultados no arrojaron agua potable. El contratista de obra mediante oficio PC-SA-TO-125-2022 del 10 de mayo, informó que el día 9 de mayo se adelantó nueva toma de muestras del agua tratada por la PTAP, la cual fue remitida a los laboratorios de Empopasto para su respectivo análisis. A la espera de que la interventoría remita los resultados y la interpretación de los mismos.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: El municipio de Cúcuta remitió al Fondo el oficio nro. 2022102000099204 del 03 de mayo de 2022, reiterando su postura de no acceder al recibo de la infraestructura. Se proyectó respuesta relacionando los oficios e informes técnicos que no han sido respondidos por el municipio y Aguas Kpital de aclaración del alcance técnico de las obras construidas y las posibles fallas de la tubería que no son atribuibles al contratista.</p> <p>Dolores - Tolima: Mediante comunicado No. CSB-123-754 del 02 de mayo de 2022, la interventoría reporta los avances del contratista en la subsanación de observaciones realizadas en el proceso de operación del proyecto. Durante el mes de mayo de 2022, el Sector de Agua y Saneamiento realiza seguimiento y requerimientos a la interventoría y contratista que se informe la fecha en que serán entregadas las reparaciones, so pena de iniciar los respectivos proceso de reclamación de la póliza de calidad y estabilidad así como de calidad del servicio de la interventoría, se remite copia de estos requerimientos a las compañías de seguros de ambos contratos.</p>
Junio	<p>Samaniego - Nariño: El contratista de obra mediante oficio PC-SA-TO-126-2022 del 07 de junio de 2022, remitió al Fondo los resultados de laboratorio realizados para evaluar la calidad del agua tratada por la PTAP, donde EMPOPASTO certificó agua sin riesgo, apta para el consumo humano. Así mismo, el Fondo de Adaptación remitió al municipio los resultados de laboratorio mediante oficio E-2022-013119 del 8 de junio de 2022.</p> <p>Mediante oficio E-2022-013455 del 28 de junio de 2022, se envió invitación al Alcalde de Samaniego para su participación al foro social de cierre del proyecto a realizarse el 8 de julio de 2022, con la finalidad de socializar con la comunidad y el municipio el alcance técnico, objetivos e impactos de la planta de tratamiento construida. El 29 de junio de 2022 mediante oficio E-2022-013487 se remitió por parte del Fondo al municipio, el acta de entrega de la infraestructura para revisión y suscripción.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: El 1 de junio de 2022 se envió al municipio el oficio E-2022-002965, mediante el cual se reiteró la trazabilidad de los principales hechos y gestiones adelantadas por el Fondo Adaptación para la entrega y recibo de las obras,</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
	<p>enfazando en la ausencia de respuesta a los informes y oficios remitidos por el FA al Municipio y Aguas Kpital.</p> <p>El 02 de junio de 2022 se acompañó por parte del Fondo Adaptación, la visita a las obras de rehabilitación del acueducto sector Canoítas en el municipio de Cúcuta, citada por la CGR con el fin de constatar el estado de las obras ejecutadas.</p> <p>El 23 de junio de 2022 mediante oficio E-2022-013410, se dio respuesta a la solicitud de información AG8-8-1/1; con la cual se aclaró los antecedentes del proyecto, así como el alcance técnico de los estudios y diseños; así como el de las obras contratadas.</p> <p>Dolores - Tolima: Mediante comunicado No. CSB-123-768 del 02 de junio de 2022, la interventoría remite el reporte de las reparaciones efectuadas por el contratista y del funcionamiento del sistema de acueducto.</p> <p>El 10 de junio de 2022, se llevó a cabo la visita de inspección a la obra, en la cual se evidenció que el proyecto se encuentra operando sin inconvenientes, se realizaron muestreos para verificar el funcionamiento de la red de distribución, cuyos resultados fueron óptimos. Se observó que algunos usuarios realizan el uso del sistema no para consumo humano sino para otras actividades que desbalancean el sistema en términos de caudal y presión.</p> <p>Mediante comunicado No. E-2022-013275 del 15 de junio de 2022, se convocó al municipio a mesa de trabajo para socializar los resultados de visita realizada a las obras el 10 de junio de 2022, a la cual, se extendió invitación a la PGN y se reiteró al municipio la necesidad de designar el personal permanente para las actividades de operación y mantenimiento del acueducto. El municipio no participó de la mesa de trabajo.</p> <p>El 30 de junio de 2022, se envía comunicado radicado No. E-2022-013515, mediante el cual, se hace entrega del informe con los resultados de la visita y se envía nuevamente el acta de entrega de infraestructura para la suscripción, toda vez que, el sistema de acueducto se encuentra en funcionamiento y ya se realizó mantenimiento a los componentes, actividades que están a cargo del municipio, de la cual, se remitió copia a la PGN.</p> <p>La principal dificultad en la entrega de este acueducto obedece principalmente a la falta de voluntad del municipio en apropiarse de la infraestructura construida, no ha designado el personal permanente para la operación y mantenimiento del acueducto y se evidenció que algunos usuarios se abastecen de agua para otros fines distintos al consumo humano, situación que afecta el óptimo funcionamiento del sistema de acueducto. Se continua con el acompañamiento que viene realizando la PGN para culminar el proceso de entrega y recibo de la infraestructura.</p>
(AEB08)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	
Enero	No existe reporte para el periodo

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Febrero	<p>Santa Lucía – Atlántico: En el mes de febrero del 2022 la Alcaldía de Santa Lucía remitió oficialmente al Fondo Adaptación el acta de entrega, firmada por parte del Fondo de Adaptación y recibo a satisfacción por el beneficiario, para el proyecto “Rehabilitación y adecuación del sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Santa Lucía – Departamento del Atlántico – Etapa 1”, meta programada inicialmente para la vigencia 2023.</p> <p>Cúcuta - Norte de Santander: Finalizando el mes de enero de 2022, se remitió oficio E-2022-000381 a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, con el fin de solicitar apoyo en el proceso de entrega y recibo de las obras de agua potable y saneamiento básico con el Municipio de Cúcuta. El 28 de febrero de 2022, se recibió comunicado de la Contraloría General de la República, en el cual informa al Fondo de Adaptación la necesidad de ampliar la comisión de seguimiento a la petición de apoyo para la entrega y recibo de las obras, debido a la complejidad de los asuntos a analizar.</p> <p>Cimitarra – Santander: Los días 9, 15 y 22 de febrero se adelantaron mesas técnicas, con el contratista de obra, la interventoría y el Fondo de Adaptación, encaminadas a concretar el planteamiento técnico de los ajustes de los diseños y cierre del presupuesto del proyecto. El 23 de febrero se adelantó mesa de trabajo virtual con la participación del contratista de obra, interventoría, Aseguradora solidaria SA y el Fondo de Adaptación, en la cual se expusieron las acciones adelantadas encaminadas a lograr la reactivación de las obras y estado actual del contrato. En dicha reunión se establecieron compromisos para la entrega de información técnica por parte del contratista, aprobación de la interventoría y demás trámites para la formalización de la modificación del contrato.</p>
Marzo	<p>Cúcuta - Norte de Santander: El 4 de marzo de 2022 se recibieron del Municipio de Cúcuta, las observaciones al acta de entrega y recibo a satisfacción por el beneficiario, del proyecto “Rehabilitación colector margen derecha quebrada La Cañada en el municipio de Cúcuta”, enviada por el Fondo Adaptación el 2 de septiembre de 2021.</p> <p>Mediante oficio E-2022-001125 del 7 de marzo, se remitió al Municipio el acta de entrega y recibo a satisfacción por el beneficiario, del proyecto “Rehabilitación colector margen derecha quebrada La Cañada en el municipio de Cúcuta” con los ajustes según las observaciones realizadas.</p>
Abril	<p>El 22 de abril de 2022 se adelantó mesa de trabajo entre la Secretaría General del Fondo Adaptación, Secretaría General y Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Cúcuta, con el fin de establecer los acuerdos para la suscripción del acta de entrega de infraestructura.</p> <p>Se continúa a la espera del acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el Municipio de San José de Cúcuta, del proyecto “Rehabilitación colector margen derecha quebrada La Cañada en el municipio de Cúcuta”, remitida por el Fondo mediante oficio E-2022-001125 del 7 de marzo de 2022, con los ajustes según las observaciones realizadas.</p>
Mayo	<p>El 3 de mayo de 2022 se suscribió el Acta de entrega por parte del Fondo Adaptación y recibo a satisfacción por el beneficiario, para el proyecto “Rehabilitación Colector Margen Derecha Quebrada la Cañada en el Municipio de Cúcuta, Departamento Norte de Santander”.</p>
Junio	<p>Meta del periodo cumplida.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

SALUD

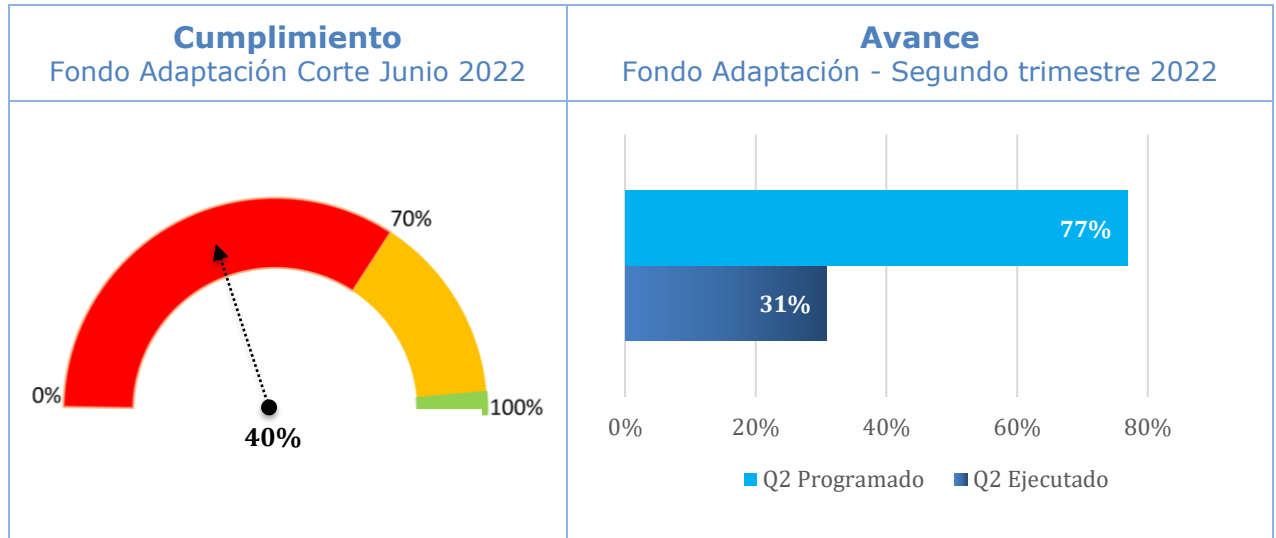

Portafolio/Programa/Proyecto: **SALUD**
Gerente de Meta: Asesor Sector Salud

Objetivo Estratégico 2018-2022 #2

Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/ Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB09_Terminar obras de infraestructura de IPS	(AEB09)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	6	1	4	1	0	2
AEB10_Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AEB10) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	7	1	4	1	1	2

Mes	Avance Cualitativo
(AEB09)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	Turbo – Antioquia: La ejecución de la obra esta en el 35% contra el 33% programado con una desviación positiva del 2%. La obra se está ejecutando sin inconvenientes, sin embargo, aun el predio no cuenta con los puntos de conexión a las redes de servicios públicos, actividad que está a cargo de la entidad territorial.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Mahates – Bolívar: *Actualmente el proyecto esta en ejecución y tiene un 89.85%, con una avance positivo del 0.28%. Se está ejecutando sin inconvenientes, se adelantan actividades de remate, acabados e instalación de equipos, muebles y aparatos. Sin embargo sigue pendiente el pago de la ESE a Afinia, por un aproximado de \$590 millones de pesos, pago que debe realizarse antes de la terminación del proyecto (programada para mayo de 2022) para garantizar la electrificación del mismo).</p> <p>La Vega – Cauca: La obra se encuentra terminada, por condiciones de orden público no se ha podido realizar la verificación de la terminación de las No conformidades en el acta de terminación. Visita programada para marzo de 2022.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: *Actualmente se encuentra en ejecución con múltiples retrasos, se suscribió el pasado 23 de febrero de 2022 los otros 8 y 9 (obra e interventoría respectivamente) prorrogando nuevamente los dos contratos por 2 meses y con una adición del valor de esos dos meses al contrato de interventoría con cargo al contratista de obra, toda vez que los motivos de los retrasos continúan siendo atribuibles a él.</p> <p>*Las actividades principales que tienen rezagado el avance del proyecto que está en un 9% son eléctricas, instalación de muebles de carpintería y metálicos, y remates generales que impiden cerrar espacios. Diariamente se le remiten oficios al contratista solicitando el incremento de personal para cumplir con los compromisos.</p> <p>*Un punto importante que afectaría la entrega de la obra en el tiempo establecido (23 de mayo de 2022) sería que el ente certificador de RETIE, no de el certificado, pero para que lo emita las obras deben estar 100% terminadas. Se estima que el 25 de marzo esa visita de certificación se lleve a cabo.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Contrato suspendido. con un 85% de ejecución. Inicialmente, el proyecto requiere se incluya en su alcance las obras de la PTAR; indexar recursos al contrato de obra por ajuste de precios cambio de IVA; más tiempo de ejecución, Sin embargo, el contrato de obra no ha entregado desde oct de 2021 actualizadas las pólizas, por lo cual, el 2 de febrero se recibió la solicitud de cesión de la posición contractual por parte de la Unión temporal. En consecuencia, de lo anterior, es necesario resolver inicialmente la cesión contractual entre los contratistas y por ende obtener actualizadas las pólizas del contrato.</p> <p>En ese sentido se han adelantado mesas de trabajo, entre contratistas de obra e interventoría, aseguradora y Fondo Adaptación, para establecer la posición del Fondo, en la urgencia por actualizar las pólizas y poner en marcha el contrato. La aseguradora citará a contratistas para exigir documentos que le permitan actualizar las pólizas. Una vez subsanado lo anterior, se procederá con la modificación contractual que permita realizar la cesión de la posición contractual inclusión de PTAR, adición por indexación, y prórroga por 4.5 meses al contrato de obra.</p> <p>Guaranda – Sucre: La obra civil se encuentra terminada, pendiente por entregar. Debido a que la ESE tiene una deuda económica ante AFINIA, lo cual ha imposibilitado que esta empresa de energía autorice la energización. Se han adelantado mesas entre la ESE, ALCALDIA, AFINIA Y EL FONDO para lograr llegar a un acuerdo de pagos sin que a la fecha exista el mismo.</p> <p>Por otra parte, se radicó el 10 de feb 2022, solicitud de descarga de obras previas a la empresa de energía eléctrica de AFINIA para programar maniobra. Afinia programó descarga para marzo de 2022. Otorgado este permiso y realizada la maniobra, el paso siguiente es la programación por parte de AFINIA de la energización para conectarse a la red pública.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	<p>Turbo – Antioquia: Suspendida la obra desde el 24 de marzo, se realizó visita de campo el 17 y 18 de marzo, se realizaron comités de seguimiento cada semana los días martes. Remisión de comunicado a alcalde de Turbo y personería informando razones de suspensión.</p> <p>Mahates – Bolívar: Se suscribió acuerdo de transacción entre la ESE y AFINIA con la finalidad de garantizar el pago y de esta forma obtener la electrificación del proyecto para la fecha de entrega 27 de mayo de 2022.</p> <p>La Vega – Cauca: Durante el periodo se realizó visita de campo el 10 de marzo, remisión de informe de visita de campo al contratista, reunión virtual para observaciones encontradas en visita de campo y reunión presencial para avance en correcciones de observaciones o no conformidades.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Se realiza visita al proyecto para realizar seguimiento en campo, en miras a terminación para abril 2022.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Se realizaron reuniones presenciales y virtuales con la compañía aseguradora. Se realizó una nueva reunión, con los contratistas de obra e interventoría y Sector salud, en la que se informó que no se había recibido el documento de autorización de cesión. Se suscribió acta de ampliación 7 a suspensión 19 del contrato de obra. Con fecha prevista de reinicio el 19 de abril de 2022.</p> <p>Guaranda – Sucre: El 22 de marzo se realizó visita con el fin de notificar los pendientes para su recibo desde el punto de vista de obra blanca, carpintería entre otras. El proyecto cuenta con acta de terminación con pendientes, los cuales el contratista se comprometió a culminar el 22 de abril de 2022. Contando con que la energización sea programada por AFINIA en este periodo.</p>
Abril	<p>Turbo – Antioquia: El contrato se encuentra suspendido hasta el 04 de mayo de 2022 por condiciones negativas de orden público, se suspendió desde el 24 de marzo. Hasta la suspensión del contrato, se estaba ejecutando sin novedades y se encontraba con una desviación positiva de 2%. El contratista a través de gestiones sociales logró que le permitieran reanudar las obras el 5 de mayo de 2022. El Fondo remitió comunicado a la alcaldía de Turbo indicando la situación del contrato y las razones de la suspensión.</p> <p>Mahates – Bolívar: Teniendo en cuenta el retraso que presenta la obra, aunque mínimo representativo, se solicitó al Contratista visita en obra para hacer seguimiento a los compromisos pactados en el acuerdo de transacción suscrito el 3/12/2021, él ratifica que entregará en los tiempos allí acordados. Se hizo reunión con Representantes Legales de contratistas el 25/04/2022.</p> <p>La Vega – Cauca: Se realizaron 3 mesas de trabajo con el contratista de obra e interventoría para coordinar procesos de entrega y verificación de productos necesarios para entregar las obras a la ESE. Se realizó la instalación de la dotación de la sede a fin de proceder con la entrega. se efectuó mesa de trabajo con la ESE y la Secretaria de Salud de Cauca. Se remitieron informes de no conformidades a la interventoría y contratista.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: El contratista continua aunando esfuerzos para lograr la terminación del proyecto, sin contar aún con el número de personal solicitado en campo, durante el mes de abril se le solicitó en varios comunicados que incrementara su personal. Se tramitó la prórroga 9 al proyecto por 16 días, modificando la fecha de terminación y entrega para el 9 de mayo y 9 de junio respectivamente.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Magüi Payan – Nariño: El 18 de abril de 2022, se suscribió acta de ampliación a la suspensión 19 del contrato de obra, teniendo en cuenta que para realizar la cesión de contrato a favor de JV ingeniería debe cumplir con la idoneidad técnica, jurídica y financiera establecida en los estudios previos. Sin embargo, revisada la información allegada no cumplía con el componente técnico. Por lo cual, se prorrogó la suspensión con fecha de reinicio 3 de mayo de 2022 y terminación el 7 de mayo de 2022. Se realizará la cesión de posición contractual inicialmente, y posterior otra modificación ya con el cesionario para incluir la actividad en el contrato de la PTAR, adicionar recursos y prorrogar por 4.5 meses el contrato 76 de 2015. Se prevé finalizar obras civiles en el cuarto trimestre de 2022.</p>
<p>Mayo</p>	<p>Turbo – Antioquia: Se reiniciaron las obras con normalidad, continúan las ejecuciones de las mismas y se realizaron los comités semanales de seguimiento programados, el contratista realizó a la interventoría solicitud de adición de obras no previstas las cuales se encuentran en revisión de esta.</p> <p>La Vega – Cauca: Se realizó mesa de trabajo con la subgerente de proyectos, el contratista, la interventoría, la gobernación del Cauca y la ESE para ver la corrección de las No conformidades para la habilitación de la sede hospitalaria. Se realizó informe de las no conformidades de la sede para corrección del contratista, se efectuó visita de campo del contratista, la interventoría y personal de la ESE para verificación de las correcciones de las no conformidades, se remitió oficio al interventor solicitando el estado de las no conformidades detectadas por la secretaria de salud del cauca para la habilitación del Hospital.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Se programa su entrega protocolaria en junio de 2022.</p> <p>Mahates – Bolívar: Teniendo en cuenta que hay actividades que aún no han sido culminadas por el contratista de Obra y por el Municipio, se tramitó prorroga al AC hasta el 24 de junio de 2022.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Se suscribió cesión contractual, actualmente suspendido y en proceso de prorroga.</p> <p>Guaranda – Sucre: Debido a situaciones de orden público, el contratista no pudo atender los pendientes a subsanar en la obra, por tal motivo se reprograma la entrega para el mes de junio.</p>
<p>Junio</p>	<p>Turbo – Antioquia: Se continua ejecutando las obras sin problemas, se realizó reunión con la alcaldía para seguimiento de compromisos de ejecución de obras complementarias para las redes de servicios públicos, la alcaldía indica inicio de obras de redes de alcantarillado y agua en la primera semana de julio de 2022</p> <p>Mahates – Bolívar: Proyecto que se culminó en su fase de construcción, pero que debió ser suspendido el 23 de junio de 2022 hasta el 6 de julio del mismo año o hasta tanto no sean recibidos los certificados de RETIE y RETILAP para la energización definitiva por parte de AFINIA.</p> <p>La Vega – Cauca: Proyecto terminado en su etapa de construcción, sin embargo, en revisión conjunta con la ESE y la secretaria de Salud de cauca se evidenciaron diferentes no conformidades para la habilitación del servicio, el contratista se encuentra en corrección de estas no conformidades con el propósito de entregar las obras en el tercer trimestre de 2022.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
	<p>Puerto Tejada – Cauca: Terminado con pendientes desde el pasado 9 de mayo de 2022. No se ha podido suscribir el acta por problemas técnicos de las bombas que fueron retiradas del Hospital por garantía.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Durante el mes de junio se realizaron las actividades administrativas necesarias para la lograr la modificación del contrato de obra e interventoría, que permitieran su reinicio. Se suscribió el 23 de junio de 2022, acta de ampliación 2 a suspensión 20 del contrato de obra con fecha de reinicio el 1 de julio de 2022, teniendo en cuenta que se estaba pendiente por cumplir actividades preoperativas por parte del contratista. Adicionalmente se realizaron las gestiones y solicitudes necesarias para la actualización de la licencia de construcción con el municipio, la cual se entregó el 22 de junio de 2022.</p>
(AEB10) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	
Enero	Tibú – Norte de Santander: Se efectuó la suscripción del acta de entrega de la IPS Centro de Salud La Gabarra del municipio de Tibú, por parte del Fondo Adaptación y el alcalde del municipio.
Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	<p>Turbo – Antioquia: El proceso de contratación para la dotación se publicará en el transcurso del mes de abril de 2022.</p> <p>Mahates – Bolívar: El proceso de contratación para la dotación se publicará en el transcurso del mes de mayo de 2022.</p> <p>La Vega – Cauca: Dotación contratada y en proceso de entrega.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Contratos de dotación suscritos (9), y con acta de inicio del pasado 24 de febrero de 2022. A partir de esa fecha se tiene 5 meses para su terminación. Se tiene prevista dotación durante el mes de mayo de 2022. Se realiza visita al proyecto para realizar seguimiento en campo, en miras a terminación para abril 2022.</p>
Abril	<p>Puerto Tejada – Cauca: Todas las mejoras o solicitudes para cumplimiento de norma hechas por parte de la Ingeniera Biomédica del Fondo han sido atendidas, así las cosas se garantiza el producto a entregar. Respecto a la fecha de entrega la misma se modificó por la nueva solicitud de prórroga.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Una vez validado por la interventoría el cumplimiento del contrato, El Fondo realizará visita para validar que todo este al día y sin pendiente alguno para programar la entrega a beneficiario en el cuarto trimestre de 2022.</p> <p>Guaranda – Sucre: Una vez validado por la interventoría cada uno de los pendientes e informado su cumplimiento por interventoría, El Fondo realizará visita para validar que todo este al día y sin pendiente alguno para reprogramar la entrega a beneficiario en el segundo trimestre de 2022.</p>
Mayo	La Vega – Cauca: Sede dotada en su totalidad, se realizó capacitación al personal indicado por la ESE.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Turbo – Antioquia: Se llevo a cabo mesa de trabajo con el equipo de dotación, al cual el contratista le manifestó diferentes consultas con el fin de prever las instalaciones pertinentes para los equipos de dotación. Las profesionales del FONDO remitieron las respuestas a las consultas del contratista sobre equipos y redes.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Se programa su entrega protocolaria para junio de 2022.</p> <p>Mahates – Bolívar: Teniendo en cuenta que hay actividades que aún no han sido culminadas por el contratista de Obra y por el Municipio, se tramitó prorroga al AC hasta el 24 de junio de 2022.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: Se suscribió cesión contractual, actualmente suspendido y en proceso de prórroga.</p> <p>Guaranda – Sucre: Debido a situaciones de orden público, el contratista no pudo atender los pendientes a subsanar en la obra, por tal motivo se reprograma la entrega para el mes de junio.</p>
Junio	<p>Turbo – Antioquia: La obra avanza sin mayores inconvenientes con 52% de avance físico ejecutado.</p> <p>La Vega – Cauca: Proyecto terminado en su etapa de construcción, sin embargo, en revisión conjunta con la ESE y la secretaría de Salud de cauca se evidenciaron diferentes no conformidades para la habilitación del servicio, el contratista se encuentra en corrección de estas no conformidades con el propósito de entregar las obras en el tercer trimestre de 2022.</p> <p>Puerto Tejada – Cauca: Terminado con pendientes desde el pasado 9 de mayo de 2022. No se ha podido suscribir el acta por problemas técnicos de las bombas que fueron retiradas del Hospital por garantía. Hasta no superar los pendientes que permitan la suscripción de acta de terminación no se podrá gestionar la entrega.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: De conformidad con la solicitud de modificación del contrato de obra, se tiene previsto culminar las actividades inherentes a dicho contrato el 17 de diciembre de 2022. Se planificará en el mes de julio con los contratistas tanto de obra como de dotación el ingreso para establecer una fecha de entrega que incluya la dotación.</p> <p>Magüi Payan – Nariño: El 27 de mayo de 2022, se suscribieron las actas de entrega y recibo final de las obras, entre contratista de obra, interventoría y Fondo dado que se atendieron todos los pendientes. Mediante acta de entrega por parte del Fondo Adaptación y recibo a satisfacción por el beneficiario, se entrega la obra al Municipio de Guaranda y la Gerencia de la ESE el pasado 4 de junio de 2022.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

VIVIENDA

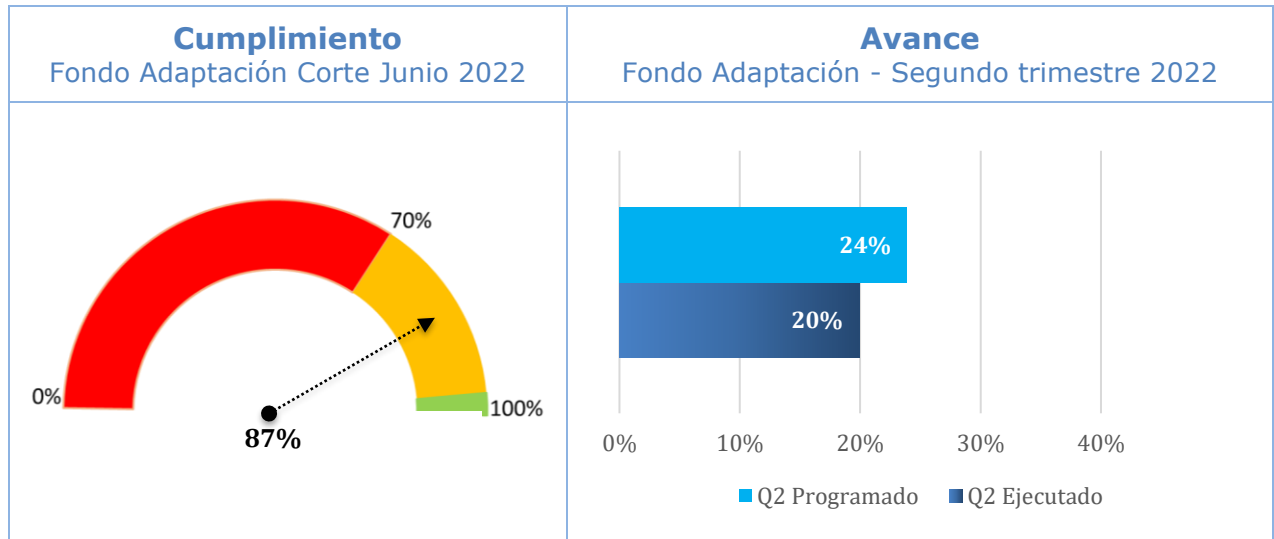

Portafolio/Programa/Proyecto: **VIVIENDA**
Gerente de Meta: Asesor Sector Vivienda

Objetivo Estratégico 2018-2022 #2

Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA26_Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEA26)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	484	279	-	205	-	282
AEA27_Terminar soluciones de vivienda	(AEA27)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	3687	139	570	1179	1799	509*
AEA28_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEA28)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	3570	211	644	540	2175	752*

*Incluye las terminaciones y entregas derivadas de los procesos conciliatorios con los operadores zonales.

Mes	Avance Cualitativo
(AEA26)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	
Enero	<p>El sector Vivienda en el mes de enero suscribió 8 contratos para un total de 277 VIP contratadas, superando en una (1) vivienda la meta definida para el periodo. Las soluciones de vivienda contratadas se dividen así:</p> <p>FA-CD-I-S-175-2022 Antioquia Valparaiso 10 FA-CD-I-S-170-2022 Antioquia La Pintada 6 FA-CD-I-S-172-2022 Atlántico Soledad 60</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>FA-CD-I-S-178-2022 Bolívar San Pablo 61 FA-CD-I-S-177-2022 Cauca Popayán 100 FA-CD-I-S-161-2022 Tolima Casabianca 19 FA-CD-I-S-167-2022 Tolima Ortega 20 FA-CD-I-S-176-2022 Valle Del Cauca Bugalagrande 1</p> <p>Estos contratos representan la futura entrega en 6 departamentos diferentes de 277 soluciones de vivienda a las familias afectadas por la ola invernal.</p>
Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	No existe reporte para el periodo
Abril	Meta del periodo cumplida.
Mayo	Meta del periodo cumplida.
Junio	Meta del periodo cumplida.
(AEA26)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	
Enero	<p>En el mes de enero se lograron terminar los trámites documentales necesarios para el reporte de 9 viviendas nuevas terminadas, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:</p> <p>Departamento de Antioquia, municipio de Vigía del Fuerte, 2 VIP Departamento de Sucre, municipio de San Marcos, 4 VIP Departamento de Nariño, municipio de Peñol, 3 VIP.</p> <p>Del plan inicialmente trazado, no se pudieron reportar 10 viviendas más en el municipio de San Pablo Nariño, cuyas obras se encuentran totalmente terminadas, pero que, por demoras en la definición del suministro de acueducto por parte del municipio, no se pudieron conectar al sistema. Sobre este particular el sector continuo las gestiones para tener una solución.</p>
Febrero	<p>En el mes de febrero el sector Vivienda reportó la terminación de 77 nuevas viviendas, para un acumulado en los dos primeros meses del año de 86 viviendas terminadas. La distribución de estas 77 VIP por departamentos es la siguiente: 21 en Nariño, 1 en César, 35 en Sucre, 1 en Valle del Cauca y 19 en la Guajira. Así, se continúa con un avance muy importante para beneficiar a la población damnificada por la ola invernal, sin embargo, los efectos del fuerte invierno y problemas de orden público han generado rezagos con respecto a la meta por municipio inicialmente definida, los cuales se tienen contemplados, con base en las gestiones realizadas, ir solucionando en el transcurso del trimestre.</p>
Marzo	<p>Las gestiones permanentes adelantadas por el sector permitieron la terminación de 39 y entrega de 35 viviendas en el municipio de Zaragoza, la cual inicialmente se tenía planeada para el mes de diciembre del año en curso, beneficiando de manera anticipada a todas estas familias afectadas por la ola invernal. En el mes de marzo se dio la energización de las viviendas construidas por el Fondo Adaptación con lo cual se logró el reporte de terminación de las mismas.</p>
Abril	<p>Se realizó el reporte de 10 VIP terminadas en el municipio de San Pablo, departamento de Nariño las cuales tienen ya registro de habitabilidad, proceso que se rezagó en espera</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>de la energización por parte del ente territorial. Se continúan los trámites respectivos para el reporte de entrega de las mismas.</p> <p>Con 21 nuevas VIP terminadas y entregadas en el municipio de Soledad, Atlántico, se completan 60 VIPs en este municipio, beneficiando así a la población afectada por la ola invernal.</p> <p>En el municipio de La Cruz, Nariño, las gestiones del FA y las labores realizadas por el contratista, han permitido el reporte de manera anticipado con respecto a la planeación inicial, de 22 nuevas Viviendas terminadas en este municipio, beneficiando así a la comunidad afectada por la fuerte ola invernal, mejorando su calidad de vida.</p>
Mayo	<p>En el mes de mayo se dio el reporte de 2 nuevas viviendas terminadas, con base en el cumplimiento de los documentos requeridos.</p> <p>Con base en las revisiones de soportes y documentos en el mes de mayo se dio el reporte de la terminación de las viviendas asociadas en el municipio de Manaure en el departamento de La Guajira.</p> <p>Con base en las validaciones documentales y revisión de soportes se dio el reporte de la terminación de 3 viviendas nuevas en el municipio de Uribia, en el departamento de la Guajira.</p> <p>Se realizó el reporte de la terminación de 3 viviendas en el municipio de Hatillo de Loba en el departamento de Bolívar.</p> <p>Derivados de las gestiones realizadas en los últimos meses se realizó el reporte de la terminación de 54 viviendas nuevas en el municipio de La Cruz, en el departamento de Nariño</p> <p>En el mes de mayo se realizó el reporte de la terminación de 20 viviendas nuevas en el municipio de Linares, en el departamento de Nariño.</p> <p>En el mes de mayo se realizó el reporte de la terminación de 32 viviendas en el municipio de Tamalameque, en el departamento del Cesar.</p> <p>Gracias a las gestiones realizadas se realizó el reporte en el mes de mayo de la terminación de 5 viviendas en el municipio de Zaragoza, departamento de Antioquia.</p>
Junio	<p>Con el reporte de la terminación de 14 VIP, el sector completa 50 en el municipio de La Cruz bajo, beneficiando así a la población damnificada por la ola invernal</p> <p>Con el reporte de La Guaca Santander se cumple la terminación de las 12 VIP contratadas para ejecución, beneficiando así a la población afectada por la ola invernal en ese municipio.</p>
(AEA28)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	
Enero	<p>El sector vivienda continua las gestiones permanentes para lograr entregar la mayor cantidad de Viviendas a las familias afectadas por la ola invernal. Así, en el mes de enero, gracias al seguimiento realizado se materializó la entrega de 80 nuevas viviendas en diferentes zonas del país, a saber:</p> <p>Antioquia Vigia Del Fuerte 10 Sucre San Marcos 4 Atlántico Campo De La Cruz 1</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Cauca Purace 9 Nariño Peñol 39 Nariño Imues 17</p> <p>Este resultado supera la meta proyectada para este mes y permite anticipar las entregas planeadas para meses futuros.</p>
Febrero	<p>En el mes de febrero el sector Vivienda reportó la Entrega de 23 nuevas viviendas, para un acumulado en los dos primeros meses del año de 103 viviendas nuevas entregadas a la población afectada a lo largo del país. La distribución de estas 23 VIP por departamentos fue así: 1 en Nariño, 1 en Cesar, 1 en Valle del Cauca, 1 en Magdalena y 19 en la Guajira.</p> <p>El invierno que se ha presentado en el país y problemas de orden público aislados han afectado la normalidad del desarrollo de algunos contratos generando una desviación negativa en el avance de las obras y los trámites de escrituración, con lo cual existe un rezago en el avance acumulado con respecto a la meta inicial que se proyecta con base en las gestiones realizadas solucionar en los próximos meses.</p>
Marzo	<p>Las gestiones permanentes adelantadas por el sector permitieron la terminación de 39 y entrega de 35 viviendas en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico; asimismo, se logró no solo la terminación, sino también la entrega de 19 VIP a igual número de familias afectadas en el municipio de Zaragoza.</p> <p>En Málaga – Santander, la energización de las viviendas terminadas por el Fondo Adaptación permitió la entrega a la comunidad de 20 nuevas VIP para beneficiar a la población afectada por la ola invernal.</p> <p>En el mes de marzo se dio la entrega de 19 VIP en el municipio de Colón, Nariño y se continúan las gestiones con el ente territorial quien tiene a cargo el descole del servicio de alcantarillado de 11 VIP restantes, trámite necesario para proceder al reporte de terminación y entrega definitiva a la comunidad.</p> <p>Adicionalmente, se realizó la entrega de 33 VIP a la comunidad afectada por la ola invernal del municipio de Caimito, en el departamento de Sucre. Con este avance, queda pendiente el reporte de la entrega de 2 VIP ya terminadas, para finalizar así la meta establecida en este municipio.</p>
Abril	<p>En el mes de abril se realizó el reporte de la entrega de 26 nuevas VIP en el municipio de Corinto, departamento del Cauca en el marco del contrato 2016-C-0178, beneficiando así al mismo número de familias en este municipio. En este contrato ya se han entregado 140 viviendas repartidas en los departamentos de Cauca y Nariño.</p> <p>Con el reporte de las 2 viviendas entregadas en el municipio de Caimito, departamento de Sucre, se completa el total de las 35 VIP planeadas en el marco del contrato 2016-C-0188 para entregar a esta comunidad, dando cumplimiento al plan definido para la presente vigencia y beneficiando a la comunidad damnificada.</p> <p>El reporte de 21 nuevas VIP entregadas en el municipio de Soledad Atlántico permiten beneficiar a más de 56 familias del departamento.</p> <p>La entrega de 22 VIP en el municipio de la Cruz - Nariño, representa una oportunidad de mejorar la calidad de vida de igual número de familias beneficiadas. Las buenas gestiones del FA permitieron adelantar la entrega planeada inicialmente para el mes de junio del presente año.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
<p>Mayo</p>	<p>Con el reporte de la entrega de 9 vip en el municipio de Puracé, departamento de Cauca, el FA llega a 18 viviendas nuevas en este municipio en el marco de este proyecto.</p> <p>En el marco del proyecto Peños – Nariño, con la entrega de 1 VIP nueva, se llega a un total de 41 soluciones de vivienda entregadas.</p> <p>En el marco del proyecto en Lorica – Córdoba, con la entrega de 2 VIPs nuevas, se llega a un total de 279 soluciones de vivienda entregadas en el municipio de Lorica, de las cuales disfrutan igual número de familias vulnerables y que en su momento fueron afectadas por la ola invernal, pero ahora se encuentran en mejores condiciones de vida.</p> <p>En el marco del proyecto de Ayapel – Córdoba, con la entrega de 1 VIP nueva, se llega a un total de 166 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p> <p>En el marco del proyecto en Dibulla – La Guajira, se entregaron 18 VIPs nuevas en el municipio.</p> <p>En el marco del proyecto en Manaure – La Guajira, con la entrega de 8 VIPs nuevas, se llega a un total de 46 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p> <p>En el marco del proyecto en Maicao – La Guajira, con la entrega de 13 VIPs nuevas, se llega a un total de 29 soluciones de vivienda entregadas en el municipio de Maicao, de las cuales disfrutan igual número de familias vulnerables y que en su momento fueron afectadas por la ola invernal, pero ahora cuentan con mejores condiciones de vida.</p> <p>En el marco del proyecto en Uribia - La Guajira, con la entrega de 3 VIPs nuevas, se llega a un total de 118 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p> <p>Hatillo de Loba – Bolívar: En el marco de este proyecto y gracias a las gestiones adelantadas desde el FA, con la entrega de 9 VIPs nuevas, se llega a un total de 261 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p> <p>Se entregaron 54 VIPs nuevas en el municipio de La Cruz, de las cuales disfrutan igual numero de familias.</p> <p>En el marco del proyecto en Linares – Nariño, con la entrega de 20 VIPs nuevas, se llega a un total de 37 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p> <p>Soledad – Atlántico: Con la entrega de 3 VIPs nuevas, se llega a un total de 59 soluciones de vivienda entregadas en el municipio.</p> <p>Con la entrega de 32 VIPs nuevas, se llega a un total de 68 soluciones de vivienda entregadas en el municipio de Tamalameque en Cesar, de las cuales disfrutan igual número de familias vulnerables y que en su momento fueron afectadas por la ola invernal.</p> <p>Con la entrega de 5 VIPs nuevas, se llega a un total de 24 soluciones de vivienda entregadas en el municipio de Zaragoza – Antioquia.</p>
<p>Junio</p>	<p>El Fondo Adaptación completa 60 VIP entregadas en Soledad – Atlántico, cumpliéndole así al país y al departamento.</p> <p>El departamento de Nariño ha sido afectado por la ola invernal de manera constante, la entrega de 14 nuevas VIP por parte del Fondo Adaptación, permite completar solo en este contrato, 50 VIP entregadas a igual número de familias, que ven como su calidad de vida mejora gracias a las acciones realizadas por la entidad.</p>


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>El Fondo Adaptación ha entregado 12 nuevas VIP a familias afectadas por la ola invernal en el municipio de Guaca - Santander, permitiendo mejorar la calidad de vida de igual número de familias.</p> <p>Es importante tener en cuenta que el consolidado de terminaciones y entregas del primer semestre del año 2022, incluye el registro de 86 terminaciones y 196 entregas logradas como resultado del cierre de los planes de intervención con los operadores zonales. A pesar de que los contratos suscritos con los operadores zonales están inmersos en demandas judiciales, se han venido adelantando acuerdos conciliatorios, para que se avance con unidades habitacionales que cumplan con las condiciones de haber sido terminadas, entregadas y legalizadas, bajo la modalidad de reubicación y reconstrucción.</p> <p>En este sentido se registran en la base de datos de entregas, las viviendas con operadores zonales que se entienden como legalizadas al cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escritura pública y certificado de tradición (Para la modalidad de reubicación) • Inscripción en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (para la modalidad de reconstrucción)

Seguimiento al Plan de Acción regionalizado y por Subgerencia

Subgerencia de Riesgos

La Subgerencia de Riesgos, adicional al macroproyecto La Mojana, Canal del Dique y Río Fonce, lidera la ejecución de proyectos y de soluciones de vivienda en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca.

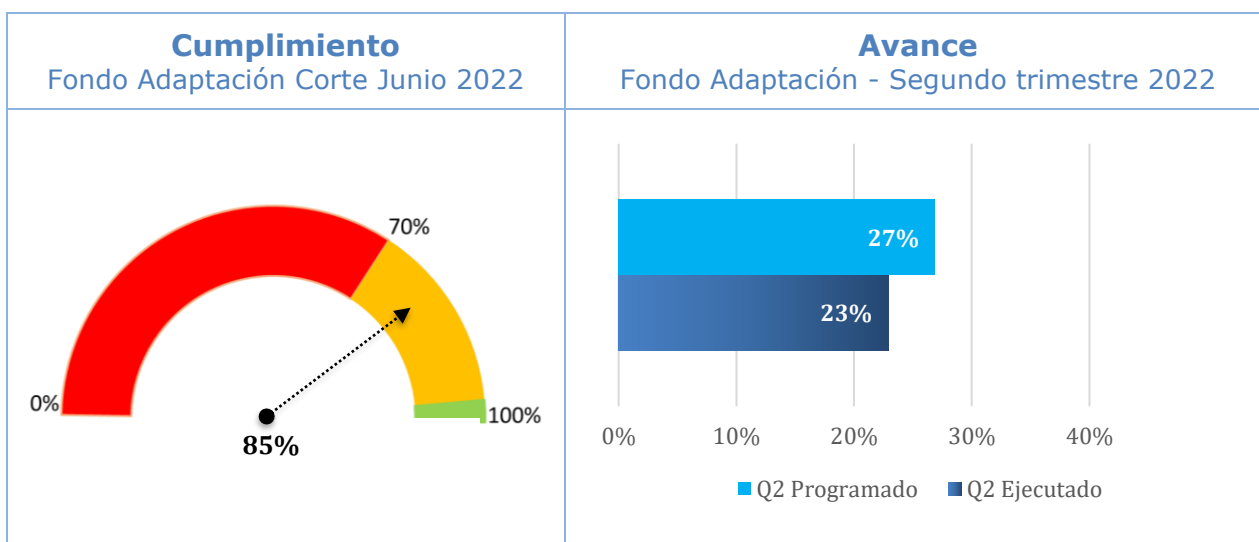

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Las metas en términos de intervenciones en cada uno de los departamentos que lidera esta Subgerencia en contratación, terminación y entrega son las siguientes:

Proyectos

Departamento	Fase	Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Atlántico	Contratar						N.A.
	Terminar	3		2		1	0
	Entregar	2			2		1*
Bolívar	Contratar	2		1	1		0
	Terminar	5	2	2	1		2
	Entregar	8		5	3		0
Nariño	Contratar						N.A.
	Terminar	1		1			0
	Entregar	2		1	1		0
Sucre	Contratar	1	1				1
	Terminar	6	1	1	4		1
	Entregar	6		1	2	3	1
TOTAL	Contratar	3	1	1	1	0	1
	Terminar	15	3	6	5	1	3
	Entregar	18	0	7	8	3	2

*Meta adelantada del 2023 correspondiente a la entrega formal del Alcantarillado de Santa Lucía- Atlántico.

Durante el segundo trimestre se logró la entrega de centro de salud ubicado en Guaranda – Sucre y el avance del 92% en la gestión predial del Macroproyecto Canal de Dique.

Soluciones de Vivienda

Departamento		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Atlántico	Contratar	60	60				60
	Terminar	130				130	65
	Entregar	131	1			130	128
Bolívar	Contratar	78	61		17	0	61
	Terminar	491			1	490	3
	Entregar	497				497	9
Córdoba	Contratar						N.A.
	Terminar						N.A.
	Entregar	3	2			1	3
Nariño	Contratar	58			58		N.A.
	Terminar	525	45	327	105	48	192
	Entregar	616	126	337	105	48	288
Sucre	Contratar						N.A.


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Departamento		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
	Terminar	648	39		280	329	39
	Entregar	378	39		280	59	39
Valle del Cauca	Contratar	1			1		1
	Terminar	1				1	1
	Entregar	1				1	1
TOTAL	Contratar	197	121		76		122
	Terminar	1795	84	327	386	998	300
	Entregar	1626	168	337	385	736	468

En relación con las soluciones de vivienda, en el segundo trimestre de la vigencia se terminaron 186 y entregaron 281 inmuebles ubicados en 31 municipios de los departamentos del Atlántico, Bolívar, Córdoba, Nariño y Sucre.

Subgerencia de Proyectos

La Subgerencia de Proyectos lidera las gestiones asociadas a la ejecución de proyectos y de soluciones de vivienda en los departamentos de Antioquia, Arauca, Casanare, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Santander, Norte de Santander y Risaralda.

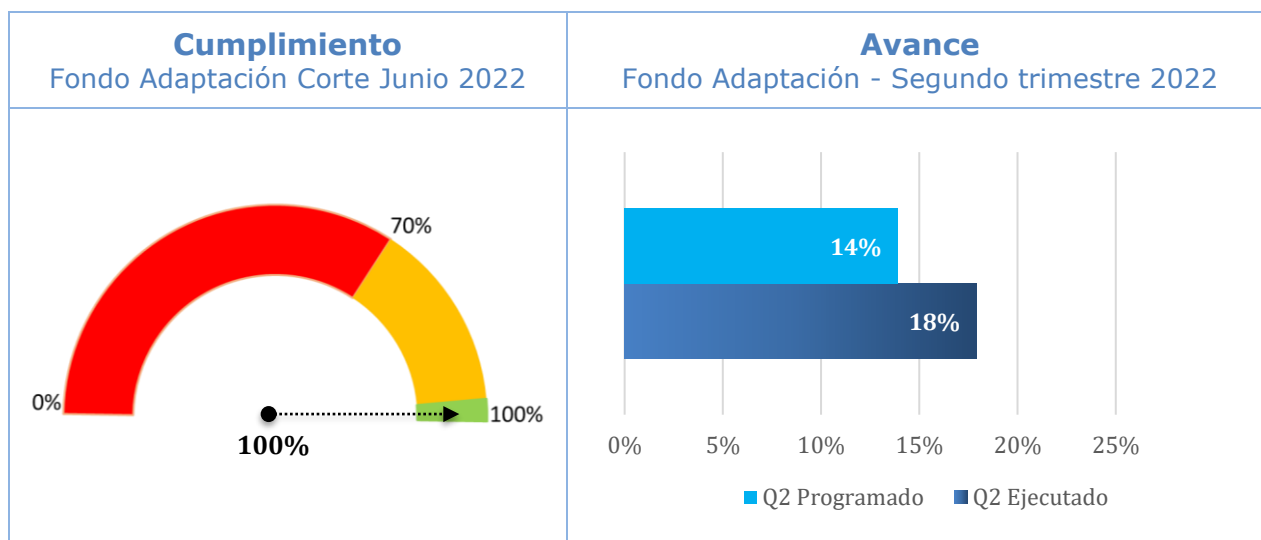

Las metas y avances en términos de intervenciones en cada uno de los departamentos que lidera esta Subgerencia en contratación, terminación y entrega son las siguientes:

Proyectos

Departamento	Fase	Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Antioquia	Contratar						N.A.
	Terminar	1			1		N.A.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Departamento	Fase	Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
	Entregar	1				1	N.A.
Arauca	Contratar						N.A.
	Terminar	1		1			1
	Entregar	1		1			0
Casanare	Contratar						N.A.
	Terminar	1			1		1
	Entregar	1				1	1
Cauca	Contratar						N.A.
	Terminar	2		2			1
	Entregar	4	2	2			2
Norte de Santander	Contratar						N.A.
	Terminar	1			1		N.A.
	Entregar	4	1	1		2	2
Santander	Contratar						N.A.
	Terminar	1			1		N.A.
	Entregar	4				4	N.A.
Transversal	Contratar						N.A.
	Terminar	4				4	N.A.
	Entregar	5			1	4	N.A.
TOTAL	Contratar	0	0	0	0	0	N.A.
	Terminar	11	0	3	4	4	3
	Entregar	20	3	4	1	12	5

Durante el segundo trimestre del año se logró la terminación de la obra de infraestructura de sitios críticos correspondiente al Puente de La Colorada en el Departamento de Arauca, la terminación del Hospital Nivel I de La Vega ESE Suroriente en Cauca; así como las entregas del proyecto Reactivar Panela en El Tambo – Cauca y una solución de alcantarillado en el municipio de Cúcuta – Norte de Santander.

Soluciones de Vivienda

Departamento		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Antioquia	Contratar	65	16	0	49	0	21
	Terminar	161	21	0	16	124	26
	Entregar	169	10	19	0	140	34
Boyacá	Contratar						N.A.
	Terminar	15				15	N.A.
	Entregar	15				15	N.A.
Cauca	Contratar	101	100		1		100
	Terminar	3	2		1		46
	Entregar	46		45		1	112
Cundinamarca	Contratar	1			1		N.A.
	Terminar	65			1	64	N.A.


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Departamento		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
	Entregar	65				65	N.A.
La Guajira	Contratar						N.A.
	Terminar	881		59	625	197	72
	Entregar	881		59	52	770	72
Meta	Contratar	1			1		N.A.
	Terminar	1				1	N.A.
	Entregar	1				1	N.A.
Norte Santander	Contratar						N.A.
	Terminar	114				114	N.A.
	Entregar	114				114	N.A.
Risaralda	Contratar						N.A.
	Terminar	20			20		N.A.
	Entregar	20			20		N.A.
Santander	Contratar	65			65		N.A.
	Terminar	97	32		35	30	32
	Entregar	97	32		9	56	32
TOTAL	Contratar	233	116		117		121
	Terminar	1357	55	59	698	545	176
	Entregar	1408	42	123	81	1162	250

Respecto a las soluciones de vivienda, en el segundo trimestre de la vigencia se terminaron 116 y entregaron 173 inmuebles ubicados en 23 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, La Guajira y Santander.

Subgerencia de Estructuración

Esta Subgerencia lidera la ejecución de proyectos y de soluciones de vivienda en los departamentos de Amazonas, Caldas, Cesar, Chocó, Magdalena, Huila y Tolima.

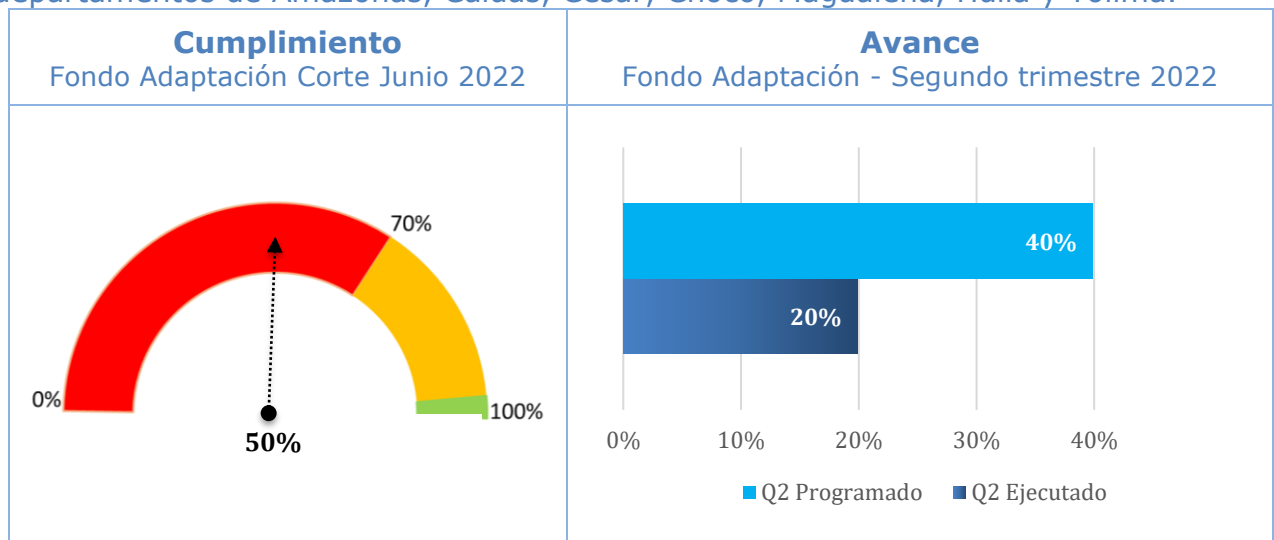

Las metas y avances de las intervenciones en cada uno de los departamentos que lidera esta Subgerencia, en contratación, terminación y entrega, son las siguientes:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Proyectos

Departamento	Fase	Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Cesar	Contratar						N.A.
	Terminar	4	2		2		3
	Entregar	4		2		2	0
Chocó	Contratar						N.A.
	Terminar	2				2	N.A.
	Entregar						N.A.
Magdalena	Contratar						N.A.
	Terminar	2			2		N.A.
	Entregar	5	3			2	2
Tolima	Contratar						N.A.
	Terminar	1				1	N.A.
	Entregar	2		1		1	0
TOTAL	Contratar						N.A.
	Terminar	9	2		4	3	3
	Entregar	11	3	3		5	2

Durante el segundo trimestre del año se logró la terminación del acueducto y PTAP en el municipio de Aguachica en el departamento del Cesar y la entrega de la Sede Educativa EUM Darío Vásquez Caballero ubicada en Remolino – Magdalena.

Soluciones de Vivienda

Departamento		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Amazonas	Contratar						N.A.
	Terminar	64			64		N.A.
	Entregar	64			64		N.A.
Caldas	Contratar	12			12		N.A.
	Terminar	1			1		N.A.
	Entregar	1				1	N.A.
Cesar	Contratar						N.A.
	Terminar	53		33	20	0	33
	Entregar	53		33		20	33
Huila	Contratar						N.A.
	Terminar	50				50	N.A.
	Entregar	50				50	N.A.
Magdalena	Contratar						N.A.
	Terminar	287	0	151	10	126	0
	Entregar	288	1	151	10	126	1
Tolima	Contratar	39	39				39

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Departamento		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
	Terminar	80				80	N.A.
	Entregar	80				80	N.A.
TOTAL	Contratar	51	39	0	12	0	39
	Terminar	535	0	184	95	256	33
	Entregar	536	1	184	74	277	34

Frente a las soluciones de vivienda, en el segundo trimestre de la vigencia se terminaron y entregaron 32 inmuebles ubicados en el municipio de Tamalameque – Cesar.

Adicionalmente, en esta Subgerencia, como su nombre lo indica, se gestionan las acciones relacionadas con la estructuración técnica y financiera de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. En este sentido sus indicadores no regionalizables para la vigencia 2022 son:

Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades /Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Objetivo Estratégico 2018-2022 #1	Identificar, Estructurar Y Ejecutar Grandes Proyectos Integrales Y Sostenibles De Reducción Del Riesgo Ante El Cambio Climático						
Objetivo Estratégico 2018-2022 #2	Gestionar Y Ejecutar Proyectos De Recuperación Post-Desastre Dirigidos A Reducir La Vulnerabilidad De La Infraestructura Y Las Comunidades Frente Al Riesgo Ante El Cambio Climático						
Estructurar el 100% de los estudios de sector y mercado de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y macroproyectos	Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	100%	25%	25%	25%	25%	50%
Evaluación técnica, financiera y económica de las diferentes modalidades de contratación de la Entidad.	Procesos evaluados técnica y financ./Evaluaciones designadas por SG	100%	25%	25%	25%	25%	50%
Identificar y / o establecer y/o actualizar políticas y lineamientos, para la priorización y/o estructuración de los proyectos desfinanciados y/o nuevos proyectos de la Entidad	Proyectos o lineamientos identificados o analizados/Proyectos o lineamientos nuevos o desfinanciados	100%	25%	25%	25%	25%	50%
Revisión ítems o APU´s contractuales adicionales / no previstos de los contratos en ejecución	Revisión ítems o APU's contratos/Modificaciones contractuales	100%	25%	25%	25%	25%	50%

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	
Enero	<p>Durante el mes de enero, se estructuraron los siguientes estudios de sector de acuerdo con las necesidades técnicas radicadas en la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 384-41123, ubicado en corregimiento de Ceilán, Municipio de Bugalagrande, departamento de Valle del Cauca, para dar cumplimiento al fallo judicial 2020-00134-00 sentencia No. 077 a favor del señor Lisímaco Mesías López. • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Antioquia, municipio Valparaíso. • Proveer soluciones de vivienda en el departamento del atlántico • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Tolima, municipio Casabianca. • Proveer soluciones de vivienda en el departamento del bolívar. • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Antioquia, municipio la pintada. • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Cauca • Prestar los servicios de soporte, mantenimiento y administración del Software SGD - INFODOC Gestión de Correspondencia para el Fondo Adaptación. • Aunar esfuerzos entre el FONDO ADAPTACIÓN y LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN para brindar seguridad y protección integral a la Gerente del Fondo Adaptación, de acuerdo con el trámite de emergencia dictado y/o el resultado que arroje el estudio de nivel de riesgo. • Prestar servicios profesionales de asesoría jurídica especializada y de representación judicial del Fondo Adaptación en casos en donde sea parte la entidad y que se presenten controversias, incluyendo todos los actos procesales vinculados al mandato otorgado en cada caso, a efectos de garantizar la mejor defensa de los intereses litigiosos de la entidad, así como en mecanismos de arreglo directo y prevención del daño antijurídico.
Febrero	<p>Durante el mes de febrero, se estructuraron los siguientes estudios de sector de acuerdo con la necesidades técnicas radicadas en la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar los estudios de patología estructural y constructiva, análisis de vulnerabilidad sísmica y diseños de reforzamiento estructural del puente vehicular Hisgaura ubicado en el Departamento de Santander – carretera Málaga – los Curos. • Construcción, terminación y entrega de las viviendas, del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote en el departamento de Norte de Santander. • Prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada de las viviendas y de las obras sin entregar a los beneficiarios en el municipio de gramalote – norte de Santander
Marzo	<p>Durante el mes de marzo, se estructuraron los siguientes estudios de sector de acuerdo con la necesidades técnicas radicadas en la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestar los servicios de monitoreo de medios para hacer seguimiento, sistematización y análisis de las informaciones que se registran en radio, prensa, televisión, revistas, páginas web y redes sociales que hagan referencia directa o indirecta al Fondo Adaptación y/o sus temas de interés. • Suministro de tiquetes aéreos para el desplazamiento de funcionarios y colaboradores del Fondo Adaptación.
Abril	<p>Durante el mes de abril, se estructuraron los siguientes estudios de sector:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestar servicios profesionales de perito, en el marco de la acción de controversias contractuales ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA promovido por el Fondo Adaptación en contra de PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S, Constructora A & C, Confianza y Liberty Seguros S.A. • Realizar el diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de avalúos comerciales de predios a nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación.
Mayo	<p>Durante el mes de mayo, se estructuraron los siguientes estudios de sector:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar la interventoría integral al diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali. Proceso publicado en el sistema SECOP II el 20 de mayo. • Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar. Proceso publicado en el sistema SECOP II el 20 de mayo. • Prestar servicios profesionales de perito, en el marco de la controversia contractual suscitada entre la UNIÓN TEMPORAL NUEVO GRAMALOTE y el Fondo Adaptación con ocasión de la ejecución del contrato 165 de 2015. • Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para la IPS empresa social del estado hospital local de Mahates ubicada en el municipio de Mahates.
Junio	<p>Durante este mes, se realizó los respectivos estudios de sector y mercado de los procesos definidos en el PAA de acuerdo a los insumos recibidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratar los productos y servicios de Google G - SUITE para el Fondo Adaptación, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-139-IAD-2020, y en la orden de compra respectiva. • Prestar el servicio de vigilancia para la infraestructura y equipos del hospital local de Mahates ubicada en el municipio de Mahates (Bolívar) del Fondo Adaptación.
Procesos evaluados técnica y financ./Evaluaciones designadas por SG	
Enero	<p>Durante el mes de enero, se asignó a la Subgerencia de Estructuración la evaluación financiera de los procesos: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para las IPS empresa social del estado suroriente E.S.E del municipio de la vega y empresa social del estado norte 3 – ese del municipio de puerto tejada en el departamento del cauca, centro de salud Saul Quiñones E.S.E. del municipio de Magui Payan en el departamento de Nariño y hospital San Vicente de Paul del municipio de Gramalote en el departamento de Norte de Santander</p>
Febrero	<p>Durante el mes de febrero, se designó la evaluación financiera y económica a la Subgerencia de Estructuración del siguiente proceso: Realizar acompañamiento socioeconómico a las familias beneficiarias del programa de vivienda del Fondo Adaptación en la modalidad de reubicación en la zona de la Mojana mediante la estructuración, implementación y asistencia técnica de las medidas tendientes a la recuperación de las redes económicas y sociales de la población.</p>
Marzo	<p>Durante el mes de marzo, a la Subgerencia de Estructuración se le designaron las siguientes evaluaciones financieras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suministro de tiquetes aéreos para el desplazamiento de funcionarios y colaboradores del Fondo Adaptación. • Verificación de la cesión de los requisitos financieros del proyecto: construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011, en los departamentos de magdalena y cesar.
Abril	<p>Durante el mes de abril, se designó la evaluación financiera de la siguiente cesión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción del Centro De Salud Saul Quiñonez En El Municipio De Magüi Payan - Departamento De Nariño de acuerdo con estudios y diseños, planos de construcción,

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
	especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto, anexos a estos Estudios Previos.
Mayo	Durante el mes de mayo, no se le designo la evaluación financiera y económica de procesos
Junio	Durante este mes, se evaluó financiera y económicamente los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none"> • Realizar el diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali. • Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para la IPS empresa social del estado hospital local de Mahates ubicada en el municipio de Mahates (Bolívar). • Elaboración de avalúos comerciales de predios a nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación.
Proyectos o lineamientos identificados o analizados/Proyectos o lineamientos nuevos o desfinanciados	
Enero	Durante este mes, no se requirió la actualización de lineamientos ni manuales en la entidad.
Febrero	Durante el mes de febrero, se realizó la actualización del Anexo Técnico de vivienda: donde se establecen los condiciones y especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los proyectos de vivienda financiados por el Fondo Adaptación en sus diferentes modalidades
Marzo	Durante este mes, no se requirió la actualización de lineamientos ni manuales en la entidad.
Abril	Durante este mes, no se requirió la actualización de lineamientos ni manuales en la entidad.
Mayo	Durante este mes, no se requirió la actualización de lineamientos ni manuales en la entidad.
Junio	Durante este mes, no se requirió la actualización de lineamientos ni manuales en la entidad.
Revisión ítems o APU's contratos/Modificaciones contractuales	
Enero	Durante este periodo, se asignaron a la subgerencia de estructuración la revisión de las siguientes modificaciones contractuales y APUS: <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los costos para el suministro e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales contrato de obra no. 076 de 2015, celebrado entre el fondo adaptación y la unión temporal infraestructura hospitalaria 2017 porti -jv 2017. proyecto: construcción de la ips saul quiñones del municipio de maguí payán, departamento de Nariño. • Revisión de los costos de adición por mayor permanencia contrato de interventoría no. 082 de 2015, celebrado entre el fondo adaptación y g.o.c. sucursal Colombia, que tiene como objeto "realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental, sobre el contrato de obra para la construcción de la ips saúl quiñones del municipio de maguí payan, Nariño.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Febrero	Durante el mes de febrero, no se le asignó a la Subgerencia de Estructuración la revisión de APUS y adiciones por partes de los sectores y macroproyectos.
Marzo	Durante el mes de marzo, la Subgerencia de Estructuración realizó la revisión de los siguientes apus e ítems no previstos de acuerdo con lo solicitado: <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de obra NO. FA-LP-I-S-003-2021, cuyo objeto es "reconstrucción de redes de alcantarillado en la avenida la paz del casco urbano del municipio de cimitarra – Santander" • Contrato de obra pública NO. FA-IC-I-S-151-2020, cuyo objeto es "rehabilitación sistema tratamiento de aguas residuales municipio de candelaria - atlántico".
Abril	Durante el mes de abril, no se le asignó la revisión de APUS y adiciones por partes de los sectores y macroproyectos
Mayo	Durante el mes de mayo, se realizó la revisión del Contrato de obra NO. FA-LP-I-S-001-2021, cuyo objeto es "rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y Juntas de Tamaná, municipio de Nóvita – departamento del Choco.
Junio	Durante este mes, se solicitó la revisión del contrato de obra no. fa-lp-i-s-001-2021, cuyo objeto es "rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y juntas de Tamaná, municipio de Nóvita – departamento del choco".

Gerencia

Conforme a la Resolución 200 de 2022 y con la finalidad de "garantizar una Entidad con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de los ciudadanos y cumplir con los objetivos estratégicos", la Gerencia lidera para el año 2022 las acciones integrales de los macroproyectos Jarillón de Cali y Gramalote; así, como las soluciones de vivienda que en el marco de estos macroproyectos se encuentran programadas para ser contratadas, terminadas o entregadas en los departamentos de Valle del Cauca y Norte de Santander.

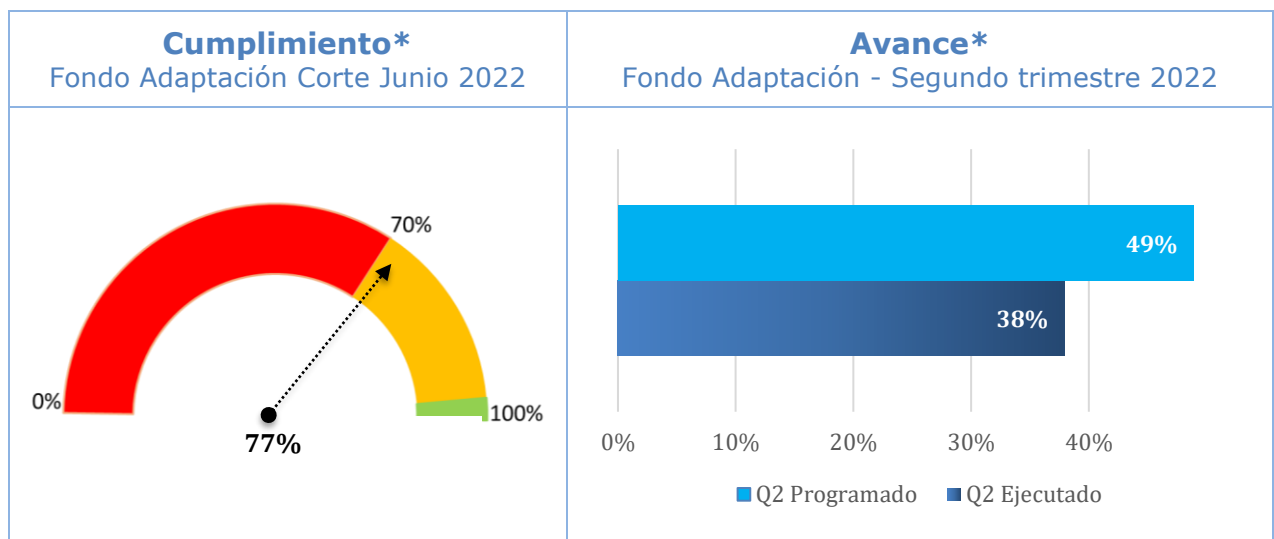

*Incluye los indicadores de comunicaciones, que corresponden a objetivos estratégicos transversales.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Las metas y avances en términos de intervenciones en cada uno de los macroproyectos y departamentos que lidera la Gerencia son las siguientes:

Proyectos

Macroproyecto	Fase	Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Valle del Cauca - Jarillón de Cali	Contratar	1		1			0
	Terminar	5	1	2	1	1	1
	Entregar	6		1	3	2	1
Norte de Santander Gramalote	Contratar						N.A.
	Terminar	1	1				1
	Entregar	2	2				2
TOTAL	Contratar	1	0	1	0	0	0
	Terminar	6	2	2	1	1	2
	Entregar	8	2	1	3	2	3

Avanzando en el cumplimiento de las metas, durante el segundo trimestre del año se entregó al municipio de Cali 11,39 kilómetros de Jarillón reforzado, en el Valle del Cauca; asimismo, se le entregaron el Municipio de Gramalote en Norte de Santander, la Casa de la Cultura y la Casa del Campesino.

Soluciones de Vivienda

Departamento		Meta 2022	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	Avance Meta
Valle del Cauca	Contratar	800	0	400	400	0	0
	Terminar	400	0	380	0	20	120
	Entregar	400	0	0	0	400	140
Norte de Santander (Gramalote)	Contratar	128	0	128	0	0	0
	Terminar	72	0	0	0	72	N.A.
	Entregar	67	0	0	0	67	N.A.
TOTAL	Contratar	928	0	528	400	0	0
	Terminar	472	0	380	0	92	120
	Entregar	467	0	0	0	467	140

Durante el segundo trimestre se terminaron 60 soluciones de vivienda para los beneficiarios focalizados por el Macroproyecto Jarillón de Cali, en el departamento del Valle del Cauca y se entregaron 132 inmuebles.

3. 2. Objetivos Estratégicos Transversales

En concordancia con el ejercicio de perspectiva de planeación 2022 y los objetivos estratégicos institucionales, en este aparte se hace seguimiento a las acciones estratégicas desde la perspectiva interna, las cuales contemplan los resultados del cliente interno.


En consecuencia, a continuación, se ilustra el seguimiento a 44 indicadores y metas relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva interna, la cual incluye específicamente los objetivos estratégicos 5 y 6 con algunos resultados clasificados en los objetivos 3 (Acciones de Gestión del Conocimiento) y 4 (Acciones de Gestión Social).

Las acciones para el logro de estas metas son ejecutadas por la Subgerencia de Regiones, la Oficina de Comunicaciones, la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría General.

- Área Subgerencia de Regiones

En la Subgerencia de Regiones se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Política Institucional de Gestión Social de los Proyectos, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Política de Gestión y Desempeño de PARTICIPACIÓN CIUDADANA la cual hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

Esta intervención se ejecuta por intermedio de un equipo social involucrado en los proyectos, los cuales actúan a través de las estrategias de: (i) Auditorías Visibles, (ii) Comités Regionales De Seguimiento – CORES y, (iii) Acompañamiento Social.

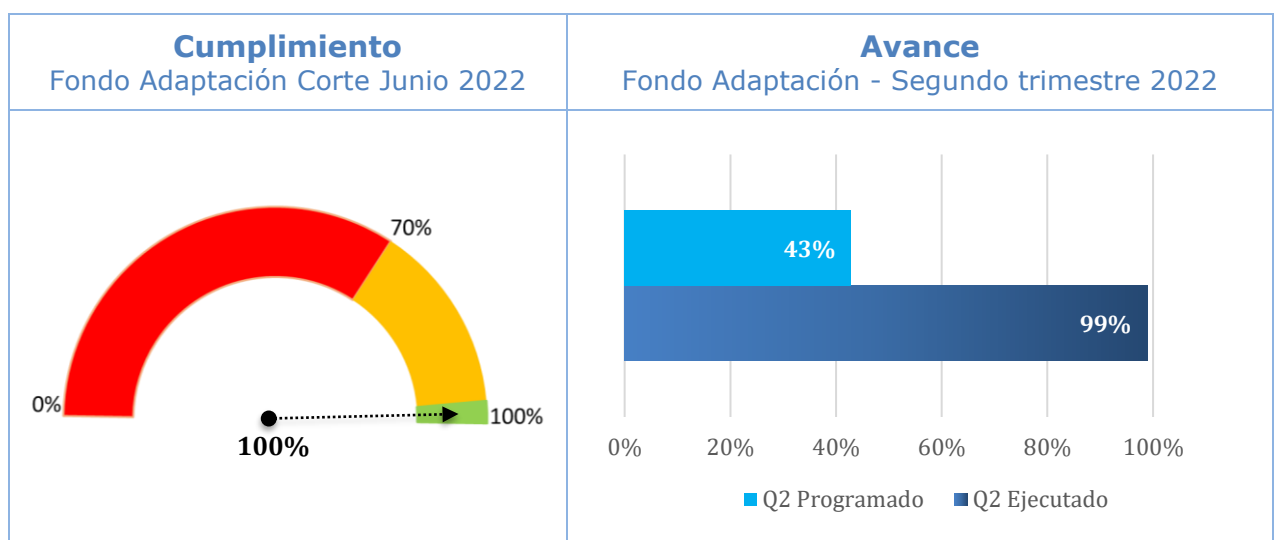

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

A continuación, se detallan los indicadores, metas y distribución trimestral de metas de la Subgerencia de Regiones para el año 2022:

Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN SOCIAL**

Gerente de Meta: Subgerente de Regiones

Objetivo Estratégico 2018-2022 #4		Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población					
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades /Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES) PAAC-2022	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES), implementada	152	25	30	49	48	170
Implementar la Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social* (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales) PAAC-2022	Política de Interacción y Sostenibilidad Social (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales), implementada	186	40	48	50	48	172
Realizar seguimientos a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana	Seguimientos a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, realizados	12	3	3	3	3	6

PAAC-2022: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2022 (Decreto 612/2018).

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

Mes	Avance Cualitativo
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES), implementada	
Enero	<p>En el mes de enero para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> -AV acompañadas: 9 en los sectores Vivienda, salud y Educación. -Fortalecimiento ELS/Comunidad/profesionales sociales: 5 en los sectores de Vivienda y Salud
Febrero	<p>Participación Ciudadana: 28</p> <p>En el mes de febrero para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AV acompañadas: 8 en los sectores de vivienda, salud, educación, y saneamiento y agua potable. • Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 18 Vivienda, salud,

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	educación, saneamiento y agua potable y en la región de La Mojana. <ul style="list-style-type: none"> • CORES: 2 en vivienda y salud.
Marzo	Participación Ciudadana: 41 En el mes de marzo para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron: <ul style="list-style-type: none"> - AV acompañadas: 12 en los sectores de vivienda, salud, educación, y saneamiento y agua potable. - Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 29 en los sectores de vivienda, salud y educación. En el repositorio de seguimiento al Plan de Acción se evidencia el detalle por cada una de las AV acompañadas, capacitaciones o CORES reportados, con fecha de realización.
Abril	Participación Ciudadana: En el mes de abril para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron 26 actividades, así: <ul style="list-style-type: none"> • AV acompañadas: 5 • Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 20 • Comités regionales de seguimiento – CORES: 1 A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector: <p>VIVIENDA</p> <p>CORES 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20/04/2022. Realización de CORES - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO y ALCALDÍA DE SANTA LUCÍA, para tratar tema de invasión proyecto en Santa Lucía - Atlántico. <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 21/04/2022. Mesa de Trabajo Comunitaria - Sorteo de vivienda Urbanización Bosques del Ciprés - Cto 242 de 2021, 50 viviendas en Neiva - Huila. - Mixta. Paola 2. 24/04/2022. Socialización Comunitaria Sorteo de viviendas compraventa proyecto Urbanización Villa Yeimy - 20 viviendas - Cto. 228 de 2020 Tamalameque - Cesar. <p>Capacitaciones Contratistas, ELS/ Comunidad: 16</p> <p>a. Capacitaciones Contratistas: 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20/04/2022. Lineamientos Sociales para entrega de Proyectos de compraventa de Nariño. <p>b. Capacitaciones ELS: 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1/04/2022. Capacitación ELS - Cto. 105-2019 - Urbanización San Francisco Mallama, Nariño. Comunicación asertiva y liderazgo. 2. 1/04/2022. Capacitación ELS - Cto.226-2018. - Urbanización San Francisco - Mallama - Nariño. - Comunicación asertiva y liderazgo. 3. 18/04/2022. Capacitación ELS - Proyecto de vivienda Urbanización Sueños de Paz - Cto. 104-2020 - Los Andes Sotomayor, Nariño. - Plan de acción para la sostenibilidad. 4. 18/04/2022. Capacitación ELS - Urbanización Sueños de Paz. Cto 226-2020 - Los Andes Sotomayor, Nariño. - Importancia del plan de acción para la sostenibilidad 5. 26/04/2022. Capacitación ELS -Cto.080-2019 - Urbanización Nueva Esperanza - Matanza Santander. Funcionamiento Estatal - Parte 2. - Virtual

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>6. 27/04/2022. Capacitación ELS 153-C-2017 - Urbanización Nuevo Achí -Achí, Bolívar. Mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>c. Capacitaciones Comunitarias: 9</p> <ol style="list-style-type: none"> 6/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Los Ángeles - 2016-C-188 - San Marcos, Sucre. Taller de sostenibilidad y cuidado 20/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Sueños de Paz - Cto. 104-2020 - Los Andes Sotomayor, Nariño. - Plan de acción para la sostenibilidad 9/04/2022. Capacitación Comunitaria - Proyecto Urbanización Villa Gloria - Cto 109-2019 - Ancuya, Nariño. - Decreto 1537 de 2021 6/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización San Francisco - Cto. 226-2018 Mallama Nariño. Deberes y derechos como usuarios de servicios públicos. 6/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización San Francisco - Cto. 105-2020 Mallama Nariño. Deberes y derechos como usuarios de servicios públicos. 20/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Sueños de Paz - Cto.226-2020 - Los Andes Sotomayor, Nariño - Conformación del plan de acción para la sostenibilidad 4/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Nuevo Achí - Cto. 153-C-2017 - Achí, Bolívar. Vivienda Saludable 5/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Nuevo Achí - Cto. 153-C-2017 - Achí, Bolívar - Vivienda Saludable 22/04/2022. Capacitación Comunitaria - Urbanización Nueva Esperanza Cto. 080-2019, Matanza, Santander. <p>EDUCACIÓN</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 foro de 50% de avance Sede IE de Guaranda En Guaranda Sucre Contrato FA-IC-I-S-351-2019 Contratista Consorcio Infraestructura Educativa 2019. 1 foro Final Sede Rubén Darío Vásquez Caballero En Remolino Magdalena Contrato FA-IC-I-S-113-2019 Contratista Consorcio Construir 21. 1 foro Final Sede ERM El Horno En San Zenón Magdalena Contrato FA-IC-I-S-210-2018 Contratista Consorcio ITTIEL <p>Capacitaciones ELS/Comunitarias: 2</p> <ol style="list-style-type: none"> capacitación Comunitaria Sede ERM Bellavista en Concordia Cuidado del Agua 20-04-2022 capacitación ELS Sede ERM Bellavista en Concordia Cuidado del Agua 06-04-2022 <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES</p> <p>Capacitaciones a contratistas: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento socioeconómico San Benito 01-04-2022 - Acompañamiento socioeconómico San Benito 25-04-2022
<p>Mayo</p>	<p>Participación Ciudadana: 29 actividades realizadas</p> <p>En el mes de mayo para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AV acompañadas: 16 • capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 13 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>SUBGERENCIA DE REGIONES</p> <p>Capacitaciones Contratistas: 3 En el marco de la implementación de la caja de herramientas social, que se encuentra diseñando la Subgerencia, en el mes de mayo se realizaron las siguientes capacitaciones, a los profesionales sociales en campo, de manera virtual</p> <ul style="list-style-type: none"> •18-05-2022 Taller sociales en campo "Habilidades para la vida" •27-05-2022 Taller sociales en campo "Plan para la sostenibilidad" •31-05-2022 Taller sociales en campo "SAC y/o PSI - Seguimiento PQRSFD" <p>VIVIENDA</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 9</p> <ul style="list-style-type: none"> •03/05/2022 Foro 50% San Benito, Sucre Urbanización Los Corales •05/05/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional - alcalde de los Andes Sotomayor Contrato 104 de 2019- 35 viviendas y Cto 226 de 2018 •10/05/2022 Mesa de Trabajo interinstitucional Alcaldía Los Andes Sotomayor Contrato 104 de 2019- 35 viviendas y Cto 226 de 2018. •12/05/2022 mesa de gestión interinstitucional "Urbanización El Cedro - 54 Viviendas La Cruz, Nariño •17/05/2022 mesa de gestión interinstitucional Urbanización Vista Hermosa - 185 viviendas Alban, Nariño •10/05/2022. Sorteo proyecto de vivienda Compraventa Urbanización Molinitos 20 viviendas - Dosquebradas, Risaralda. •21/05/2022. Socialización Comunitaria inicio del Proyecto Compraventa Urbanización Maria Gracia en Popayán, Cauca. - Mixto •19/05/2022. Acompañamiento virtual a socialización del proyecto de compraventa Cto 226 de 2021, Prado -Tolima. 43 viviendas. •26/05/2022 Mesa de gestión interinstitucional Urbanización altos de la playa Contrato 226 de 2018 <p>Capacitaciones Contratistas, ELS/ Comunidad: 4</p> <p>a. Capacitaciones Contratistas: 1 Virtual</p> <ul style="list-style-type: none"> •12/05/2022. Capacitación Componente social Compraventa -Cto. 202-2021 Viotá - Cundinamarca. <p>b. Capacitaciones ELS: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •03/05/2022. Fortalecimiento ELS - Proyecto Urbanización Los Corales - 270 Viviendas San Benito Abad Cto 188 de 2016. Tema: Mecanismos de participación ciudadana. <p>c. Capacitaciones Comunitarias: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> •04/05/2022. Capacitación Comunitaria Proyecto Urbanización Los Corales -270 Viviendas San Benito Abad Cto 188 de 2016 - Sucre. Temas: Vivienda Saludable, Planes de vida familiar, Gestión del Riesgo, Convivencia Familiar y Resolución de Conflictos, Presupuesto Familiar y De la informalidad a la formalidad. •14/05/2022. Capacitación Comunitaria Urbanización Villa Gloria - 36 Viviendas - Cto. 109 -2019. Tema: Resolución pacífica de conflictos. <p>EDUCACIÓN</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> •Foro Final IE Promoción Social Sede Mixta No1: En Gamarra Cesar, Contrato No. 107 de 2013, Contratista Unión Temporal AB Construcciones 2014 e interventoría HMV

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> •Foro Final IE Rafael Salazar Sede San Antonio: En Gamarra Cesar, Contrato No. 107 de 2013, Contratista Unión Temporal AB Construcciones 2014 e interventoría HMV •Socialización Comunitaria Sede Nuestra Señora del Carmen – Sempegua: En Chimichagua Cesar Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Contratista R Y D construcciones e interventoría Consorcio Interventorías Civiles •Socialización Comunitaria IE Antonio Brujes Carmona – Jaraba: En Santa Ana Magdalena Contrato FA-IC-I-S-115-2019 Contratista R Y D construcciones e interventoría Consorcio Interventorías Civiles <p>Capacitaciones ELS/Comunitarias 3</p> <ul style="list-style-type: none"> •Capacitación Comunitaria Sede ERM Bellavista en Concordia Gestión del Riesgo 04-05-2022 •Capacitación Comunitaria Sede ERM Bellavista en Concordia Cultura Tradicional 12-05-2022 •Capacitación Comunitaria Sede ERM Bellavista en Concordia Trabajo en Equipo 12-05-2022 <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> •25-05-2022 Reunión ELS ASE - San Benito Sucre •25-05-2022 Seguimiento SAC ASE - San Benito Sucre •3-05-2022 Acompañamiento Foro Inicial ASE San Benito <p>SALUD</p> <p>Capacitaciones ELS/Comunitarias 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •23/05/2022 IPS Centro de salud Don Bosco, en el corregimiento de Currulao Municipio de Turbo Antioquia – Habilidades para la vida <p>ACUEDUCTO</p> <p>Capacitaciones ELS/Comunitarias 2</p> <ul style="list-style-type: none"> •27/05/2022 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR - Gestión del recurso hídrico •23/05/2022 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA (CESAR) Gestión de las emociones
Junio	<p>Participación Ciudadana: 34</p> <p>En el mes de junio para dar cumplimiento a la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> •AV acompañadas: 22 •Capacitaciones ELS/Comunidad/profesionales sociales: 13 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>SUBGERENCIA DE REGIONES</p> <p>Capacitación contratistas: 3</p> <p>1.06-06-2022: Taller de identidad profesionales sociales en campo 2.07-06-2022: Taller de atención preferencial e incluyente. presencial y Virtual a servidores Fondo Adaptación</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>3.16-06-2022: Taller de identidad profesionales sociales en campo</p> <p>VIVIENDA</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 10 1.03/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional alcalde San Pablo - Nariño - Virtual 2.06/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional - Ocupación Ilegal - Proyecto Villa Sofía Santa Lucía Atlántico - Virtual 3.08/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional Alcaldía Los Andes Sotomayor - Nariño - Virtual. 4.13/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional alcalde San Pablo - Nariño - Virtual 5.16/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional alcalde San Pablo - Nariño - Virtual 6.16/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional alcaldía Los Andes Sotomayor- Nariño- Virtual 7.17/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional alcalde Mallama - Nariño - Virtual 8.30/06/2022. Mesa de Trabajo Interinstitucional Alcaldía de Colón- Génova, Nariño - Virtual. 9.09/06/2022. Mesa de Trabajo Comunitaria para sorteo de viviendas del proyecto de compraventa - Cto. 232-2021- Urbanización Marsella Real en Sabanalarga - Atlántico. - 70 Viviendas. Mixta 10.22/06/2022. Foro Final y entrega de 12 viviendas en el proyecto de vivienda en Guaca - Santander. Mixta.</p> <p>Capacitaciones Contratistas, ELS/ Comunidad: 7</p> <p>a. Capacitaciones ELS: 2 1.01/06/2022. Capacitación ELS - Gestión de Emociones - Cto 188 de 2016 Urbanización Los Corales-270 Viviendas San Benito Abad - Sucre 2.14/06/2022. Capacitación ELS - Gestión y articulación en relación con el proceso de reasentamiento o reconstrucción - Cto. 098-2019 Urbanización San Jorge 32 viviendas</p> <p>b. Capacitaciones Comunitarias: 5 1.08/06/2022. Capacitación Comunitaria - Gestión del Riesgo - Cto 188 de 2016 Urbanización Los Corales-270 Viviendas San Benito Abad - Sucre 2.08/06/2022. Capacitación Comunitaria - Talleres Formación Temas Básicos - Cto 188 de 2016 Urbanización Los Corales-270 Viviendas San Benito Abad - Sucre. 3.10/06/2022. Capacitación comunitaria: Presupuesto Familiar - C-153 DE 2017 - Proyecto Urbanización Nuevo Achí - Bolívar - 4.18/06/2022. Capacitación Comunitaria - Reciclaje Recreativo - Cto. 109-2019 - Urbanización Villa Gloria - 36 Viviendas - Ancuya - Nariño. 5.10/06/2022. Capacitación Comunitaria - Rutas de Atención Integral - Cto. 098-2019 - Urbanización San Jorge 32 viviendas - Ospina, Nariño.</p> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 2 1.14-06-2022: 1 Foro Final Sede Centro Educativo Básico Ampliado de Bomba: En Pedraza Magdalena, Contrato FA-IC-I-S-108 – 2019, Contratista Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena. 2.15-06-2022: Mesa de trabajo con Comunidad Sede ERM Bellavista: En Concordia Magdalena, Contrato FA-IC-I-S-108 – 2019, Contratista Fernando Ramírez S.A.S e interventoría Consorcio Intermagdalena.</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 1</p> <p>1.Apropiación-Acompañamiento Reunión ELS ASE-28-06-2022-San Benito Sucre</p> <p>Capacitaciones comunitarias: 1</p> <p>1.Apropiación-Capacitación Habilidades para la Vida-ASE-28-06-2022-San Benito Sucre</p> <p>SALUD</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 6</p> <p>1.03-06-2022: Foro de seguimiento Hospital de Puerto Tejada: Contrato 251-2017, Contratista Consorcio Tadeo Ese Norte 3 e interventoría Gustavo Adolfo Torres Duarte.</p> <p>2.16-06-2022: Mesa de Gestión Interinstitucional con Alcaldía IPS Don Bosco: En Currulao Turbo, Contrato FA-IC-I-S-107-2018, Contratista Lopeca SAS Ingenieros e interventoría Ingeniería Master</p> <p>3.16-06-2022: Foro 50% de avance IPS Don Bosco: En Currulao Turbo, Contrato FA-IC-I-S-107-2018, Contratista Lopeca SAS Ingenieros e interventoría Ingeniería Master</p> <p>4.04-06-2022 Foro Final Hospital Guaranda Guaranda Sucre</p> <p>5.22-06-2022 mesa de gestión interinstitucional Hospital Mahates Bolívar</p> <p>6.22-06-2022 Reunión ELS Hospital Mahates Bolívar</p> <p>Capacitaciones contratistas: 1</p> <p>1.13-06-2022 Capacitación contratista Hospital Maguí Payán Nariño</p> <p>ACUEDUCTO</p> <p>Acompañamiento a Espacios de Participación Ciudadana: 3</p> <p>1.Foros inicial en el Municipio de Cimitarra.</p> <p>2.Mesa De Gestión Interinstitucional: con Gobernación de Atlántico y Municipio de Candelaria, en virtud del proyecto de PTAR. Tema: situación de asentamiento en el AID.</p> <p>Capacitaciones Contratista 1</p> <p>1.Capacitación en temas de gestión social a profesionales sociales del Proyecto Acueducto de Novita.</p>
<p>Política de Interacción y Sostenibilidad Social (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales), implementada</p>	
<p>Enero</p>	<p>En el mes de enero para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comités de seguimiento: 10 - Acercamiento con comunidad/conceptos sociales: 1 - Cierres social acueducto: 1
<p>Febrero</p>	<p>En el mes de febrero para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comités de seguimiento: 17 • Acercamiento con comunidad/conceptos sociales: 2 • Plan de gestión social – vivienda: 1

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	<p>En el mes de marzo para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comités de seguimiento: 20 - Acercamiento con comunidad/conceptos sociales: 8 - Plan de gestión social – salud: 1 - Cierres Sociales sector vivienda: 2 - Cierres Sociales sector educación: 3 <p>En el repositorio de seguimiento al Plan de Acción se evidencia el detalle por cada uno de los comités o acercamientos con la comunidad de los sectores o macroproyectos, realizados.</p>
Abril	<p>Política de Gestión Social: En el mes de ABRIL para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron: 29 ACTIVIDADES, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comités de seguimiento: 20 • Plan de gestión social – educación: 1 • Plan de gestión social – acueducto: 1 • Cierres Sociales sector vivienda: 5 • Cierres Sociales sector – acueducto: 2 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>VIVIENDA Comités de Seguimiento: 14 Cierres sociales - vivienda: 5</p> <p>SALUD Comité de seguimiento social: 1</p> <p>MOJANA Comité de seguimiento social: 2</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES Comités de seguimiento: 2</p> <p>EDUCACIÓN Comité de seguimiento social: 1 Plan de Gestión social: 1</p> <p>ACUEDUCTO Plan de gestión social: 1 Cierres sociales: 2</p> <p>En el repositorio de seguimiento al Plan de Acción se evidencia el detalle por cada uno de los comités o acercamientos con la comunidad, de los sectores o macroproyectos, realizados.</p>
Mayo	<p>Política de Gestión Social: 44</p> <p>En el mes de MAYO para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizó el cumplimiento de las siguientes metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comités de seguimiento: 24

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de gestión social – apropiación: 1 • Plan de gestión social – salud: 1 • Plan de gestión social – acueducto: 1 • Cierres Sociales sector vivienda: 16 • Cierres Sociales sector – educación: 1 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>VIVIENDA Comités de Seguimiento: 15 Cierre de Gestión Social: 16</p> <p>COMFAGUAJIRA (3), COMFENALCO SANTANDER (10) y COMFACESAR (3)</p> <p>SALUD Comités de seguimiento social: 7 Planes De Gestión Social: 1</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES Comités de seguimiento social: 1 Planes De Gestión Social: 1</p> <p>EDUCACIÓN Cierres Sociales: 1</p> <p>ACUEDUCTO Comités de seguimiento social: 1 Planes De Gestión Social: 1</p> <p>En el repositorio de seguimiento al Plan de Acción se evidencia el detalle por cada uno de los comités o acercamientos con la comunidad, de los sectores o macroproyectos, realizados.</p>
Junio	<p>Política de Gestión Social: 31</p> <p>En el mes de JUNIO para dar cumplimiento a la implementación de Política de interacción y sostenibilidad social se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comités de seguimiento: 18 • Acercamiento con comunidad: 1 • Cierres Sociales sector – educación: 4 • Cierres sociales sector – vivienda: 7 • Cierre sociales sector – Jarillón: 1 <p>A continuación, se informa lo realizado frente a estas actividades por cada sector:</p> <p>VIVIENDA Comités de Seguimiento: 10 Acercamiento con comunidad: 1 Cierre de Gestión Social: 7 (Comfenalco Santander: 3, Proyectos Compraventa: 4)</p> <p>SALUD Comités de seguimiento social: 5</p> <p>APROPIACIÓN DE CAPACIDADES Comités de seguimiento social: 1</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>EDUCACIÓN</p> <p>Comités de Seguimiento Social: 2</p> <p>JARILLON</p> <p>Cierre social: 1</p> <p>En el repositorio de seguimiento al Plan de Acción se evidencia el detalle por cada uno de los comités o acercamientos con la comunidad, de los sectores o macroproyectos, realizados.</p>
<p>Seguimientos a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, realizados</p>	
<p>Enero</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – enero 2022- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en dos foros finales de auditorías visibles del sector educación. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación comunitaria, capacitación ELS, foro final, foro seguimiento, mesas de gestión interinstitucional, mesa de trabajo con comunidad, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 22 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
<p>Febrero</p>	<p>En esta oportunidad – febrero 2022- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en un foro inicial de auditorías visibles del macroproyecto Jarillion. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación comunitaria, capacitación ELS, foro seguimiento, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 33 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
<p>Marzo</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – MARZO 2022- se cuenta con 17 sondeos de satisfacción realizados</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>en los sectores de Educación, Salud, Acueducto y Vivienda. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación comunitaria, capacitación ELS, foro seguimiento, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 89 espacios de participación donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p> <p>La relación de las temáticas sobre las que se han realizado sugerencias o recomendaciones se encuentran disponibles en el repositorio de seguimiento al Plan de Acción.</p>
Abril	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – ABRIL 2022- se cuenta con 20 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Educación, Salud, Vivienda y Macroproyecto La Mojana. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como:</p> <p>Capacitación comunitaria, capacitación ELS, foro seguimiento, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 37 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación, dentro de las que se encuentran. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
Mayo	<p>Para el mes de mayo se cuenta con 9 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Educación, Salud, Vivienda, Apropiación de capacidades y Agua. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como capacitación comunitaria, capacitación ELS, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p> <p>Este mes se reportan 37 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación, donde se destaca la reiteración frente a la importancia de socializar con anticipación las fechas de entrega de las obras o los cambios de fecha cuando un proyecto no se puede entregar a tiempo. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
Junio	<p>En esta oportunidad – JUNIO 2022- se cuenta con 11 sondeos de satisfacción realizados en los sectores de Educación, Acueducto, Salud, Vivienda. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como capacitación comunitaria, capacitación ELS, mesas de gestión interinstitucional, reunión de ELS, seguimiento al SAC y socialización comunitaria.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	Este mes se reportan 19 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación. Cada espacio de participación que recibió alguna sugerencia tiene un seguimiento a la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.

- Área Gerencia – Equipo de Comunicaciones

A través del Equipo de Comunicaciones se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Comunicaciones, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS y PARTICIPACIÓN CIUDADANA las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

Esta intervención se ejecuta a través de las estrategias de: (i) Comunicaciones externas, (ii) Comunicaciones externas y, (iii) Transparencia activa. Los indicadores, metas y distribución trimestral de metas de Comunicaciones se detallan a continuación:

Portafolio/Programa/Proyecto: **COMUNICACIONES**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Comunicaciones

Objetivo Estratégico 2018-2022 #5	Fortalecer La Capacidad De Gestión, Uso Y Apropiación De La Información Institucional						
Acciones Estratégicas 2022 Programas/Proyectos/Actividades/Hitos	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Participar en la celebración del día de la transparencia, de acuerdo con el cronograma establecido por el líder sectorial	Participación en la celebración del día de la transparencia	1	-	-	-	1	N.A.
Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas 365 de la Entidad	Índice de rendición de cuentas la gestión Pública, espacios virtuales y presenciales de diálogo con la ciudadanía	6	-	-	3	3	N.A.
Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación	Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa	2916	729	729	729	729	2.557
Fortalecer la estrategia de comunicación interna para satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y potencializar el trabajo en equipo	Acciones, contenidos y productos desarrollados en la estrategia de comunicación interna de la entidad	1008	252	252	252	252	490

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Ejecutar institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 2015	12	3	3	3	3	6
--	--	----	---	---	---	---	---

PAAC-2022: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2022 (Decreto 612/2018).
 PES-2022: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2022" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Mes	Avance Cualitativo
Participación en la celebración del día de la transparencia	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Índice de rendición de cuentas la gestión Pública, espacios virtuales y presenciales de diálogo con la ciudadanía	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa	
Enero	<p>Durante el mes de enero se diseñaron y publicaron 46 piezas informativas para mantener informados a los colaboradores de temas como: socialización del Plan de Acción 2022, formatos para pagos, circulares, plazos de radicación y capacitaciones, entre otros. El material gráfico corresponde a: 33 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones, 2 piezas de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos" y la realización de 2 videos internos.</p> <p>Así mismo, y como parte de la estrategia que busca fortalecer los canales internos, durante esta vigencia, se realizaron acciones de mejora para actualizar y modernizar la intranet AdaptaNET, además se publicaron 3 slides y 3 notas informativas.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Febrero	<p>Durante el mes de febrero el Equipo de Trabajo de Comunicaciones diseñó y publicó, a través de los diferentes canales internos, 89 piezas informativas, como parte de la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo mantener informados a los colaboradores en temas como: circulares, resoluciones, actualización de formatos, plazos de radicación y capacitaciones, entre otros.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 52 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones, 5 piezas de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos", la realización de 4 videos internos y 3 contenidos generales para pantallas. Así mismo, y como parte de la estrategia que busca fortalecer los canales internos, durante esta vigencia, se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación de 6 slides y 7 notas informativas. Adicionalmente, se realizó el lanzamiento del boletín quincenal "El Fondo en los Medios" del que se socializó la primera edición (1) en el mes de febrero. Se tomaron fotografías de (4) actividades internas y se realizaron (7) acciones de mejora en la intranet.</p>
Marzo	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral, durante el mes de marzo el E. T. de Comunicaciones diseñó y publicó, a través de los diferentes canales internos, 120 piezas informativas, para la divulgación de: circulares, resoluciones, actualización de formatos, plazos de radicación y capacitaciones, entre otros.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 66 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones, 2 piezas de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos", la realización de 2 videos internos y 5 contenidos para la actualización de pantallas.</p> <p>Durante esta vigencia, se continuó trabajando en el fortalecimiento de canales internos, por esta razón se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación de 8 slides y 15 notas informativas. Adicionalmente, se enviaron (2) boletines quincenales "El Fondo en los Medios". Se tomaron fotografías de (4) actividades internas, se realizaron (6) acciones de mejora en la intranet y se realizó apoyo gráfico en el ajuste de (10) presentaciones para gerencia.</p>
Abril	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación externa que busca socializar con la ciudadanía los avances de la gestión de la Entidad, en el mes de abril, se redactaron y publicaron nueve (9) comunicados de prensa y (192) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (214) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron dos (2) galerías fotográficas y se realizaron cuatro (4) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de los públicos de interés.</p>
Mayo	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación externa de la entidad, durante el mes de mayo se redactó y publicó seis (6) comunicados de prensa y (163) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (390) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron once (11) galerías fotográficas y se realizaron (18) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de los públicos de interés.</p>
Junio	<p>Durante el mes de junio, se redactó y publicó diez (10) comunicados de prensa y (191) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (498) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron ocho (8) galerías fotográficas y se realizaron</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	nueve (9) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de los públicos de interés.
Acciones, contenidos y productos desarrollados en la estrategia de comunicación interna de la entidad	
Enero	<p>La estrategia de comunicación externa tiene como objetivo mantener informados a los beneficiarios y a la comunidad en general respecto a los avances de los proyectos y la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto.</p> <p>Las acciones ejecutadas durante el mes de enero corresponden a la redacción y publicación de seis (6) comunicados de prensa y (138) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (93) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron cuatro (4) galerías fotográficas y se realizaron siete (7) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.</p>
Febrero	<p>Las acciones ejecutadas durante el mes de febrero corresponden a la redacción y publicación de diez (10) comunicados de prensa y (254) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (126) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron seis (6) galerías fotográficas y se realizaron ocho (8) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.</p>
Marzo	<p>Las acciones ejecutadas en marzo, como parte de la estrategia de comunicación externa de la entidad, corresponden a la redacción y publicación de (6) comunicados de prensa y (111) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (56) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron (2) galerías fotográficas y se realizaron (5) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.</p>
Abril	<p>Durante esta vigencia se realizaron varias actividades de socialización de contenidos internos con el propósito de mantener informados a los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral. En ese sentido, en abril se diseñaron y publicaron, a través de los diferentes canales internos (mail institucional, pantallas digitales e intranet), 73 piezas informativas, para la divulgación de: circulares, resoluciones, actualización de formatos, plazos de radicación y capacitaciones, entre otros.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 38 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones, 2 piezas de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos", la realización de 1 video interno y 4 contenidos para la actualización de pantallas. Así mismo, se continuó trabajando en el fortalecimiento de la intranet AdaptaNET con la publicación de contenido relevante y noticioso a través de: 6 slides y 11 notas informativas. Adicionalmente, se enviaron a los correos de los colaboradores (2) boletines quincenales "El Fondo en los Medios". Se tomaron fotografías de (1) actividad interna, se realizaron (2) acciones de mejora en la intranet, se realizó el apoyo de (6) slides en presentaciones para gerencia y se realizó el apoyo en la difusión de dos (2) campañas a nivel interno.</p>
Mayo	<p>Como parte de la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral, en mayo se diseñó y publicó, a través</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>de los diferentes canales internos, 90 piezas informativas, para la divulgación de: circulares, resoluciones, actualización de formatos, plazos de radicación y capacitaciones, entre otros.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 53 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y capacitaciones, 1 pieza de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos", la realización de 1 video interno y 4 contenidos para la actualización de pantallas. Durante esta vigencia, se continuó trabajando en el fortalecimiento de canales internos, por esta razón se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación de 7 slides y 11 notas informativas. Adicionalmente, se enviaron (2) boletines quincenales "El Fondo en los Medios". Se tomaron fotografías de (3) actividades internas, se realizó (1) acción de mejora en la intranet, se realizó el apoyo en el ajuste de (6) slides en presentaciones para gerencia y se realizó el apoyo en la difusión de una (1) campaña a nivel interno.</p>
Junio	<p>Durante la vigencia del 1 al 30 de junio se diseñó y publicó, a través de los diferentes canales internos, 70 piezas informativas como parte de la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 41 mailings para socializar circulares, lineamientos, circulares, resoluciones, formatos y capacitaciones, entre otros. Así mismo, se elaboraron 1 pieza de la campaña interna "Cuidándote nos cuidamos todos", 1 video interno y 3 contenidos para la actualización de pantallas. En junio, se actualizó la intranet AdaptaNET con la publicación de 6 slides y 12 notas informativas. Adicionalmente, se envió (1) boletín de "El Fondo en los Medios". Se realizaron (2) acciones de mejora en la intranet. Se realiza el ajuste a nivel de diseño de (2) dos presentaciones para gerencia.</p>
<p>Realizar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015</p>	
Enero	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de enero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p>
Febrero	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de febrero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p>
Marzo	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de marzo se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p>
Abril	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de abril se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la</p>


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de abril se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sqB5j0. El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de abril se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3NF0neR</p>
Mayo	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de mayo se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de mayo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sqB5j0 . El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de mayo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3M8obHv</p>
Junio	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de junio se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de junio se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sqB5j0 El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de junio se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3yJeNXz .</p>

- Área Oficina de Planeación y Cumplimiento

La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Gestión del Conocimiento, Arquitectura Organizacional vista desde los procesos y la tecnología, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño, gestión del conocimiento y la innovación, fortalecimiento institucional y simplificación de procesos y gobierno digital, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública. Así mismo a través de este equipo se realiza la gestión y seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión y al presupuesto relacionado, se hace un seguimiento y acompaña a las áreas en todos los procesos de auditoría, tanto los realizados por la Contraloría General de la República, como el acompañamiento a la ejecución de la Auditoría Técnica Integral y Preventiva – ATIP.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

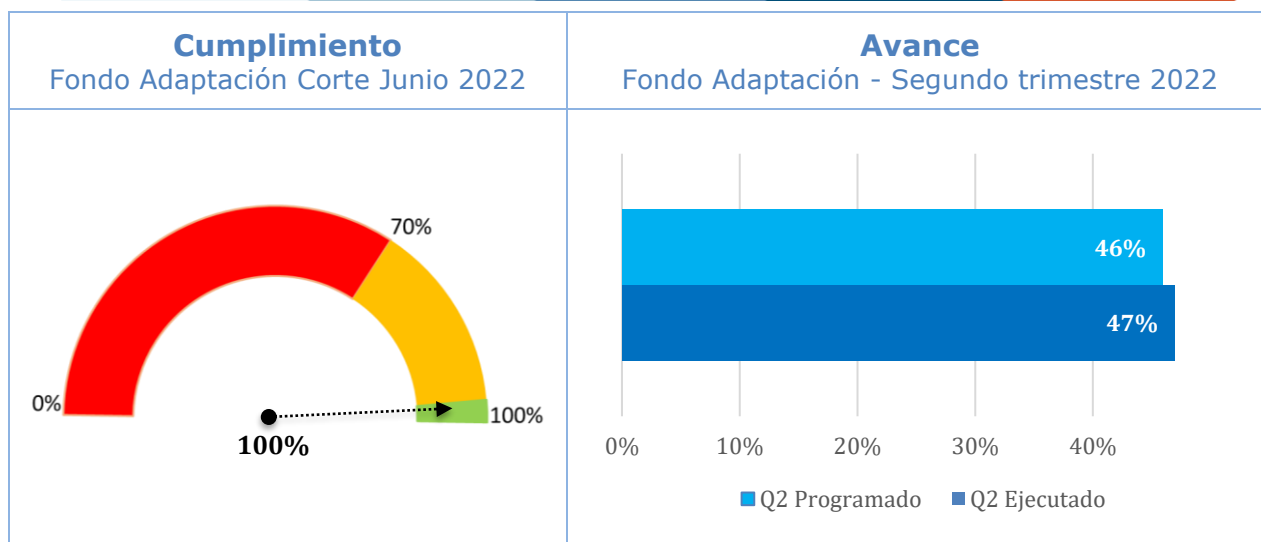

Portafolio/Programa/Proyecto: **PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Gerente de Meta: Jefe de la Oficina de Planeación y Cumplimiento

Objetivo Estratégico 2018-2022 #3	Generar, Gestionar Y Transferir Conocimiento Técnico, Orientado A Reducir La Vulnerabilidad De La Nación Y De Los Países De La Región, Ante Riesgos De Cambio Climático						
Objetivo Estratégico 2018-2022 #6	Modernizar Y Fortalecer El Funcionamiento Del Fondo Adaptación Con Visión De Largo Plazo						
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar la Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG)*	Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG), ejecutada	100%	20%	20%	30%	30%	40
Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del FURAG de la vigencia 2021 PES-2022	Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021 en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	1	-	-	-	1	N.A.
Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación PES-2022	Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación	1	-	-	-	1	N.A.
Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad	Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado	100%	20%	20%	30%	30%	40
Ejecutar la Estrategia de Gestión de Riesgos PAAC-2022	Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada	100%	25%	25%	25%	25%	50

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Participar en la cuarta semana de gestión del conocimiento y la Innovación organizada por el Ministerio de Hacienda. (PES-2022) PES-2022	Sesión cuarta semana de gestión del conocimiento y la innovación	1	0	0	0	1	N.A.
Generar dos hipótesis de investigación acorde al objeto misional de la Entidad PES-2022	Hipótesis de investigación acorde al objeto misional de la Entidad	2	0	1	0	1	0.5

PAAC-2022: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2022 (Decreto 612/2018).

PES-2022: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2022" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Mes	Avance Cualitativo
Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG), ejecutada	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	El avance programado a primer trimestre en la estrategia de gestión del conocimiento corresponde principalmente a la consolidación y análisis del estado de las postulaciones relacionadas en el documento Conpes 3776 de 2013. Se realizó un registro del total de postulaciones, metas financiadas, avance por fase (contratado, terminado, entregado), por sector y macroproyecto. Adicionalmente se efectuó, el día 1 de abril de 2022, la capacitación para el cargue de información y evidencias en la Herramienta destinada al Seguimiento del Plan de Acción, un repositorio que permite copilar el conocimiento y la información generada en la ejecución de la programación anual.
Abril	Se publicó el primer informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción de la vigencia, el conocimiento y las evidencias que soportan el mismo se encuentran consolidadas en un repositorio virtual de Planeación y Cumplimiento.
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	<p>Como parte del proceso de empalme de cambio de gobierno se adelantaron las siguientes acciones en el marco de la Gestión del Conocimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión 2018 – 2022. El documento que se encuentra disponible, tanto en la web del Fondo Adaptación, como en el "Datálogo" del Departamento Nacional de Planeación, contiene (i) los antecedentes de la creación, estructura y organización de la entidad; (ii) el balance por sector y macroproyecto, incluyendo las postulaciones del CONPES 3776 de 2013, las metas financiadas, los proyectos no financiados, los proyectos ejecutados por otras entidades y los técnica o jurídicamente inviables; así como el detalle de las intervenciones adelantadas en el cuatrienio y las entregas que se encuentran en proceso de contratación o ejecución; (iii) el estado de la situación financiera incluyendo los recursos en fiducia y la solicitud de recursos para el anteproyecto de presupuesto 2023; y, (iv) los temas prioritarios técnicos que se le sugieren a la administración entrante. <p>Este documento cuenta inicialmente con 34 anexos que incluyen el detalle de cada uno de los productos contratados y entregados en la historia de la entidad y documentos técnicos que buscan brindar elementos para el análisis del alcance del Fondo hacia el futuro.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> Presentación con el resumen del informe de gestión e infografía de respaldo para facilitar compartir la información con diversos grupos de interés. Se creó el micrositio https://www.fondoadaptacion.gov.co/gestion20182022/ pensado en la ciudadanía, el cual busca compartir en un lenguaje sencillo el balance de la Entidad por sector y macroproyecto. Se creó un repositorio que contiene los soportes de la totalidad de las entregas realizadas en el periodo agosto 2018 – mayo 2022; este se debe continuar actualizando mensualmente, el enlace es compartido con Presidencia de la República.
Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021 en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	El 22 de marzo de 2022, se certificó el diligenciamiento de la información del año 2021 del Fondo Adaptación cargado en la herramienta destinada por la Función pública. A la espera de los resultados de la medición para su análisis.
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	<p>El día 13 de mayo se participó en el Duodécimo Encuentro del Equipo Transversal de Planeación, donde el Departamento Administrativo de la Función Pública presentó los resultados del Índice de Desempeño Institucional. Tras analizar los resultados obtenidos, se generó el comunicado de Prensa "Fondo Adaptación consigue la tasa de crecimiento más alta en la calificación del Índice de Desempeño Institucional 2021" que a su vez destacó el obtener el cuarto lugar en los resultados de la medición del desempeño del Sistema de Control Interno (SIC).</p> <p>Posteriormente, para Comité de Gerencia y Consejo Directivo se preparó la presentación con el análisis de los resultados por dimensión y política.</p>
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	Si bien no se han programado reuniones sectoriales en el periodo, el Fondo Adaptación participó en el Cuarto Encuentro de Equipo Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación, convocado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Función Pública y la ESAP, el día 15 de marzo de 2022.
Abril	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Mayo	Si bien no se han programado reuniones sectoriales en el periodo, el Fondo Adaptación participó en la primera Cátedra Permanente de la Escuela de Formadores en Gestión del Conocimiento y la Innovación, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, realizada el día 11 de mayo de 2022.
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. Para el presente corte se incorporan varios documentos al SGC entre registros y documentos (lineamientos, manuales y guías). El resultado de la gestión por procesos para todo el trimestre se consolidará en el mes de marzo. De la misma manera se ha venido trabajando en las acciones suscritas en el plan de mejora a procesos enviado a la OCI.
Marzo	El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. Para el presente trimestre y por solicitud de los líderes de procesos la OAP ha incluido y/o actualizado un total de 26 documentos que obedecen a los cinco tipos en el Sistema de Gestión de Calidad (4 Políticas, 1 Lineamiento, 7 Manuales/Guías y 14 Formatos). De la misma manera se ha venido trabajando en las acciones suscritas en el plan de mejora a procesos enviado a la Oficina de Control Interno.
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	Para el presente corte se incorporan las actualizaciones a las caracterizaciones de los procesos de gestión jurídica. El resultado de la gestión por procesos para todo el trimestre arroja 20 tipos documentales actualizados entre registros, documentos (lineamientos, manuales y guías), caracterizaciones, flujogramas, normogramas e indicadores.
Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	El 8 de febrero se realizó la charla informativa de gestión de riesgos a los colaboradores del FA.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	Se ha brindado acompañamiento a las dependencias para que al cierre del primer trimestre informen sobre la necesidad de actualización de los riesgos y diligencien las herramientas de valoración.
Abril	No existe reporte para el periodo
Mayo	Se actualizó y publicó en la página web de la entidad el Informe de Seguimiento al Avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, así como el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al mes de abril.
Junio	No existe reporte para el periodo
Sesión cuarta semana de gestión del conocimiento y la innovación	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Hipótesis de investigación acorde al objeto misional de la Entidad	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	<p>Considerando el cambio de gobierno, se incorporó en el Informe de Gestión cuatro temáticas prioritarias que se le entregan a la administración entrante como recomendaciones para tener en cuenta y para adelantar, en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, las hipótesis de investigación. Se sugirieron como temas de análisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las alternativas para desarrollar proyectos con viabilidad técnica y jurídica priorizados por el CONPES 3776 de 2013 pero que continúan desfinanciados. • La estrategia judicial asociada a los procesos a favor de la entidad. • La integralidad del Macroproyecto La Mojana y las intervenciones en esa región, partiendo del impacto de los Muros de protección para San Marcos y Magangué. • La posible transformación del Fondo Adaptación para la identificación y ejecución de proyectos integrales de mitigación y adaptación al cambio climático.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

- Equipo Tecnología

Este equipo es el encargado de ejecutar las acciones asociadas con los Plan Estratégico de Tecnología – PETIC y el Plan de Seguridad Digital de la entidad, que hacen parte integral como anexos del Plan de Acción 2022.

Portafolio/Programa/Proyecto: **TECNOLOGÍA**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Tecnología

Objetivo estratégico 2018-2022 #5		Fortalecer la capacidad de gestión, uso y apropiación de la información institucional					
Acciones estratégicas 2022 (programas/proyectos/actividades/hit os)	Indicador	Meta 2022	Programación trimestral				AVANCE META
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad*	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado	100%	20%	30%	30%	20%	60
Ejecutar Plan de Seguridad Digital (MIPG)*	Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado	100%	20%	30%	30%	20%	49

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

Mes	Avance Cualitativo
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado	
Enero	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>a. Implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo SGDEA. Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inició la implementación y puesta en marcha del SGDEA. - Reuniones de explicación y de seguimiento para el llenado de las matrices de datos maestros o datos básicos y tablas de mantenimiento en FOREST. - Contratación de la infraestructura en la nube de Oracle para alojar la aplicación FOREST y todos sus datos. Se adjunta Orden de compra de Oracle. - Reuniones para la explicación con respecto a los datos a migrar desde INFODOC al nuevo sistema FOREST. <p>b. Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información. Con respecto a esta iniciativa fue aprobado el Plan Estratégico de TI y el Plan de Seguridad Digital en el comité de Gestión y Desempeño del 27 de enero de 2022.</p> <p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>Sistema SIFA: modificación el formulario de terceros para solicitar nuevos datos de banco para pago por compensaciones. Nueva parametrización de tres grupos de central de cuentas para revisión y causación de radicados.</p> <p>Sistema PSA: Se realizó el otrosí al contrato del sistema PSA con Price. Contrato FA-CDO-I-S-003-2020.</p> <p>El Avance del PETI al término del mes de enero de 2022 es de 5%</p>
Febrero	<p>En el mes de febrero con respecto a la acción de "Ejecutar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones –PETI en la Entidad", se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <p>a. Implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo SGDEA: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes actividades en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatización, configuración y parametrización en el entorno de pruebas: 90% • Capacitación usuario final y técnicos: 2% • Instalación licencias: 90% • Migración de información: 20% <p>En general el proyecto tiene un avance del 43%.</p> <p>b. Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información. Con respecto a esta iniciativa se impartieron capacitaciones a los colaboradores en el sistema SIFA.</p> <p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <p>Sistema SIFA: En el mes de febrero se trabajaron principalmente los siguientes requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró una nueva forma de generar el reporte de ejecución por CDRs (reporte CRO) en archivo plano, ya que el Excel está generando más de 65.000 filas. - Se creó una opción para cargar soportes o documentos a solicitudes de CDR - Se construyó la entidad documentos para el manejo de documentos de tesorería: reintegro de anticipos, reintegro de aportes, compensaciones. - Nueva funcionalidad para la expedición del certificado de cumplimiento para pago de contratos de prestación de servicios de personas naturales. - Se realizó una modificación para que los radicados por viáticos sean revisados y causados por un grupo exclusivo de central de cuentas, diferente al grupo de pago masivo y de cuentas de personas jurídicas. <p>Sistema PSA: En el mes de febrero se construyó la hoja de vida de un nuevo sector para el proyecto de Reactivación de Yati-Bodega. Además, se crearon 3 intervenciones que pertenecen a este nuevo sector.</p>
Marzo	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI: En el mes de marzo con respecto a la acción de "Ejecutar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – PETI en la Entidad", se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <p>a. Implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo SGDEA: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes actividades</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatización, configuración y parametrización en el entorno de pruebas: 100% • Capacitación usuario final y técnicos: 5% • Instalación licencias: 100% • Migración de información: 50% • Instalación entorno de pruebas: 100% • Instalación entorno de producción: 5% • Soporte técnico proactivo y reactivo: 5% <p>En general el proyecto tiene un avance del 52%.</p> <p>b. Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información. Con respecto a esta iniciativa se impartieron capacitaciones a los colaboradores en el sistema SIFA, en especial en el certificado de cumplimiento para pago que se genera desde el sistema. Se adjunta la lista de asistencia. También se impartieron charlas en el sistema SIFA y PSA al personal de la empresa Deloitte y al personal de la Contraloría General quienes hacen las respectivas auditorías en la Entidad.</p> <p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <p>Sistema SIFA: En el mes de marzo se trabajaron principalmente los siguientes requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se diseñó e implementó la nueva funcionalidad para que los contratistas personas naturales de prestación de servicios puedan hacer el certificado de cumplimiento para pago a través del sistema. - Se diseñó y desarrolló la lista de chequeo para contratos liquidados, con el fin de hacer seguimiento de las actividades post-liquidación de un contrato. - Se realizó un cambio en la instrucción de giro para que muestre los usuarios que hicieron la revisión, causación y visado en el sistema. <p>El Avance del PETI al término del mes de marzo de 2022 es de 45%</p>
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	<p>Al 30 de junio respecto a la ejecución del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones –PETI en la Entidad, se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <p>a. Implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo SGDEA: Actualmente se viene avanzando en diferentes frentes para cumplir con la fecha pactada para la salida a producción la primera semana de agosto. Dentro de las tareas realizadas, se encuentran la entrega de licencias, la implementación del entorno de pruebas, las pruebas funcionales de la herramienta y las capacitaciones para administradores.</p> <p>Las actividades en proceso a la fecha son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del módulo de expedientes • Capacitación de los usuarios VIP, incluyendo el módulo de expedientes • Generación del certificado SSL para sitio web

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> • Relación de expedientes digitales para su vinculación con los registros de expedientes en la herramienta • Iniciar proceso de recolección de firmas mecánicas y certificadas • Definir proceso de carga de expedientes digitales <p>A corte 30 de junio, se va cumpliendo con el cronograma estipulado según la adición realizada al contrato para la inclusión del desarrollo del módulo de expedientes. El proyecto presenta un avance del 90%.</p> <p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <p>Sistemas SIFA</p> <p>A 30 de Junio en SIFA se ha construido software nuevo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separación de listas de chequeo de autorizaciones de gasto y viáticos • Construcción de programa para Certificado de Cumplimiento para pagos, el cual ayuda a los contratistas a elaborar el Excel presentado en las cuentas, está conectado con el módulo de contratación de manera que presenta los históricos de pagos. • Construcción de programas y reportes para unificar criterios de impresión de los nuevos documentos de reintegros, compensaciones y anticipos • Construcción de programa para modificar radicados, solo se permiten aquellos radicados que tengan un estado determinado • Creación de equivalente producto1 y producto2 para carga de PAC, con distribución de porcentajes • Construcción de programa de seguimiento de liquidaciones <p>Sistema PSA</p> <p>En el mes de Junio se trabajó con la firma PWH en el desarrollo de las siguientes funcionalidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esquema de alertas a supervisores e interventores que incluyó la definición del alcance, el desarrollo de la funcionalidad en la herramienta, la verificación de notificaciones a los supervisores e interventores de las alertas que llegarán a sus correos electrónicos y las alertas a los supervisores e interventores para actualización oportuna de cronogramas. 2. Un Tablero de control de alertas de desviaciones en los cronogramas con dos componentes: <ul style="list-style-type: none"> • Dashboard seguimiento PSA: • Dashboard de actualización de proyectos PSA: <p>En el mes de junio se avanzó en definición del alcance de la herramienta y elaboración de los reportes y en el desarrollo del web dashboard de seguimiento estado de proyectos en el PSA. Para el mes de julio se tiene previsto la puesta en marcha y operación de las dos funcionalidades.</p> <p>El Avance general del PETI 2022 al término del mes de junio es de 60%.</p>
Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado	

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Enero	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de enero de 2022 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se construyó el plan de seguridad digital 2022, el cual fue aprobado en Comité de Gestión y Desempeño del 27 de enero 2022. 2. Se contrato al Oficial de Seguridad. 3. Se construyó el Plan de cultura y sensibilización en seguridad para el 2022. 4. Se socializó a través de correo electrónico un video con el procedimiento de reporte de incidentes de seguridad digital. <p>El avance del plan de seguridad digital al término del mes de enero de 2022 es del 5%</p>
Febrero	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de febrero de 2022 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la gestión de Incidentes de Seguridad Digital de manera permanente. 2. Se logró la aprobación y publicación del plan de Cultura y sensibilización en Seguridad. 3. Se realizó el reporte de avances de Seguridad Digital para FURAG. 4. Se gestionó la publicación de cápsulas de seguridad a todo el Fondo. 5. Se elaboró encuesta de Cultura en Seguridad Digital para difundir por medio de correo electrónico.
Marzo	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de marzo de 2022 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó Gestión de Incidentes de Seguridad Digital de manera permanente. 2. Se aplicó el instrumento de autodiagnóstico del MSPI a los controles de tipo Técnico. 3. Se realizo carga de evidencias para dar respuesta a formulario de FURAG 4. Se gestionó la publicación de cápsulas de seguridad a todo el Fondo. 5. Se envió a toda la Entidad la encuesta de cultura y apropiación en Seguridad. 6. Se llevo a cabo la Capacitación de Activos de información y riesgos digitales a toda la Entidad. 7. Se elaboró matriz para recopilar la información solicitada en la Resolución 1519-2020 Anexo3. 8. Se elaboró el documento en borrador de desarrollo seguro.
Abril	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de abril de 2022 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó Gestión de Incidentes de Seguridad Digital de manera permanente. 2. Se gestiono la publicación de capsulas de seguridad a todo el Fondo. 3. Se realizo el reenvió de encuesta de cultura y apropiación en Seguridad con nueva configuración de accesibilidad. 4. Se elaboró documento en borrador de desarrollo seguro. 5. Presentación de línea de tiempo de los avances de MSPI en Comité de Gestión 6. Se presentó propuesta para implementar fondos de pantalla con tips de seguridad. 7. Se realizó una revisión preliminar de plan de continuidad del negocio. 8. Se realizaron sesiones de trabajo para integrar la gestión de riesgos Digitales.
Mayo	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de mayo de 2022 fueron las siguientes:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022


Mes	Avance Cualitativo
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó Gestión de Incidentes de Seguridad Digital de manera permanente. 2. Se gestiono la publicación de capsulas de seguridad a todo el Fondo. 3. Se configuro y probó herramienta para prueba de phishing. 4. Se lanzó campaña de sensibilización por medio de un correo falso y se generó informe con resultados. 5. Se presentó propuesta para implementar fondos de pantalla con tips de seguridad. 6. Se realizó visita en las instalaciones para revisión de controles de Seguridad. 7. Se realizó revisión del plan de continuidad del negocio. 8. Se elaboró y presentó el alcance de la auditoria en seguridad de la información. 9. Se solicitó un ejercicio de análisis de vulnerabilidades. 10. Se solicitó información referente a los líderes de proceso con el fin de iniciar el proceso de revisión de activos de información.
Junio	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad durante el mes de junio de 2022 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Se realizó Gestión de Incidentes de Seguridad Digital de manera permanente. 10. Se gestiono la publicación de capsulas de seguridad a todo el Fondo. 11. Se realizó Charla #2 sobre Políticas de Seguridad de la Información 12. Definición de alcance para auditoria SGSI y Pruebas de Vulnerabilidades 13. Se realizo verificación aleatoria de controles de acceso en sitio 14. Se realizaron reuniones con diferentes líderes de procesos para actualizar la matriz de Activos de Información. 15. Se realizó retroalimentación del ejercicio de Phishing realizado en el mes de mayo. <p>El avance del plan de seguridad digital al término del mes de junio de 2022 es del 49%.</p>

- Área Secretaría General

La Secretaría General y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Arquitectura Organizacional vista desde las personas y su actuación en los procesos que generan impacto interno (BACK-OFFICE) a partir de los requisitos y atributos de calidad demandados por los ciudadanos.

Los resultados que produce la Secretaría General se articulan con el alcance de las Políticas de Gestión y Desempeño de TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD, ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTIÓN PRESUPUESTAL (COMPRAS PÚBLICAS) y DEFENSA JURÍDICA, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

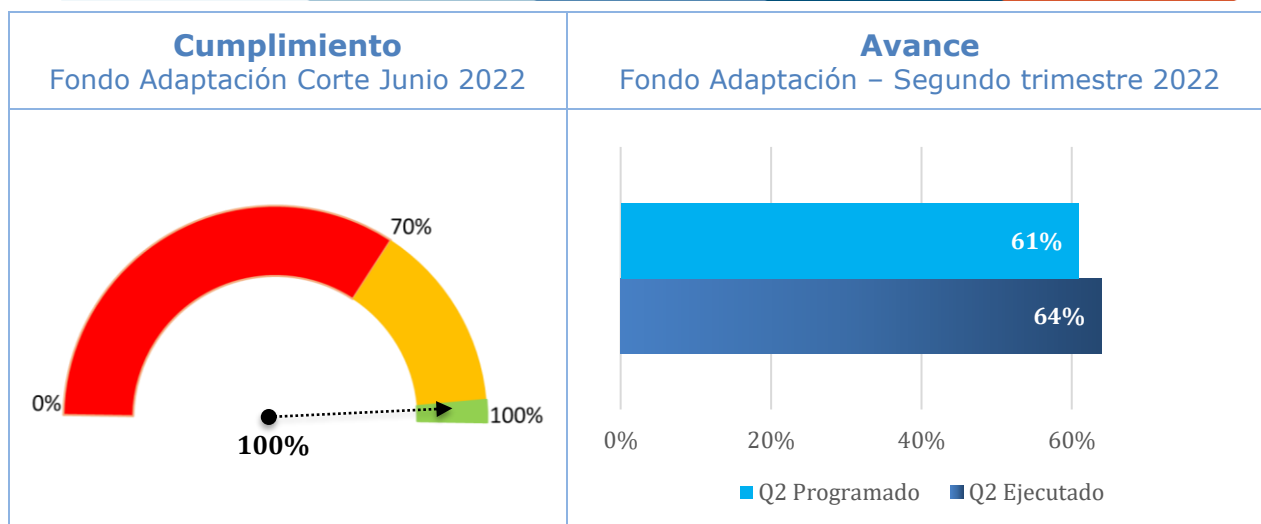

- Equipo Talento Humano y Servicios

A través de este equipo se ejecuta el portafolio de proyectos relacionado con Talento Humano, Atención al Ciudadano, servicios y Gestión Documental. Como parte integral del Plan de Acción 2022, se suman el Plan Estratégico de Talento Humano (PETH), el Plan Institucional de Archivos (PINAR) y el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA).

Portafolio/Programa/Proyecto: **TALENTO HUMANO**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Talento Humano y Servicios

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6	Modernizar Y Fortalecer El Funcionamiento Del Fondo Adaptación Con Visión De Largo Plazo						
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar Plan de Previsión conforme con el PAC mensual solicitado	Plan de previsión ejecutado conforme con el PAC mensual solicitado	100%	25%	25%	25%	25%	49
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Alcanzar la cobertura de personas capacitadas a través del Plan Institucional de Capacitación	Porcentaje de personas capacitadas a través del Plan institucional de capacitación	95%	25%	25%	25%	20%	88
Ejecutar el Plan de trabajo del SG-SST	Plan de trabajo del SG-SST ejecutado	100%	21%	25%	25%	29%	46
Alcanzar el 93% de favorabilidad en la medición de clima y cultura organizacional	Porcentaje de la encuesta de medición de clima y cultura	93%	0%	0%	0%	93%	N.A.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

	organizacional en nivel alto de favorabilidad							
Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano PES-2022	Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	100%	0%	0%	0%	100%		N.A.
Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano PES-2022	Sesiones de capacitaciones sectoriales de la Política de Talento Humano	100%	0%	0%	0%	100%		N.A.
Analizar los resultados de la política de Talento Humano en la medición del FURAG de la vigencia 2021 PES-2022	Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021 en relación con la política de Talento Humano	100%	0%	0%	0%	100%		N.A.

PES-2022: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2022" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Mes	Avance Cualitativo
Plan de previsión ejecutado conforme con el PAC mensual solicitado	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	Se presenta un avance en ejecución presupuestal del 24% teniendo en cuenta los recursos asignados.
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	Para el segundo trimestre de la vigencia 2022 se dio cumplimiento a la meta establecida, llegando al 25% de cumplimiento
Porcentaje de personas capacitadas a través del Plan institucional de capacitación	
Enero	En el mes de enero se realizó 1 evento de entrenamiento en el marco del PIC, con la participación de 154 colaboradores. Esta jornada fue divulgada por mailing e invitada por Google Calendar, logrando un 55% de cobertura frente al 100% de la población actual.
Febrero	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de febrero se realizaron o participaron en 15 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 136* colaboradores.
Marzo	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se realizaron o participaron en 12 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 152* colaboradores.
Abril	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se realizaron o participaron en 11 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 117* colaboradores.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Mayo	No existe reporte para el periodo
Junio	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de junio se realizaron o participaron en 8 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 111* colaboradores.
Plan de trabajo del SG-SST ejecutado	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	Conforme a las evidencias del informe del Plan de Acción para el primer trimestre, informe de accidentalidad y el Plan de mejora de ARL Positiva, el porcentaje de cumplimiento es el 100% de la metra del trimestre (21%)
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	Teniendo en cuenta que el siguiente reporte corresponde al segundo trimestre de la vigencia 2022, la Meta Q2 con un valor porcentual de 25% de la Meta programada se cumple al 100%. Ahora bien respecto al cumplimiento acumulado, se reporta un avance total acumulado del 46% correspondiente a la suma de las Metas Q1 y Q2 sobre el valor porcentual asignado para cada una.
Porcentaje de la encuesta de medición de clima y cultura organizacional en nivel alto de favorabilidad	
Enero	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de enero se realizó 1 actividad programada de bienestar e incentivos con la participación de 5 colaboradores.
Febrero	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de febrero se realizaron 9 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 62 servidores públicos y otros colaboradores.
Marzo	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se realizaron 18 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 140 servidores públicos y colaboradores.
Abril	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de abril se realizaron 11 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 24 servidores públicos y colaboradores.
Mayo	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de mayo se realizaron o participaron en 11 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas, talleres y/o cursos programados y no programados, con la participación de 88 colaboradores aproximadamente.
Junio	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de junio se realizaron 6 actividades programadas y no programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 50 servidores públicos y colaboradores.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Sesiones de capacitaciones sectoriales de la Política de Talento Humano	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021 en relación con la política de Talento Humano	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Portafolio/Programa/Proyecto: **SERVICIOS**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Talento Humano y Servicios

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6	Modernizar Y Fortalecer El Funcionamiento Del Fondo Adaptación Con Visión De Largo Plazo						
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado	100%	25%	25%	25%	25%	50

Mes	Avance Cualitativo
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado	
Enero	Se realizó medición de los 8 indicadores correspondientes al periodo de enero 2022 de acuerdo a los compromisos del plan de acción 2022.
Febrero	Plan de acción de Febrero 2022 "Introducción al sistema de gestión ambiental del Fondo Adaptación" Durante el mes de febrero se llevaron a cabo actividades relacionadas a los aspectos ambientales de la entidad como el consumo de agua, energía y papel y la generación de residuos sólidos; los cuales tienen una relación directa con el plan de acción planeado durante la vigencia 2021. Como cumplimiento del mismo, se relacionan las siguientes actividades para el mes: 1) Capacitación del Sistema de gestión ambiental, 2) Campaña de "Tips y datos ecológicos", 3) Seguimiento al consumo de agua y papel. 4) Recomendaciones para el equipo de servicio de aseo y cafetería acerca del manejo de los residuos sólidos del Fondo Adaptación.
Marzo	Se realizaron las actividades internas correspondientes al periodo de marzo con grandes logros como el acercamiento y participación con la Secretaría de Ambiente,
Abril	Frente al cumplimiento ambiental se realizaron las actividades pertinentes al periodo abril 2022, se destaca el mejoramiento en la clasificación de los residuos sólidos, como también la disminución de los residuos generados y el consumo de agua y por otro lado la dificultad de la lectura del consumo de energía.
Mayo	En colaboración del gestor ambiental de la localidad de Santa fé-Promoambiental se instruyó a los funcionarios y colaboradores en todo el tema de residuos sólidos, para continuar con el cumplimiento de la codificación de las bolsas por colores según la resolución 2184 de 2019, pero también se tuvo la dificultad del seguimiento de consumo de energía por parte del arrendador del inmueble, sede actual de las instalaciones del Fondo Adaptación
Junio	Las actividades ejecutadas están siempre en proceso permanente y continuo, orientadas a administrar la información y los recursos relacionados con la Política Ambiental del Fondo Adaptación a fin de alcanzar una mejor calidad de vida dentro de la entidad. Dificultades en el proceso, es la medición del consumo de energía por la falta de la instalación de los medidores o contadores por parte del operador de la subestación de energía a cargo del Banco Davivienda, se resaltan logros en la adquisición de hojas de seguridad de sustancias químicas y su respectivo tratamiento ambiental.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Portafolio/Programa/Proyecto: **ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Talento Humano y Servicios

Objetivo estratégico 2018-2022 #6	Modernizar y fortalecer el funcionamiento del fondo adaptación con visión de largo plazo						
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido	Porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido	100%	100	100	100	100	95
Participar en las mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano, coordinadas por el MHCP	Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	100%	-	-	-	100%	N.A.
Participar en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA (suministro y análisis de información).	Sesión de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA	1	-	-	-	1	N.A.
De acuerdo a la misionalidad de la entidad actualizar el portafolio de productos y servicios, y gestionar la publicación en los diferentes canales de comunicación, con el fin de orientar a los grupos de valor, y que tenga criterios de accesibilidad, lenguaje claro y gobierno abierto.	Actualizar el portafolio de servicios	100%	-	-	-	100%	N.A.

Mes	Avance Cualitativo
Porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido	
Enero	<p>Para la vigencia 2022 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad: Para el mes de enero de 2022 se recibieron 194 PQRSFD, de las cuales 65 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 129 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte a 31 de enero de 2022 el indicador se cumplió al 100%, toda vez que no hubo respuestas extemporáneas. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano. En el periodo a reportar se socializó: Enero 17 de 2022 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5º Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.
Febrero	<ol style="list-style-type: none"> Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad: Para el mes de febrero de 2022 se recibieron 247 PQRSFD, de las cuales 62 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>ley y 2 extemporáneamente, para un total de 64 respuestas gestionadas durante febrero, así mismo 183 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte a 28 de febrero de 2022 el indicador se cumplió al 99%.</p> <p>2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano. En el periodo a reportar se socializó: Febrero 14 de 2022 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD. Febrero 14 de 2022 – En intranet se socializó la importancia de responder PQRSFD oportunamente.</p>
Marzo	<p>1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas en la entidad: Para el primer trimestre de 2022 se recibieron 746 PQRSFD, de las cuales 478 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 9 extemporáneamente, para un total de 487 respuestas gestionadas durante el 01 de enero a 31 de marzo de 2022, así mismo 259 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte a 31 de marzo de 2022 el indicador se cumplió en un 98%.</p> <p>2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia 2022 temas para la atención al ciudadano. En el periodo a reportar se socializó: Marzo 14 de 2022 – En intranet se socializó la importancia de emplear un lenguaje claro y sencillo como servidores públicos. Marzo 28 de 2022 – En intranet se socializó ¿Qué permite el lenguaje claro?</p>
Abril	<p>1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas en la entidad: Para el mes de abril de 2022 se recibieron 221 PQRSFD, de las cuales, a 30 de abril de 2022, 40 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 181 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte al mes de abril el indicador se cumplió al 100%, toda vez que no hubo respuestas extemporáneas.</p> <p>2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia 2022 temas para la atención al ciudadano.</p> <p>En el periodo a reportar se socializó:</p> <p>Abril 11 de 2022 – En intranet se socializó Aspectos generales de la atención al ciudadano.</p> <p>Abril 19 de 2022 – Cambio en los términos de respuesta a las PQRSFD según Ley 1755 de 2015. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>Abril 25 de 2022 – En intranet se socializó Recomendaciones generales para atención en situaciones difíciles.</p>
Mayo	<p>Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia 2022 temas para la atención al ciudadano. En el periodo a reportar se socializó:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<ul style="list-style-type: none"> • Mayo 9 de 2022- En intranet se socializó ¿Qué hacer cuando las peticiones de los ciudadanos llegan incompletas? • Mayo 23 de 2022 – En intranet se socializó Para saber aplicación del traslado por competencia.
Junio	<p>1.Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas en la entidad: Para el segundo trimestre de 2022 se recibieron 798 PQRSFD, de las cuales 623 ya fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley, 30 extemporáneamente y 145 peticiones en trámite de respuesta; sin embargo, con corte al 30 de junio de 2022 están dentro del tiempo de ley y es necesario contar con el cierre del trámite a fin de indicar el cumplimiento del indicador. Por lo anterior el cumplimiento de respuestas a PQRSFD generadas oportunamente en el segundo trimestre de la actual vigencia con corte al 30 de junio corresponde al 95%.</p> <p>* Nota aclaratoria primer trimestre (Q1):</p> <p>Se actualiza la información del reporte del Q1, teniendo en cuenta que con la ampliación de términos a las respuestas a los derechos de petición hasta después del 16 de mayo de 2022 vencían los tiempos para consolidar la gestión de las PQRSFD recibidas durante el primer trimestre. Los datos definitivos son: Para el primer trimestre de 2022 se recibieron 746 PQRSFD, de las cuales 727 fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley, 18 extemporáneamente y 1 petición incompleta pendiente de elaboración de auto de desistimiento tácito para el cierre final. Por lo anterior el cumplimiento de respuestas a PQRSFD generadas oportunamente en el primer trimestre de la actual vigencia corresponde al 98%.</p> <p>2.Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia 2022 temas para la atención al ciudadano.</p> <p>En el periodo a reportar se socializó:</p> <p>Junio 6 de 2022 – En intranet se socializó ¿Qué hacer con las peticiones reiterativas ya resueltas?</p> <p>Junio 7 de 2022 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD según Ley 1755 de 2015. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD</p> <p>Junio 21 de 2022 – En intranet se socializó ¿Qué hacer con el rechazo de peticiones de información por motivos de reserva?</p>
Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	
Enero	Durante el mes de enero de 2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó mesa sectorial, así como tampoco realizó requerimiento alguno sobre el tema. Es importante indicar que el avance de esta actividad depende directamente del MHCP, como cabeza y organizador de las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano.
Febrero	Durante el mes de febrero de 2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó mesa sectorial, así como tampoco realizó requerimiento alguno sobre el tema.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Marzo	El 2 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m. por Microsoft Teams, se realizó la primera mesa sectorial de servicio al ciudadano citada por el Ministerio de Hacienda, tema: Oficina de Relación con el Ciudadano (Art 17 Ley 2052 de 2020).
Abril	Para el mes de abril Ministerio de Hacienda no realizó agendamiento de mesa sectorial
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No hubo convocatoria de mesa de trabajo por parte del Ministerio de Hacienda
Sesión de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Actualizar el portafolio de servicios	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN DOCUMENTAL**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Talento Humano y Servicios

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6	MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO						
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado	100%	25%	25%	25%	25%	50
Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP PES-2022	Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	100%	-	-	-	100%	3

PES-2022: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2022" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.
 (*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG

Mes	Avance Cualitativo
Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	<p>Para el mes de febrero se adelantaron las siguientes actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar las respectivas inserciones del archivo de gestión en orden cronológico. 2. Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario. <p>Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 5 transferencias externas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente. Información que corresponde a un total 0.66 Metros Lineales. 4. Clasificar por serie y subserie documental. Durante el periodo evaluado se han adelantado las siguientes actividades de clasificación por parte del E.T Sección Gestión Documental sobre la serie comunicaciones oficiales de la vigencia 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 y 2020 correspondiente a un total de 6 metros lineales de información. 5. Realizar la completitud del expediente e incluir la documentación en orden cronológico. 6. Realizar seguimiento a la convalidación de TRD <p>Se realizó la reunión de apertura del proceso de convalidación de las TRD el pasado 22 de febrero, con participación del Archivo General de la Nación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA <p>Se realizaron mesas de trabajo con el contratista Forest en la cual se trabajaron la matrices de información correspondientes, para realizar las configuraciones correspondientes de la nueva herramienta con el ánimo de iniciar pruebas de la misma, para lo anterior se han adelantado un total de 10 mesas de trabajo con la participación de los Equipos de Trabajo de Tecnologías de la Información y la Sección Gestión Documental en conjunto con los colaboradores de Forest BPMS Macroproyectos.</p>
Marzo	<p>Meta 1. Actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR – Plan Institucional de Archivos 2022.</p> <p>Actividad 1. Realizar las respectivas inserciones del archivo de gestión en orden</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>cronológico.</p> <p>Desarrollo: Se han realizado las actividades de Inserción, correspondientes a la Serie HISTORIAS LABORALES 0.25 metros de información correspondientes a entregas de tarjeta de proximidad, planes de capacitación.</p> <p>Serie RESOLUCIONES Vigencia 2019 correspondiente a 0.25 metros lineales de información</p> <p>Actividad 2. Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario.</p> <p>Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 3 transferencias externas, para un total 44.75 Metros lineales de información.</p> <p>Actividad 3. Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente.</p> <p>Actividad 4. Clasificar por serie y subserie documental.</p> <p>Actividad 5. Realizar la completitud del expediente e incluir la documentación en orden cronológico. Se ha realizado la completitud de información perteneciente a la Serie CONTRATOS con la inserción de 0,70 metros lineales, correspondientes a las concertaciones y evaluaciones de los funcionarios de la Entidad.</p> <p>Actividad 6. Elaboración y actualización de Instrumentos archivísticos, y documentación que apoyen el proceso de Gestión Documental.</p> <p>Desarrollo: Proyección de los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programa de Gestión Documental (PGD) 2. Guía para la Organización y Transferencia de Documentos Físicos 3. Guía para la Organización y Transferencia de Documentos electrónicos Aplicando la Tabla de Retención Documental. <p>Actividad 7. Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA. Se realizaron mesas de trabajo con el contratista Macroproyectos para la implementación de su herramienta Forest, en la cual se trabajaron la matrices de información correspondientes, para realizar las configuraciones correspondientes de la nueva herramienta con el ánimo de iniciar pruebas de la misma, para lo anterior se han adelantado un total de 10 mesas de trabajo con la participación de los Equipos de Trabajo de Tecnologías de la Información y la Sección Gestión Documental, Sección Atención al ciudadano en conjunto con los colaboradores de Forest BPMS Macroproyectos, en donde se adelantó la fase de transferencia de conocimiento a los administradores de la herramienta.</p> <p>Meta 2. Mesas Sectoriales – Ministerio de Hacienda</p> <p>Durante el periodo evaluado se participó en las actividades de elaboración y formulación de la Guía para la elaboración del Plan de Preservación Digital. Así mismo en la reunión de entrega y socialización de esta.</p>
Abril	<p>Para el mes de abril se adelantaron las siguientes actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR 2022.</p> <p>Realizar las respectivas inserciones del archivo de gestión en orden cronológico.</p> <p>Se han realizado las actividades de Inserción, correspondientes a la serie Control Interno De Gestión, una (1) carpeta equivalente a 0.0085 metros lineales de información correspondientes a entregas de informes de gestión. Serie Contratos dos (2) cajas equivalentes a 0.71 metros lineales</p> <p>Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario.</p> <p>Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente.</p> <p>Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas internas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo:</p> <p>E.T Sector Vivienda – 11 Inserciones</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>E.T Sector Transporte – 3 inserciones E.T Reactivación Económica – 12 Inserciones E.T Sector Educación – 38 Inserciones E.T Macroproyecto El Gramalotes 4 Inserciones y 3 Carpetas E.T gestión Contractual – 277 Inserciones Control Interno de Gestión – 6 inserciones E.T Macroproyecto Canal del Dique 2 cajas 0.50 metros lineales</p> <p>Clasificar por serie y subserie documental. Durante el periodo evaluado se han adelantado las siguientes actividades de clasificación y organización por parte del operador de organización sobre la serie proyectos - contrato 094 de 2012 Comfama correspondiente a un total de 120 cajas, equivalentes a 30 metros lineales de información.</p> <p>Proyección de los siguientes documentos: Ajustes al borrador del documento de actualización del Programa de Gestión Documental Elaboración del Diagnostico Integral de Archivos de la Entidad</p> <p>Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA Se realizaron mesas de trabajo con el contratista Forest en la cual se trabajaron la matrices de información correspondientes, para realizar las configuraciones correspondientes de la nueva herramienta con el ánimo de iniciar pruebas de la misma, para lo anterior se han adelantado un total de 7 mesas de trabajo con la participación de los Equipos de Trabajo de Tecnologías de la Información y la Sección Gestión Documental en conjunto con los colaboradores de Forest BPMS Macroproyectos en la cual se realizaron actividades de transferencia de conocimiento, adicional se adelantaron actividades de parametrización del módulo de radicación del SGDEA, para lo anterior se realizó la depuración de base de datos de terceros la cual inicialmente contaba con 29.300 registros, se retiraron registros duplicados y se finalizó con 17.973 registros .</p>
Mayo	<p>Actividad 1. Realizar las respectivas inserciones del archivo de gestión en orden cronológico.</p> <p>Desarrollo: Serie CONTRATOS Vigencia 2012 A 2019 correspondiente a 0.51 metros lineales de información</p> <p>Actividad 2. Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario. Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 2 transferencias externas, discriminadas de la siguiente forma: 1.Contrato 2019-C-0358 Ingeniero Gustavo Adolfo Torres Duarte 5 Cajas X-200 2.Contrato 2015-C-0171 Interventoría Restrepo y Uribe S.A.S 19 Cajas X-200 3.Contrato 2017-C-0179 Corpoacero 10 Cajas X-200</p> <p>Para un total 8.5 Metros lineales de información.</p> <p>Actividad 3. Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente. Desarrollo: Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas internas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo: 1.Secretaría General – Resoluciones-6 Carpetas 2.Reactivación Económica – 4 Folios Información que corresponde a un total 0.25 Metros Lineales de información.</p> <p>Actividad 4. Clasificar por serie y subserie documental. Desarrollo: Durante el periodo evaluado se han adelantado las siguientes actividades de clasificación por parte del E.T Sección Gestión Documental sobre la Serie CONTRATOS y</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>PROYECTOS de las vigencias 2012 y 2013 correspondiente a un total de 509 cajas, equivalentes a 124 metros lineales de información.</p> <p>Actividad 5. Realizar la completitud del expediente e incluir la documentación en orden cronológico. Desarrollo: Se ha realizado la completitud de información perteneciente a la Serie Resoluciones con la inserción de 0,25 metros lineales, correspondientes a las Resoluciones de vigencia 2020 de la Entidad.</p> <p>Actividad 6. Elaboración y actualización de Instrumentos archivísticos, y documentación que apoyen el proceso de Gestión Documental. Desarrollo: Proyección de los siguientes documentos: 1.Circular 008 de 11 de mayo de 2022 2.Resolución 367 de 2 de mayo de 2022</p> <p>Actividad 7. Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA. Desarrollo: Se realizaron mesas de trabajo con el contratista Macroproyectos para la implementación de su herramienta Forest, en la cual se trabajaron la matrices de información correspondientes, para realizar las configuraciones correspondientes de la nueva herramienta con el ánimo de iniciar pruebas de la misma, para lo anterior se han adelantado un total de 10 mesas de trabajo con la participación de los Equipos de Trabajo de Tecnologías de la Información y la Sección Gestión Documental, Sección Atención al Ciudadano en conjunto con los colaboradores de Forest BPMS Macroproyectos, en donde se adelantó la fase de transferencia de conocimiento a los administradores de la herramienta y se solicitan bases de datos a informática Documental para continuar con los procesos de migración correspondiente.</p>
Junio	<p>Meta 1. Actividades en desarrollo de la ejecución del PINAR – Plan Institucional de Archivos 2022.</p> <p>Actividad 1. Realizar el control de calidad respectivo del archivo de gestión. Desarrollo: Se llevó a cabo las actividades de control de calidad, a las Series:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HISTORIAS LABORALES INACTIVAS a un total de (8) ocho metros de información. • RESOLUCIONES Vigencia 2011-2020 a un total de (4) cuatro metros lineales de información. • PQRSDF a un total de (30.50) treinta puntos cincuenta metros lineales de información. • INFORMES DE COMISIÓN a un total de (3.25) tres puntos veinticinco metros lineales. • CONTRATOS 2012 a un total de (3.25) tres puntos veinticinco metros lineales. <p>Para un total de (49) cuarenta y nueve metros lineales.</p> <p>Actividad 2. Dar ubicación física al expediente y actualizar el inventario. Desarrollo: Se han recibido durante el periodo evaluado un total de 11 transferencias externas, discriminadas de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato 2013-C-0050 Corporación Minuto De Dios, 32 Cajas X200 2. Contrato 2019-C-0113 Construir 21, 23 Cajas X200 3. Contrato 2018-C-0210 Consorcio Itiel, 15 Cajas X200 4. Contrato 2020-C-0223 Unexalog Sas, 3 Cajas X200 5. Contrato 2012-C-0088 Comfandi, 5 Cajas X200 6. Contrato 2016-C-0237 Consorcio Obra Vip Sucre, 30 Cajas X200 7. Contrato 2014-C-0292 Pomcas-Rio Cali, 12 Cajas X200 8. Contrato 2012-C-0096 Operador Zonal Colsubsidio, 91 Cajas X200 9. Contrato 2020-C-0064 Consorcio Wa-Gramalote, 12 Cajas X200

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>10. Contrato 2020-C-0070 Interventoría Restrepo Y Uribe S.A.S, 1 Cajas X200 11. Contrato 2013-C-0242 Comfachocó, 14 Cajas X200</p> <p>Para un total (59,5) cincuenta y nueve coma cinco metros lineales de información.</p> <p>Actividad 3. Recibir la documentación que se genera en Fondo Adaptación y que es transferida semanalmente. Desarrollo: Durante el periodo se recibieron las transferencias internas de las oficinas internas del Fondo Adaptación correspondientes a los siguientes equipos de trabajo: 1.E.T. Sector Gestión Financiera – Sección Presupuesto – Comunicaciones Solicitud de expedición y modificación de CDR – 2 carpetas. 2.E.T. Control Interno Disciplinario – Informes de Seguimiento y Control, Actas De Comité Institucional e Informes A Entidades De Estado – 1 Carpeta. 3.E.T. Gestión del Talento Humano – Evaluaciones del Desempeño Laboral y tipologías varias de Historias Laborales - 2 carpetas. 4.Secretaría General – Resoluciones – Vigencia 2020 - 1 Caja X200</p> <p>Información que corresponde a un total 0.50 metros lineales de información.</p> <p>Actividad 4. Clasificar por serie y subserie documental. Desarrollo: Durante el periodo evaluado se han adelantado las siguientes actividades de clasificación por parte del E.T. Sección Gestión Documental sobre las siguientes series: 1.RESOLUCIONES Vigencia 2011-2020 a un total de (4) cuatro metros lineales de información. 2.PQRSDF a un total de (30.50) treinta punto cincuenta metros lineales de información. 3.INFORMES DE COMISIÓN a un total de (3.25) tres punto veinticinco metros lineales. 4. CONTRATOS 2012 a un total de (3.25) tres punto veinticinco metros lineales. Para un total de (49) cuarenta y nueve metros lineales.</p> <p>Información que corresponde a un total 41 metros lineales de información.</p> <p>Actividad 5. Realizar la completitud del expediente e incluir la documentación en orden cronológico. Desarrollo: Se ha realizado la completitud de información perteneciente a las series: 1. ACTAS - Actas De Comité De Coordinación Del Sistema De Control Interno. 2. INFORMES - Informes De Seguimiento Y Control -2022. 3. CONTRATOS.</p> <p>Correspondiente a 0,09 metros lineales de inserciones de información.</p> <p>Actividad 6. Elaboración y actualización de Instrumentos archivísticos, y documentación que apoyen el proceso de Gestión Documental. Desarrollo: Proyección de los siguientes documentos: 1. Diagnostico integral de archivos 2. Programa de Archivos Descentralizados 3. Programa de Reprografía 4. Programa de Documentos Vitales 5. Tablas de Control De Acceso</p> <p>Actividad 7. Realizar seguimiento al cronograma de implementación del SGDEA. Desarrollo: Se realizaron mesas de trabajo con el contratista Macroproyectos para la implementación de su herramienta Forest, para la cual se programaron 5 días de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	capacitación para administradores en lapsos de 4 horas diarias, capacitaciones que se realizaron los días 13,14,15,16 y el 21 de junio.
Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	
Enero	No existe reporte para el periodo
Febrero	Para el mes de febrero, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no programó mesas sectoriales de los equipos de gestión documental del sector, por tal razón no se presenta avances durante este periodo.
Marzo	Se participó en la mesa sectorial realizada el pasado 31 de marzo en la cuales se compartieron los siguientes temas: Avances y logros alcanzados a la fecha por la mesa, entre los cuales se encuentran el diagnóstico inicial realizado en 2019 y como ha incrementado el puntaje desde la primera medición. Se presentó el estado del proyecto de Guía Elaboración Plan de Preservación Digital, con base en los avances de las mesas desde su formulación en 2020, hasta la generación del producto final. Así mismo, se relacionó en la sesión acerca de la guía generada por el AGN y como desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público buscamos articular nuestra guía con esta. Se socializó a la mesa el desarrollo de la nueva metodología de diagnóstico, la cual estará orientada principalmente bajo el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos V.2020 del AGN.
Abril	Para el mes de abril, no se programaron reuniones de la Mesa Sectorial de Gestión Documental del Sector Hacienda.
Mayo	Durante el periodo evaluado no se presentaron actividades de la mesa sectorial.
Junio	Durante el periodo evaluado se participó en las actividades del 1RA SESIÓN DE EXPERIENCIAS realizada el día 29 de junio de 2022.

- Equipo Gestión Contractual

Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN CONTRACTUAL**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Gestión Contractual

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6	Modernizar Y Fortalecer El Funcionamiento Del Fondo Adaptación Con Visión De Largo Plazo						
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Realizar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Procesos de contratación tramitados de forma adecuada y oportuna en los términos de ley.	100%	100	100	100	100	100

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Gestionar de forma adecuada y oportuna las actas o informes radicados según Plan de liquidaciones 2022	Actas o informes radicados según Plan de Liquidaciones 2022 sobre actas o informes gestionados en un término máximo de 30 días calendario desde su radicación.	100%	100	100	100	100	100
Realizar modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas	Modificaciones, cesiones, terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas.	100%	100	100	100	100	100

Mes	Avance Cualitativo
Procesos de contratación tramitados de forma adecuada y oportuna en los términos de ley.	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	Durante el primer trimestre de 2022, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades solicitaron la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de 2 órdenes de compra las cuales se tramitaron oportunamente. Adicionalmente, requirieron adelantar el trámite para 190 procesos de contratación llevados a cabo electrónicamente a través de SECOP II, de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Abril	Durante el mes de abril de 2022, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades no requirieron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Adicionalmente, requieren adelantar el trámite para 1 proceso de contratación llevado a cabo electrónicamente a través de SECOP II, de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Mayo	Durante el mes de mayo de 2022 las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 1 orden de compra la cual se tramitó oportunamente. Adicionalmente, requieren adelantar el trámite para 3 procesos de contratación llevado a cabo electrónicamente a través de SECOP II de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Junio	En junio de la presente vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 25 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 25 solicitudes, 4 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p> <p>Se concluye que, durante el segundo trimestre de 2022 las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo con sus necesidades solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de 4 órdenes de compra, las cuales se tramitaron oportunamente. Adicionalmente, requirieron adelantar el trámite para 7 procesos de contratación llevado a cabo electrónicamente a través del SECOP II de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
<p>Actas o informes radicados según Plan de Liquidaciones 2022 sobre actas o informes gestionados en un término máximo de 30 días calendario desde su radicación.</p>	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	El avance consolidado del Plan de Liquidaciones 2022 para el primer Q1 con corte 31/03/2022 es el siguiente: Total radicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022:166 trámites con el siguiente estado: a)Contratos/Convenios liquidados: 76; b)Cierres de expediente tramitados: 4; c)Trámites devueltos para ajustes de Sectores, Macroproyectos y Equipos:19; d)En revisión equipo gestión contractual - liquidaciones: 8 recibidos el 31/3/2022; e)En trámite de firma: 6; f)No objeto de Liquidación: 52; g)En liquidación judicial: 1.
Abril	Entre el 1º y el 30 de abril de 2022 se radicaron 26 trámites. El estado actual de esos 26 trámites es el siguiente: 4 actas de liquidación suscritas; 8 trámites devueltos para ajustes; 4 actas en firma; 7 trámites en revisión, radicados entre el 28 y el 29 de abril; 3 contratos con reporte no objeto de liquidación. Adicionalmente a los 3 contratos no objeto de liquidación relacionados en el Plan de Liquidaciones 2022, en el marco de la depuración de la herramienta SIFA conforme a las actividades de mejora del Plan de Mejoramiento de la Secretaría General -Informe de Seguimiento al Macroproceso de Gestión Contractual, los Sectores, Macroproyectos y demás Equipos de Trabajo reportaron en el mes de febrero, 12 contratos no objeto de liquidación.
Mayo	No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un reporte trimestral (Q1, Q2, Q3) en atención al plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General. Sin embargo, se reporta que entre el 1º y el 31 de mayo de 2022 se radicaron 47 trámites para revisión del Equipo de Gestión Contractual - Liquidaciones. El estado actual de esos 47 trámites es el siguiente: 5 actas de liquidación suscritas; 6 informes de cierre de expediente tramitados; 1 informe de cierre en revisión del Equipo de Gestión Financiera; 6 trámites devueltos para ajustes; 9 trámites en revisión del Equipo de Gestión contractual; y 20 contratos con reporte no objeto de liquidación.
Junio	El avance del Plan de Liquidaciones 2022 - Q2 con corte 30/6/2022, es el siguiente: Total 119 trámites con el siguiente estado: a) Contratos/Convenios liquidados: 22; b) Cierres

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	de expediente tramitados: 16; c)Trámites devueltos para ajustes de Sectores, Macroproyectos y Equipos: 19; d)En revisión equipo gestión contractual - liquidaciones: 52; e)En trámite de firma: 1; f)No objeto de Liquidación: 7; g) En revisión financiera: 2. TOTAL: 119
Modificaciones, cesiones, terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas.	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	En el primer trimestre de 2022, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 50 requerimientos, los cuales, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 50 solicitudes, 2 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Abril	En abril de presente vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 12 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 12 solicitudes, 1 requirió mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Mayo	En mayo de presente vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 17 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 17 solicitudes, 4 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Junio	Durante el mes de junio de 2022 las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo con sus necesidades, solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de 3 órdenes de compra, las cuales se tramitaron oportunamente. Adicionalmente, requirieron adelantar el trámite para 3 procesos de contratación llevado a cabo electrónicamente a través de Secop II de esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%. En conclusión, en el segundo trimestre de vigencia, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	En tal virtud, se recibieron 54 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 54 solicitudes, 4 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.

- Equipo Defensa Judicial

En Defensa Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo, se desarrollan y consolidan las acciones para lograr una mejor defensa de los intereses de la Entidad. Las acciones planteadas buscan alinearse con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa del Estado y fortalecer los resultados y desempeño en la política de Defensa Judicial en el Índice de Desempeño Institucional.

Portafolio/Programa/Proyecto: **DEFENSA JUDICIAL**

Gerente de Meta: Asesor Equipo Defensa Judicial

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6		Modernizar Y Fortalecer El Funcionamiento Del Fondo Adaptación Con Visión De Largo Plazo					
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran.	Reporte de índice de condenas diligenciado y socializado al Comité de Conciliación de la Entidad.	1	-	-	-	1	N.a.
Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda	Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	2	-	-	-	2	N.a.
Realizar la verificación semestral de aquellos contratistas que incumplan su deber legal del pago de salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores, así como, de honorarios a sus contratistas	Reporte sobre el pago de contratistas, Realizado.	1	-	1	-	2	0
Medir las tasas de éxito del Fondo durante la vigencia inmediatamente anterior en los procesos judiciales en los que es demandado, recibiendo, gestionando y haciendo seguimiento a los procesos judiciales entablados en su contra	Medir tasas de éxito procesal de conformidad con el indicador implementado en el Sistema de Gestión de Calidad del FA.	1	1	-	-	1	1

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Reporte de índice de condenas diligenciado y socializado al Comité de Conciliación de la Entidad.	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	No aplica para el periodo del reporte
Reporte sobre el pago de contratistas, Realizado.	
Enero	No aplica para el periodo del reporte
Febrero	No aplica para el periodo del reporte
Marzo	No aplica para el periodo del reporte
Abril	No aplica para el periodo del reporte
Mayo	No aplica para el periodo del reporte
Junio	Se han presentado dificultades en la unicidad de criterios a reportar en atención a la multiplicidad de contrataciones que realiza la entidad para el adecuado seguimiento de pagos de aportes a seguridad social efectuados por los empleadores a sus trabajadores. Se espera generar el reporte en el tercer trimestre, una vez se unifiquen los criterios.
Medir tasas de éxito procesal de conformidad con el indicador implementado en el Sistema de Gestión de Calidad del FA.	
Enero	No existe reporte para el periodo

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Febrero	No existe reporte para el periodo
Marzo	Se construyó el reporte del indicador denominado defensa judicial, cuyo objetivo es medir las tasas de éxito del Fondo en los procesos judiciales en los que es demandado, recibiendo, gestionando y haciendo seguimiento a los procesos judiciales entablados en su contra, mismo que arrojó como resultado una tasa de éxito del 80% de las decisiones ejecutoriadas durante la vigencia 2021. A la fecha se encuentra pendiente la publicación de dicho indicador en el proceso 10. Defensa Judicial conforme al Kit Documental incorporado en el Sistema de Gestión de Calidad para tal fin.
Abril	Meta para el periodo cumplida
Mayo	Meta para el periodo cumplida
Junio	Meta para el periodo cumplida

- Equipo Control Interno Disciplinario

Portafolio/Programa/Proyecto: **CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

Gerente de Meta: Asesor Control Interno Disciplinario

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6		MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO					
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Gestionar las actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente	Número de requerimientos tramitados en el término establecido / Número de requerimientos asignados.	100%	100%	100%	100%	100%	100
Capacitar a funcionarios de la entidad en la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias.	Realizar actividades de capacitación para la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares.	4	-	-	-	4	4

Mes	Avance Cualitativo
Número de requerimientos tramitados en el término establecido / Número de requerimientos asignados.	
Enero	Durante el mes de Enero de 2022, se analizó uno a uno el estado de expedientes a cargo del equipo de trabajo de control interno disciplinario, en especial los aspectos relacionados con vencimiento de términos procesales, buscando prevenir riesgos relacionados con estos aspectos dentro de la legislación vigente. Así mismo se socializó el Plan de Acción Integrado 2022 publicado en la pagina web de la entidad, en cuya página 44, punto 4.5.4. se indica las acciones estratégicas dispuestas para nuestro equipo de trabajo de control interno disciplinario, junto con sus indicadores de metas y programación de las mismas dentro del año 2022. Por su parte, se estructuró el

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	<p>cronograma y temáticas a abordar para las sensibilizaciones o capacitaciones en promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, dispuesto como meta en el presente año, la cual se informará oportunamente para efecto de la convocatoria. Dado el cambio de normatividad disciplinaria, durante el mes de enero se elaboró con el equipo de trabajo el proyecto de modificación de la ficha de caracterización, normograma, manual de funciones y organización de planta de personal dispuesto para el equipo de trabajo de control interno disciplinario, así como para la secretaria general y gerencia del fondo, a fin de ajustar, dentro del proceso disciplinario, las etapas de instrucción y juzgamiento exigidas por la Ley 1952 de 2019, la cual entrará en vigencia el próximo 29 de marzo. Por último, el pasado 31 de enero se asistió a la Primera Sesión del año 2022 del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda, en el cual abordaron los temas de Balance Día de la Transparencia 2021, realizado el pasado 29 de noviembre, el cual contó con la participación de funcionarios y contratistas del fondo.</p>
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el mes de Febrero de 2022, se realizó seguimiento al avance de los procesos disciplinarios de cada uno a uno de los expedientes a cargo del equipo de trabajo de control interno disciplinario, en especial lo relacionado con vencimiento de términos procesales, buscando prevenir riesgos relacionados con estos aspectos y la prescripción de la acción disciplinaria. • Dado el cambio de normatividad disciplinaria, durante el mes de febrero se elaboró y remitió una solicitud de concepto dirigido a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, con el propósito de tener claridad sobre los términos procesales a aplicar en las actuaciones disciplinarias activas a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 el próximo 29 de marzo. Así mismo, se consultó sobre la estructura disciplinaria de la entidad, en aras de obtener certeza operacional en el trámite de las etapas de instrucción y juzgamiento del nuevo proceso disciplinario.
Marzo	<p>El porcentaje de avance de esta meta establecida para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2022, es de un 100%.</p>
Abril	<p>Frente al avance en la gestión de actuaciones disciplinarias, se destaca el cumplimiento a los términos en todos y cada uno de los procesos disciplinarios a cargo del equipo de trabajo, atendiendo los diferentes requerimientos dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.</p>
Mayo	<p>Frente al avance en la gestión de actuaciones disciplinarias, destaca que se ha dado cumplimiento a los términos en todos y cada uno de los procesos disciplinarios a cargo del equipo de trabajo, atendiendo los diferentes requerimientos dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente. En materia de seguimiento al avance de los procesos disciplinarios en cada uno de los expedientes a cargo del equipo de trabajo de control interno disciplinario, con miras a prevenir vencimiento de términos procesales, y riesgos relacionados con la prescripción de la acción disciplinaria, se efectúa control permanente sobre los mismos, lo que ha arrojado como consecuencia el cumplimiento pleno de las metas y términos establecidos.</p>
Junio	<p>El porcentaje de avance de esta meta establecida para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2022, es de un 100%.</p>
<p>Realizar actividades de capacitación para la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares.</p>	
Enero	<p>No aplica para el periodo del reporte</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Febrero	<p>En atención a las actividades a desarrollar en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC para la vigencia 2022, en especial la definida dentro Eje 2: Creación de valor público conforme al Plan Nacional de Formación y Capacitación - PNFC 2020-2030, denominada como Capacitación en el Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019, y en consideración al Plan de Acción Integrado 2022, dentro del cual se dispuso, como acción estratégica para con nuestro Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, la realización de cuatro (4) sensibilizaciones o capacitaciones encaminadas a la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, como parte del plan estratégico de sensibilización para el presente año, para el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, se efectuaron un total de tres (3) capacitaciones, las cuales se desarrollaron de la siguiente manera:</p> <p>25/02/2022. Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019 / "Prevención en materia de faltas disciplinarias por presunta participación o intervención en política". Total:117 personas.</p>
Marzo	<p>En atención a las actividades a desarrollar en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC para la vigencia 2022, en especial la definida dentro Eje 2: Creación de valor público conforme al Plan Nacional de Formación y Capacitación - PNFC 2020-2030, denominada como Capacitación en el Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019, y en consideración al Plan de Acción Integrado 2022, dentro del cual se dispuso, como acción estratégica para con nuestro Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, la realización de cuatro (4) sensibilizaciones o capacitaciones encaminadas a la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, como parte del plan estratégico de sensibilización para el presente año, para el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, se efectuaron un total de tres (3) capacitaciones, las cuales se desarrollaron de la siguiente manera:</p> <p>16/03/2022. Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019 / "Inhabilidades e incompatibilidades en la contratación estatal", "Faltas disciplinarias en la liquidación y supervisión de contratos", y "profundización de la Ley 1952 de 2019". Total: 19 personas (Líderes de equipo)</p> <p>29/03/2022. Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019. Total 125 personas.</p>
Abril	<p>De la meta anual dispuesta definida en cuatro (4) sensibilizaciones o capacitaciones a realizar, encaminadas a la promoción del conocimiento de las normas disciplinarias y prevención de conductas irregulares, para el mes de abril se llevó a cabo la cuarta y última de ellas, con lo cual se da cumplimiento cabal a la meta dispuesta definida en el Plan de Acción Integrado 2022 del Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, así como al Plan Institucional de Capacitación - PIC para la vigencia 2022, en lo que respecta a la meta definida dentro del Eje 2: Creación de valor público conforme al Plan Nacional de Formación y Capacitación - PNFC 2020-2030, denominada como Capacitación en el Nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019.</p>
Mayo	<p>El avance de esta meta establecida para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, es muy significativo, en la medida que, a corte del mes de abril, fueron efectuadas el total de las cuatro (4) capacitaciones programadas para todo el año 2022 dentro del plan de acción dispuesto.</p>
Junio	<p>El avance de esta meta establecida para el Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022, es muy significativo, dado que se efectuó un total de cuatro (4) capacitaciones, correspondientes al total de las capacitaciones programadas para todo el año 2022</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
	dentro del plan de acción dispuesto para este equipo de trabajo, con un total de asistencia en las 4 capacitaciones de 368 personas.

- Indicadores Plan de Acción de Alcance Institucional

Los siguientes indicadores miden la ejecución presupuestal de la entidad; sus resultados derivan de la gestión y logros tanto de las áreas misionales como de los grupos de trabajo de procesos de apoyo. Por su importancia, su resultado se mide a nivel institucional.

Portafolio/Programa/Proyecto: **FONDO ADAPTACIÓN**

Gerente de Meta: Institucional – Reporta Asesor Equipo Gestión Financiera

Objetivo Estratégico 2018-2022 #6		MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN CON VISIÓN DE LARGO PLAZO					
Acciones Estratégicas 2022 (Programas/Proyectos/Actividades /Hitos)	Indicador	Meta 2022	Programación Trimestral				Avance Meta
			Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecución presupuestal	Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	95%				95%	97
Ejecución presupuestal	Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	95%				95%	45
Ejecución presupuestal	Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	100%				100%	99
Ejecución presupuestal	Ejecución PAC Total	100%				100%	33,73

Mes	Avance Cualitativo
Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	
Enero	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de enero de 2022 es del 1,18%.
Febrero	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de Febrero de 2022 es del 1,44%. presentando un incremento del 0,26% respecto al mes de Enero de 2022.
Marzo	El avance de la ejecución total en compromisos, de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de marzo de 2022 es de 1,71%, que en comparación con el mes de febrero presenta un incremento del 0,27%.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Abril	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos en SIIF Nación al mes de abril de 2022 es del 2,01%, presentando un incremento del 0,30% respecto al mes de marzo de 2022.
Mayo	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de mayo de 2022 es del 93,99%, presentando un incremento del 91,98%.
Junio	El avance de ejecución total en compromisos de recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación al mes de junio de 2022, es del 97,33%, presentando un incremento del 3,34%.
Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	
Enero	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de enero de 2022 es del 13,54%.
Febrero	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de Febrero de 2022 es del 18,99%. presentando un incremento del 5,45% respecto al mes de Enero de 2022.
Marzo	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de marzo de 2022 es del 24,41%, que en comparación con el mes de febrero de 2022 se presenta un incremento del 5,42%.
Abril	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de abril de 2022 es del 30,80%, presentando un incremento del 6,39% respecto al mes de marzo de 2022.
Mayo	El avance de ejecución en compromisos de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de mayo de 2022 es del 36,92%, presentando un incremento del 6,12%.
Junio	El avance de ejecución en compromisos de recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de junio de 2022, es del 44,59%, presentando un incremento del 7,67%.
Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	
Enero	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de enero de 2022 es del 0,56%.
Febrero	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de Febrero de 2022 es del 0,56%. No se presenta incremento respecto al mes de Enero de 2022.
Marzo	Al mes de marzo de 2022 no se presenta avance en la ejecución de recursos de inversión, toda vez que no se ha realizado el levantamiento previo concepto - DNP para poder comprometer los recursos.
Abril	El avance de la ejecución total en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de abril de 2022 es del 0,56%, sin presentar movimiento respecto al mes de marzo de 2022.
Mayo	El avance de la ejecución en compromisos de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de mayo de 2022 es del 96,87%, presentando un incremento del 96,31%.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2022

Mes	Avance Cualitativo
Junio	El avance de ejecución en compromisos de recursos de inversión en SIIF Nación al mes de junio de 2022, es del 99,99%, presentando un incremento del 3,12%.
Ejecución PAC Total	
Enero	En enero de 2022 se efectuaron pagos por \$ 2,620 millones de acuerdo con la facturación radicada y los documentos de tramite de pago en funcionamiento e inversión la ejecución del mes frente a la proyección de PAC que realizaron las áreas fue de un 63% y se alcanzó el 0,31% con respecto a la meta anual, teniendo en cuenta que el porcentaje esperado para el mes de enero era del 0,5%
Febrero	En febrero de 2022 se efectuaron pagos por \$ 13,785 millones de acuerdo con la facturación radicada y los documentos de trámite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, lo que corresponde a un 86% del valor proyectado en PAC. Teniendo en cuenta que la meta establecida para el mes de FEBRERO es del 4,12%, de lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 4,43%.
Marzo	En el mes de Marzo de 2022 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de tramite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos por \$ 21,854 millones , valor que frente al valor proyectado del PAC para este mes por valor de \$17,694 millones, evidencia una sobre ejecución del 124% . Por lo anterior para el mes de marzo se alcanzo la meta en un 6,79% frente al porcentaje asignado para el cumplimiento de la meta anual para este mismo mes es del 5,5%. De lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 11,22%.
Abril	En el mes de Abril de 2022 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de tramite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos por \$ 22,507 millones , resultado que frente al valor proyectado del PAC para este mes por \$26,232 millones, se evidencia una ejecución del 86%. Por lo anterior para el mes de abril se obtuvo un 8,84%, quedando por debajo frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mismo mes, el cual es del 10,3%. De lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 20,06%
Mayo	En el mes de MAYO de 2022 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de tramite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos por \$ 13.822 millones , resultado que frente al valor proyectado del PAC para este mes por \$26,072 millones, se evidencia una ejecución del 53%. Por lo anterior para el mes de mayo se obtuvo un 5,78%, quedando por debajo frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mismo mes, el cual es del 10,9%. De lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 25,86%
Junio	En el mes de JUNIO de 2022 de conformidad con la facturación radicada y los documentos de tramite de pago allegados por las áreas administrativas y misionales, se efectuaron pagos por \$ 24.795 millones , resultado que frente al valor proyectado del PAC para este mes por \$20.733 millones, se evidencia una sobre-ejecución del 120%. Por lo anterior para el mes de junio se obtuvo un 7,89%, quedando por encima frente al porcentaje asignado de la meta anual para este mismo mes, el cual es del 6,6%. De lo anterior se concluye que el resultado obtenido de avance acumulado respecto a la meta anual es del 33,75%
