

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Impulsando el desarrollo sostenible del país,
a través de la adaptación al cambio climático

Octubre de 2021



Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Raquel garavito Chapaval
Gerente

Aníbal José Pérez García
Subgerente de Gestión Del Riesgo

Andrés Parra Beltrán
Subgerente de Estructuración

Helga Milena Hernández
Subgerente de Proyectos

Iliana Margarita Garzón
Subgerente de Regiones

Sandra Marcela Murcia
Secretaria General

Víctor Alejandro Venegas Mendoza
Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Cumplimiento

Víctor Alejandro Venegas Mendoza
Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Cumplimiento

Oscar Gonzalez
Asesor II Equipo de Trabajo
Planeación y Cumplimiento

Informe seguimiento de Plan de Acción 2021
versión 1, Octubre de 2021. Bogotá D.C.

**Equipo Directivo Fondo
Adaptación:**

Equipo Técnico:

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	2021/10/07	Documento Inicial

**Informe de
seguimiento
Plan de Acción
2021**

Contenido

Presentación

1. Introducción

2. Contexto de Formulación y Seguimiento del Plan de Acción 2021

Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2021
Criterios para la evaluación del Plan
Esquema de seguimiento

3. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos Misionales

4. Resultados Detallados Plan de Acción 2021

- 4.1. Área Subgerencia de Riesgo
- 4.2. Área Subgerencia de Proyectos
- 4.3. Área Subgerencia de Estructuración

5. Seguimiento Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales

- 5.1. Avances Cierre de Brechas Políticas MIPG
- 5.2. Área Subgerencia de Regiones
- 5.3. Área Gerencia – Equipo de Comunicaciones
- 5.4. Área Oficina de Planeación
- 5.5. Área Secretaría General

6. Seguimiento Plan de Acción Indicadores Transversales

Presentación

El año 2021, reviste para el Fondo Adaptación una importancia particular. La Entidad se acerca a finalizar la tarea de concluir y entregar la mayoría de proyectos con presupuesto asignados que como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: El Fenómeno de "La Niña" 2010-2011", fueron identificados, estructurados y gestionados para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal, y demás acciones relacionadas con los efectos del fenómeno de "La Niña".

La Entidad durante estos años ha desarrollado cinco macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no tienen precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con innumerables aprendizajes que posicionan al FA como una entidad líder en la concepción, estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de largo plazo y con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático.

En el Plan de Acción 2021 se plantearon las metas para terminar y entregar los proyectos pendiente por culminar, además incluye metas transversales que dan cuenta del compromiso de la entidad por convertirse en un referente de la administración pública y ser reconocida como la entidad líder en la ejecución de proyectos de adaptación y cambio climático en Latinoamérica.

Es por esto, que este año, cuando nos acercamos a la culminación de los proyectos, queremos a través de este informe de seguimiento al Plan de Acción del tercer trimestre del año 2021 presentar y socializar a los grupos de interés de la Entidad, las acciones ejecutadas por cada uno de los sectores, macroproyectos y procesos de apoyo, los avances que se han tenido al respecto y que vamos en camino a su cumplimiento.

1. Introducción

En el Plan de Acción 2021 del Fondo Adaptación, se establecen las acciones y determinan las metas, e indicadores que permitan al Fondo Adaptación impulsar el logro de los objetivos estratégicos y cumplir con su objetivo misional durante la vigencia 2021.

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que establece que, cada uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán como fundamento para la evaluación de resultados.

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 74¹), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, y distribución presupuestal de los proyecto de inversión, ligados a los indicadores de gestión.

El Plan de Acción, incluye, elementos de los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Decreto 1499 de 2017² y demás disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El propósito de este informe de ejecución es informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2021, y como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción del tercer trimestre de 2021 se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el mismo sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción programada primero se resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan los resultados cuantitativos por indicadores.

2. Contexto para la formulación del Plan

Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2021

Para facilitar la consulta del Informe de Seguimiento al plan y posibilitar la referencia cruzada de objetivos y responsables, el Informe de Seguimiento se estructuró de la misma forma que está estructurado el Plan de Acción, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2022 y la estructura organizativa actual del Fondo Adaptación establecida en la Resolución 0240 de 2020, en la cual se incluye la planta de personal teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos de la Entidad.

Criterios para la evaluación del Plan

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI. El avance anual de las metas del PEI 2019-2022 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de cada vigencia.

La elaboración del plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias (las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que contempla que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objeto tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados).

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente:

Criterios	Validación
Claro. Preciso e inequívoco.	Productos Tangibles
Relevante. Apropriado al tema en cuestión	Entregables del Proyecto
Económico. Disponible a un costo razonable	Meta Financiada
Medible. Abierto a validación independiente	Son sujeto de revisión bajo evidencia
Adecuado. Base para estimar resultados	Cuentan con Fuentes de información
Sensible. Se observan cambios en el tiempo	Avanzan en Períodos de Medición C/M/L

Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. La estimación de los resultados se hace con una ponderación importante de estas circunstancias, en la que juega un papel relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales riesgos.

Esquema de seguimiento

El Plan de Acción del Fondo Adaptación permite medir el desempeño institucional desde diferentes perspectivas, con el fin de identificar brechas en la gestión y facilitar la toma de decisiones oportunas para la mejora continua.

En el caso del Fondo Adaptación el Seguimiento al Plan de Acción permite medir el desempeño de la siguiente estructura:


- 6 Objetivos Estratégicos
- 7 Áreas
- 25 Equipos
- 27 Gerentes de meta
- Acciones estratégicas
- Indicadores de Eficacia

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

- Metas Anuales
- Metas Trimestrales

Para el Seguimiento al Plan de Acción se han establecido dos indicadores de control:

1. Indicador de Cumplimiento de Metas Consolidadas. Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. Para este ejercicio de seguimiento este indicador se presenta para los Objetivos Estratégicos y las Áreas. El gráfico que ilustra este indicador se muestra de la siguiente manera.



El semáforo de colores presentado en la gráfica, representa los siguientes avances:



Acción/Indicador sin metas/avances



Metas Ejecutadas = >100%




Metas Rezagadas entre >70%<99%



Metas Rezagadas <70%

2. Indicador de Avance de Metas Consolidadas. Busca mostrar el progreso de un objetivo en el tiempo, sin examinar su causa y sus efectos. Para este seguimiento se realiza un análisis de Avance de Metas Consolidadas por Área y Equipo, donde se relaciona lo planeado versus lo ejecutado mes a mes en la senda de tiempo. El gráfico siguiente ilustra la forma como se presenta este indicador.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

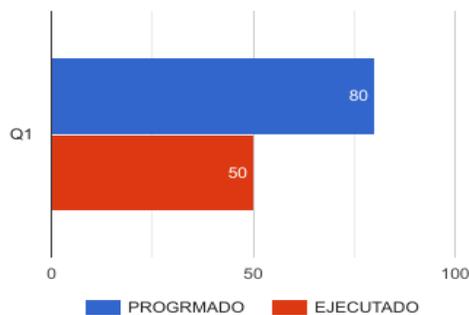

Adicionalmente, para cada meta específica del equipo de trabajo se indica el avance numérico y se realiza una valoración de semáforo para establecer su avance respecto a lo planeado.

- Acción/Indicador sin metas/avances
- Metas Ejecutadas = >100%
- Metas Rezagadas entre >70%<99%
- Metas Rezagadas <70%

Finalmente se incluye la bitácora de seguimiento de cada meta donde cada equipo responsable ilustra los avances en términos cualitativos durante cada mes.

3. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos Misionales

La perspectiva de planeación, es el punto de vista desde el cual se analizan y consideran los objetivos estratégicos del plan.

El Fondo Adaptación contempla dos perspectivas en su planeación acordes con el perfil de los resultados a lograr en los objetivos estratégicos: la perspectiva externa, en la cual se contempla el punto de vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas por el Fondo y la perspectiva interna, desde el que se contempla los resultados del cliente interno. Los objetivos estratégicos por cada perspectiva son los siguientes:

Perspectiva externa

OE1. Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

OE2. Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

OE3. Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

OE4. Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población.

Perspectiva interna

OE5. Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.


OE6. Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Desde el punto de vista de la planeación en esta primera parte se ilustran las acciones, indicadores y metas relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva externa, la cual incluye los objetivos institucionales 1, 2, 3 y 4.

Objetivo Estratégico #1: Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

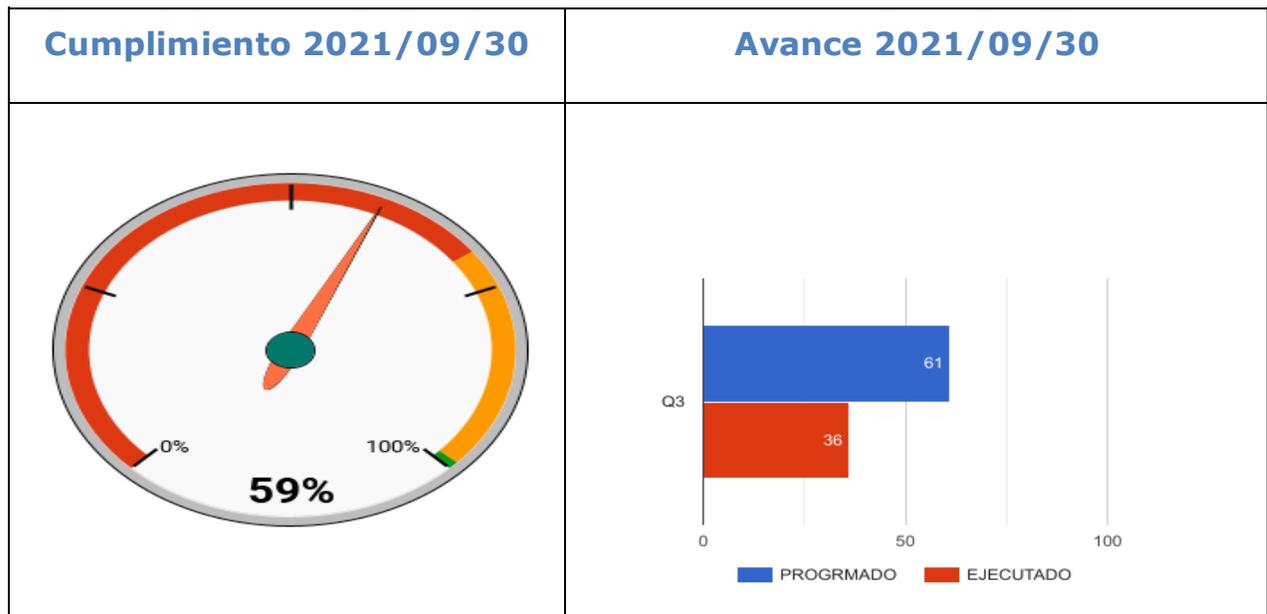


Objetivo Estratégico #2: Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

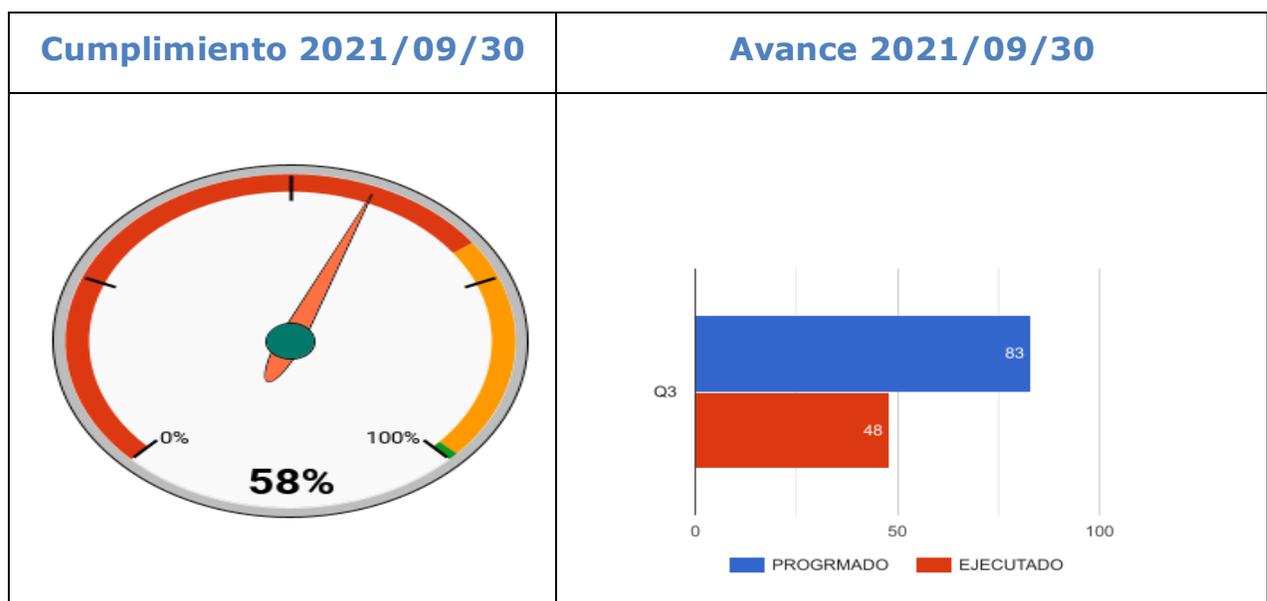


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Objetivo Estratégico #3: Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

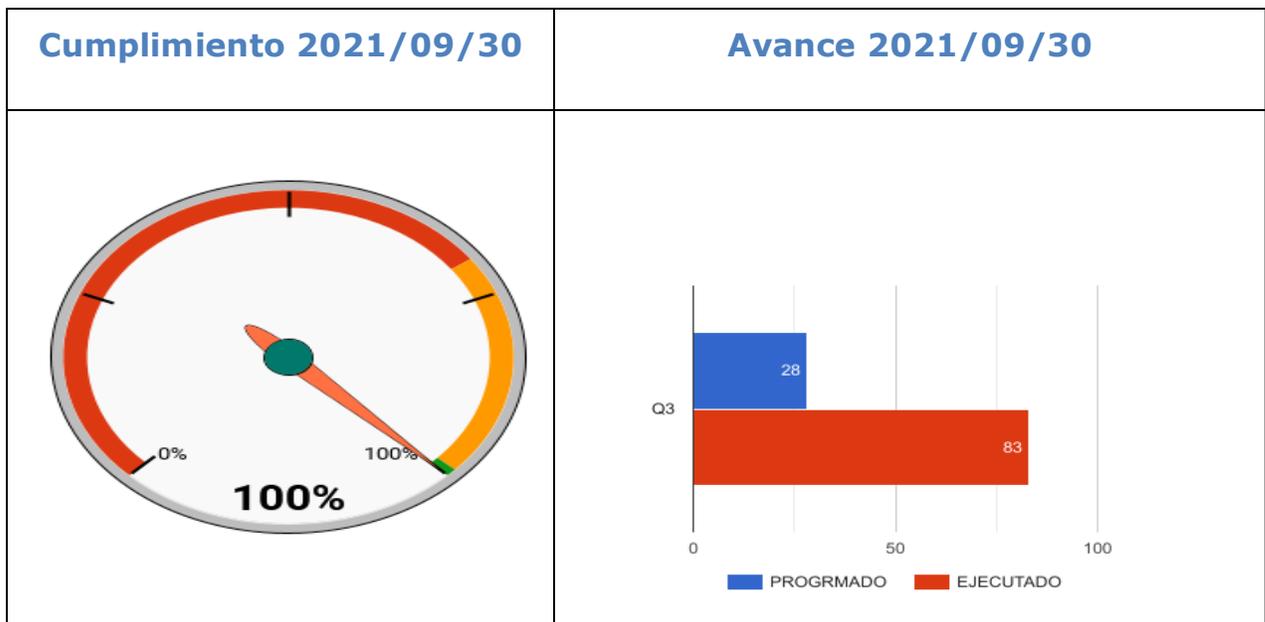

Objetivo Estratégico #4: Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de su resiliencia de las regiones y de su población.

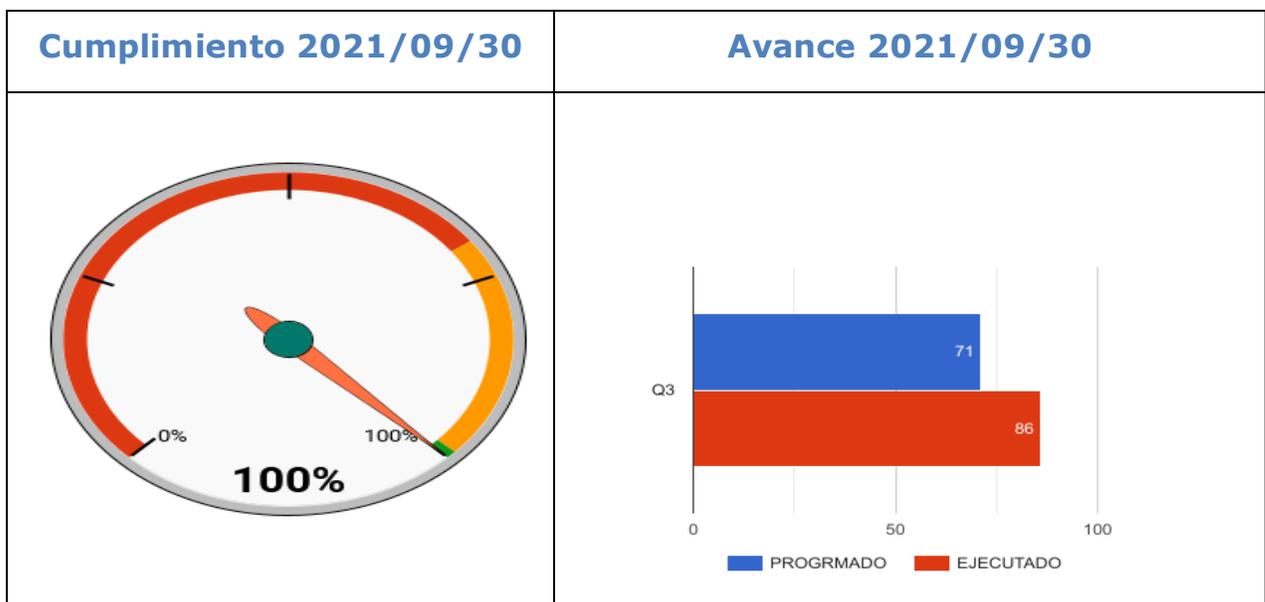

4. Seguimiento Plan de Acción por área

A continuación se detalla el nivel de avance por área y equipo:

4.1. Área Subgerencia de Riesgo

En la Subgerencia de Riesgos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con cinco macroproyectos de impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. De igual forma se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con dos portafolios de proyectos de impacto nacional y regional, orientados a la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático:



Vivienda



Medio ambiente



Reactivación económica



Río Fonce



Gramalote



Jarillón de Cálí



Canal del Dique




La Mojana

Las gráficas a continuación muestran la relación de los indicadores formulados para la vigencia 2021 trimestre a trimestre, adicionalmente, el avance cuantitativo total.

Cumplimiento 2021/09/30	Avance 2021/09/30
-------------------------	-------------------

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

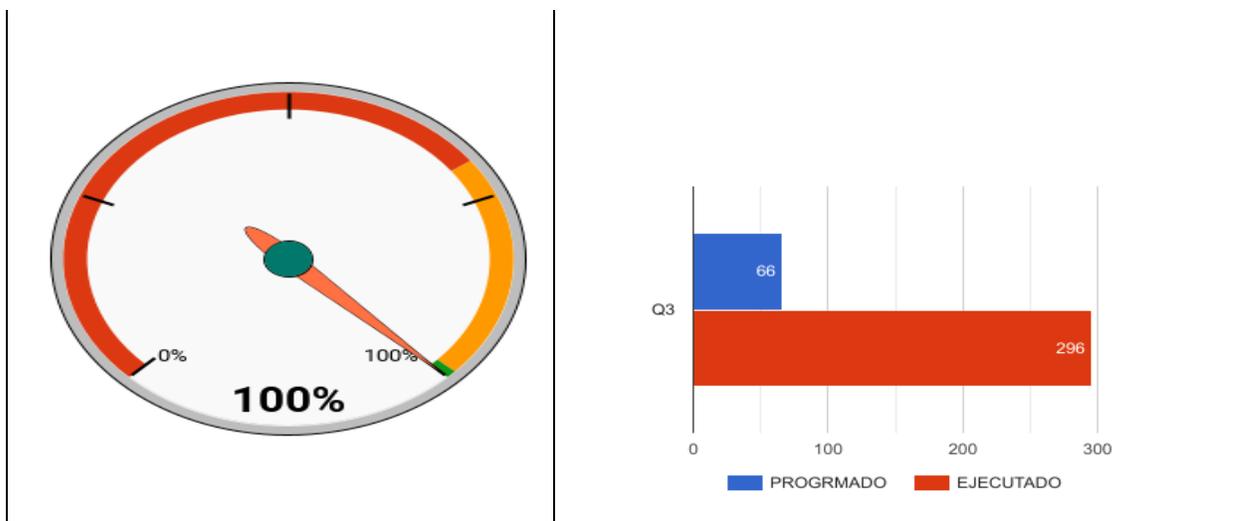

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS** Portafolio/Programa/Proyecto: **CANAL DEL DIQUE**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA01_Contratar proyectos de protección de centros poblados	(AEA01)_Proyectos contratados	# 1	1	1	0	0	0	1
AEA02_Terminar proyectos de protección	(AEA02)_Proyectos terminados	# 1	1	0	0	1	0	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

de centros poblados y tramos viales								
AEA03_Entregar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	(AEA03)_Proyectos entregados	# 1	2	0	1	0	1	1
AEA04_Contratar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEA04)_Longitud de dique construido o reforzado, contratada (Santa Lucía Gambote)	# 1	639	639	0	0	0	639
AEA05_Terminar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEA05)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	# 1	639	0	0	639	0	0
AEA06_Entregar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEA06)_Longitud de dique construido o reforzado, entregada (Santa Lucía Gambote)	# 1	918	0	279	0	639	279
AEA07_Elaborar gestión predial (Contrato 185 de 2015)	(AEA07)_Gestión predial, elaborada (Contrato 185 de 2015)	# 1	83	29.8	33.3	3.9	16	60.3
AEA08_Radicar documentos para estructuración financiera, jurídica y/o de riesgos fase 2 Canal del Dique	(AEA08)_Documentos para estructuración financiera, jurídica y/o de riesgos fase 2 Canal del Dique, radicados	# 1	2	0	2	0	0	2

Bitácora de Seguimiento

(AEA01)_Proyectos contratados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEA02)_Proyectos	Enero	El indicador de la presente acción estratégica solo se podrá reportar o analizar una vez se adjudique el contrato de obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.
	Febrero	Para la medición de la presente acción estratégica, en febrero de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. El plazo de ejecución del contrato de obra será

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

terminados		de 5 meses (2 meses de preconstrucción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras) para lo cual se cuenta con el acta de inicio que se firmó el 26 de febrero de 2021.
	Marzo	Actualmente se adelanta la etapa de preconstrucción (2 meses) que irá hasta el 25 de abril de 2021.
	Abril	Una vez cumplido por parte de la Constructora VMJ S.A.S. con los entregables de la etapa preconstructiva, el 26 de abril de 2021 se suscribió el acta de cambio de etapa, dando inicio con la construcción de las obras (2 meses) que irá hasta el 25 de junio de 2021.
	Mayo	<p>Actualmente la Constructora VMJ S.A.S. ejecuta la etapa constructiva, la cual vence el 25 de junio de 2021. En este sentido, el 27 de mayo de 2021, la interventoría de la Constructora VMJ S.A.S. radicó con comunicación R-2021-007282 el aval a la solicitud del contratista para una adición y prórroga de 2 meses en la etapa constructiva de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía.</p> <p>Al respecto, el 28 de mayo de 2021, se remitió comunicado E-2021-004143 a la interventoría solicitando la completitud a la modificación contractual, para su respectiva evaluación y consideración por parte del Fondo Adaptación.</p>
	Junio	El 08 de junio de 2021 fueron suspendidos por 1 mes los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Mediante comunicación el contratista de la

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>interventoría manifestó que la comunidad de Santa Lucía a través de vías de hecho exige al contratista de obra mayor participación de trabajadores del municipio. El 30 de junio de 2021, se llevó a cabo reunión con la Alcaldía de Santa Lucía para definir un protocolo que permita afrontar la problemática social y reanudar prontamente la terminación de las obras en mención.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la terminación inicial del contrato se traslada del 25 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021.</p>
Julio	<p>Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de julio de 2021, se adelantan acercamientos con la Alcaldía de Santa Lucía y la PGN para lograr el acompañamiento de las fuerzas públicas en el reinicio de las obras restantes.</p> <p>La terminación del contrato en mención, se tiene prevista para el 25 de septiembre de 2021.</p>
Agosto	<p>Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de agosto de 2021, se han adelantado acercamientos con la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y la PGN a fin de contar con el apoyo que permita garantizar el reinicio contractual de las obras para el 8 de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>septiembre de 2021.</p> <p>La terminación del contrato en mención se tiene prevista para el 25 de octubre de 2021.</p>
	Septiembre	<p>El 8 de septiembre de 2021 se reiniciaron los contratos de obra e interventoría para la ejecución de las obras restantes de Santa Lucía. El 2 de septiembre de 2021 se realizó con el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y los contratistas la socialización del reinicio, informando a la comunidad de Santa Lucía sobre los procedimientos y la capacidad de contratación de mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Con base en la modificación del contrato de obra que se suscribió el 24 de septiembre de 2021, la terminación del proyecto se tiene prevista para el 25 de diciembre de 2021.</p>

Bitácora de Seguimiento

(AEA03)_Proyectos entregados	Enero	Se adelantó reunión con la Alcaldía de Arjona el 27 de enero de 2021. Se adelanta el proceso de conciliación para la atención de no conformidades presentadas por la Alcaldía de Arjona para proceder con la legalización de acta y recibo del centro poblado.
	Febrero	Fueron revisadas las no conformidades por parte de la Alcaldía de Arjona, las cuales se consideraron no procedentes. El ET-MP Canal del Dique adelanta proyecto de oficio para reiterar suscripción del acta de entrega de recibo de la obra de Gambote, se prevé su radicación la primera semana de marzo de 2021.

	Marzo	<p>Gambote:</p> <p>El 4 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001640 a la Alcaldía de Arjona con las respuestas a cada uno de los requerimientos de la reunión del 27 de enero de 2021. En concordancia y a partir del marco legal, se solicitó la suscripción del acta, informando que de no obtener respuesta en los 5 días hábiles posteriores, se entendería como recibido a satisfacción la obra, con la responsabilidad de mantenimiento, cuidado y custodia de esta.</p> <p>Posteriormente, el 16 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001937 a la Procuraduría General de la Nación (PGN), informando sobre la no suscripción del Acta por parte de la Alcaldía de Arjona y solicitando su intervención en ejercicio de la función preventiva.</p> <p>Santa Lucía:</p> <p>Para la medición de la presente acción estratégica, en marzo de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. Actualmente se adelanta la etapa de preconstrucción (2 meses) que irá hasta el 25 de abril de 2021.</p>
	Abril	<p>Gambote:</p> <p>El 15 de abril de 2021 se venció el plazo legal de pronunciamiento de la Alcaldía de Arjona con respecto al acta de entrega y recibo a satisfacción del beneficiario de las obras ejecutadas en el centro poblado de Gambote. En ese orden de ideas, en abril de 2021, se aplicó por parte del FA el silencio administrativo positivo, figura de ley en Colombia que aplica</p>

		<p>para los casos en que las entidades administrativas no se pronuncian dentro del plazo legal respecto a la solicitud elevada del FA a la Alcaldía de Arjona bajo el oficio E-2021-001640, lo que implica que ya fue entregada la obra del centro poblado de Gambote a la Alcaldía del municipio en mención.</p> <p>Santa Lucía: Una vez cumplido por parte de la Constructora VMJ S.A.S. con los entregables de la etapa preconstructiva, el 26 de abril de 2021 se suscribió el acta de cambio de etapa, dando inicio con la construcción de las obras (2 meses) que irá hasta el 25 de junio de 2021.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Santa Lucía: Se informa que actualmente la Constructora VMJ S.A.S. ejecuta la etapa constructiva, la cual vence contractualmente el 25 de junio de 2021. En este sentido, el 27 de mayo de 2021, la interventoría de la Constructora VMJ S.A.S. radicó con comunicación R-2021-007282 el aval a la solicitud del contratista para una adición y prórroga de 2 meses en la etapa constructiva de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía.</p> <p>Al respecto, el 28 de mayo de 2021, se remitió comunicado E-2021-004143 a la interventoría solicitando la completitud a la modificación contractual, para su respectiva evaluación y consideración por parte del Fondo Adaptación.</p>
	<p>Junio</p>	<p>Santa Lucía: El 08 de junio de 2021 fueron suspendidos por 1 mes los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Lucía, debido a problemáticas sociales. Mediante comunicación el contratista de la interventoría manifestó que la comunidad de Santa Lucía a través de vías de hecho exige al contratista de obra mayor participación de trabajadores del municipio. El 30 de junio de 2021, se llevó reunión con la Alcaldía de Santa Lucía para definir un protocolo que permita afrontar la problemática social y reanudar prontamente la terminación de las obras en mención.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la terminación inicial del contrato en mención se traslada del 25 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021.</p>
Julio	<p>Santa Lucía: Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de julio de 2021, se adelantan acercamientos con la Alcaldía de Santa Lucía y la PGN para lograr el acompañamiento de las fuerzas públicas en el reinicio de las obras restantes.</p> <p>La terminación del contrato en mención, se tiene prevista para el 25 de septiembre de 2021.</p>
Agosto	<p>Santa Lucía: Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de agosto de 2021, se han adelantado acercamientos con la</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y la PGN a fin de contar con el apoyo que permita garantizar el reinicio contractual de las obras para el 8 de septiembre de 2021.</p> <p>La terminación del contrato en mención se tiene prevista para el 25 de octubre de 2021.</p>
	Septiembre	<p>Santa Lucía:</p> <p>El 8 de septiembre de 2021 se reiniciaron los contratos de obra e interventoría para la ejecución de las obras restantes de Santa Lucía. Lo anterior, luego que el 2 de septiembre de 2021 se realizará con el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y los contratistas la socialización del reinicio, informando a la comunidad de Santa Lucía sobre los procedimientos y la capacidad de contratación de mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>Con base en la modificación del contrato de obra que se suscribió el 24 de septiembre de 2021, la terminación del proyecto se tiene prevista para el 25 de diciembre de 2021.</p>

Bitácora de Seguimiento

	Enero	El contrato de obra que está en proceso de evaluación, selección y adjudicación.
	Febrero	El 12 de febrero de 2021 se suscribe el contrato FA-SAMC-I-S-002-2020 entre el Fondo Adaptación y la Constructora VMJ S.A.S. por valor de \$486.954.011 con el objeto de construir las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de Santa Lucía,

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA04)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)		área de influencia del Canal del Dique. La constructora en mención será la encargada de construir 639 metros de dique lineales con un plazo de ejecución de 5 meses (2 meses de pre-construcción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras).
	Marzo	Teniendo en cuenta la suscripción del acta de inicio del 26 de febrero de 2021 para el contrato de obra FA-SAMC-I-S-002-2020 Constructora VMJ S.A.S., actualmente se desarrolla el plazo de ejecución de 5 meses hasta el 25 de julio de 2021 para las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de Santa Lucía, área de influencia del Canal del Dique. La constructora en mención será la encargada de construir 639 metros de dique lineales.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

	Enero	El indicador de la presente acción estratégica solo se podrá reportar o analizar una vez se adjudique el contrato de obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA05)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	Febrero	En febrero de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. El plazo de ejecución del contrato de obra será de 5 meses (2 meses de preconstrucción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras) para lo cual se cuenta con el acta de inicio que se firmó el 26 de febrero de 2021.
	Marzo	Para la medición de la presente acción estratégica, en marzo de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía. Actualmente se adelanta la etapa de preconstrucción (2 meses) que irá hasta el 25 de abril de 2021.
	Abril	Una vez cumplido por parte de la Constructora VMJ S.A.S. con los entregables de la etapa preconstructiva, el 26 de abril de 2021 se suscribió el acta de cambio de etapa, dando inicio con la construcción de las obras (2 meses) que irá hasta el 25 de junio de 2021.
	Mayo	Actualmente la Constructora VMJ S.A.S. ejecuta la etapa constructiva, la cual vence contractualmente el 25 de junio de 2021. En este sentido, el 27 de mayo de 2021, la interventoría de la Constructora VMJ S.A.S. radicó con comunicación R-2021-007282 el aval a la solicitud del contratista para una adición y prórroga de 2 meses en la etapa constructiva de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía. Al respecto, el 28 de mayo de 2021, se remitió comunicado E-2021-004143 a la interventoría solicitando la completitud a la modificación contractual, para su respectiva evaluación y

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		consideración por parte del Fondo Adaptación.
Junio		<p>El 08 de junio de 2021 fueron suspendidos por 1 mes los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Mediante comunicación el contratista de la interventoría manifestó que la comunidad de Santa Lucía a través de vías de hecho exige al contratista de obra mayor participación de trabajadores del municipio. El 30 de junio de 2021, se llevó a cabo reunión con la Alcaldía de Santa Lucía para definir un protocolo que permita afrontar la problemática social y reanudar prontamente la terminación de las obras en mención.</p> <p>La terminación inicial del contrato en mención se traslada del 25 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021.</p>
Julio		<p>Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de julio de 2021, se adelantan acercamientos con la Alcaldía de Santa Lucía y la PGN para lograr el acompañamiento de las fuerzas públicas en el reinicio de las obras restantes.</p> <p>La terminación del contrato en mención, se tiene prevista para el 25 de septiembre de 2021.</p>
Agosto		Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de agosto de 2021, se han adelantado acercamientos con la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y la PGN a fin de contar con el apoyo que permita garantizar el reinicio contractual de las obras para el 8 de septiembre de 2021.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la terminación del contrato en mención se tiene prevista para el 25 de octubre de 2021.</p>
Septiembre	<p>El 8 de septiembre de 2021 se reiniciaron los contratos de obra e interventoría para la ejecución de las obras restantes de Santa Lucía. Lo anterior, luego que el 2 de septiembre de 2021 se realizara con el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y los contratistas la socialización del reinicio, informando a la comunidad de Santa Lucía sobre los procedimientos y la capacidad de contratación de mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>De acuerdo con lo anterior y con base en la modificación del contrato de obra que se suscribió el 24 de septiembre de 2021, la terminación del proyecto se tiene prevista para el 25 de diciembre de 2021.</p>

Bitácora de Seguimiento

(AEA06)_Longitud de dique construido o reforzado, entregada (Santa Lucía Gambote)	Enero	<p>Gambote:</p> <p>Se adelantó reunión con la Alcaldía de Arjona el 27 de enero de 2021. Se adelanta el proceso de conciliación para la atención de no conformidades presentadas por la Alcaldía de Arjona para proceder con la legalización de acta y recibo del centro poblado.</p>
	Febrero	<p>Gambote:</p> <p>Fueron revisadas las no conformidades por parte de la Alcaldía de Arjona, las cuales se consideraron no procedentes. El ET-MP Canal del Dique adelanta proyecto de oficio para reiterar suscripción del acta de entrega de recibo de la obra de Gambote, se prevé su radicación la primera semana de marzo de 2021.</p> <p>Santa Lucía:</p> <p>Para la medición de la presente acción estratégica, en febrero de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.</p> <p>El plazo de ejecución del contrato de obra será de 5 meses (2 meses de preconstrucción, 2 meses de construcción y 1 mes de entrega y recibo de las obras) para lo cual se cuenta con el acta de inicio que se firmó el 26 de febrero de 2021.</p>
	Marzo	<p>Gambote:</p> <p>El 4 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001640 a la Alcaldía de Arjona con las respuestas a cada uno de los requerimientos de la reunión del 27 de enero de 2021. En concordancia y a partir del marco legal, se</p>

		<p>solicitó la suscripción del acta, informando que de no obtener respuesta en los 5 días hábiles posteriores, se entendería como recibido a satisfacción la obra, con la responsabilidad de mantenimiento, cuidado y custodia de esta.</p> <p>Posteriormente, el 16 de marzo de 2021 se remitió el oficio E-2021-001937 a la Procuraduría General de la Nación (PGN), informando sobre la no suscripción del Acta por parte de la Alcaldía de Arjona y solicitando su intervención en ejercicio de la función preventiva.</p> <p>Santa Lucía: Para la medición de la presente acción estratégica, en marzo de 2021, se logró la contratación de la obra que ejecutará las obras restantes en el centro poblado de Santa Lucía.</p>
	Abril	<p>Gambote: El 15 de abril de 2021 se venció el plazo legal de pronunciamiento de la Alcaldía de Arjona con respecto al acta de entrega y recibo a satisfacción del beneficiario de las obras ejecutadas en el centro poblado de Gambote. En ese orden de ideas, en abril de 2021, se aplicó por parte del FA el silencio administrativo positivo, figura de ley en Colombia que aplica para los casos en que las entidades administrativas no se pronuncian dentro del plazo legal respecto a la solicitud elevada del FA a la Alcaldía de Arjona bajo el oficio E-2021-001640, lo que implica que ya fue entregada la obra del centro poblado de Gambote a la Alcaldía del municipio en mención.</p> <p>Santa Lucía:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>Para la medición de la presente acción estratégica, se informa que una vez cumplido por parte de la Constructora VMJ S.A.S. con los entregables de la etapa preconstructiva, el 26 de abril de 2021 se suscribió el acta de cambio de etapa, dando inicio con la construcción de las obras (2 meses) que irá hasta el 25 de junio de 2021.</p>
	Mayo	<p>Santa Lucía:</p> <p>Para la medición de la presente acción estratégica, se informa que actualmente la Constructora VMJ S.A.S. ejecuta la etapa constructiva, la cual vence contractualmente el 25 de junio de 2021. En este sentido, el 27 de mayo de 2021, la interventoría de la Constructora VMJ S.A.S. radicó con comunicación R-2021-007282 el aval a la solicitud del contratista para una adición y prórroga de 2 meses en la etapa constructiva de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía.</p> <p>Al respecto, el 28 de mayo de 2021, se remitió comunicado E-2021-004143 a la interventoría solicitando la completitud a la modificación contractual, para su respectiva evaluación y consideración por parte del Fondo Adaptación.</p>
	Junio	<p>Para la medición de la presente acción estratégica, se informa que el 08 de junio de 2021 fueron suspendidos por 1 mes los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Mediante comunicación el contratista de la interventoría manifestó que la comunidad de Santa Lucía a través de vías de hecho exige al contratista de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>obra mayor participación de trabajadores del municipio. El 30 de junio de 2021, se llevó a cabo reunión con la Alcaldía de Santa Lucía para definir un protocolo que permita afrontar la problemática social y reanudar prontamente la terminación de las obras en mención.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la terminación inicial del contrato en mención, se traslada del 25 de julio de 2021 al 25 de agosto de 2021.</p>
Julio	<p>Santa Lucía: Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de julio de 2021, se adelantan acercamientos con la Alcaldía de Santa Lucía y la PGN para lograr el acompañamiento de las fuerzas públicas en el reinicio de las obras restantes.</p> <p>La terminación del contrato en mención, se tiene prevista para el 25 de septiembre de 2021.</p>
Agosto	<p>Santa Lucía: Desde el 08 de junio de 2021 se encuentran suspendidos los contratos de obra e interventoría de las obras restantes en el municipio de Santa Lucía, debido a problemáticas sociales. Al 31 de agosto de 2021, se han adelantado acercamientos con la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y la PGN a fin de contar con el apoyo que permita garantizar el reinicio contractual de las obras para el 8 de septiembre de 2021.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		De acuerdo con lo anterior, la terminación del contrato en mención se tiene prevista para el 25 de octubre de 2021.
	Septiembre	<p>Santa Lucía: El 8 de septiembre de 2021 se reiniciaron los contratos de obra e interventoría para la ejecución de las obras restantes de Santa Lucía. Lo anterior, luego que el 2 de septiembre de 2021 se realizará con el acompañamiento de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía, la Policía Nacional y los contratistas la socialización del reinicio, informando a la comunidad de Santa Lucía sobre los procedimientos y la capacidad de contratación de mano de obra no calificada de la zona.</p> <p>De acuerdo con lo anterior y con base en la modificación del contrato de obra que se suscribió el 24 de septiembre de 2021, la terminación del proyecto se tiene prevista para el 25 de diciembre de 2021.</p>

Bitácora de Seguimiento

(AEA07)_Gestión predial,	Enero	Se avanzó en un 8,57% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención.
	Febrero	Se avanzó en un 8,57% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención.
	Marzo	Se avanzó en un 8% adicional en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Durante el Q1 de 2021, el avance acumulado es del 25% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

elaborada (Contrato 185 de 2015)		de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.
	Abril	Se avanzó en un 10% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Al corte de este seguimiento, el avance acumulado es del 35% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.
	Mayo	Se avanzó en un 5,86% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Al corte de este seguimiento, el avance acumulado es del 41% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.
	Junio	Se avanzó en un 4% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Al corte de este seguimiento, el avance acumulado es del 45% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.
	Julio	Se avanzó en un 8% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Al corte de este seguimiento, el avance acumulado es del 53% de conformidad con el

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.</p>
	Agosto	<p>Se avanzó en un 7% en el desarrollo de la gestión predial durante el período en mención. Al corte de este seguimiento, el avance acumulado es del 60% de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.</p>
	Septiembre	<p>Al corte de este seguimiento, el avance acumulado se mantiene en aproximadamente un 60%, de conformidad con el cronograma dispuesto en el Sistema de Gestión de Proyectos-PSA del Fondo Adaptación, el cual tiene por nombre: 007-0023-Canal del Dique-Obras preventivas-Gestión predial inhouse-Seguimiento-ejecución.</p> <p>La gestión predial se encuentra en espera de la expedición de la Resolución con la cual el Fondo delegará al Líder Sectorial del Macroproyecto para la firma de los actos administrativos que son producto de la gestión predial. Paralelamente, el Macroproyecto se encuentra a la espera del concepto de análisis de la Entidad para adelantar 2 procesos de contratación requeridos para dicha gestión predial.</p>

Bitácora de Seguimiento


	Enero	Radicar informe de fuentes fiscales y
--	-------	---------------------------------------

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA08)_ Documentos para estructuración financiera, jurídica y/o de riesgos fase 2 Canal del Dique, radicados		documentos precontractuales ante las entidades Gubernamentales: El contrato de estructuración financiera, jurídica y de riesgos (Bonus Banca de Inversión) y el contrato de estructuración técnica (Gómez Cajiao & Asociados) se encuentran suspendidos.
	Febrero	La radicación de los productos de la acción estratégica en mención, se encuentra prevista para junio de 2021, los cuales requieren previamente la terminación de la etapa 2 de la estructuración por APP por parte de Gómez Cajiao & Asociados con la ejecución del panel de expertos y el cierre de productos para radicación por parte de Bonus Banca de Inversión.
	Marzo	La radicación de los productos de la acción estratégica en mención, se encuentra prevista para junio de 2021, los cuales requieren la terminación de la etapa 2 de la estructuración por APP por parte de Gómez Cajiao & Asociados, prevista para la última semana de abril de 2021 con la ejecución del panel de expertos y el cierre de productos para radicación por parte de Bonus Banca de Inversión, de los cuales a la fecha, se cuenta con 5 subproductos bajo concepto de favorabilidad.
	Abril	Entre el 27 y el 29 de abril de 2021, se llevaron a cabo los paneles de expertos (1-Obras hidráulicas, 2-Obras ambientales y 3-Vías y edificaciones) con los cuales se realizarán las complementaciones a los productos de la

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos. De está manera, se mantiene previsto para junio de 2021 adelantar la radicación de 2 documentos: 1-Radicación de fuentes fiscales y 2-Radicación documentos precontractuales ante las entidades Gubernamentales.</p>
Mayo	<p>Se avanzó en el cierre de los productos objeto de la estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos para la radicación de 2 documentos: 1-Radicación de fuentes fiscales y 2-Radicación documentos precontractuales ante las entidades Gubernamentales.</p>
Junio	<p>Se radicó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) la estructuración de la APP del proyecto de "Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique".</p>
Julio	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
Agosto	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
Septiembre	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>

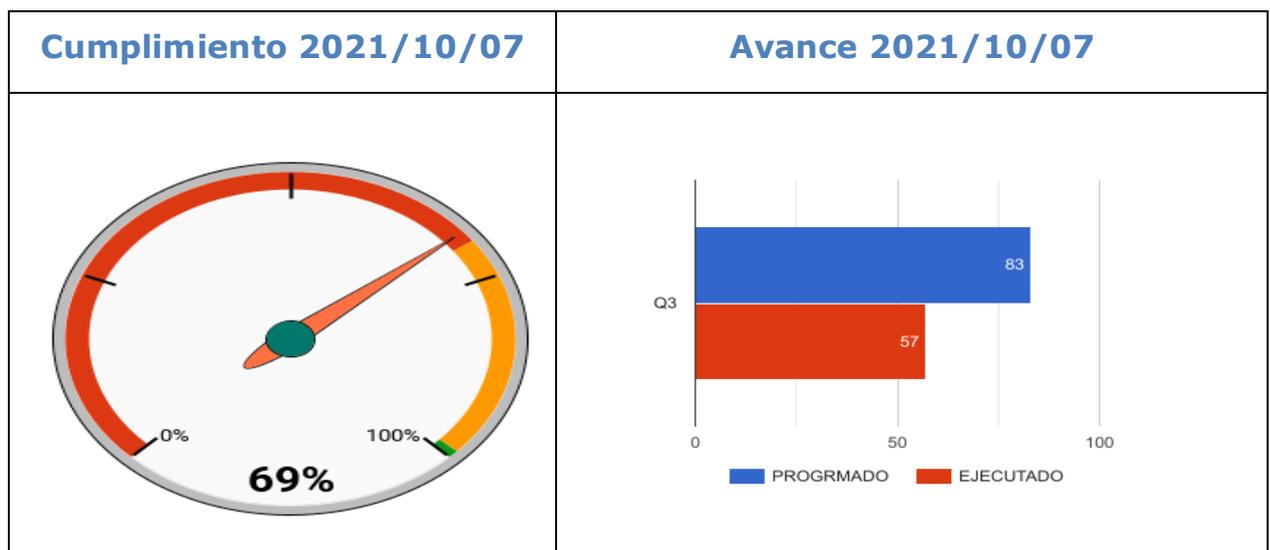

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS Portafolio/Programa/Proyecto: LA MOJANA



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA09_Terminar y entregar diseños de obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEA09)_Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), terminados y entregados	# 1	2	0	0	0	2	-
AEA10_Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE	(AEA10)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual	# 1	60	0	0	0	60	-

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

AEA11_Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA11)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	#	2	0	0	2	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Bitácora de Seguimiento

(AEA09)_Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), terminados y entregados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

	Enero	La ejecución de las obras de la etapa I, se encuentra finalizado por vencimiento de plazo, sin el cumplimiento satisfactorio del alcance del mismo. En comité operativo del convenio No. 018 de 2017, la Agencia Nacional Inmobiliaria ANIM informa que fue impuesta la cláusula penal como tasación anticipada de perjuicios al
--	-------	--

(AEA10)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual

contratista Craing Ltda., sin embargo, debido al no pago por el contratista y la aseguradora como garante, la ANIM y la Fiduciaria se encuentran en ejecución del respectivo procedimiento de cobro judicial al contratista y para el caso de la aseguradora, una Acción de Protección al Consumidor ante la Superintendencia Financiera.

El 26 de enero de 2021, se desarrolló el comité operativo No 21 del convenio, donde la ANIM manifiesta que ya se surtió el proceso de selección de los dos contratistas, de obra (AGOPLA SAS) e interventoría (GAVINCO SAS), para la terminación de las obras de FASE I, y se procederá con la formalización de los respectivos contratos, visita de obra y acta de inicio, para lo que se espera cumplir con el cronograma originalmente establecido, esperando dar inicio en los primeros días de febrero. Adicionalmente, se informa el estado del proceso de reintegro de los dineros pagados en exceso al contratista CRAING por costos fijos, para el cual, se presenta un resumen y se confirma el valor final de solicitud de reintegro, que corresponde a 214 millones de pesos, con lo que la Fiduciaria ha ajustado el acta de liquidación del contrato, para proceder a realizar las acciones legales para su cobro. El FONDO seguirá realizando un seguimiento al desarrollo de este procedimiento. En el mes anterior se adelantó la sexta sesión (17 de diciembre) de audiencia de mediación, de acuerdo al acompañamiento que actualmente realiza la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, donde se establece que han sido cumplidos los compromisos establecidos en la mediación, con lo que se da por terminada y

		<p>exitosa esta diligencia de mesa de mediación, y se recibió la versión final del documento de conclusión el 29 de enero de 2021. De igual forma, el Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.</p> <p>Para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 21-ENE), con un porcentaje actual ejecutado del proyecto (duración) es del 83.5% y planeado de 81.9%, para una diferencia (atraso) de 1.6%. El saldo a 31 de diciembre de 2020 de la Subcuenta del Fondo Adaptación es de \$3,649,411,975.16, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,350,588,024.84, por ende, porcentaje de ejecución del 54.38%</p>
Febrero		<p>El 03 de febrero de 2021 se realizó el comité fiduciario No. 05, donde se presentó el estado financiero del proyecto a corte 31 de diciembre de 2020, en la parte técnica, la ANIM manifiesta que ya se surtió el proceso de legalización de los contratos de obra (AGOPLA SAS) e interventoría (GAVINCO SAS), para la terminación de las obras de fase I, y se procederá con la suscripción de las respectivas actas de inicio, que se proyecta se realicen en la primera semana de febrero. Sin embargo, a la fecha de este reporte, no se tiene conocimiento de la</p>

suscripción de dichos documentos e inicio de la obra, situación que es preocupante en especial para el cumplimiento del cronograma establecido para la terminación de las obras de fase I. El Fondo ha insistido de manera formal, por medio de varias comunicaciones, en que se le informe y actualice sobre el inicio de las obras, sin embargo, la ANIM no ha sido concluyente al respecto, lo cual, se espera sea subsanado en el siguiente comité operativo a desarrollarse en el mes de marzo de 2021.

El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio. Para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 21-FEB), con un porcentaje actual ejecutado del proyecto (duración) del 83.17% y planeado de 86.30%, para una diferencia (atraso) de 3.13%. El saldo a 31 de enero de 2021 de la Subcuenta del Fondo Adaptación es de \$3,642,349,175.13, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,357,650,824.87, por ende, porcentaje de ejecución del 54.47%. En el mes de enero fue finalmente apropiado el saldo de recursos aportados por el Fondo al convenio, los cuales, han sido destinados para el contrato de obra para la terminación de la fase I del proyecto.

	Marzo	<p>En el comité operativo No. 22, desarrollado el 10 de marzo de 2021, la ANIM manifiesta que se han tenido inconvenientes para la generación de las garantías (pólizas) de la obra, pero se espera la firma del acta de inicio el día 10 de marzo de 2021, adicionalmente, se suscribió una cesión de contratista de obra y que se encuentra en revisión el cronograma de ejecución para optimizar los tiempos, debido al retraso en el inicio de la obra. Pese a lo manifestado en el comité operativo, a la fecha no se tiene conocimiento de la suscripción del acta de inicio de la obra, en especial para el cumplimiento del cronograma establecido para la terminación de las obras de fase I. Desde el Fondo se ha insistido de manera formal, por medio de varias comunicaciones, en que se le informe y actualice sobre el inicio de las obras. Sin embargo, la ANIM no ha sido concluyente al respecto y el flujo de información no ha sido oportuno. Adicionalmente, se sigue realizando seguimiento al proceso de reintegro de los dineros pagados en exceso al contratista CRAING por costos fijos, del cual, no se recibe mayor información en el comité operativo 22, continuando el desarrollo de la demanda que ha sido interpuesta para el cobro de la cláusula penal pecuniaria y el reintegro del mayor costo pagado al contratista Craing Ltda. De igual forma, el Fondo, sigue realizando desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.</p>
--	-------	---

	<p>El 29 de marzo, se recibió comunicación (email) por parte de la CGR, mencionando que por instrucciones expresas del Comité de aprobación de proyectos de la estrategia Compromiso Colombia, este proyecto fue incluido como un plan operativo que lidera la GDC de Sucre, para lo cual, el FONDO realizará seguimiento y acompañamiento a esta actividad.</p> <p>Para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente periodo, un porcentaje actual ejecutado del proyecto (duración) del 83.17% y planeado de 89.60%, para una diferencia (atraso) de 6.43%.</p> <p>El saldo a 28 de febrero de 2021 de la Subcuenta del Fondo Adaptación es de \$3,640,094,766.52, con lo cual, el valor ejecutado estimado total sería de \$4,359,905,233.48, por ende, un porcentaje de ejecución del 54.50% de los recursos aportados por el FONDO</p>
Abril	<p>Para el mes de abril de 2021 no se realizó comité operativo, pese a varias solicitudes realizadas por la supervisión. Finalmente, se tiene programada la realización de los comités operativo y fiduciario el 13-MAY. En la misma línea de lo expresado previamente, la supervisión realizó varias solicitudes de información para conocer el estado del proyecto, En atención a lo anterior, la ANIM, mediante correo electrónico recibido el pasado 19 de abril de 2021, (radicado Fondo No. R-2021-0005505) informó sobre la suscripción el 08 de abril de 2021 del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría para la</p>

terminación de la fase I del proyecto. Debido al retraso en el inicio de la obra (del orden de casi 60 días), y que la fecha de finalización supera el plazo actual del convenio, se ha solicitado (Rad E-2021-003365) a la ANIM que se presente un plan de contingencia para subsanar esta situación y normalizar la ejecución del proyecto.

Adicionalmente, el Fondo sigue realizando seguimiento al proceso de reintegro del mayor valor pagado al contratista CRAING por costos fijos, sobre lo cual, en solicitud (E-2021-002664 de 14-ABR) de programación de comité operativo No 23, se ha indicado que sea incluido este aspecto en el orden del día. El 30 de Abril de 2021 se recibieron los dos primeros informes semanales de interventoría de las obras de terminación de Fase I, donde, para fecha de corte 24-ABR se reporta que el avance programado del contrato es de 1.38% y Ejecutado es de 0.59%, para una desviación de 0.79%. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.

Por otro lado, para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 20-ABR), con un porcentaje actual programado del proyecto (duración) del 92.57% y ejecutado de 84.43%, para una diferencia(atraso) de 8.14%. El saldo a 31 de marzo de 2021 de la Subcuenta del Fondo Adaptación es de

		<p>\$3,633,996,059.03, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,366,003,940.97, por ende, porcentaje de ejecución del 54.58% de los recursos aportados por el FONDO</p>
	<p>Mayo</p>	<p>En el presente periodo se realizó el comité operativo No 23 (24-MAY), donde se informó por parte de la ANIM, que se han presentado algunos atrasos debidos a la dificultad de adquirir algunos materiales (en especial, el acero) y el transporte a la obra por la situación actual de orden público en el País. Debido a lo anterior, la ANIM presentará un plan de contingencia para normalizar la ejecución de las obras, la respectiva solicitud de modificación del convenio, ya que se va a vencer el plazo actual (27-JUN), sin la finalización de las obras y que tendrán como referencia el respectivo plan de contingencia. Adicionalmente, en referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAING LTDA) por costos fijos, La ANIM ha mencionado que ha iniciado un proceso de demanda nuevo para el cobro de este valor. El 24 de mayo de 2021 se realizó el comité Fiduciario No 6, donde se presentaron por parte de la Fiduciaria el estado del patrimonio autónomo, sobresaliendo que, en el periodo de marzo de 2021, se presentaron pérdidas del ejercicio y que se espera una condición similar para el mes de mayo de 2021, por lo anterior, se realizará una reunión conjunta para evaluar las acciones a realizar en referencia a esta situación.</p> <p>El 25 de mayo se recibieron los informes semanales 3 a 6 de interventoría de las obras de terminación de fase I, donde, para fecha de</p>

		<p>corte 22 de mayo se reporta que el avance programado del contrato es de 13.25% y Ejecutado es de 6.29%, para una desviación de 6.96%. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.</p> <p>Por otro lado, para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 22-MAY), con un porcentaje actual programado del proyecto (duración) del 96.20% y ejecutado de 84.87%, para una diferencia(atraso) de 11.33%. El saldo a 30 de abril de 2021, según último extracto de subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, es de \$3,637,796,609.87, con lo cual, el ejecutado estimado total sería de \$4,362,203,390.13, por ende, porcentaje de ejecución del 54.53% de los recursos aportados por el FONDO.</p>
	Junio	<p>El 25 de junio se formalizó la modificación contractual No 2 del Convenio No. 018 de 2017, correspondiente a una prórroga por un (1) año y cuatro (4) meses, para contar finalmente, con un plazo total del convenio de cuatro (4) años y ocho (8) meses y fecha de terminación 27 de octubre de 2022. En el marco de la solicitud de modificación contractual presentada por la ANIM, se incluyó un plan de acción para la culminación de las obras (donde se establecen algunas acciones para normalizar la ejecución de las obras), siendo la nueva fecha de terminación del contrato de obra de fase I</p>

el 07 septiembre de 2021. Adicionalmente, en la solicitud la ANIM proyecta que la etapa precontractual de contratación de la Fase II se realice entre octubre de 2021 y enero de 2022, y la ejecución de las obras de fase II entre febrero y agosto de 2022 y finalmente, la liquidación de contratos de obra e interventoría a octubre de 2022. La ANIM en el marco de solicitud también manifiesta que no se requerirán de recursos adicionales para la finalización de las obras de fase I. En el presente mes no se realizó comité operativo.

En referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAING LTDA) por costos fijos, La ANIM en el periodo anterior había mencionado que inició un proceso de demanda nuevo para el cobro de este valor, se ha recibido actualización sobre este procedimiento, el cual, se espera solicitar en el marco del siguiente comité operativo. En el mes de mayo se presentó nuevamente rendimientos negativos (pérdidas del orden de \$2 millones de pesos) del ejercicio, para lo cual, el FONDO solicitó una reunión para revisar este aspecto, la cual, se realizó el 30-JUN, con la participación de la fiduciaria, quién informó sobre las expectativas del mercado, mencionando posibles condiciones estables al menos hasta el mes de septiembre de 2021. Con base en el último informe semanal (No. 11) de interventoría de las obras de terminación de fase I, para fecha de corte 26-JUN se reporta que el avance programado del contrato es de 38.27% y ejecutado es de 22.05%, para una desviación (atraso) de 22.05%. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un

		<p>acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.</p> <p>Por otro lado, para el seguimiento en PSA, se cuenta para el presente mes (corte 19-JUN), con un porcentaje actual programado del proyecto (duración) del 99.17% y ejecutado de 85.83%, para una diferencia (atraso) de 13.34%. Sin embargo es importante mencionar que debido a la formalización del otrosí No 2 del contrato se viene adelantando la actualización de la nueva línea base (No 3) de seguimiento, la cual, se espera quede formalizada en el mes de julio. El saldo a 31 de mayo de 2021, según último extracto de subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, es de \$3,635,479,554.96, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,364,520,445.04, por ende, porcentaje de ejecución del 54.56% de los recursos aportados por el FONDO</p>
	Julio	<p>La ANIM informa que se evidencia un atraso en la ejecución de la Fase 1 causado por la dificultad en la consecución de acero en las cantidades requeridas (los proveedores manifestaron tener limitaciones de cantidades en los despachos), lo cual afectó a su vez el avance en la ejecución de la estructura y demás actividades dependientes. Por lo cual, informa que contratista, interventoría y ANIM se encuentran en el proceso de estudio de pertinencia, análisis de tiempos y</p>

rendimientos, para proseguir con la solicitud de prórroga, la cual será radicada en los próximos días, novedades que serán presentadas en el siguiente comité operativo que se tiene programado para el 05-AGO.

En el presente mes no se realizó comité operativo.

En referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAING LTDA.) por costos fijos, la ANIM informa que dio inicio a un proceso de demanda nuevo para el cobro de este valor.

Con corte al 24 julio 2021, y según se presenta en el último informe semanal (No. 15) de interventoría de las obras de terminación de fase I, el avance programado del contrato es de 43.64% y ejecutado de 38.00%, para una desviación (atraso) de 5.64%. Es importante mencionar que los valores de avance programado se encuentran en revisión por parte de ANIM, por lo mencionado previamente (posible prórroga), por lo cual, no se cuenta con un valor preciso real a la fecha. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.

Por otro lado, En el seguimiento que se realiza en PSA del avance del convenio, y una vez actualizada la línea base No 03 el pasado 13 de

	<p>julio de 2021, con base en la respectiva modificación contractual realizada el 25-JUN, se identifica que el porcentaje planeado actual del proyecto (duración) es 76.41% y ejecutado de 69.59%, para una diferencia(atraso) de 6.82%, a fecha de corte 17 de julio de 2021. El saldo a 31 de mayo de 2021, según último extracto de subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, es de \$3,638,874,720.33, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,361,125,279.67, por ende, porcentaje de ejecución del 54.51% de los recursos aportados por el FONDO.</p>
<p>Agosto</p>	<p>El 05-AGO se realizo, el comité operativo No 24, donde se informa por parte de la ANIM que se encuentran realizando las verificaciones y ajustes para la reprogramación de los hitos del contrato y en legalización de la suscripción de la modificación del contrato de obra, y se encuentra en revisión de lo pertinente para la interventoría. Adicionalmente, en el marco del comité, la ANIM presenta el Análisis Económico Operatividad Fase 1, por valor estimado de \$1.507.148.500 (incluidos los costos directos e indirectos asociados al contrato de obra, y los costos de la interventoría), recursos que podrían ser apropiados de los recursos aportados por el SENA, se menciona que estas actividades para dejar operativa la fase I del proyecto no afectarán el plazo actual del contrato de obra y se podría realizar en el tiempo de la prórroga que se encuentra en legalización.</p> <p>El 06 de agosto de 2021, se suscribió la modificación contractual No. 3 del contrato de obra para la terminación de la Fase I, donde</p>

fue realizada la prórroga del mismo por 67 días, teniendo un plazo final hasta el 13 de octubre de 2021.

Adicionalmente, en el presente periodo, se realizó el comité fiduciario No. 7, el 26 de agosto, donde se menciona que aún no se ha suscrito la modificación contractual de la interventoría de obra, y se presenta un registro fotográfico actualizado de la misma. Se solicita a ANIM la programación del comité operativo del mes de septiembre.

En referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAING LTDA.) por costos fijos, La ANIM en junio de 2021 se había mencionado que inició un proceso de demanda nuevo para el cobro de este valor, no se ha recibido actualización sobre este procedimiento, el cual, se espera solicitar en el marco del siguiente comité operativo. Con base en el último informe semanal (No. 20) de interventoría de las obras de terminación de fase I, para fecha de corte 28-AGO se reporta que el avance programado del contrato es de 48,90% y ejecutado de 38,92%, para una desviación (atraso) de 9.98%. Esta situación es preocupante, teniendo en cuenta que en el presente mes se realizó la respectiva reprogramación de actividades a acorde a la prórroga suscrita y ya a finales del mes se cuenta con un atraso del orden del 10%, Se consultará sobre esta situación y las respectivas medidas a implementar por parte de la ANIM para normalizar la ejecución de la obra.

El Fondo, sigue realizando, desde su

		<p>competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para normalizar la ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos del convenio.</p> <p>Por otro lado, En el seguimiento que se realiza en PSA del avance del convenio, se identifica que el porcentaje planeado actual del proyecto (duración) es 79.42% y ejecutado de 70.06%, para una diferencia(atraso) de 9.36%, a fecha de corte 21 de agosto de 2021. El saldo a 31 de julio de 2021, según último extracto de subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, es de \$3,503,179,315.38, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,496,820,684.62, por ende, porcentaje de ejecución del 56.21% de los recursos aportados por el FONDO.</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>Se suscribió el 3 de septiembre la modificación del contrato de interventoría, con la inclusión de una prórroga por dos meses y seis días calendario, para un plazo total de siete meses y seis días, también fue incluida una adición por valor de \$94.838.500, para un valor total de \$307.163.500 (IVA Incluido). En el presente mes no se realizó comité operativo, pese a las solicitudes realizadas por el Fondo Adaptación para su programación. Se reciben algunas comunicaciones de la ANIM en referencia al Análisis Económico para que una vez sea concluida la Fase I esta sea operativa, por valor final estimado de \$2.183.316.548 (incluidos los costos directos e indirectos asociados al contrato de obra para PTAR, PTAP, Urbanismo</p>

y andenes), recursos que podrían ser apropiados de los recursos aportados por el SENA, de manera inicial la ANIM había mencionado que estas actividades para dejar operativa la fase I del proyecto no afectarán el plazo actual del contrato de obra, sin embargo, no se cuenta con definición sobre este aspecto a la fecha. Se solicita a ANIM la programación pronta del comité operativo.

En referencia al reintegro del valor pagado en exceso al contratista Inicial (CRAING LTDA.) por costos fijos, La ANIM en junio de 2021 se había mencionado que inició un proceso de demanda nuevo para el cobro de este valor, no se ha recibido actualización sobre este procedimiento, el cual, se espera solicitar en el marco del siguiente comité operativo. Con base en el último informe semanal (No. 24) de interventoría de las obras de terminación de fase I, para fecha de corte 26-SEP se reporta que el avance programado del contrato es de 73.5%, avance ejecutado 51.84%, por ende, un 21.51% de diferencia (atraso). Esta situación es crítica, teniendo en cuenta el atraso mencionado y que a la fecha se cuenta con una ejecución algo mayor al 50% del alcance inicial del contrato, con lo cual, es muy probable que no se cumpla con el plazo actual (13 de octubre de 2021), para la culminación de las obras en el 100% del alcance pactado, e inclusive sobre las obras complementarias que se espera ejecutar en esta fase para la operatividad de las mismas. La ANIM también ha informado que pese a que algunas situaciones presentadas en obra (en especial, problemas de orden público y condiciones climatológicas) que an afectado la ejecución de

la misma, y que no son responsabilidad del contratista, este no ha tomado las acciones respectivas de manera oportuna, por lo cual, ha solicitado a la interventoría presente un informe de presunto incumplimiento por parte del contratista. Sin embargo, a la fecha no se conoce el estado actual de este proceso.


Debido a todas estas situaciones, el Fondo ha solicitado a la ANIM que se evalúe de manera detallada los costos y tiempo necesarios para culminar las obras de Fase I y el convenio de manera satisfactoria, y en especial, se implementen las respectivas medidas para normalizar la ejecución de la obra. El Fondo, sigue realizando, desde su competencia, un acompañamiento permanente del convenio y adelantando actividades de seguimiento detallado al avance, en pro, de que sean tomadas todas las acciones y medidas necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los objetivos del convenio.

Por otro lado, En el seguimiento que se realiza en PSA del avance del convenio, se identifica que el porcentaje planeado actual del proyecto (duración) es 82.04% y ejecutado de 71.01%, para una diferencia(atraso) de 11.03%, a fecha de corte 19 de septiembre de 2021. El saldo a 31 de agosto de 2021, según último extracto de subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, es de \$3,505,786,133.26, con lo cual, el ejecutado estimado total sería \$4,494,213,866.74, por ende, porcentaje de ejecución del 56.18% de los recursos aportados por el FONDO

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Bitácora de Seguimiento

(AEA11)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	El contrato para la construcción de viviendas No. 153 de 2017 se encuentra suspendido y de su culminación depende el inicio del acompañamiento socioeconómico en Achí, que se encuentra actualmente en estructuración.

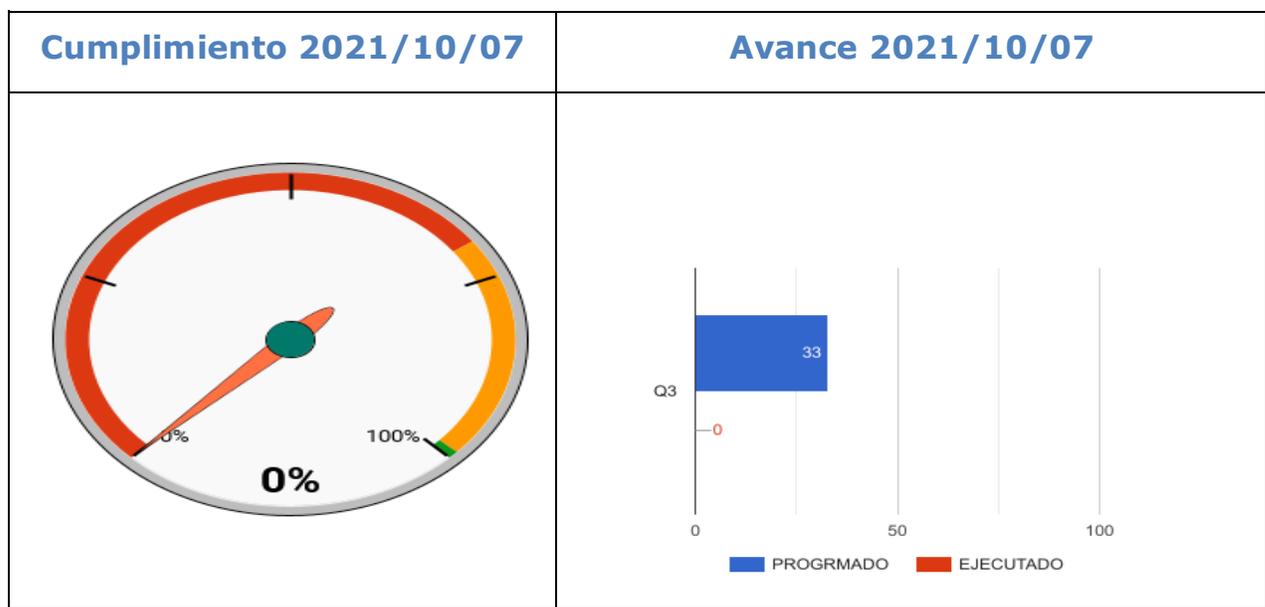

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS** Portafolio/Programa/ **JARILLÓN DE CALI**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA12_Contratar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA12)_Km de Jarillón, contratado	# 1	2.5	0	2.5	0	0	2.695
AEA13_Terminar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA13)_Km de Jarillón, terminado	# 1	4.9 515	0.3 815	1.6 5	2.7 2	0.2	3,66
AEA14_Entregar reforzamiento Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA14)_Km de Jarillón, entregado	# 1	22. 78	2.4 55	11. 372	1.1 8	7.7 73	3,22
AEA15_Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del	(AEA15)_Soluciones de vivienda, contratadas	# 1	400	0	400	0	0	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)									
AEA16_Terminar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali	(AEA16)_Soluciones de vivienda, terminadas	# 1	820	80	200	240	300	260	
AEA17_Entregar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA17)_Soluciones de vivienda, entregadas	# 1	820	80	200	240	300	236	
AEA18_Terminar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR)	(AEA18)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	# 1	2	0	2	0	0	0	
AEA19_Entregar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)	(AEA19)_Obras infraestructura estratégica, entregadas (PTAR, PTAP)	# 1	2	0	2	0	0	0	

Bitácora de Seguimiento

(AEA12)_Km de Jarillón,	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Se realizó la contratación de las obras de reforzamiento del Jarillón del Río Cauca correspondiente al Tramo VI, cuyo objeto establece: Realizar la actualización de los diseños y la construcción de las obras de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

contratado		reforzamiento y reconstrucción de los diques margen izquierda río Cauca, sectores Comfenalco y Floralia, margen derecha del río Cali sector río Cali, y obras complementarias, para la disminución del riesgo contra inundaciones por desbordamiento, licuación y corrimiento lateral, en el municipio de Santiago de Cali. CONTRATO DE OBRA FA-LP-I-S-003-2020 suscrito entre el FONDO ADAPTACIÓN y DONADO ARCE & COMPAÑIA S.A.S.
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEA13)_Km de Jarillón, terminado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	El avance de este mes avances corresponde a las obras de los tramos IV, tramo V, tramo VII
	Abril	El avance en este mes es el siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - Tramo IV = 0,149 kilómetros Finalizados - Tramo V= 0,407 kilómetros Finalizados - Tramo VII= 0,036 kilómetros Finalizados Con lo anterior se alcanza un avance total de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	1,8161 kilómetros finalizados que corresponde al 37% de la meta establecida para el año 2021.
Mayo	<p>El avance de mayo 2021 está representado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tramo IV 0.079 kilómetros - Tramo V 0.145 kilómetros <p>Para un avance de reforzamiento del mes de 0.224 kilómetros y un acumulado de 2 kilómetros reforzados que representa el 41% de la meta</p> <p>Pese a estos avances en el mes de mayo se suspendió la ejecución de las obras por situaciones de orden público en el marco de las actividades del paro nacional.</p>
Junio	<p>Las obras se reiniciaron a finales del mes de junio de 2021 por suspensión en el marco de las actividades del paro nacional, impactando el rendimiento que llevaban las obras.</p> <p>La terminación del reforzamiento del Jarillón del Rio Cauca al corte de junio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obras tramo VII: 0.009 km - Obras Lote 6A: 0,230 km <p>Total reforzado en el mes 0.239 km</p>
Julio	<p>Avance del reforzamiento del jarillon del rio Cauca al corte de julio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Obras tramo IV: 0,265 km reforzados -Obras tramo V: 0,160 km reforzados <p>Total del mes : 0,425 km reforzados Total año 2021: 2,704 km reforzados</p>
Agosto	<p>Avance de reforzamiento del Jarillón de Rio Cauca al corte de agosto 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Obras tramo IV: 0,514 km reforzados

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<ul style="list-style-type: none"> - Obras tramo V: 0,250 km reforzados -Total reforzado del mes de agosto 2021: 0,764 km de Jarillón - Total reforzado año 2021 : 3,5 km de Jarillón - Total reforzamiento acumulado : 21,5 km de Jarillón
	Septiembre	<p>Tramo IV: se terminaron las actividades en obra dentro del plazo contractual 02-09-21. Se inicia proceso de entrega técnica del proyecto y liquidación de obra.</p> <p>Tramo V: Continúan las actividades de reforzamiento, el contratista de obra está implementando un plan de acción para incrementar los rendimientos en aras de terminar dentro del plazo contractual vigente, 27 de diciembre de 2021.</p> <p>Tramo VI. Se encuentra en etapa de preconstrucción, con cumplimiento dentro los tiempos del cronograma de obra vigente.</p> <p>Tramo VII: El 01 de septiembre de 2021 se reinició el contrato de obra. Posteriormente el 03 de septiembre de 2021 se suscribió el Otrosí No.7 mediante el cual se amplió el plazo contractual por un término de 4 meses hasta el 04 de enero de 2022.</p>

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Gestión en la entrega frente al Municipio de

(AEA14)_Km de Jarillón, entregado		Santiago de Cali de las obras de reforzamiento de las obras del tramo II, correspondiente a 2,455 kilómetros de Jarillón reforzado.
	Abril	<p>Se realizaron mesas de trabajo para definir rutas de trabajo con los vinculados CVC y EMCALI que permitan establecer los protocolos para la entrega al Municipio de las obras: Tramo I, Tramo II, Subtramos, Tramo III y Obras de infraestructura.</p> <p>Entre las dificultades para la entrega se encuentra las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras del Tramo III. - Discusión con el Municipio sobre la recepción total de las obras de Jarillón.
	Mayo	<p>Se realizó mesa de trabajo con CVC y se revisó el tema donde se acordó que CVC entregaría la trazabilidad de las actividades adelantadas con el Municipio para el caso de la entrega de las de las obras del tramo 1, y de este modo replicar el proceso para subtramos. Las obras del tramo III debe surtir un proceso de entrega técnica previamente por parte de CVC.</p> <p>ENTREGA JARILLON AL MUNICIPIO</p> <p>DIFICULTADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras del Tramo III. CVC adelanta proceso de posible incumplimiento. - Definición por parte del Municipio acerca de la dependencia encargada del recibo de las obras de reforzamiento del Jarillón.
Junio	CVC entregó a la supervisión la trazabilidad de las actividades adelantadas con el Municipio para el caso de la entrega de las de las obras del tramo 1, y de este modo replicar el proceso	

	<p>para subtramos. Las obras del tramo III debe surtir un proceso de entrega técnica previamente por parte de CVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De igual forma la supervisión hizo entrega de la información asociada de los planos record de subtramos con el fin de completar la información requerida para iniciar la entrega al Municipio por parte de la CVC. <p>Entre las dificultades para la entrega se encuentra las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras del Tramo III. CVC adelanta proceso de posible incumplimiento. El contratista se encuentra adelantando la gestión a los temas técnicos y ambientales reportados por CVC que permitirán adelantar el proceso de liquidación de la obra. - Definición por parte del Municipio acerca de la dependencia encargada del recibo de las obras de reforzamiento del Jarillón. Se vienen desarrollando mesas de trabajo con el Municipio para establecer los protocolos necesarios para la entrega.
Julio	<p>Las obras del tramo III debe surtir un proceso de entrega técnica previamente por parte de CVC, teniendo en cuenta que actualmente las CVC adelanta un proceso de presunto incumplimiento.</p> <p>Entre las dificultades para la entrega se encuentra las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras del Tramo III. CVC adelanta proceso de posible incumplimiento. El contratista se encuentra adelantando la gestión

	<p>a los temas técnicos y ambientales reportados por CVC que permitirán adelantar el proceso de liquidación de la obra.</p>
Agosto	<p>Se llevó a cabo mesa de trabajo en CVC el 24-08-2021, la CVC se encuentra construyendo matriz de la totalidad de predios cedidos al Municipio en el año 2012 con su estado, la cual es la base para las gestiones que tenga que adelantar la UAEGBS o la misma CVC.</p> <p>Entre las dificultades para la entrega se encuentra las siguientes:</p> <p>Estudio de predios: Se adelanta estudio del estado de los predios cedidos al Municipio por parte de la CVC y de la Secretaría de Gestión de Riesgo Emergencia y Desastres (SGRED) de la Alcaldía de Cali, como requisito inicial para el proceso de entrega.</p>
Septiembre	<p>Por parte de la CVC se remitió toda la información predial recopilada a la UAEGBS, quien deberá en la mayoría de los casos estudiados, hacer la gestión con Catastro para incorporar los predios del Jarillón al inventario del Municipio.</p> <p>Entre las dificultades para la entrega se encuentra las siguientes:</p> <p>Gestión de la UAEGBS ante los entes de la misma administración: La UAEGBS tiene en su poder toda la información predial necesaria para la incorporación de los predios a los bienes al Municipio como requisito para el recibo de obras, teniéndose incertidumbre acerca del tiempo que se requiere para efectuar dicha</p>

gestión.

Bitácora de Seguimiento

(AEA15)_Soluciones de vivienda, contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	<p>Se realizó estudio de viabilidad de ofertas de vivienda por parte de Comfandi de tres proyectos habitacionales ubicados por fuera de Cali, en el marco del acuerdo transaccional.</p> <p>Así mismo, se realizaron mesas de trabajo con constructores y el Fondo Adaptación para presentar lineamientos en materia de contratación de proyectos habitacionales.</p> <p>Se legalizo el otrosí al convenio Marco 001/2015 para vincular al Fondo Especial de Vivienda al Macroproyecto Plan Jarillón de Cali, lo cual permitirá la suscripción de un convenio derivado entre el Fondo Adaptación y el FEV que permita aunar esfuerzos para la contratación de las viviendas.</p>
	Mayo	<p>Se adelantan tramite con constructores para obtener postulaciones en firme de proyectos habitacionales. Si bien ProPacífico recibió información básica de 3 proyectos ubicados en el municipio de Candelaria como oferta de vivienda, se solicitó el concepto a la Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, para definir la viabilidad del proyecto, en el marco del acuerdo transaccional entre COMFANDI y FA.</p> <p>Se legalizo el otrosí al convenio Marco 001/2015 para vincular al Fondo Especial de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		Vivienda al Macro Proyecto Plan Jarillón de Cali, lo cual permitirá la suscripción de un convenio derivado entre el Fondo Adaptación y el FEV que permita aunar esfuerzos para la contratación de las viviendas.
	Junio	Se viene finalizando el tramite con constructores para obtener postulaciones en firme de proyectos habitacionales.
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Legalización otrosí al convenio Marco 001/2015 para vincular al Fondo Especial de Vivienda al Macro Proyecto Plan Jarillón de Cali, lo cual permitirá la suscripción de un convenio derivado entre el Fondo Adaptación y el FEV que permita aunar esfuerzos para la contratación de las viviendas.
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEA16)_Soluciones de vivienda, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Finalización con certificados de habitabilidad de 80 VIP en el Proyecto Habitacional Torres de Almadina en el sector 1 de las torres C;D;E;F.
	Abril	Se vienen realizando seguimiento a los compromisos al Acuerdo de transacción entre Fondo Adaptación y Comfandi que permitirán finalizar o devolver los recursos del proyecto Torres de la Paz. Así mismo, se viene trabajando en la subsanación de las observaciones emitidas por la Secretaria de Planeación para saneamiento de la Licencia de

	<p>urbanismo por parte del contratista del proyecto Torres de Alamadina.</p> <p>Entre las dificultades que se han presentado en el avance del indicador se encuentran las siguientes;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización de la licencia de urbanismos del proyecto Torres de Alamadina que impide realizar la entrega a los beneficiarios. - Emisión de paz y salvo del impuesto predial asociado al lote del proyecto Pondaje y Charco Azul por haber sido cedido por el Municipio de Cali.
Mayo	Sin registro de avance en el indicador
Junio	<p>Se encuentra en estudio la reprogramación de entrega de hitos presentada por COMFANDI asociados al Acuerdo de Transacción entre Fondo Adaptación y Comfandi del proyecto Torres de la Paz.</p> <p>Se cuenta con Licencia de urbanismo del proyecto Torres de Alamadina, que reinicio el 29 de junio 2021. Se proyecta realizar mesas de trabajo con la secretaria de planeación del municipio para revisar y gestionar los pendientes a cargo del contratista y lograr el permiso de ocupación.</p> <p>Continua el proceso de desembolso de recursos en calidad de préstamo por parte de Comfandi en el proyecto Pondaje y Charco Azul por un total de 1.700.000.000.</p> <p>Se encuentra en trámite la emisión de paz y salvo del impuesto predial asociado al lote del proyecto Pondaje y Charco Azul por haber sido cedido por el Municipio de Cali.</p> <p>Así mismo, se encuentra en trámite la radicación de solicitud de revalidación de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>licencia de construcción del proyecto Pondaje y Charco Azul.</p> <p>Se está evaluando posible incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi.</p> <p>Se espera la reactivación de las obras a finales del mes de junio 21 por Suspensión en el marco de las actividades del paro nacional.</p>
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	<p>Finalización de 100 VIP en el proyecto habitacional Pondaje y Charco Azul con la generación de sus respectivos certificados de habitabilidad:</p> <p>Edificio 2 Torre 3 Edificio 2 Torre 4 Edificio 2 Torre 5 Edificio 4 Torre 8 Edificio 4 Torre 9</p>
	Septiembre	<p>Finalización con certificados de habitabilidad de 80 VIP en el proyecto habitacional Alamadina correspondiente a las torres C,D,E,F,</p> <p>Torres de Alamadina: La interventoría del proyecto habitacional expidió el 28 de septiembre de 2021 los certificados de existencia y habitabilidad de 4 edificaciones (Torres C-D-E-F) del Sector 2.</p>

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA17)_Soluciones de vivienda, entregadas	Marzo	Durante este periodo se logro finalizar la construcción de las 80 VIP del Proyecto Habitacional Alamadina con certificados de habitabilidad emitidos por el Operador de vivienda COMFANDI y validados por la supervisión ProPacífico, corresponde a 80 VI del Sector 1 de las torres C-D-E-F.
	Abril	<p>Se realizó la correspondiente asignación y pago efectivo de cuatro (4) compensaciones económicas (carta cheques), conforme al Convenio 016-2017 firmado entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali y las obligaciones pactadas en el Convenio Marco No. 001 de 2015.</p> <p>Las compensaciones realizadas se describen a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Leidy Patricia Ibarquen Granado cc 31.589.915 (vendedor) / Luz Adriana Sandoval cc 66.755.732 (comprador). 2- Elva Marina Ruiz cc 34.508.254 (vendedor) / Silveria Florentina Angulo Quiñones cc 27.129.791 (comprador) 3. Leidy Patricia Ibarquen Granado cc 31.589.915 (vendedor)/ María Nhora Saldarriaga Portillo cc 38.886.980 (comprador). 4. Paulina de la Estrella Sisa Acuña cc 23.552.273 (vendedor) / Melania Angulo Delgado cc 52.077.758 <p>Se viene realizando el seguimiento a los compromisos al Acuerdo de transacción entre Fondo Adaptación y Comfandi que permitirán finalizar o devolver los recursos del proyecto Torres de la Paz. Así mismo, el seguimiento a la subsanación de las observaciones emitidas</p>

	<p>por la Secretaria de Planeación para saneamiento de la Licencia de urbanismo por parte del contratista del proyecto Torres de Alamadina.</p> <p>Se registran dificultades con la actualización de la licencia de urbanismos del proyecto Torres de Alamadina que impide realizar la entrega a los beneficiarios. Igualmente, se registra dificultad con la emisión de paz y salvo del impuesto predial asociado al lote del proyecto Pondaje y Charco Azul por haber sido cedido por el Municipio de Cali.</p>
Mayo	<p>Durante el mes de mayo 2021 se pagaron efectivamente 6 compensaciones económicas por vivienda usada conforme convenio 016-2017 suscrito entre el Municipio de Cali y el FA por un valor total de 341.246.360,00 para el proceso de reasentamiento de familias beneficiadas del Plan Jarillón de Cali:</p> <p>Se logró por parte de la Secretaria de Planeación el saneamiento de la Licencia de del proyecto Torres de Alamadina.</p> <p>Se presentan las siguientes dificultades en el desarrollo del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi.- Suspensión de los proyectos habitacionales por situaciones de orden público en el marco de las actividades del paro nacional.- Emisión de paz y salvo del impuesto predial asociado al lote del proyecto Pondaje y Charco Azul por haber sido cedido por el Municipio de Cali.

	Junio	<p>Se encuentra en estudio la reprogramación de entrega de hitos presentada por COMFANDI asociados al Acuerdo de Transacción entre Fondo Adaptación y Comfandi del proyecto Torres de la Paz.</p> <p>Se cuenta con Licencia de urbanismo del proyecto Torres de Alamadina, que reinicio el 29 de junio 2021. Se proyecta realizar mesas de trabajo con la secretaria de planeación del municipio para revisar y gestionar los pendientes a cargo del contratista y lograr el permiso de ocupación.</p> <p>Continua el proceso de desembolso de recursos en calidad de préstamo por parte de Comfandi en el proyecto Pondaje y Charco Azul por un total de 1.700.000.000.</p> <p>Se legalizo el otrosí No. 8 desembolso por parte del FA de \$1.312.472.000 para el desarrollo del Proyecto Pondaje y Charco Azul. Se actualizan pólizas por parte de la constructora para poder iniciar facturación.</p> <p>Se está evaluando posible incumplimiento de los compromisos del acuerdo de transacción del proyecto Torres de la Paz por parte de Comfandi.</p> <p>Se logro la reactivación de las obras a finales del mes de junio 21 por Suspensión en el marco de las actividades del paro nacional.</p> <p>Se realizó el pago efectivo de 3 compensaciones económicas (carta - cheques) efectuadas durante el mes de junio de 2021, a los beneficiarios del Plan Jarillón de Cali en</p>
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		marco del convenio interadministrativo 2017-CV-0016 entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Cali.
	Julio	Continua el proceso de desembolso de recursos en calidad de préstamo por parte de Comfandi en el proyecto Pondaje y Charco Azul por un total de 1.700.000.000. al corte se ha desembolsado el 98,23 %.
	Agosto	<p>Para el proyecto habitacional Urbanización Torres de la Paz, se adelanta Plan de trabajo por parte de Comfandi para analizar viabilidad de solicitud de prórroga, este plan se incorporaría al Acuerdo de Transacción firmado entre el FA y Comfandi, con el objetivo de reiniciar y finalizar el proyecto.</p> <p>Para el proyecto habitacional Ciudadela el Pondaje y Charco Azul y en línea con la programación de entrega de viviendas a beneficiarios, se generan certificados de habitabilidad de 100 VIP de las 120 VIP para entrega del 20 de septiembre, los 20 certificados de habitabilidad, están en proceso. Entrega a beneficiarios de 120 VIP de las edificaciones 2 y 4 en el mes de septiembre 2021, estando las entregas, dentro de lo programado.</p> <p>El proyecto habitacional cuenta con revalidación de las Licencias de construcción y urbanismo mediante la resolución No. CU3 - 76003210511 del año 2021 mes 7 día 22.</p>
	Septiembre	Corresponde a la entrega de las 120 VIP en el proyecto habitacional El Pondaje y Charco Azul a los beneficiarios del Plan Jarillón de Cali.

Bitácora de Seguimiento

(AEA18)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Se presentan condiciones climáticas adversas que obligaron a suspensión de contratos de obra e interventoría.
	Mayo	Se presentan condiciones climáticas adversas que obligaron a suspensión de contratos de obra e interventoría. Suspensión de la obra por situaciones de orden público en el marco de las actividades del paro nacional.
	Junio	Gestiones administrativas para la ampliación de la suspensión. Se proyecta que la obra reinicie el 9 de julio de 2021. Se realizó suspensión de la obra por situaciones de orden público en el marco de las actividades del paro nacional. El contratista presenta dificultades de tipo logístico en cuanto a disponibilidad de equipo especializado (piloteadora) y de personal para para reiniciar obra.
	Julio	Gestiones administrativas para la suscripción de la suspensión No.11. Se proyecta que la obra reinicie el 9 de septiembre de 2021. Suspensión de la obra sustentada en que el contratista presenta dificultades de tipo logístico en cuanto a disponibilidad de equipo especializado (piloteadora) y de personal para para reiniciar obra, tiempo de fabricación de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		geocontenedores que fueron hurtados durante las protestas del para nacional el cual es de aproximadamente 45 días.
	Agosto	El contratista radicó a la interventoría solicitud de prórroga del contrato por 40 días.
	Septiembre	Se dio reinicio a las obras el día 09/09/2021, habiéndose solicitado por parte del contratista una ampliación de plazo por 40 días a partir del día 29/09/2021 con fecha de terminación para el día 07/11/2021.


Bitácora de Seguimiento

(AEA19)_Obras infraestructura estratégica, entregadas (PTAR, PTAP)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	<p>Se realizaron mesas de trabajo para definir rutas de trabajo con EMCALI que permitan establecer los protocolos para la entrega de las obras.</p> <p>Se viene presentando dificultades para el cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras por condiciones climáticas.</p>
	Mayo	<p>Se realizó mesa de trabajo con EMCALI donde se acordó que se consultaría el trámite para realizar la entrega del tramo de 195 metros de la Estación de Bombeo Paso del Comercio y este trámite se replicará para la entrega de PTAR-PTAP.</p> <p>Se viene presentando dificultades para el cierre técnico de las actividades a cargo del</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		contratista de las obras por condiciones climáticas y el Paro Nacional.
	Junio	<p>Se suministro modelo de acta de entrega de obras de infraestructura la cual se ajustará a las condiciones del contrato PTAR-PTAP para hacer las gestiones de entrega en el momento en que finalice la obra a satisfacción.</p> <p>Se realizará mesa de trabajo con EMCALI para el trámite de la entrega del tramo de 195 metros de la Estación de Bombeo Paso del Comercio y este trámite se replicará para la entrega de PTAR-PTAP.</p> <p>Se registran dificultades para el cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras que por dificultades de tipo logístico y de clima no han permitido el reinicio de la obra, la cual se proyecta reiniciar el 9 de julio 2021.</p>
	Julio	Se realizará mesa de trabajo con EMCALI para el trámite de la entrega del tramo de 195 metros de la Estación de Bombeo Paso del Comercio y este trámite se replicará para la entrega de PTAR-PTAP.
	Agosto	EMCALI remitió modelo de acta de entrega en la cual están contenidos los requisitos para llevar a cabo la entrega de obras finalizadas a esa Entidad. En el momento de finalización de la obra y recibo por parte de la interventoría, se procederá con el trámite de entrega a EMCALI.
	Septiembre	Cierre técnico de las actividades a cargo del contratista de las obras que tiene fecha de terminación estimada de su contrato para el día 11 de noviembre de 2021.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

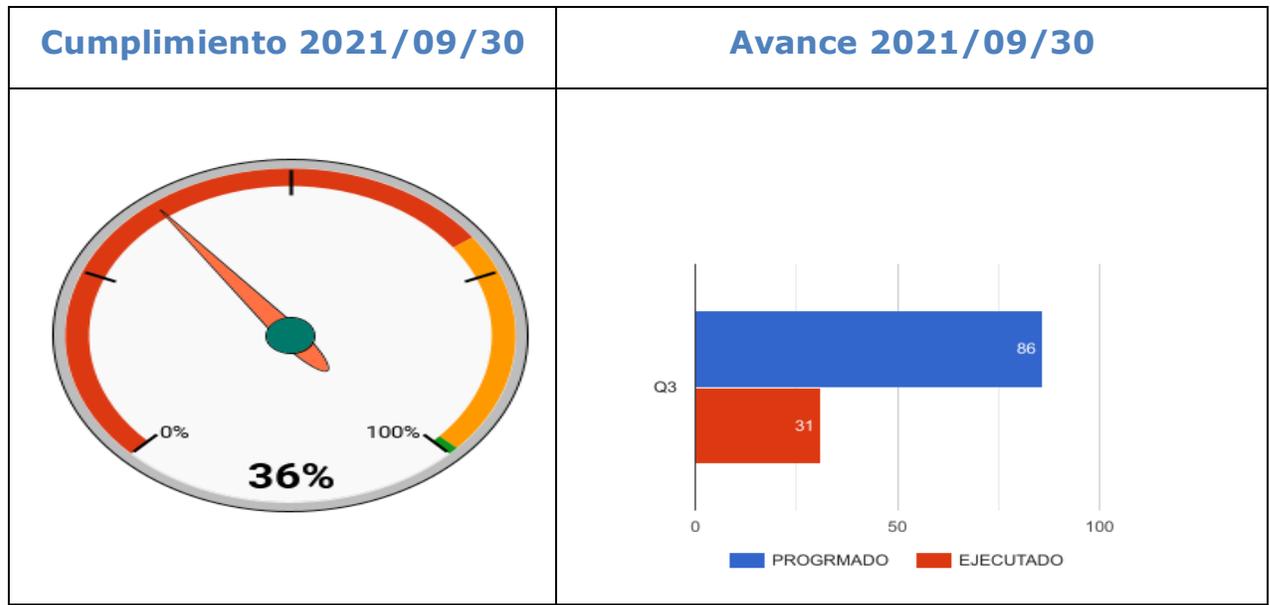

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: RÍO FONCE



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA20_Entregar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES PEI)	(AEA20)_Obras de estabilización entregadas (INDICADOR PEI) [2 pte +1 obra estab]	#	3	0	0	3	0	0

Bitácora de Seguimiento

	Enero	El Departamento de Santander, suspendió el contrato de obra el 14 de diciembre de 2020, hasta el 30 de enero de 2021, sustentado en que, debido a que por la petición de prórroga
--	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

<p>(AEA20)_Obras de estabilización entregadas (INDICADOR PEI) [2 pte +1 obra estab]</p>		<p>de dos meses del contratista, la Gobernación, debe gestionar los recursos para la adición de la interventoría.</p> <p>Conforme el último Informe, elaborado por la Interventoría Consorcio Rio Fonce 2, con corte a diciembre de 2020, los avances son: Estabilización Represa La Laja - 88%; Puente Hospital - Onzaga - 84% y Puente San Joaquín - 98%.</p> <p>El Fondo mediante Oficio E-2021-00522 del 28/01/2021, requirió al Departamento de Santander informar el estado del contrato 3553 de 2015 e informar que medidas tiene previstas el Departamento para dar cumplimiento a la ejecución de las obras faltantes teniendo en cuenta que el contrato termina el 30 de enero de 2021 y que el Departamento, a través del otro si No. 11 al Convenio Interadministrativo 061 de 2013, se comprometió a entregar las obras antes del 20 de marzo de 2021. A 31 de enero no se cuenta con respuesta por parte del Departamento.</p>
	<p>Febrero</p>	<p>El Departamento de Santander, suspendió el contrato de obra el 14 de diciembre de 2020, hasta el 30 de enero de 2021, sustentado en que, debido a la petición de prórroga de dos meses del contratista, la Gobernación, debe gestionar los recursos para la adición de la interventoría.</p> <p>Mediante comunicación de radicado 20210023500 del 23 de febrero de 2021 (Fondo R-2021-002610 de fecha 24/02/2021) el Departamento Indica que el contrato 3553 de 2015 continúa suspendido porque a treinta (30) de enero de 2021 no</p>

		<p>fue posible la consecución del certificado de disponibilidad presupuestal para la mayor permanencia de la interventoría y como consecuencia de ello amplió el término de la suspensión. Anexo al radicado R-2021-002709 del 26/02/2021 mediante el cual la Supervisión del Departamento remite informes del Convenio 061 de 2013 allega copia de la ampliación No.1 a la Suspensión No. 8 del contrato 3553 de 2015 la cual determina como fecha de terminación el 26/02/2021.</p> <p>Conforme el último Informe, elaborado por la Interventoría Consorcio Rio Fonce 2, con corte a enero de 2021, los avances son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estabilización Represa La Laja - 88%; -Puente Hospital - Onzaga - 84% y - Puente San Joaquín - 98%. <p>El Fondo mediante Oficios E-2021-001219 del 18/02/2021 y E-2021-001505 del 26/02/2021 requirió al Departamento informar que medidas tiene previstas para dar cumplimiento a la ejecución de las obras sin finalizar del contrato 3553 de 2015 antes del 20 de marzo de 2021, fecha de terminación del Convenio y tomar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la terminación y entrega de las obras, en vigencia del Convenio Interadministrativo 061 de 2013.</p>
	Marzo	<p>Luego de estar suspendido el contrato 3553 de 2015 desde el 14 de diciembre de 2020, el Departamento de Santander dio reinició al</p>

		<p>contrato mediante Acta de reiniciación No. 8 el 23 de marzo de 2021 con nueva fecha de terminación el 25 de mayo de 2021 y mediante Adicional No. 8 suscrito el 10 de marzo de 2021 lo prorroga por dos (02) meses.</p> <p>Conforme el último Informe, elaborado por la Interventoría Consorcio Rio Fonce 2, con corte a marzo de 2021, los avances en las obras son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estabilización Represa La Laja - 88%; -Puente Hospital - Onzaga - 94% y -Puente San Joaquín - 98%. <p>El Fondo mediante oficio radicado E-2021-001837 del 12/03/2021, dando alcance Oficio E-2020-008768 del 22/12/2020, convoca al Gobernador de Santander a reunión con el fin de determinar las acciones a seguir para dar cumplimiento al objeto del Convenio 061 de 2013 y a la finalización de las tres obras faltantes del contrato 3553 de 2015 y mediante oficio radicado E-2021-002057 del 23/03/2021, requiere al Departamento adelantar lo pertinente para el reinició de las obras y presentar el plan de atención a las oportunidades de mejora, evidenciadas por la ATIP aprobado por la interventoría de manera inmediata y efectuar seguimiento a su implementación.</p> <p>De otra parte, con intermediación de la Contraloría General de la Nación, en reuniones convocadas por dicha entidad el día 18 y 25 de marzo se ha realizado seguimiento al avance del contrato.</p>
	Abril	El 8 de abril de 2021, el Fondo Adaptación, efectuó visita, con el fin de corroborar el avance en las obras, cuyo contrato reinició el

		<p>23 de marzo de 2021, con prórroga hasta el 25 de mayo de 2021. Encontrando alguna actividad en el Puente de Onzaga y sin ejecutar nada en las dos otras obras (Puente San Joaquín y Represa la Laja Pinchote). El Fondo requirió la toma de acciones para finalizar las obras en el plazo contractual.</p> <p>Del seguimiento efectuado por el Fondo pudo establecerse que, desde la fecha de la visita hasta finalizar el mes, no hubo acciones del contratista en las tres obras.</p> <p>De otra parte, con intermediación de la Contraloría General de la Nación, se han efectuado reuniones convocadas por dicha entidad los días 13, 22 y 30 de abril, realizando seguimiento al avance del contrato. En dichas reuniones el contratista ha manifestado su intención de finalizar las obras, indicando que lo haría dentro del plazo contractual; así mismo el Departamento se comprometió a iniciar un proceso por presunto incumplimiento, dado que no hay ejecución de obras.</p> <p>Conforme el cronograma en el Sistema PSA, con corte a abril de 2021, los avances en las obras son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estabilización Represa La Laja: 88%; -Puente Hospital - Onzaga: 99% y -Puente San Joaquín: 98%.
	<p>Mayo</p>	<p>Durante el mes de mayo las obras no presentaron avance, inicialmente no hubo presencia en las obras y el 20 de mayo del 2021, en audiencia por presunto incumplimiento el Departamento de Santander suspendió el contrato 3553 de 2015,</p>

considerando la situación de orden público y la dificultad de acceso a la obra en Pinchote.

Ante la anterior situación el Fondo, en procura de que las obras finalizaran, efectuó las siguientes acciones:

El 07/05/2021 el Fondo mediante oficio E-2021-003630 requirió al Departamento de Santander informar el avance sobre el proceso de presunto incumplimiento del Contrato 3553 de 2015 y las medidas previstas para dar cumplimiento a la ejecución de las obras faltantes, que conforme el otro si No. 12 al Convenio Interadministrativo No. 061 de 2013, se comprometió a entregar. No obstante, el Departamento de Santander mediante oficio radicado R-2021-007225 del 26/05/2021, solicitó la suspensión del convenio 061 de 2013 por un (01) mes, manifestando que:

“(...) el Contrato de Obra No. 3553 de 2015 se encuentra actualmente suspendido hasta que la situación de orden público en el que se encuentra el país como son las protestas, marchas y por el bloqueo de las vías nacionales, impidiendo el ingreso de materiales al sitio de las obras.

Que en la obra del Municipio de Pinchóte, no se ha podido ingresar a la hacienda las flores que es propiedad privada, la cual tiene la única vía de acceso hacia las (Sic) represa las lajas, se está programando una mesa de trabajo para ver la posible solución para el acceso al sitio de obras (...)”

El 28/05/2021 el Fondo requirió mediante oficio

		<p>E-2021-004158 al Departamento efectuar durante la suspensión, las gestiones necesarias que permitan que al momento de reiniciar el Convenio No. 061 de 2013 y el contrato 3553 de 2015, se tenga definido y planeado la manera y plazo en que se dará cumplimiento a todos los aspectos necesarios para poder finalizar y entregar las tres obras, incluyendo, entre otros, las observaciones efectuadas por la ATIP, el acceso al predio donde se ubica la represa Las Lajas y el movimiento de las redes eléctricas en el Puente Onzaga.</p> <p>Conforme el cronograma en el Sistema PSA, con corte a mayo de 2021, los avances en las obras son: Estabilización Represa Las Lajas : 88%; Puente Hospital - Onzaga : 97% y Puente San Joaquín: 98%.</p>
	Junio	<p>El Departamento de Santander, atendió la petición de suspensión del Consorcio Rio Fonce del contrato 3553 de 2015 a partir del 20 de mayo, considerando la situación de orden público y la dificultad de acceso a la obra en Pinchote, por lo cual el contrato 3553 de 2015 se encuentra a la fecha suspendido.</p> <p>En aras de que al momento de reiniciar estén previstas las acciones que permitan la pronta finalización de las obras, el Fondo efectuó las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• El 09 de junio de 2021, el Fondo convocó a reunión al Departamento de Santander, quien agendó a sus contratistas: de obra Consorcio Río Fonce y de interventoría Consorcio Río Fonce 2, en la cual se revisaron

los temas pendientes por ejecutar del contrato 3553 de 2015 y en la cual ante la petición del Fondo, la interventoría y el contratista se comprometen a incluir en la propuesta de adición y prórroga, todos los ítems que no estén incluidos y que sean necesarios para la entrega y pronta terminación de la obra, tales como los identificados por la ATIP, estabilización y barandas en el puente de San Joaquín, así como el traslado del poste a fin de eliminar la interferencia de las redes eléctricas que se presenta en el Puente de Onzaga, presentando los APU respectivos, por parte del contratista a la Interventoría y al Departamento para su aprobación. Igualmente queda como compromiso que el Departamento y el contratista realicen visita a Pinchote a fin de gestionar el permiso de ingreso al predio del frente de obra de la represa.

- El 16 de junio de 2021, el Fondo convocó a reunión al Departamento de Santander, al contratista Consorcio Río Fonce y a la Interventoría contratada por el Departamento Consorcio Río Fonce 2, con el fin de verificar el avance y cumplimiento de los compromisos establecidos en la reunión del 09 de junio, el Departamento informa que el viernes 11 de junio se realizó la reunión en Pinchote con el abogado apoderado del predio, el administrador de la finca, el constructor y que se llegó a acuerdo para el ingreso al frente de obra. El contratista, informa que ya se pasaron los APU a la interventoría los cuales se encuentran en revisión y aprobación. El Fondo solicita responder de forma diligente, pronta y con el sustento técnico necesario, los requerimientos de la ATIP remitida por el

		<p>Departamento al Fondo, con base en lo que el contratista informe y la interventoría apruebe incluyendo el soporte fotográfico respectivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> El 17 de junio se efectúa seguimiento con acompañamiento de la Contraloría – DIARI, en reunión que contó con la participación del Departamento, el contratista y la interventoría. El contratista se compromete a presentar cronograma de finalización de las obras. Conforme el cronograma en el Sistema PSA, con corte a junio de 2021, los avances en las obras son: <ul style="list-style-type: none"> -Estabilización Represa Las Lajas: 88%; -Puente Hospital - Onzaga: 97% y -Puente San Joaquín: 98%.
	Julio	<p>El Departamento de Santander mantuvo suspendido el contrato No. 3553 de 2015 en el mes de julio de 2021 por lo cual no se presentaron avances en el desarrollo de las obras del Proyecto Rio Fonce.</p> <p>El Fondo efectuó reuniones de seguimiento al Convenio 061 de 2013, tendientes a que el Departamento constate los avances en lo requerido para el proto y efectivo reinicio de las obras.</p> <p>Conforme el cronograma en el Sistema PSA, con corte a junio de 2021, los avances en las obras se mantienen en:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estabilización Represa Las Lajas: 88%; -Puente Hospital - Onzaga: 97% y - Puente San Joaquín: 98%.
	Agosto	Durante el mes de agosto. El Departamento de

Santander mantuvo suspendido el contrato No. 3553 de 2015, que ejecuta las obras pendientes del Proyecto Rio Fonce, motivo por el cual no hubo avance en las tres obras.

La suspensión inició el 20 de mayo de 2021 y termina el 6 de septiembre de 2021. La suspensión se motivó inicialmente porque el contratista no podía ejecutar las obras ante la situación de orden público y dificultades de acceso al predio la Laja, posteriormente el Departamento la mantuvo suspendida entre tanto gestionaba los recursos para la mayor permanencia de la interventoría, para la prórroga de un mes a otorgar el contratista de obra.

En aras de que al momento de reiniciar estén previstas las acciones que permitan el reinicio efectivo y la pronta finalización de las obras, el Fondo efectuó reunión el 10 de agosto de 2021, requiriendo las siguientes acciones: Atención a las observaciones de la ATIP, soportes que permitan establecer que contará al re-inicio con los equipos y los materiales, para las tres obras, soportes de pago a los representantes del predio de la represa la Laja. Definición de todo lo asociado al traslado del poste a fin de eliminar la interferencia de las redes eléctricas que se presenta en el Puente de Onzaga. Finalizado el mes no se recibió la información.

Los días 18 y 25 de agosto, se realizó reunión de seguimiento permanente de la Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la Nación que la Contraloría – DIARI, la primera reunión

		<p>contó con la participación del Departamento, el contratista y la interventoría, se solicita cronograma y fotos del estado de las obras; en la reunión del 25 de agosto de 2021 se presentó el cronograma y fotos de las obras, sin la asistencia del contratista; conforme lo informado por el Departamento, se espera el reinicio de obras el 7 de septiembre de 2021.</p> <p>Toda vez que el contrato reinicia el 7 de septiembre de 2021, el Departamento le va a otorgar un mes de prórroga y le restan 5 días de contrato, se prevé la terminación de las obras el 11 de octubre de 2021. Así las cosas, por todo lo expuesto no se logrará cumplir la meta establecida en el plan de acción, para finalizar las obras en septiembre.</p> <p>Conforme el cronograma de obras en el Sistema PSA y lo informado por la Interventoría, con corte a julio de 2021, las obras mantienen el avance de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estabilización Represa Las Lajas: 88%; -Puente Hospital - Onzaga: 97% y -Puente San Joaquín: 98%.
Septiembre		<p>Obras Proyecto Rio Fonce: Durante el mes de septiembre. El Departamento de Santander reinicio el contrato No. 3553 de 2015, el 07 de septiembre de 2021, que ejecuta las obras pendientes del Proyecto Rio Fonce. Así mismo, el Departamento le otorgó un mes de prórroga, por lo que se prevé la terminación de las obras el 11 de octubre de 2021.</p> <p>De acuerdo con lo expuesto por el contratista e interventoría, debido a lluvias permanentes en</p>

los sitios de trabajo según oficio radicado del contratista CRF-RL-024-2021 de fecha 22 de septiembre de 2021 e informe de interventoría de fecha 23 de septiembre de 2021, donde se menciona plan de ejecución y aunque se presentó un plan de contingencia, posiblemente no se logrará cumplir la meta establecida en el plan de acción, para finalizar las obras en septiembre.

Conforme al cronograma de obras en el Sistema PSA, con corte a septiembre 25 de 2021, las obras mantienen el avance de:

- Estabilización Represa La Laja - 88%
- Puente vehicular Hospital - Onzaga - 97%
- Puente vehicular San Joaquín - 98%.

Lo anterior no muestra el avance efectivo en la obra, debido al no cargue del seguimiento en el cronograma en PSA de obra por parte de la interventoría del Departamento. No obstante lo anterior, la Interventoría informó que a 30 de septiembre, las obras presentan actividades que reflejan mayor porcentaje como son:

PUENTE SAN JOAQUÍN:


Se realizó los anclajes sobre los gaviones, se fundió las vigas para anclar las barandas; inició el armado de las barandas en el sitio y se construyeron los gaviones para la Estabilización de taludes.

PUENTE HOSPITAL ONZAGA:

Se están realizando las diligencias necesarias para mover el cableado eléctrico de líneas

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>eléctricas de baja tensión.</p> <p>REPRESA LAS LAJAS MUNICIPIO DE PINCHOTE:</p> <p>Se está conformando el relleno de material en el respaldo de la presa de acuerdo con el cronograma de obra.</p>
--	--	---

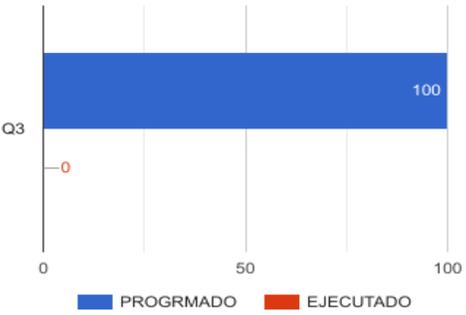Cumplimiento 2021/09/30	Avance 2021/09/30
 <p>0%</p>	 <p>Q3</p> <p>0 50 100</p> <p>PROGRMADO EJECUTADO</p>

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS** Portafolio/Programa/Proyecto: **GRAMALOTE**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA21_Terminar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento	(AEA21)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos terminados	# 1	4	0	0	0	4	1
AEA22_Entregar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento	(AEA22)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos entregados	# 1	4	0	0	0	4	1
AEA23_Terminar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA23)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	# 1	128	0	0	0	128	0
AEA24_Entregar Proyectos de Infraestructura de	(AEA24)_Viviendas municipio	# 1	150	0	0	0	150	11

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Viviendas	gramalote, entregadas									
-----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bitácora de Seguimiento

(AEA21)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos terminados	Enero	Al 31 de enero de 2021, el avance en la etapa de construcción de los equipamientos Casa del Adulto Mayor y Escenario Deportivo se repartieron de la siguiente manera: para el escenario deportivo se registró un avance acumulado de 14,61%, esto se ve reflejado en actividades como montaje de vigas de conexión de estructura metálica y colocación de acero de refuerzo para tanque y cuarto de máquinas. Con respecto a la Casa del Adulto Mayor se registró un avance acumulado de 26,02% concentrado en actividades como excavación mecánica para mejoramiento del suelo de zona administrativa y colocación de acero de refuerzo para tanque subterráneo.
	Febrero	Durante el mes de febrero, el Escenario Deportivo reportó un avance acumulado de 27,79%, este avance corresponde a actividades de la etapa de construcción como el montaje de la estructura metálica para la cancha principal y el vaciado de concreto para la rampa de acceso al escenario principal. Con respecto a la Casa del Adulto Mayor se reportó un avance acumulado de 36,91% reflejado en actividades como la cimentación de la zona administrativa y avances en mampostería en fachada de la edificación y en el sistema de accesos a la rampa principal.
	Marzo	Al cerrar el mes de marzo la construcción de la Casa del Adulto Mayor registró un avance

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>acumulado de 53,34%, este avance correspondió principalmente a el avance en las actividades correspondientes a construcción en muros de durapanel en zona administrativa, finalización zona durapanel zona habitacional e inicio de pintura de la estructura metálica. Para el Escenario deportivo se registró un avance acumulado de 39,68% centrado en los avances en la estructura de acero de refuerzo y concretos para muros de contención, excavaciones mecánicas y redes de alcantarillado sanitario.</p>
	Abril	<p>Al cerrar el mes de marzo la construcción de la Casa del Adulto Mayor registró un avance acumulado de 59,1%, este avance correspondió principalmente al avance en las actividades correspondientes al vaciado cubierto durapanel área administrativa, vaciado muro de contención paralelo a talud zona administrativa, pañete impermeabilizado para zonas húmedas e instalaciones eléctricas. Para el Escenario deportivo se registró un avance acumulado de 46,69% centrado en los avances en la instalación geotextil NT-2400 capa 1,2,3,4 y 5 muro de suelo armado 7; vaciado concreto para vástago muro tipo 4 zona norte cancha 2 externa, área de muro de la rampa de acceso al coliseo y cuneta de coronación; Instalación geodren planar muro de suelo armado 7 e instalación de redes hidrosanitarias.</p>
	Mayo	<p>La construcción de la Casa del Adulto Mayor presenta un avance acumulado de 68.36%, este avance corresponde principalmente a actividades como la mampostería a la vista del acceso principal a la administración, enchape</p>

	<p>de piso y paredes baños zona habitacional y administrativo. 65%, instalación Calderín para red de agua caliente, vaciado de concreto estampado, descansos acceso principal, entre otros. Con respecto a la construcción del Escenario Deportivo presenta un avance de 51,14%, este avance corresponde a actividades como la construcción de muros de contención e instalación de canal de aguas lluvias en la cubierta del escenario deportivo y avance en la mampostería a la vista, camerino norte, anclaje superior; Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas camerino sur.</p>
Junio	<p>La construcción de la Casa del Campesino presenta un avance acumulado de 73.50%, este avance corresponde principalmente a la terminación de pañetes, cielorrasos y avances en cubiertas e impermeabilizantes así como mampostería e instalaciones hidrosanitarias, entre otros. Con respecto a la construcción de la Casa de la Cultura presenta un avance acumulado de 43,68%, este avance corresponde principalmente a actividades como la instalación de las redes eléctricas para los salones principales, museo y cuartos técnicos y armado de la estructura de la placa de mezanine.</p>
Julio	<p>El nuevo proceso para la contratación de las 128 viviendas restantes en el municipio de Gramalote, el cual se cerró el pasado 30 de junio, resultado desierto por errores en la presentación de la oferta (póliza) del oferente, El Fondo se encuentra realizando los ajustes al proceso para realizar nueva licitación en el mes de agosto de 2021.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Agosto	La terminación de la Casa del Adulto Mayor se realizó el pasado 31 de julio con la respectiva acta donde se encuentran algunas observaciones que actualmente el contratista se encuentra atendiendo, con el fin, de suscribir la respectiva acta de recibo a satisfacción.
	Septiembre	El proyecto presenta un avance acumulado de 78%, representado en la ejecución de actividades como: instalación barandas perímetro coliseo y nivel 2, Encofrado y vaciado concreto muros antepecho rampa, Encofrado y vaciado muro antepecho escalera de acceso, Muro de contención parque infantil, MC1-B y Tipo A e Instalaciones eléctricas para el alumbrado del escenario, entre otras. Actualmente, se encuentra en proceso una modificación de prórroga con fecha de terminación estimada al 16 de noviembre de 2021.

Bitácora de Seguimiento

(AEA22)_Proyectos de Infraestructura de Equipamientos entregados	Enero	Al 31 de enero de 2021, el avance en la etapa de construcción de los equipamientos Casa de la Cultura y Casa del Campesino se repartieron de la siguiente manera: para la Casa de la Cultura se registró un avance acumulado de 15,10%, esto se ve reflejado en actividades principales como la construcción del tanque red contra incendios, la cimentación de salones y la excavación mecánica en la zona de parqueaderos. Con respecto a la Casa del Campesino se registro un avance acumulado de 25,13% concentrado en actividades como el vaciado de concreto en las vigas aéreas y
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		construcción placa maciza del volumen 2 y cimentación de bodegas en el volumen 3.
Febrero		Durante el mes de febrero, la Casa de la Cultura reportó un avance acumulado de 19,46%, este avance corresponde principalmente a actividades de la etapa de construcción como el avance de la rampa de acceso a la biblioteca y el montaje de vigas cimentación para los salones. Con respecto a la Casa del Campesino se reportó un avance acumulado de 32,68% reflejado en actividades como la instalación de las redes sanitarias en las habitaciones y el vaciado de concreto en los muros de contención de la edificación.
Marzo		Al cerrar el mes de marzo la construcción de la Casa de la Cultura registró un avance acumulado de 24,89%, este avance correspondió principalmente al avance en la colocación de aceros de refuerzo para estructura en biblioteca, salones, placas de contrapiso y el vaciado de concreto para columnas sobre placa. Con respecto a la Casa del Campesino se registró un avance acumulado de 43,55% centrado en los avances en la colocación de acero de refuerzo para vigas volumen 2, placa tanque, vaciado de concreto para vigas aéreas volumen 2, tapa tanque, vaciado concreto para zarpa muto T6.
Abril		Al cerrar el mes de abril la construcción de la Casa de la Cultura registró un avance acumulado de 33,47%, este avance correspondió principalmente al avance en la instalación de la malla electrosoldada, vaciado de concreto columnas de Biblioteca, vaciado de concreto vigas aéreas placa de Museo y las instalaciones eléctricas de la placa cubierta de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Museo. Con respecto a la Casa del Campesino se registró un avance acumulado de 55,26% principalmente evidenciado en los avances en los muros en bloque # 5 fachada culatas del volumen 2, instalación cerchas de madera cubierta del volumen 2, pañetes de fachada posterior del volumen 1 y pañetes internos del volumen 2, construcción de cajas de inspección sanitarias y recolección de aguas lluvias volumen 1.</p>
Mayo	<p>La construcción de la Casa del Campesino presenta un avance acumulado de 62.24%, este avance corresponde principalmente a actividades como el vaciado de concreto columnetas y vigas cinta eje 6 volumen 2 y locales del volumen 3, rellenos con material seleccionado producto de excavación entre volumen 2 y volumen 3 y la demolición de andén existente acceso vehicular volumen 2 y volumen 3, entre otros. Con respecto a la construcción de la Casa de la Cultura presenta un avance acumulado de 36,12%, este avance corresponde principalmente a actividades como la instalación de malla electrosoldada placa cubierta de Salones, vaciado de concreto placa aligerada cubierta de Salones y el armado de la estructura falsa de la placa de mezanine.</p>
Junio	<p>La construcción de la Casa del Adulto Mayor presenta un avance acumulado de 79.18%, este avance corresponde principalmente a actividades como la terminación de acabados y remates, avances en mesones lavamanos zona administrativa, corte, ensamble e instalación de puertas y ventanas de aluminio, barandas y pasamanos salón social, acabado mesón lavamanos múltiples (granito); instalación</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		muebles (closets) y puertas zona habitacional y administrativa. Con respecto a la construcción del Escenario Deportivo presenta un avance de 61,15%, este avance corresponde principalmente actividades como el vaciado placa rampa acceso a coliseo, carpintería metálica de Arcos, avance mampostería a la vista, modulo norte y anclaje superior.
	Julio	El avance acumulado ejecutado de la Casa del Adulto Mayor a julio de 2021 llego a 95,37%, este avance corresponde principalmente al desarrollo de las siguientes actividades: terminación de acabados y remates generales, avance ensamble e instalación de puerta principal CAM, corte, ensamble, instalación y pintura de barandas acceso a rampa y zona social, avance instalación extractor y rejillas de ventilación de gas, instalaciones de divisiones acero inoxidable baños zona administrativa.
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	El pasado 29 de septiembre la administración municipal de Gramalote firmó el acta de entrega de bienes y servicios del equipamiento Casa del Adulto Mayor.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no
--	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA23)_Viviendas municipio gramalote, terminadas		terminación a satisfacción dentro del plazo de vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de enero de 2021, se reanudo la audiencia virtual donde la Secretaria General del Fondo Adaptación convoco al contratista, su apoderado, la compañía de seguros garante, la interventoría y al macroproyecto Gramalote, en esta audiencia se decretaron las pruebas solicitadas por el contratista, y se determina como fecha de reanudación de la audiencia el próximo 4 de febrero de 2021.
	Febrero	El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no terminación a satisfacción dentro del plazo de vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de febrero de 2021, dicho incumplimiento se encuentra en la etapa aprobatoria y a la espera de la programación de otra audiencia.
	Marzo	Se continuaron con las mesas de trabajo técnicas y jurídicas con la participación de la contraloría, interventoría, contratista y el Fondo Adaptación con el fin de buscar alternativas que permitieran la terminación de las 128 viviendas que quedaron pendientes a la finalización del plazo de ejecución, el pasado 25 de marzo se dio finalización a estas mesas sin llegar a un acuerdo con el contratista pese a las alternativas presentadas por el FA, paralelo a esto se ha venido trabajando en la estructuración del nuevo contrato de obra y

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	nueva interventoría.
Abril	Al no lograr una negociación con el contratista se dio continuidad al proceso de la nueva contratación con la modalidad licitación pública la cual inicio con el memorando I-2021-001977 de fecha 13 de abril de 2021, solicitando dar inicio y radicando los documentos para ello, estudios previos, estudio de mercado, estudio de sector, anexos y formatos. El proceso se radico en secop II el 14 de abril LP-S-P-005-2021 para la contratación de la construcción y entrega de las 128 viviendas faltantes en el municipio de Gramalote. Por su parte simultáneamente a este proceso el 15 de abril se dio inicio a la demanda de reconvención.
Mayo	El pasado 24 de mayo se publicó el aviso de convocatoria pública, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones del proceso, se espera que de acuerdo con los tiempos definidos el próximo 8 de junio se tengan las respectivas observaciones y se continúe con el proceso.
Junio	Durante el mes de junio se desarrollo: 1. 08 de junio de 2021 el plazo para observaciones al proyecto de Pliego. 2. El 11 de junio de 2021 Se realizo la apertura formal - publicación pliego definitivo y 3. del 22 al 25 de junio se realizó el acompañamiento a los posibles proponente en campo, para conocer la obra.
Julio	El nuevo proceso para la contratación de las 128 viviendas restantes en el municipio de Gramalote, el cual se cerró el pasado 30 de junio, resultado desierto por errores en la presentación de la oferta (póliza) del oferente, El Fondo se encuentra realizando los ajustes al

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		proceso para realizar nueva licitación en el mes de agosto de 2021.
	Agosto	Dado que la causa por la cual se dio el rechazo de la oferta, correspondió a la no presentación de la póliza de seriedad de oferta, el Fondo en el mes de agosto adelanto reuniones con los asesores de seguros del país y FASECOLDA para conocer las inquietudes que pudiesen tener ante un nuevo proceso de contratación y poder contar con su participación a los posibles oferentes del mismo. Lo anterior con el fin incluir estos aspectos en los nuevos estudios previos
	Septiembre	El 30 de septiembre se llevó a cabo el comité de contratación para iniciar el proceso de contratación de la construcción y terminación de las 128 viviendas faltantes del municipio de Gramalote. La respectiva publicación de este proceso se realizará en octubre de 2021.

Bitácora de Seguimiento

(AEA24)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	Enero	El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no terminación a satisfacción dentro del plazo de vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de enero de 2021, se reanudo la audiencia virtual donde la Secretaria General del Fondo Adaptación convoco al contratista, su apoderado, la
---	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


		compañía de seguros garante, la interventoría y al macroproyecto Gramalote, en esta audiencia se decretaron las pruebas solicitadas por el contratista, y se determina como fecha de reanudación de la audiencia el próximo 4 de febrero de 2021.
	Febrero	El contrato 2015-C-0165 de construcción de soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote finalizó el pasado 27 de octubre de 2020, de acuerdo con esta finalización la subgerencia de riesgo radicó el incumplimiento parcial pero definitivo del contrato, por la no terminación a satisfacción dentro del plazo de vigencia del contrato de las viviendas en el municipio. Durante el mes de febrero de 2021, dicho incumplimiento se encuentra en la etapa aprobatoria y a la espera de la programación de otra audiencia.
	Marzo	Se continuaron con las mesas de trabajo técnicas y jurídicas con la participación de la contraloría, interventoría, contratista y el Fondo Adaptación con el fin de buscar alternativas que permitieran la terminación de las 128 viviendas que quedaron pendientes a la finalización del plazo de ejecución, el pasado 25 de marzo se dio finalización a estas mesas sin llegar a un acuerdo con el contratista pese a las alternativas presentadas por el FA, paralelo a esto se ha venido trabajando en la estructuración del nuevo contrato de obra y nueva interventoría.
	Abril	Al no lograr una negociación con el contratista se dio continuidad al proceso de la nueva contratación con la modalidad licitación pública la cual inicio con el memorando I-2021-001977 de fecha 13 de abril de 2021, solicitando dar

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>inicio y radicando los documentos para ello, estudios previos, estudio de mercado, estudio de sector, anexos y formatos. El proceso se radico en secop II el 14 de abril LP-S-P-005-2021 para la contratación de la construcción y entrega de las 128 viviendas faltantes en el municipio de Gramalote. Por su parte simultáneamente a este proceso el 15 de abril se dio inicio a la demanda de reconvención.</p>
Mayo	<p>El pasado 24 de mayo se publicó el aviso de convocatoria pública, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones del proceso, se espera que de acuerdo con los tiempos definidos el próximo 8 de junio se tengan las respectivas observaciones y se continúe con el proceso.</p>
Junio	<p>Durante el mes de junio se desarrollo: 1. 08 de junio de 2021 el plazo para observaciones al proyecto de Pliego. 2. El 11 de junio de 2021 Se realizo la apertura formal - publicación pliego definitivo y 3. del 22 al 25 de junio se realizó el acompañamiento a los posibles proponente en campo, para conocer la obra.</p>
Julio	<p>Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de julio se entregaron 7 viviendas a los beneficiarios, estas viviendas pertenecen al grupo de 22 soluciones que se encontraban en el contrato 165 de 2015 que se encuentra actualmente en proceso jurídico y que quedaron terminadas pero sin entregar.</p>
Agosto	<p>Dado que la causa por la cual se dio el rechazo de la oferta, correspondió a la no presentación de la póliza de seriedad de oferta, el Fondo en el mes de agosto adelanto reuniones con los asesores de seguros del país y FASECOLDA</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		para conocer las inquietudes que pudiesen tener ante un nuevo proceso de contratación y poder contar con su participación a los posibles oferentes del mismo. Lo anterior con el fin incluir estos aspectos en los nuevos estudios previos.
	Septiembre	El 30 de septiembre se llevó a cabo el comité de contratación para iniciar el proceso de contratación de la construcción y terminación de las 128 viviendas faltantes del municipio de Gramalote. La respectiva publicación de este proceso se realizará en octubre de 2021.

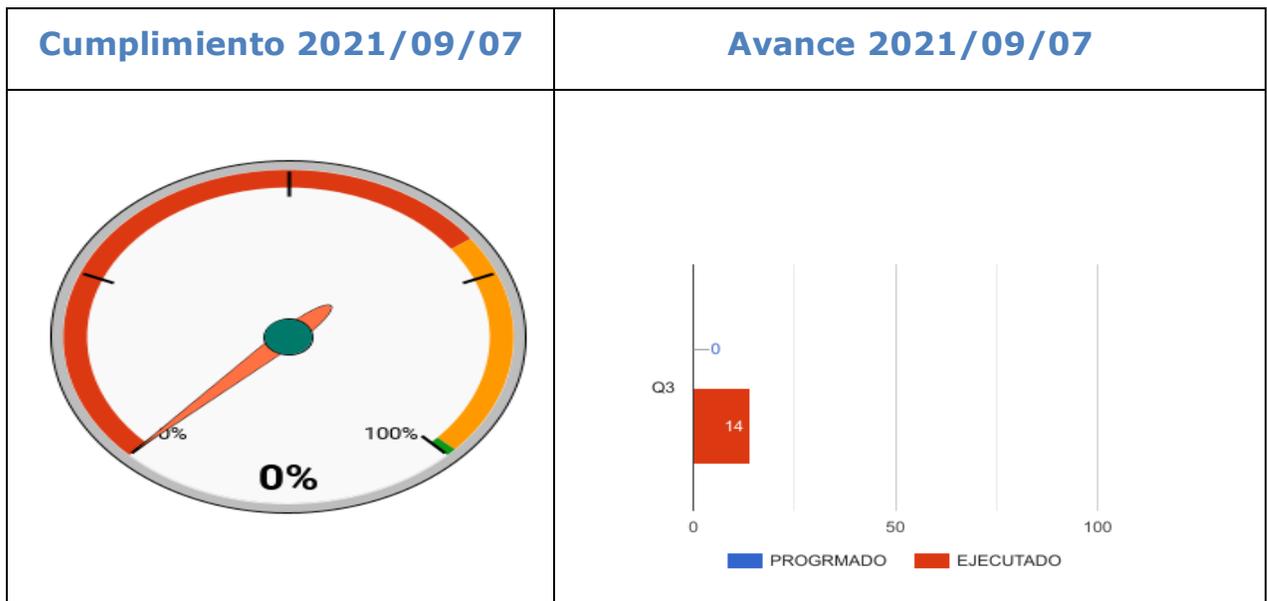

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS** Portafolio/Programa/Proyecto: **MEDIO AMBIENTE**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA25_Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	(AEA25)_POMCAS, entregados	#	1	0	0	1	0	1
AEA26_Terminar integración tecnológica	(AEA26)_Integración Tecnológica, terminada	#	1	0	0	0	1	0

Bitácora de Seguimiento

Enero	Respecto al POMCA en ejecución "Actualización POMCA Río Cali", el Convenio 016 de 2014 con la CVC, se encuentra suspendido del 29/12/2020 al 11/02/2021, entre tanto se
-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA25)_POMCAS, entregados		logra acuerdo con la interventoría Consorcio POMCAS para su mayor permanencia y entre tanto la Corporación realiza los trámites para el aporte de los recursos.
	Febrero	Respecto al POMCA en ejecución "Actualización POMCA Río Cali", el Convenio 016 de 2014 con la CVC, estuvo suspendido desde el 29/12/2020 al 14/02/2021, por la gestión necesaria para acordar el valor de la mayor permanencia de la interventoría. Una vez se logró concertar los tiempos y costos de la mayor permanencia de interventoría, el convenio reinició el 15/02/2021 y se prorrogó hasta el 30/09/2021. Así mismo, en dicha fecha reinició el contrato de consultoría, a fin de mes el contratista entregó para revisión la fase de Prospectiva y Zonificación, avanzando así en la ejecución del POMCA del río Cali.
	Marzo	Respecto al POMCA en ejecución "Actualización POMCA Río Cali", en el mes de marzo de 2021 se logró la aprobación de la fase de Prospectiva y Zonificación tanto por parte de la interventoría como por parte de la Corporación, y se avanza en el ajuste correspondiente a los productos de la Fase de Formulación.
	Abril	El POMCA del Río Cali continúa en ejecución, durante el mes de abril de 2021, se avanzó en el proceso de revisión y ajuste de los documentos de la Fase de Formulación del POMCA, al finalizar el mes el contratista hizo entrega de una nueva versión del documento, el cual se encuentra en revisión de la interventoría.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Mayo	<p>Respecto al POMCA del Río Cali, continúa la revisión y ajuste de los documentos de la Fase de Formulación del POMCA Río Cali.</p> <p>Conforme informó la interventoría al Fondo en reunión de seguimiento, continúa presentando falta de calidad en la entrega de los productos del POMCA, en particular los asociados a la fase de Formulación, por lo cual el Fondo convocó, el 6 de mayo de 2021, a reunión de seguimiento del Convenio 016 de 2014 el 6 de mayo de 2021.</p> <p>La reunión contó con participación de Procuraduría General de la Nación, CVC, la interventoría, el contratista y el Fondo Adaptación de presentar informe de incumplimiento, se requirió el compromiso del Contratista, se reiteró a la interventoría la petición del Fondo; de presentar informe por presunto incumplimiento a la Corporación. Se identificó posible imposibilidad de finalizar los productos del POMCA en los tiempos acordados en el cronograma. Se solicita revisar alternativas.</p> <p>El 8 de mayo de 2021, la interventoría presentó informe de posible incumplimiento al contrato 261 del 24 de abril de 2015. El Fondo solicitó a la interventoría mediante oficio E-2021-004081, tomar medidas frente a terminación del contrato 292 de 2014, sin haber aprobado del POMCA del río Cali.</p>
	Junio	<p>Respecto al POMCA del Río Cali, continúa la revisión y ajuste de los documentos de la Fase de Formulación.</p> <p>Teniendo en cuenta que el 17 de junio de 2021</p>

finalizaba la vigencia del Contrato 292 de 2014 mediante el cual se realizan las acciones de interventoría al Contrato 0261 de 2015 que tiene como objeto realizar la actualización del POMCA del Río Cali, y dado que la interventoría señaló que considera inviable obtener la aprobación del POMCA en los tiempos previstos, se convocó a reunión de seguimiento del convenio 016 de 2014, el 4 de junio de 2021, con la participación del Ing. Aníbal Pérez – Subgerente de Gestión del Riesgo.

En la anterior reunión se analizó la propuesta de la interventoría de suspender el contrato 292 de 2014, con el fin de optimizar los tiempos de interventoría, no obstante, la Corporación señaló que requiere que la interventoría se encuentre activa para su participación en la audiencia de posible incumplimiento a la que se citará al contratista. El Fondo Adicionalmente señaló la necesidad de buscar alternativas para lograr el cumplimiento del objeto del convenio.

El Fondo Adaptación mediante los oficios E-2021-004347 del 08/09/2021, E-2021-004470 del 15/06/2021 reiteró alerta a la Corporación por la finalización del contrato de interventoría y la necesidad de tomar acciones para el garantizar el cumplimiento del objetivo del convenio.

Por solicitud del consultor el contrato 0261 de 2015 fue suspendido el 11 de junio de 2021, por el término de un mes, con lo cual simultáneamente se suspendió el contrato de interventoría y el Convenio 016 de 2014 se suspendió el 21 de junio de 2021 atendiendo a la solicitud de la

	CVC. Por lo anterior durante el mes de junio, no hubo avances.
Julio	A petición del contratista, la CVC amplió la suspensión del Contrato 0261 de 2015 que tiene como objeto realizar la actualización del POMCA del Río Cali, previo visto bueno por parte de la interventoría. Simultáneamente el Contrato 292 de 2014 que realiza la interventoría del contrato fue suspendido en el mismo plazo. La suspensión del convenio 016 de 2014 entre la CVC y el Fondo Adaptación se amplió hasta el 10 de agosto de 2021. Por lo anterior en el mes de julio no hubo avances en el desarrollo del POMCA.
Agosto	La última fase del POMCA, correspondiente a la Formulación, fue aprobada por la interventoría Consorcio POMCA el mes de agosto de 2021.
Septiembre	<p>La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC mediante comunicación 0520-878872021 del 23/09/2021, manifiesta que "... después de surtida la revisión y aprobación de lo que corresponde a CVC, posterior a la aprobación de la interventoría, y realizando los ajustes respectivos por parte del consultor, la Corporación informa que el documento (...) cumple con los requisitos mínimos de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, y los alcances técnicos correspondientes."</p> <p>De acuerdo con lo anteriormente manifestado, con la aprobación de la fase de formulación del POMCA del Río Cali, última fase de los productos técnicos de los POMCA se cuenta con</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		todos los productos técnicos del POMCA aprobados, con ello se da cumplimiento a la meta del tercer trimestre de 2021.
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEA26)_Integración Tecnológica, terminada	Enero	Mediante oficio E-2021-000394 del 26 de enero de 2021, se convoca a una mesa de trabajo a la directora del Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales – IDEAM, con el fin de tratar los temas de Cronograma, contrataciones y demás, para asegurar que se cumplan con los tiempos definidos para el cumplimiento y terminación del proyecto “Herramienta WEB” y dar cumplimiento al Plan de Acción definido por el Sector.
	Febrero	El 4 de febrero se realizó reunión virtual convocada por el gerente del Fondo, con el acompañamiento del IDEAM para realizar seguimiento al avance en la contratación asociada a la Herramienta de información. Con el fin de avanzar en el proyecto de la herramienta mediante oficio E-2021-001448 de 25 de febrero de 2021 se puso a disposición del IDEAM la información cartográfica de 35 POMCA, cargada en Dropbox. En el mes de febrero de 2021 el IDEAM realizó la contratación de 3 profesionales para la prestación de servicios con el objeto de “Prestar los servicios profesionales para apoyar al IDEAM en la definición, planificación,

		<p>estructuración, seguimiento y verificación del proyecto de herramienta web para la disponibilidad y visualización en tiempo real de datos y productos de índole ambiental, en el marco del convenio 04 de 2012 entre el Fondo Adaptación e IDEAM, que permita la contratación de productos y servicios necesarios para su puesta en funcionamiento”, “Prestar los servicios profesionales para apoyar al IDEAM en la elaboración de fichas técnicas de requerimientos y apoyo en la realización de estudio de mercado con el propósito de adelantar un proceso cuyo objeto es la contratación del diseño y puesta en producción de una herramienta web, como parte del fortalecimiento del sistema nacional para la prevención y atención de desastres y del sistema de información” y finalmente “Prestar los servicios profesionales para la consolidación e impulso jurídico de los procesos de selección necesarios que se deriven del proyecto de herramienta web como parte del fortalecimiento del sistema nacional para la prevención y atención de desastres y del sistema de información ambiental para Colombia –siac-, en el marco del convenio no. 004 de 2012”.</p>
	<p>Marzo</p>	<p>El 2 de marzo se realizó reunión virtual con el acompañamiento del IDEAM para realizar seguimiento al avance en la contratación asociada a la Herramienta de información. De otra parte, se remitió oficio E-2021-001861 de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


	<p>12 de marzo de 2021 al IDEAM en respuesta al radicado R-2021-003240 de fecha 05/03/2021, solicitando modificaciones en los contratos derivados No 100, 157, 166 y 180 de 2021. Así mismo, se suscribió el contrato de prestación de servicios 180 de 2021 con lo cual se concretó el equipo para dar inicio a las actividades de la definición de la contratación de la consultoría de la Herramienta WEB</p>
Abril	<p>El personal contratado por el IDEAM para la ejecución de la herramienta avanzó en la definición de los términos para la contratación de la herramienta. Están prestos a solicitar un estudio de mercado, para definir valores y avanzar en la contratación, lo anterior corresponde al avance informado por el IDEAM en reunión realizada el jueves 22 de abril de 2021; es de anotar que el IDEAM manifiesta que logrará terminar en el plazo establecido.</p> <p>De otra parte, el Fondo reviso el informe del IDEAM, conl radicado R-2021-003788 del 16/03/2021, con el cual el remitió el informe consolidado de las actividades ejecutadas en el marco de la Herramienta Web para los periodos de noviembre (Del 1 al 19) y diciembre de 2020; enero y febrero de 2021 y mediante remitió oficio de radicado E-2021-002866 de 16 de abril de 2021 se solicitan ajustes.</p>
Mayo	<p>El Fondo convocó a reunión el día 20 de mayo de 2021, con el fin de realizar seguimiento a los avances de la herramienta web enmarcada en el Convenio 004 de 2012. En ella el IDEAM informó que se encuentra en la etapa de recepción de respuestas relacionadas con el estudio de mercado realizado. No obstante,</p>

	<p>para el caso de la adquisición del Hardware el IDEAM señala que se encuentran consolidando y revisando los resultados de las respectivas cotizaciones, evidenciándose atraso en el estricto cronograma. Ante la anterior situación el Fondo solicitó al IDEAM dar diligencia y remontar el avance en el cronograma, recordando que la Herramienta web debe finalizarse antes del 30 de noviembre.</p> <p>El Fondo revisó el informe del IDEAM, con radicado R--2021-005655 del 23/04/2021, con el cual el remitió el informe consolidado de las actividades ejecutadas en el marco de la Herramienta Web para el periodo de marzo de 2021, el cual se encontraba acorde con lo requerido por la modificación No 8 del Convenio.</p>
Junio	<p>El Fondo convocó a reunión el día 16 de junio de 2021, con el fin de realizar seguimiento a los avances de la herramienta web enmarcada en el Convenio 004 de 2012. En ella el IDEAM informó que para la ejecución de las actividades concernientes con el desarrollo de la herramienta web se está realizando un convenio enmarcado en Ciencia y tecnología para el primer componente el cual está relacionado con el software y para el segundo componente "la compra de equipos" se propone la modalidad de la compra mediante la bolsa mercantil.</p> <p>Dentro de la bolsa mercantil se tiene la posibilidad de transferir en cuanto se genere la operación de la compra todos los recursos que se tienen destinados para el proyecto, para que posteriormente a través de las órdenes de pago</p>

		<p>que genere el Fondo o el IDEAM se le gire al proveedor</p> <p>Mediante oficio E-2021-004475 de 15 de junio de 2021 se da respuesta al radicado IDEAM 0211050000291 (radicado Fondo R-2021-007664 de 27 de mayo de 2021) mediante el cual se remiten los estudios previos para la contratación del componente de Fábrica de Software y HPC de la Herramienta Web. Con lo anterior el IDEAM procederá a suscribir el Convenio Especial de Cooperación con BIOS.</p>
	<p>Julio</p>	<p>En el mes de Julio de 2021, el IDEAM avanzó en el desarrollo de la herramienta web mediante la suscripción del I Convenio No 344 con el Centro De Bioinformatica Y Biologia Computacional de Colombia OBIOS O CBBCEI, que tiene por objeto "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, operativos, financieros y científicos para el desarrollo, investigación e implementación de una Herramienta WEB para el mejoramiento de los sistemas de información del IDEAM mediante la estrategia de fábrica de software y solución HPC, que permita llevar a cabo metodologías convencionales y ágiles, así como la atención de los servicios complementarios que se deriven del desarrollo de la Herramienta." Logrando en el mes algunos avances.</p> <p>Asi mismo, el IDEAM presentó al Fondo la metodología por medio de la cual efectuaría la adquisición de los equipos necesarios para la Herramienta Web, a través de Bolsa Mercantil. Presentaron al Fondo los respectivos estudios previos y el Fondo los avalón con algunos comentarios para su gestión.</p>

	<p>Agosto</p>	<p>En el mes de agosto de 2021, el IDEAM avanzó en el desarrollo de la herramienta web, mediante las gestiones del Convenio No 344 con el Centro De Bioinformatica y Biologia Computacional de Colombia BIOS O CBBC, mediante la transferencia de conocimiento, en de mesas de trabajo realizadas con las diferentes áreas del IDEAM, el equipo estructurador y el equipo BIOS. El equipo científico está realizando ajustes en el modelo de pronósticos para optimizar tiempos de respuesta y resoluciones.</p> <p>El IDEAM radicó la documentación requerida en la Bolsa Mercantil, para la adquisición de los equipos necesarios para la Herramienta Web, con lo cual espera avanzar en esta importante etapa del proyecto.</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>En el mes de septiembre de 2021, el IDEAM avanzó en el desarrollo de la herramienta web, mediante las gestiones del Convenio No 344 con el Centro de Bioinformatica y Biologia Computacional de Colombia BIOS O CBBC, finalizando algunas pruebas para la optimización de los modelos, BIOS presenta atrasos en la ejecución, por lo cual el IDEAM solicitó paralelizar actividades y brindar mayor apoyo de personal por parte de BIOS.</p> <p>El 13 de septiembre de 2021 se suscribe el contrato de Comisión No 435 de 2014 celebrado entre el IDEAM y Comfinagro S.A, para la compra de equipos requeridos para el desarrollo de la herramienta web, con lo cual se avanza en este proceso.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

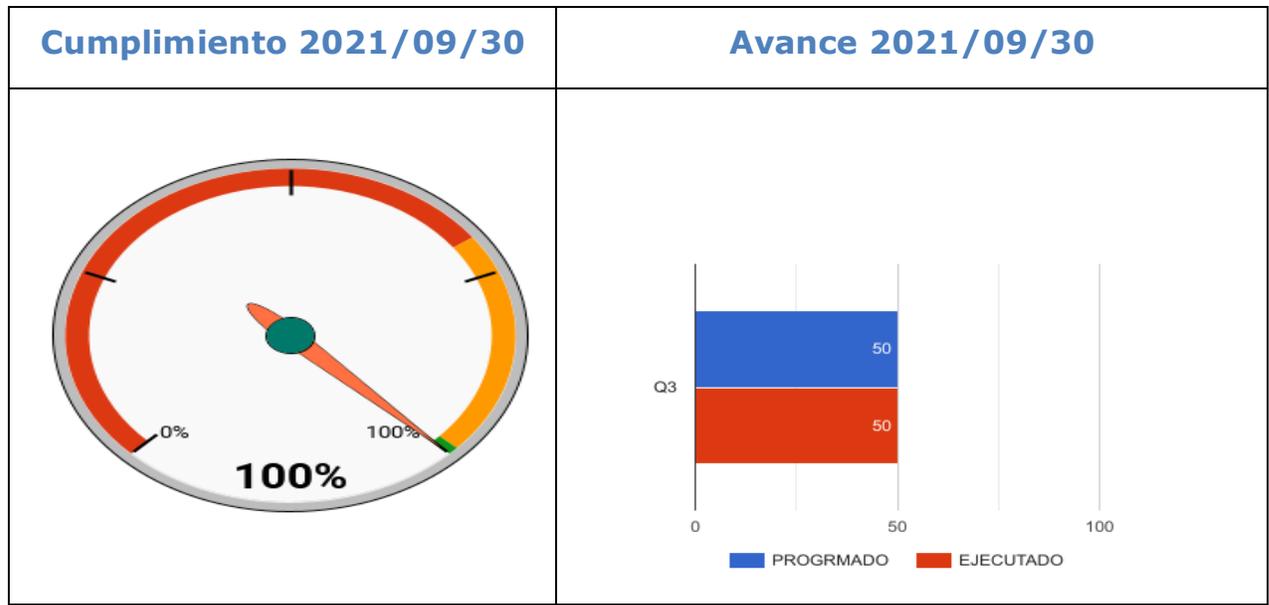

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS Portafolio/Programa/Proyecto: REACTIVACIÓN ECONÓMICA



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA27_Contratar asociación Productiva-Proyecto Yatí	(AEA27)_Asociación Productiva-Proyecto Yatí, contratada	# 1	1	0	0	1	0	0
AEA28_Terminar Proyectos Reactivar	(AEA28)_Proyectos Reactivar, terminados	# 1	3	1	0	1	1	3
AEA29_Entregar Proyectos Reactivar	(AEA29)_Proyectos Reactivar, entregados	# 1	2	0	0	1	1	1
AEA30_Entregar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA30)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos	# 1	1	1	0	0	0	1

o mixtos,
entregados

Bitácora de Seguimiento

(AEA27)_ Asociación Productiva-Proyecto Yatí, contratada	Enero	Proyecto en estructuración y avance por parte del E.T. de Reactivación Económica.
	Febrero	A la fecha se cuenta con avance en estructuración técnica, estudio previo radicado a secretaria General, estudio de mercado y mesas de trabajo para validar los avances presentados. El día 25 de Febrero se presentó propuesta de pagos acorde a revisión de procesos de ley 80 llevados a cabo por otras entidades y se enviaron documentos a profesionales del equipo de contratación del Fondo y oficina Financiera para revisión y visto bueno de las mismas.
	Marzo	Avance descriptivo del proceso Yatí. A la fecha se cuenta con avance en estructuración técnica con documentos como: estudio previo, estudio de mercado, matriz de riesgos, anexo de productos. Lo anterior se radicó a secretaría general el 30 de Marzo para revisión bajo el memorando I-2021-001698. Este proceso se acompañó de manera permanente por medio de mesas de trabajo por profesionales de las áreas de planeación y financiera del Fondo. Sobre el anterior proceso, también se cuenta con la presentación del documento para revisión del Departamento Nacional de Planeación, su versión final se remitió el 26 de Febrero.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Abril	A la fecha se cuenta con avance en estructuración técnica con documentos como: estudio previo, estudio de mercado, matriz de riesgos, anexo de productos. Lo anterior se radicó a Secretaría General el 30 de Marzo 2021 para revisión bajo el memorando I-2021-001698. Sobre lo anterior, la Secretaría General envió comentarios el día 28 de Abril de 2021. Actualmente se está reestructurando el proceso acorde a los comentarios emitidos por Dirección Nacional de Planeación, principalmente con los costos del proyecto. El Equipo de Trabajo del Sector de Reactivación Económica está adelantando un nuevo estudio de mercado.
	Mayo	Yati: Actualmente se está reestructurando el proceso acorde a los comentarios emitidos por la Dirección Nacional de Planeación-DNP- principalmente con lo referente a los costos del proyecto. El Equipo de Trabajo del Sector de Reactivación Económica adelantó un nuevo estudio de mercado donde analizó diferentes procesos de entidades estatales con el objetivo de tener una tendencia similar en la financiación de los beneficiarios del proyecto en Yati.
	Junio	Avance descriptivo del proceso Yati: A la fecha se cuenta con avance en estructuración técnica con documentos como: estudio previo, estudio de mercado, matriz de riesgos, anexo de productos. Lo anterior se radicó a Secretaría General el 30 de marzo 2021 para revisión bajo el memorando I-2021-001698. Sobre lo anterior, la Secretaría General envió comentarios el día 28 de abril de 2021. Actualmente se cuenta con el documento de

		<p>postulación reestructurado acorde a los comentarios emitidos por Departamento Nacional de Planeación el cual fue remitido a la oficina de planeación del Fondo junto con presentación actualizada y línea de tiempo del proceso.</p> <p>Además, el Equipo de Trabajo del Sector de Reactivación Económica adelantó un nuevo estudio de mercado, actualizó el estudio previo y anexo de productos acorde a las recomendaciones y ajustes realizados al documento de postulación presentado a DNP. Es importante resaltar que desde el Sector se han realizado todas las gestiones y acciones necesarias para avanzar en el proceso, pero depende de externalidades como la aprobación por parte del DNP para llevar a buen término la contratación final del operador y el inicio en la ejecución del proyecto.</p>
	Julio	<p>Proyecto Yati: Se recibieron 12 observaciones al documento por parte del DNP el 13 de Julio. Sobre esto, El 16 de Julio por parte de DNP, solicitaron nuevos ajustes los cuales fueron gestionados por parte del sector de reactivación y planeación del FONDO, principalmente sobre la caracterización e identificación de líneas productivas de los beneficiarios. El documento ajustado fue remitido el día 19 de Julio. Sobre lo anterior, el DNP realizó revisión y se tiene prevista reunión para concretar el documento final y socializar los ajustes. La comunicación se realiza directamente entre la oficina de planeación y DNP.</p>
	Agosto	<p>Teniendo en cuenta la comunicación de la</p>

Dirección Nacional de Planeación, se realiza el seguimiento directamente desde la oficina de planeación del FONDO. A la fecha se está a la espera por parte del equipo de Planeación, los comentarios realizados al documento por parte de la DNP.

El proyecto se encuentra en un 97% de ejecución. Quedan únicamente por culminar 200 visitas de seguimiento a los insumos que se terminaron de entregar a los 700 beneficiarios el pasado 27 de agosto, también faltan dos capacitaciones en gestión de riesgos a 12 beneficiarios del proyecto. Así las cosas, en el mes de agosto se completaron las capacitaciones a los 700 beneficiarios en :

- Promoción la importancia de la vinculación a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región
- Promoción del liderazgo y el trabajo en equipo
- Monitoreo de ataque de insectos plaga
- Buenas prácticas agrícolas
- Aplicación de insumos
- Demostración de método en buenas prácticas de manufactura
- Demostración de método en elaboración de huertas caseras
- Normatividad comercial, costos de la actividad panelera, logística comercial, empaque y embalajes
- Manejo de empaques de agroinsumos, envases de lubricantes y empaques desechados de panela.

Además, el 30 de agosto se hizo la rueda de negocios y se cerró oficialmente el proyecto mediante un evento en las instalaciones de Comfacauca, Popayán.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Septiembre	Mediante radicado Nro. 20214320006706 El Departamento Nacional de Planeación aprobó el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXION VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS por un monto de 18 mil millones de pesos por doce meses. El Fondo Adaptación dio inicio a las reuniones con el propósito de conocer la base de datos de beneficiarios así como la forma de ingresar al territorio.
--	------------	---

Bitácora de Seguimiento

(AEA28)_Proyectos Reactivar, terminados	Enero	<p>El cronograma de gerencia del proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 25/01/2021. El sistema reporta un avance planeado del 56,21% Vs. un avance real del 59,68% con una desviación positiva del 3%.</p> <p>El cronograma de Inversión del proyecto presenta un atraso con una fecha de corte del 25/01/2021. El sistema reporta un avance planeado del 60% Vs. un avance real del 56,46% con una desviación negativa del 4%. Se están realizando las acciones correspondientes para poner al día las tareas atrasadas.</p>
	Febrero	En su sexto mes de ejecución ya lleva consolidado un trabajo de desarrollo económico y rural en los municipios de Caldono, Cajibío, Popayán y El Tambo, donde se han apoyado a

700 productores en los componentes técnicos, social, comercial, ambiental y de gestión de riesgo. Se viene trabajando con 18 organizaciones de primer nivel productoras y comercializadoras de Panela, conformadas por pequeños productores propietarios de no más de una hectárea de caña, con unidades productivas básicas de transformación de panela, donde se genera en cada molienda unos 4 empleos directos, con mano de obra familiar y de la misma región. Donde la comercialización la realizan a través del aliado comercial identificado en el proyecto y que juega un papel importante porque garantiza los procesos venta y enganche a nuevos mercados, claro está que esto va ligado a que la producción de panela de estos grupos proveedores de panela deben estar desarrollando procesos de mejoramiento tecnológico. Este mejoramiento tecnológico de producción y competitividad se está logrando con la validación técnica, ambiental y de gestión del riesgo para lograr proyectos grupales y familiares que sean sostenibles en el tiempo. A la fecha se ha apoyado con talleres, Escuelas de Campo, demostraciones de métodos y visitas de asistencia técnica a cada uno de los productores, se han identificado 25 unidades productivas que aglutinan en labores de procesos a más de 300 productores que no cuentan con estos espacios de producción de panela, se han instalado 5 Sistemas de Manejo de Aguas Mielles, que benefician los procesos de buenas prácticas de manufactura y reduce la contaminación de las aguas y suelos. Se han entregado insumos a más de 400 productores para mejoramiento de sus cultivos, se han gestionado alianzas

		<p>institucionales con Alcaldías y entidades privadas. El proyecto se encuentra en condiciones normales según herramienta con una fecha de corte del 25/02/2021 de acuerdo con la lectura del sistema el cual reporta un avance planeado del 62,77% Vs. un avance real del 66,41%. presenta desviación positiva del 4%. Ruta crítica en condiciones normales sin desviaciones.</p>
	<p>Marzo</p>	<p>Estado avance reactivar agrícola: Durante el mes de marzo de 2021, en 4 municipios se realizaron 13 jornadas ECAS con asistencia de 309 beneficiarios, para un total de jornadas ECAS en los 11 municipios de 32 jornadas, con asistencia de 643 asistentes. Se iniciaron los eventos de Expo-asociaciones en los municipios de Miranda y El Tambo. El componente empresarial realizó 263 visitas para un consolidado de 3.408 visitas técnicas empresariales para el 85% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor, igualmente se realizó apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo. El componente ambiental y gestión del riesgo, se realizaron 309 visitas para un total de 3.757 visitas logrando así un 93% de cumplimiento de la meta al final del proyecto. Igualmente reporta 12 puntos ecológicos en las fincas de los beneficiarios para un total 891 puntos en total en las fincas de los beneficiarios, 35 camas biológicas en fincas de los beneficiarios para un total de 363 camas biológicas establecidas en las fincas de los beneficiarios. El componente de mercadeo reportó en el mes de marzo la realización de dos giras a los aliados comerciales, una a Caficauca comprador de café y otra Casa Luker</p>

comprador de cacao, por motivo de prevención de Covid 19, en cada una de las giras se movilizaron 10 beneficiarios, para un total de 20 agricultores asistentes. El componente técnico reporta la realización de 752 visitas técnicas, para un total de 12.547 visitas logrando un 89,6% de cumplimiento de la meta. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 12.547 visitas, empresarial 3.408 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.757 visitas) es de 19.712, cumpliéndose con el 98,5% de ejecución con respecto a la meta global de 20.000 visitas técnicas al final del proyecto.

Estado de avance PANELA:
El proyecto Reactivar Panela Cauca se encuentra en un 73% de su ejecución, con más de 450 toneladas de insumos entregados a los 700 beneficiarios del proyecto, representado en abono orgánico, compuesto y acondicionador de suelos, que mejoran notoriamente la producción de caña en la región. Igualmente se completó la instalación de los 25 Sistemas para el manejo de aguas dulces en igual número de unidades productivas, actividad que mejora las buenas prácticas de manufactura de la Panela y a la producción sostenible con la protección y mejora de las condiciones medio ambientales en los trapiches. Paralelo a la instalación se han entregado 25 equipos de Muselinas o zarandas para la limpieza y mejora en la calidad de los jugos, que repercute de manera directa en la calidad y presentación de la panela. Se continúa con los talleres y demostraciones de método en los componentes estratégicos que propende por la mejora de la calidad de vida de los 700 productores, sus familias y sus

		<p>organizaciones de base que acoge a una gran mayoría de beneficiarios.</p>
	<p>Abril</p>	<p>Durante el mes de marzo de 2021, en 4 municipios se realizaron 13 jornadas ECAS con asistencia de 309 beneficiarios, para un total de jornadas ECAS en los 11 municipios de 32 jornadas, con asistencia de 643 asistentes. Se iniciaron los eventos de Expoasociaciones en los municipios de Miranda y El Tambo. El componente empresarial realizó 263 visitas para un consolidado de 3.408 visitas técnicas empresariales para el 85% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor, igualmente se realizó apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo, se reportan además 4 nuevos beneficiarios empleando los libros contables para un total de 998 agricultores que realizan el registro de las actividades, costos e ingresos de la finca. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 12.547 visitas, empresarial 3.408 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.757 visitas) es de 19.712, cumpliéndose con el 98,5% de ejecución con respecto a la meta.</p> <p>Se concluyó la instalación de los Sistemas de Riego para el manejo de las aguas dulces SMAD en las 25 unidades productivas, además paralelo a ello se realizó la entrega de igual cantidad de Muselinas para las mismas unidades productivas.</p> <p>Con ello se concluye el ciclo de las entregas de insumos que se inició a finales de enero y se completó en febrero y la primera semana de marzo.</p>

	<p>También se ha avanzado en los talleres y terminando temas de capacitación, además de ir consolidando trabajo con los grupos y los beneficiarios para consolidar unos resultados que den fe del trabajo que se ha venido desarrollando en cada uno de los componentes.</p> <p>Se capacitan, EN LIDERAZGO, a 44 beneficiarios, para un acumulado de 700 productores. En motivación personal a 178, 450 en demostración de buenas practicas agrícolas, en total. Estandarización de procesos, control de calidad de la panela: 558.</p> <p>Para el corte se capacitaron 153 productores en 19 grupos para un total de 61 grupos que equivalen a 486 beneficiarios capacitados.</p> <p>Para el corte se realizaron 472 visitas para un acumulado de 2.527 visitas.</p>
<p>Mayo</p>	<p>Reactivar Agrícola: 4 reuniones con los equipos locales de seguimiento de los Municipios de Sucre, Florencia, Argelia y El Tambo en el marco de las entregas de insumos de los municipios de Argelia, Florencia, Sucre y El Tambo. En el mes de abril se llevaron a cabo los eventos de expo-asociaciones en el marco del fortalecimiento de los procesos asociativos, con la asistencia de 932 asistentes en los 11 municipios. Se realizaron 6 encuestas ICO en los siguientes municipios: BALBOA: Asociación ASPROHNAC, CALDONO: Asociación la Primavera y ASFODECAV, PATÍA: Asociación ASOBRIX y SUCRE: Asociación ASPROSUCRE. El componente empresarial realizo 215 visitas para un consolidado de 3.623 visitas técnicas empresariales para el 91% de cumplimiento de</p>

la meta de 4 visitas a cada productor. Apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo, se reportan además 2 nuevos beneficiarios empleando los libros contables para un total de 1.000 agricultores que realizan el registro de las actividades, costos e ingresos de la finca. 3 ruedas de negocios, en las líneas, limón Tahití, café, que sumadas a las 3 ruedas de negocios del mes pasado, se han llevado a cabo un total de 6 eventos. El componente técnico reporta 766 visitas técnicas, para un total de 13.303 visitas logrando un 95,1% de cumplimiento de la meta de 14.000 visitas al final del proyecto. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 13.303 visitas, empresarial 3.623 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.955 visitas) es de 20.881, cumpliéndose con el 104% de ejecución con respecto a la meta global de 20.000 visitas técnicas al final del proyecto. 386 beneficiarios recibieron insumos por 166 mil pesos.

Reactivar Panela: Panela. 513 visitas de seguimiento a productores a los cuales se les tomo el registro fotográfico, firma Formato 65 y el formato de memorando de visita técnica, para mejorar las prácticas de producción en sus cultivos de caña panelera. Se capacitaron 61 beneficiarios en Gestión del riesgo de desastres y Medidas para la reducción del riesgo en los municipios de Cajibío, El Tambo y Popayán. En Cajibío, se orientó este tema los días 13 y 25 de abril; el 13 de abril, en la vereda Monterredondo con 1 beneficiario y el 25 de abril, en la vereda Nuevo Horizonte con 9 productores para completar los 700 beneficiarios. Así mismo, en el municipio de El

		<p>Tambo, se capacitaron 13 beneficiarios el 14 de abril en la vereda Perolindes, el 21 de abril participaron 10 productores de la vereda Miraflores, 13 de la vereda Casas Viejas el 23 de abril y 3 beneficiarios de la vereda Loma de Paja el 27 de abril. Por otra parte, se visita la vereda Cerrillos en el municipio de Popayán el 17 de abril y se capacitan 12 beneficiarios en este tema. Y, para cumplir con la meta de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas, durante el mes de abril 101 productores fueron capacitados en Buenas prácticas Agrícolas. En capacitación en Diseño e instalación y manejo en sistemas de riego a un total de 186 beneficiarios.</p>
	<p>Junio</p>	<p>El componente social elaboró una cartilla diseñada con el fin de vincular también a niños y adolescentes a la labor comunitaria del cuidado y mantenimiento del vivero. Se realizaron 120 visitas para un consolidado de 3.743 visitas técnicas empresariales, que corresponde al 93,5% con respecto a la meta de 4.000 visitas al final del proyecto. Se logró realizar seguimiento a los emprendimientos escogidos como fueron: el vino de frutas de Fumfuturo de Buenos Aires y las trufas de café y chocolate de la asociación DEL CAFÉ de El Tambo. Se han realizado 19 visitas de asistencia técnica ambiental realizadas, con los temas de manejo de residuos sólidos y Manejo Integral de Agroquímicos y/o Biológicos, manejo integral de residuos orgánicos en la unidad productiva y manejo y conservación de suelos. Durante el mes de Junio se logró el 100% de visitas a los beneficiarios y se logró tener un vivero comunitario por municipio y se lograron 7 ruedas de negocios.</p>

		<p>Organizaciones Caracterizadas desde lo social y organizacional, 18, ICO inicial a organizaciones paneleras, 18, Taller de liderazgo y trabajo en equipo, 700, Taller de Motivación laboral y Resolución de conflictos, 473, Reuniones con los Equipos locales de seguimiento, 36, No de productores caracterizados y con línea base, 700, Capacitaciones en manejo y/o monitoreo de Diatraea, 700, Visitas de acompañamiento y seguimiento a productores paneleros, 3107, Capacitación en buenas prácticas agrícolas 548, Productores que implementan BPA en sus predios 235, Productores que implementan BPA en sus predios para procesos de certificación, 9, Capacitación en buenas prácticas de manufactura, 700, Productores que implementan BPM en sus predios, 70, Demostraciones en elaboración de huertas caseras 700. Productores que implementa acciones del proceso vinculadas al Conocimiento de normatividad ambiental y preparados orgánicos de las actividades de pre-limpieza y limpieza, 557, Beneficiarios capacitados en cambio climático y actividades de gestión del riesgo, 700, Capacitaciones en mejoramiento tecnológico de la producción panelera, 86, Productores que implementan BPA en sus predios para procesos que conllevan a la prevención del riesgo, 222, Capacitación en diseño y montaje de sistemas de riego, 494</p>
	<p>Julio</p>	<p>Reactivar Cauca Panela: En el mes de julio, de forma resumida se han realizado. Demostraciones de métodos en BPA. 666 de 700 como meta. Taller motivación laboral. 625 personas de 700. Taller tema resolución de</p>

		<p>conflictos. 634. Visitas de acompañamiento y seguimiento 3853. Visita de Centro de acopio.12. Taller de pre-limpieza y limpieza.691. 18 organizaciones caracterizadas. 36 reuniones con equipos locales de seguimiento. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas y Ambientales. 598. Capacitación en Diseño, instalación y manejo de sistemas de riego para cultivos.462. Principios básicos en atención de emergencias.611. las actividades: Taller de liderazgo en equipo, productores caracterizados y con línea base, Capacitaciones en manejo o monitoreo de Diatraea , Capacitación en manejo de Insumo, Capacitación en buenas prácticas de manufactura, Demostraciones en elaboración de huertas caseras, Capacitación en manejo de residuos sólidos, Beneficiarios capacitados en cambio climático y actividades de gestión del riesgo, Capacitados en Normatividad comercial y requisitos para la comercialización de la panela, Requisitos exigidos por el Aliado Comercial, Capacitación en buenas prácticas de manufactura, se encuentran culminadas.</p>
	<p>Agosto</p>	<p>Reactivar Cauca Agrícola: El proyecto se encuentra en un 97% de ejecución. Quedan únicamente por culminar 200 visitas de seguimiento a los insumos que se terminaron de entregar a los 700 beneficiarios el pasado 27 de agosto, también faltan dos capacitaciones en gestión de riesgos a 12 beneficiarios del proyecto. Así las cosas, en el mes de agosto se completaron las capacitaciones a los 700 beneficiarios en : - Promoción la importancia de la vinculación a alguna asociación legalmente constituida que</p>

opere en la región -Promoción del liderazgo y el trabajo en equipo -Monitoreo de ataque de insectos plaga -Buenas prácticas agrícolas - Aplicación de insumos -Demostración de método en buenas prácticas de manufactura - Demostración de método en elaboración de huertas caseras -Normatividad comercial, costos de la actividad panelera, logística comercial, -empaque y embalajes -Manejo de empaques de agroinsumos, envases de lubricantes y empaques desechados de panela. Además, el 30 de agosto se hizo la rueda de negocios y se cerró oficialmente el proyecto mediante un evento en las instalaciones de Comfacauca, Popayán.

Proyecto Reactivar Cauca Panela. El proyecto se encuentra en un 97% de ejecución. Quedan únicamente por culminar 200 visitas de seguimiento a los insumos que se terminaron de entregar a los 700 beneficiarios el pasado 27 de agosto, también faltan dos capacitaciones en gestión de riesgos a 12 beneficiarios del proyecto. Así las cosas, en el mes de agosto se completaron las capacitaciones a los 700 beneficiarios en : - Promoción la importancia de la vinculación a alguna asociación legalmente constituida que opere en la región -Promoción del liderazgo y el trabajo en equipo -Monitoreo de ataque de insectos plaga -Buenas prácticas agrícolas - Aplicación de insumos -Demostración de método en buenas prácticas de manufactura - Demostración de método en elaboración de huertas caseras -Normatividad comercial, costos de la actividad panelera, logística comercial, -empaque y embalajes -Manejo de empaques de agroinsumos, envases de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		lubricantes y empaques desechados de panela. Además, el 30 de agosto se hizo la rueda de negocios y se cerró oficialmente el proyecto mediante un evento en las instalaciones de Comfacauca, Popayán.
	Septiembre	El proyecto culminó actividades en campo, de acuerdo con el contrato, el 8 de septiembre de 2021. Se radicó factura por el sexto pago de gerencia mediante R- 2021- 013249 del 30 de septiembre. El consultor se encuentra organizando archivos.

Bitácora de Seguimiento

(AEA29)_Proyectos Reactivar, entregados	Enero	Se avanza en la preparación de la entrega del archivo físico que se estima para el mes de marzo, De igual forma se está elaborando por parte del contratista los informes finales y demás gestiones operativas y administrativas posteriores a la terminación del contrato. En gestión la liquidación del contrato fiduciario derivado.
	Febrero	El proyecto se encuentra finalizado, a la fecha se están adelantando actividades administrativas posteriores a la fecha de terminación (19 de Diciembre 2020). Actualmente y acorde a la programación de pagos y a los hitos contractuales están pendientes por radicar cuatro pagos. Sobre el proceso de liquidación, se solicita ampliar la fecha para el mes de Marzo teniendo en cuenta que se encuentra dentro del plazo establecido contractualmente de 8 meses.
	Marzo	Reactivar Magdalena: El proyecto se encuentra finalizado, a la fecha se están adelantando

actividades administrativas posteriores a la fecha de terminación (19 de Diciembre 2020). Sobre lo anterior se presentaron actas de terminación suscritas por los beneficiarios. En el mes de Marzo se radicaron los hitos de Gerencia N°7 y N°8 acorde al cronograma de pagos. Sobre el proceso de liquidación, se cuenta con avance en la elaboración del documento y gestión ante gestión documental para revisión de organización de archivo físico y digital.

Durante el mes de marzo de 2021, en 4 municipios se realizaron 13 jornadas ECAS con asistencia de 309 beneficiarios, para un total de jornadas ECAS en los 11 municipios de 32 jornadas, con asistencia de 643 asistentes. Se iniciaron los eventos de Expo-asociaciones en los municipios de Miranda y El Tambo. El componente empresarial realizó 263 visitas para un consolidado de 3.408 visitas técnicas empresariales para el 85% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor, igualmente se realizó apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo. El componente ambiental y gestión del riesgo, se realizaron 309 visitas para un total de 3.757 visitas logrando así un 93% de cumplimiento de la meta al final del proyecto. Igualmente reporta 12 puntos ecológicos en las fincas de los beneficiarios para un total 891 puntos en total en las fincas de los beneficiarios, 35 camas biológicas en fincas de los beneficiarios para un total de 363 camas biológicas establecidas en las fincas de los beneficiarios. El componente de mercadeo reportó en el mes de marzo la realización de dos giras a los aliados comerciales, una a Caficauca

		<p>comprador de café y otra Casa Luker comprador de cacao, por motivo de prevención de Covid 19, en cada una de las giras se movilizaron 10 beneficiarios, para un total de 20 agricultores asistentes. El componente técnico reporta la realización de 752 visitas técnicas, para un total de 12.547 visitas logrando un 89,6% de cumplimiento de la meta. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 12.547 visitas, empresarial 3.408 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.757 visitas) es de 19.712, cumpliéndose con el 98,5% de ejecución con respecto a la meta global de 20.000 visitas técnicas al final del proyecto.</p>
	<p>Abril</p>	<p>Magdalena Café: El proyecto se encuentra finalizado, a la fecha se están adelantando actividades administrativas posteriores a la fecha de terminación (19 de Diciembre 2020). En el mes de abril se radicó el hito de gerencia N°9 acorde al cronograma de pagos. De igual manera se cuenta con avance en elaboración del proyecto acta de liquidación y solicitud del estado de cuenta.</p> <p>Para el corte, en 4 municipios se realizaron 13 jornadas ECAS con asistencia de 309 beneficiarios, para un total de jornadas ECAS en los 11 municipios de 32 jornadas, con asistencia de 643 asistentes. Se iniciaron los eventos de Expoasociaciones en los municipios de Miranda y El Tambo. El componente empresarial realizó 263 visitas para un consolidado de 3.408 visitas técnicas empresariales para el 85% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor, igualmente se realizó apoyo al emprendimiento</p>

		<p>de dulces de chocolate con café de El Tambo, se reportan además 4 nuevos beneficiarios empleando los libros contables para un total de 998 agricultores que realizan el registro de las actividades, costos e ingresos de la finca. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 12.547 visitas, empresarial 3.408 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.757 visitas) es de 19.712, cumpliéndose con el 98,5% de ejecución con respecto a la meta.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Reactivar Magdalena Café: El 12 de Mayo se radicó acta de liquidación acorde al plan de liquidaciones del sector con el memorando I-2021-002568. Se encuentran adelantando gestiones de aclaración y subsanaciones enviadas el 26 de Mayo por parte de profesionales jurídicos de secretaría General. De igual manera, el contratista se encuentra gestionando soportes de terminación acorde a lo estipulado contractualmente para el pago del hito N°10.</p> <p>Reactivar Agrícola: 4 reuniones con los equipos locales de seguimiento de los Municipios de Sucre, Florencia, Argelia y El Tambo en el marco de las entregas de insumos de los municipios de Argelia, Florencia, Sucre y El Tambo. En el mes de abril se llevaron a cabo los eventos de expo-asociaciones en el marco del fortalecimiento de los procesos asociativos, con la asistencia de 932 asistentes en los 11 municipios. Se realizaron 6 encuestas ICO en los siguientes municipios: BALBOA: Asociación ASPROHNAC, CALDONO: Asociación la Primavera y ASFODECAV, PATÍA: Asociación ASOBRIX y SUCRE: Asociación ASPROSUCRE.</p>

		<p>El componente empresarial realizó 215 visitas para un consolidado de 3.623 visitas técnicas empresariales para el 91% de cumplimiento de la meta de 4 visitas a cada productor. Apoyo al emprendimiento de dulces de chocolate con café de El Tambo, se reportan además 2 nuevos beneficiarios empleando los libros contables para un total de 1.000 agricultores que realizan el registro de las actividades, costos e ingresos de la finca. 3 ruedas de negocios, en las líneas, limón Tahití, café, que sumadas a las 3 ruedas de negocios del mes pasado, se han llevado a cabo un total de 6 eventos. El componente técnico reporta 766 visitas técnicas, para un total de 13.303 visitas logrando un 95,1% de cumplimiento de la meta de 14.000 visitas al final del proyecto. El total de visitas técnicas consolidadas realizadas por los tres componentes (técnico 13.303 visitas, empresarial 3.623 visitas y ambiental y gestión del riesgo 3.955 visitas) es de 20.881, cumpliéndose con el 104% de ejecución con respecto a la meta global de 20.000 visitas técnicas al final del proyecto. 386 beneficiarios recibieron insumos por 166 mil pesos.</p>
	<p>Junio</p>	<p>Reactivar Magdalena: Actualmente el proyecto se encuentra en fase de liquidación, por lo cual se radicó en el mes de mayo ante secretaria General el proyecto de acta de liquidación bajo el memorando I-2021-002568. Sobre lo anterior, se cuenta con comentarios sobre el documento remitidos el día 29 de Junio por parte de la jurídica asignada al proceso, los cuales están siendo subsanados por parte del sector.</p> <p>El componente social elaboró una cartilla</p>

		<p>diseñada con el fin de vincular también a niños y adolescentes a la labor comunitaria del cuidado y mantenimiento del vivero. Se realizaron 120 visitas para un consolidado de 3.743 visitas técnicas empresariales, que corresponde al 93,5% con respecto a la meta de 4.000 visitas al final del proyecto. Se logró realizar seguimiento a los emprendimientos escogidos como fueron: el vino de frutas de Fumfuturo de Buenos Aires y las trufas de café y chocolate de la asociación DEL CAFÉ de El Tambo. Se han realizado 19 visitas de asistencia técnica ambiental realizadas, con los temas de manejo de residuos sólidos y Manejo Integral de Agroquímicos y/o Biológicos, manejo integral de residuos orgánicos en la unidad productiva y manejo y conservación de suelos. Durante el mes de Junio se logró el 100% de visitas a los beneficiarios y se logró tener un vivero comunitario por municipio y se lograron 7 ruedas de negocios.</p>
	<p>Julio</p>	<p>Reactivar Magdalena Café: 1- Se cuenta con visto bueno y aprobación por parte de la oficina de liquidaciones del FONDO. 2- Se cuenta con visto bueno y aprobación por parte de la oficina Financiera del FONDO 3- Está en tramite de firmas por parte del líder sectorial y Contratista.</p> <p>Reactivar Agrícola Cauca:</p> <p>Se radicó factura por el 9º pago de gerencia radicado: *R/2021/010253* soportado con el informe final con el 100 % de actividades en PSA. De forma resumida:</p>

	<p>Aplicación y análisis de los ICO a las organizaciones de base, 10 jornadas de seguimiento a las asociaciones de productores. Fueron realizados 32 eventos de Foro de cierre en los 11 municipios. 11 foros iniciales realizados en 11 municipios. 14.152 visitas realizadas desde el inicio de la fase 3 del proyecto. 1000 visitas técnicas reconocimiento y toma de muestras de suelo y reconfirmación de georreferenciación realizadas. 1000 resultados de análisis de suelos entregados por el operador. 1000 planes de fertilización. 278 hectáreas sembradas en línea productiva limón Tahití con los 40.680 árboles entregados a 344 beneficiarios (de Mercaderes, Patía, Balboa, Miranda, Bolívar y Buenos Aires). 4000 visitas técnicas empresariales. 5 acuerdos comerciales, uno por línea productiva, que se perfeccionaron desde la Pre-inversión del proyecto. 3.003 visitas de asistencia técnica ambiental. 25 jornadas de evaluación a la estrategia ambiental y mitigación del riesgo. 32 eventos dentro de los talleres ECAS realizados en los 11 municipios. 25 jornadas de seguimiento en la elaboración de informes ambientales y de gestión de riesgo.</p>
<p>Agosto</p>	<p>Café: Se cuenta con acta de liquidación suscrita por las partes con fecha del 05 de agosto, cumpliendo de esta manera con lo establecido contractualmente.</p> <p>Teniendo en cuenta la suscripción del acta de liquidación, se solicitó al contratista realizar las gestiones para radicación del hito N°10 de gerencia que se estableció contra liquidación.</p> <p>De acuerdo a esto, se radicó factura</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


		<p>correspondiente al hito N°10 del contrato bajo el memorando R-2021-010920 del 12 de agosto. Como resultado de lo anterior las gestiones para el contrato se encuentran al 100%.</p> <p>Reactivar Cauca Agrícola: El proyecto, en proceso de liquidación, durante el mes de agosto logró destrabar el acta de comité operativo y la remitió a la fiducia para lograr realizar el último giro y pago a proveedores. Se revisó el archivo y se dieron pautas sobre la organización de los documentos.</p>
	Septiembre	<p>Reactivar Cauca Agrícola: El proyecto, se encuentra en proceso de liquidación, durante el mes de Septiembre: Se radicó PROYECCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN ante Secretaría General mediante radicado: I-2021-005309 del 27 de septiembre de 2021 Se radicó ACTA DE CIERRE el 24 de septiembre de 2021 mediante R2021-013027 Se radicó ACTA DE CIERRE SOCIAL el 24 de septiembre de 2021 mediante R-2021-013027</p>

Bitácora de Seguimiento

	Enero	<p>Archivo físico del proyecto entregado, también se está elaborando el acta de liquidación con el fin de radicar el 26/02/2021 de acuerdo con el Plan de Liquidaciones 2021 del Sector y cumplimiento de Metas 2021.</p>
	Febrero	<p>Se remite Acta de Liquidación el 24/02/2021 bajo radicado No. I-2021-001067 para revisión de la Secretaría General</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA30)_Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, entregados	Marzo	Se remite Acta de Liquidación el 24/02/2021 bajo radicado No. I-2021-001067 para revisión de la Secretaría General. Se remiten últimas observaciones hechas por Secretaría General el 26/03/2021 y queda para revisión y ajuste de la supervisora del proyecto.
	Abril	Se finaliza proceso de acta de liquidación de contrato FA-CD-I-S-093-2019 el 28/04/2021.
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

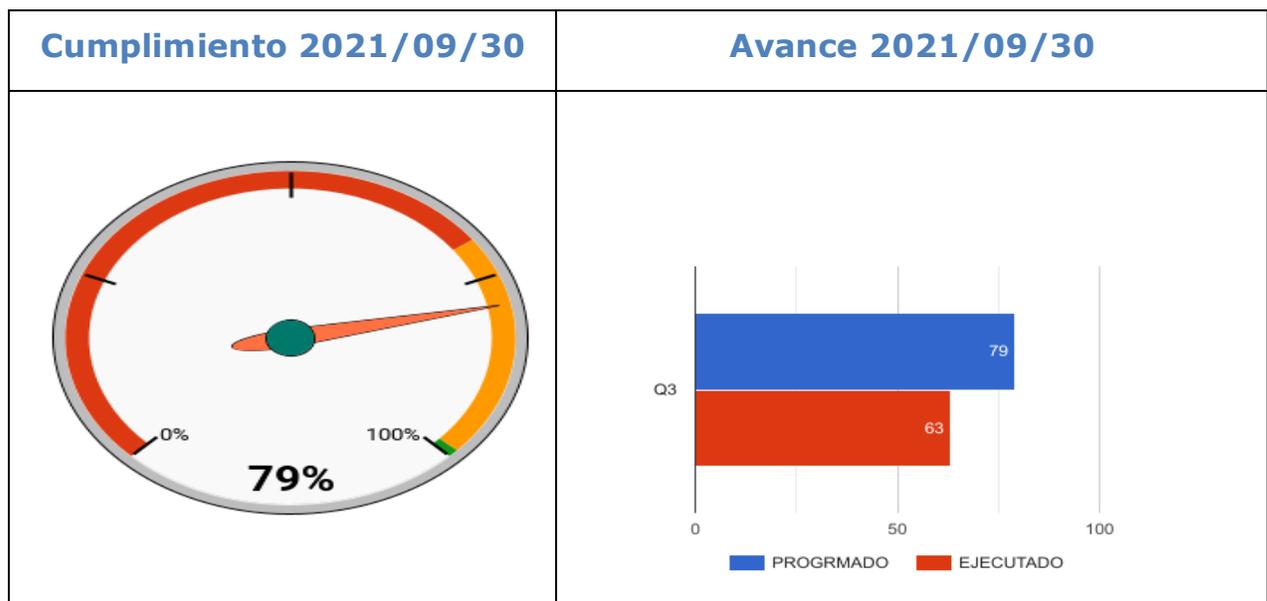

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS Portafolio/Programa/Proyecto: VIVIENDA



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA31_Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEA31)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	# 2	115 7	214	443	500	0	358
AEA32_Terminar soluciones de vivienda	(AEA32)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	# 2	228 3	101	224	965	993	609
AEA33_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEA33)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	# 2	258 4	45	754	347	143 8	601

Bitácora de Seguimiento

(AEA31)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	Enero	
	Febrero	La contratación de los proyectos de Malambo (32 viviendas) y Soledad (60 viviendas) - Atlántico, fueron aprobadas en comité de contratación del 25/1/2021. El sector remitió el estudio previo de Malambo con soportes el 19/2/2021 a Secretaría General para los trámites pertinentes de contratación. Sobre el proyecto de Soledad, el borrador de los estudios previos se encuentran en ajustes conforme a petición de la Secretaría General del 23/2/21.
	Marzo	Se reporta ejecución de meta contratadas para el mes de marzo/21, así: 60 viviendas en Soledad (Atlántico) y 32 viviendas en Malambo (Atlántico). Adicionalmente, se tenía prevista la contratación de 19 viviendas en Casabianca (Tolima) y 60 viviendas en Sucre (Sucre), no obstante, a la fecha los oferentes de éstos proyectos se encuentran subsanando documentos técnicos y financieros para continuar con el proceso de contratación correspondiente.
	Abril	Para el mes de abril de 2021, se tenía prevista la contratación de 129 viviendas, las cuales no fue posible reportar por lo siguiente: 1. Manaure (La Guajira) (12 viviendas): Proceso aprobado en comité de contratación el 26/4/2021. Los estudios previos y anexos correspondientes se encuentran en revisión de Secretaria General desde el lunes 3/5/2021 para continuar con la suscripción del contrato. 2. Uribia (La Guajira) (52 viviendas): Proceso aprobado en comité de contratación el 26/4/2021. Los estudios previos y anexos

		<p>correspondientes se encuentran en revisión de Secretaria General para continuar con la suscripción del contrato.</p> <p>3. Vélez (Santander)(32): A la fecha continúa la revisión de la propuesta por falta de remisión de documentos por parte del postulante.</p> <p>4. Tibú (Norte de Santander)(4 viviendas): Se está tramitando adición al contrato FA-CD-I-S-100-2019 para la inclusión de las 4 viviendas. El contrato se encuentra suspendido debido a la difícil situación de orden público que se está presentando en la región del Catatumbo. Se suscribirá el otrosí en mención cuando la situación de orden público se supere y se reinicie el contrato.</p> <p>5. Ocaña (Norte de Santander)(14 viviendas): Proyecto postulado que continúa en revisión técnica. Se encuentra pendiente por parte del Fondo Adaptación, la visita al sitio donde se ejecutarán las viviendas para revisar condiciones técnicas y de riesgo del predio, no obstante la misma no se ha podido realizar debido a la difícil situación de orden público que se presenta en la zona.</p> <p>6. Caucasia (Antioquia)(15 viviendas): Para la atención de las 15 familias, se tiene prevista la adición al contrato FA-CD-I-S-230-2020 que actualmente está por iniciar. No obstante lo anterior, se ha dificultado la labor de ubicación y confirmación para firma de acta de entendimiento de estas 15 familias, requisito previo para trámite y suscripción del otrosí.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Se reporta el hito Contratadas con 11 viviendas en Manaure (La Guajira). Respecto a los proyectos que se tenían planteados para contratar en el periodo de reporte:</p>

1. Dosquebradas (Risaralda): 40 SV. Proyecto postulado con 20 SV y aprobado en comité de contratación de 2/6/21. Actualmente se encuentra en preparación, revisión y aprobación de estudios previos para continuar con proceso de contratación.

2. Valparaíso (Antioquia): 10 SV. El constructor se encuentra subsanando documentos de la postulación relacionados con la intervención del lote que es propiedad de la Alcaldía. Ya se hizo visita al predio para verificar condiciones de riesgo.

3. Boavita (Boyacá): 14 SV. El día 4-6-21 se hará reunión con el constructor para conocer más detalles del proyecto. Se tiene visita programada al predio para verificar condiciones de riesgo el día 10-6-21.

4. San Calixto (Norte de Santander): 23 SV. No se recibió ninguna postulación durante las 3 convocatorias que se han abierto para estudio de mercado. Se está revisando el reemplazo de este proyecto con otro para un municipio que cumpla con los criterios de priorización y que se postule en la convocatoria que se encuentra abierta y que cierra el próximo 14-6-21.

5. La Pintada (Antioquia): 6 SV. Se hizo visita al lote del proyecto el 2/6/21 y se tendrá presentación del proyecto con constructor la semana del 7/6/21. Si el proyecto cumple con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, continuará en proceso de aprobación ante comités de calidad y contratación.

6. Útica (Cundinamarca): 20 SV. El constructor

		<p>se comprometió a remitir para evaluación las subsanaciones requeridas respecto a los diseños del proyecto, el 24/6/21. En caso de que el constructor no logre allegar todos los documentos subsanados en la fecha estipulada, se procederá a buscar otro proyecto que cumpla con los requisitos para contratación.</p> <p>7. Fundación (Magdalena): 15 SV. Se recibieron dos proyectos en postulación pero ninguno cumplió con los requisitos financieros de capital de trabajo. Se está revisando reemplazo con otro proyecto que cumpla con los requisitos de postulación.</p> <p>8. San Gil (Santander): 16 SV. Este proyecto se tiene planteado para la atención de beneficiarios del municipio de Piedecuesta (Santander). No se recibió postulación en la primera convocatoria. Está publicado nuevamente en la convocatoria que se encuentra abierta hasta el 16/6/2021. Se estudia alternativa de reubicación en el municipio de San Gil (Santander).</p>
	<p>Junio</p>	<p>Se reporta la terminación del hito Contratadas, con la suscripción de dos contratos de la estrategia de Nuevas Contrataciones así: 50 viviendas en Uribia (La Guajira) y 59 viviendas en Sucre (sucre). Para el presente periodo, se tenía programada la contratación de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sabanalarga (Atlántico) (74 SV): se postularon dos proyectos que a la fecha están en revisión técnica, jurídica y financiera para presentación de comité de calidad la semana del 12/7/21. 2. Tamalameque (Cesar) (19 SV): se está tramitando adición al contrato FA-CD-I-S-228-

	<p>2020, actualmente en ejecución, a fin de incluir éstas viviendas. Se está en revisión de los documentos del contratista a fin de proceder con la modificación al contrato.</p> <p>3. Popayán (Cauca) (77 SV): no hubo postulación de ningún proyecto en ninguna de las convocatorias que se han publicado este año. Se volvió a sacar a publicar convocatoria para este proyecto en la nueva postulación el día 6-7-21.</p>
<p>Julio</p>	<p>En el mes de julio el sector Vivienda suscribió el contrato FA-CD-I-S-189-2021 con el alcance de 20 viviendas en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. Así mismo, se suscribió el otrosí no. 1 al contrato FA-CD-I-S-202-2020 mediante el cual se adicionó 1 vivienda en el municipio de María la Baja, para un total de 21 nuevas viviendas contratadas. En el mes de Julio se generó un rezago de 182 viviendas respecto a la meta establecida para el mes, sin embargo es importante mencionar que el sector continúa adelantando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la meta de contratación establecida para el presente año. En ese sentido en la actualidad adelanta un sinnúmero de procesos los cuales presentan diferentes estados de avance según se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para 14 viviendas en el municipio de Ocaña, el contrato se encuentra en proceso de firma. - Para 61 viviendas en el municipio de San Pablo, el constructor está adelantando los trámites para la legalización de compra del predio. - Para 160 viviendas en los municipios de Casabianca y Abrego el proceso ya se realizó.

Se tiene pendiente la viabilidad jurídica por modificación en el instructivo de vivienda al interior de la entidad.

- Para 42 viviendas en los municipios de Vélez y Valparaíso, se está en espera de recibir las subsanaciones técnicas, financieras y jurídicas en la documentación entregada por parte de los constructores.
- Para 14 viviendas en el municipio de Boavita, el proyecto está en proceso de ajuste con base en las observaciones recibidas al interior de la entidad para continuar con la firma del contrato.
- Para 93 viviendas en los municipios de Popayán y San Gil, los proyectos se encuentran en fase de estudio de mercado.
- Para 74 viviendas en el municipio de Sabanalarga se está revisando la documentación recibida para determinar la respectiva viabilidad del proyecto.
- Para 23 viviendas en los municipios de Tamalameque y Tibú se están adelantando los trámites para la adición a contratos existentes.
- Para 63 viviendas en los municipios de Riohacha, San Calixto y Dosquebradas no se encontraron proyectos existentes y se hizo necesario cambiar el municipio objetivo.
- Para 15 viviendas en el municipio de Fundación el proyecto está en estudio de la viabilidad técnica, jurídica y financiera.
- Para 6 viviendas en el municipio de La Pintada, el proyecto se encuentra en fase de presentación.
- Para 15 viviendas en el municipio de Cauca, se están realizando los trámites para la aprobación de las pólizas y las gestiones sociales para identificación de las familias.

	<p>Agosto</p>	<p>En el mes de agosto se suscribieron los contratos 201 y 202 de 2021, en los municipios de Ocaña (Norte de Santander) con un alcance de 14 viviendas y en Viotá (Cundinamarca) con alcance de 64 viviendas, para un total en el periodo de 78 viviendas contratadas y un acumulado en el año de 354.</p> <p>De manera paralela y constante se continúan adelantando los diferentes procesos de contratación, en diferentes estados de avance entre los cuales mencionamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para 189 viviendas Boavita, Casabianca, Abrego, Fundación se adelantan gestiones para citación comité de contratación. - Para 124 viviendas en Vélez, Valparaíso, Yodo, Ituango, Taminango y la Pintada en proceso de revisión y subsanación de la documentación entregada por el constructor. - Para 74 viviendas en Sabanalarga se realizan las gestiones para revisión en comité de Calidad para continuar al comité de contratación. - Para 19 viviendas en Tamalameque se adelantan gestiones para adicionar a contrato actualmente en ejecución. - Para 90 viviendas en el municipio de La Unión, Riohacha y Neiva no se tiene postulación. - Para 77 viviendas en el municipio de Popayán se tiene en revisión la documentación de la postulación recibida. - Para 61 viviendas en el municipio de Cantagallo se continúan los trámites respectivos para la legalización del predio por parte del constructor.
	<p>Septiembre</p>	<p>En el mes de septiembre el sector Vivienda adicionó 4 viviendas al contrato FA-CD-I-S-</p>

		<p>100-2019 suscrito con la Unión temporal Villa Teresa, para un total de 100 viviendas a ejecutar en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Con esta adición, el sector acumula 358 viviendas contratadas en 11 municipios del país en la presente vigencia.</p> <p>Por otro lado, se realizaron varias mesas de trabajo al interior del sector para revisar los diferentes procesos de contratación definidos en el plan del presente año y las estrategias a seguir para garantizar su cumplimiento en el transcurso del trimestre siguiente. En este sentido se trabaja con el objetivo de desarrollar 4 grupos principales de contratación que finalmente deriven en la suscripción de los contratos así:</p> <p>Grupo I: 256 viviendas en los municipios de Abrego, Alban, Casabianca, Fundación, La Pintada y Sabanalarga.</p> <p>Grupo II: 15 viviendas en el municipio de Boavita.</p> <p>Grupo III: 173 viviendas en los municipios Ituango, Neiva, San Pablo, Valparaíso y Yondó.</p> <p>Grupo IV: 212 viviendas en los municipios de Barranquilla, Rio Viejo, San Estanislao, Veléz y Villa del Rosario.</p>
--	--	---

Bitácora de Seguimiento

	Enero	<p>Se reporta ejecución de meta "Terminadas" así: 47 viviendas en Tolima del Grupo 1 Nuevas Contrataciones y 2 viviendas (1 en Cauca y 1 en Nariño) del Grupo 2 Directas. Total: 49</p>
--	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEA32)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	Febrero	Se reporta el hito viviendas "Terminadas", así: Grupo 1 Nuevas contrataciones: 31 SV, Grupo 2 Directas: 29 SV y Grupo 3 OZ: 31 SV. Total: 91 SV.
	Marzo	Se reporta el hito viviendas TERMINADAS para el mes de marzo/21, así: 65 viviendas del Grupo 2 Directas en Puerto Nariño (Amazonas) y 102 viviendas del Grupo 1 Nuevas Contrataciones en Manatí (Atlántico).
	Abril	<p>Para el presente mes, el reporte de terminadas para el mes de abril/21 contemplaba el reporte de 112 viviendas distribuidas así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Grupo 3 OZ: 44 viviendas en Sevilla (Valle del Cauca). No se ha remitido por parte del Operador Zonal Comfandi, las actas de habitabilidad para reportar el hito terminadas debido a que está pendiente la conexión final de servicios públicos, por parte de la administración municipal. Grupo 3 OZ: 68 viviendas en Hatillo de Loba (Bolívar). No se ha remitido por parte del Operador Zonal Comfenalco Cartagena, las actas de habitabilidad para reportar el hito terminadas. Se han presentado demoras en el reporte debido a una situación de invasión que se presentó en 16 de las viviendas del proyecto, que se encuentra en trámite de solución por parte del operador zonal. No obstante lo anterior, para el mes de Abril de 2021, el Grupo 2 Contrataciones Directas reportó la terminación de 18 viviendas: 17 en Ayapel (Córdoba) y 1 en Sucre (Sucre).

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>Mayo</p>	<p>A pesar que la meta correspondía a 40 SV, para el presente periodo se reporta el hito terminadas con los siguientes proyectos:</p> <p>Grupo 1 Nuevas contrataciones: 43 SV en Manatí (Atlántico).</p> <p>Grupo 2 Directas: 1 vivienda en el Peñón (Bolívar).</p> <p>Grupo 3 Nuevas Contrataciones: 65 SV en Hatillo de Loba (Bolívar). 5 SV en Pachavita (Boyacá) 1 SV en Saboyá (Boyacá) 6 SV en Cantón de San Pablo (Chocó) Total: 121 SV</p>
	<p>Junio</p>	<p>Se reporta el hito Terminadas con el reporte de una vivienda de la estrategia de Directas en el Peñón (Bolívar), del proyecto Fonvivienda. Para el mes de Junio de 2021, se tenía planteada la meta de terminar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 8 viviendas en Manatí, que ya fueron reportadas como terminadas y entregadas en marzo y mayo de 2021. 2. 35 viviendas en Caimito (Sucre) que están pendientes de la conexión de energía. Trámite que se espera cerrar en el mes de julio de 2021. 3. 5 viviendas en Ayapel (Córdoba), que fueron reportadas como terminadas en febrero de 2021. 4. 12 viviendas en Cantón de San Pablo (Chocó), que fueron reportadas como terminadas (6) en febrero de 2021 y (6) en mayo de 2021. 5. 12 viviendas en Belén de Umbría (Risaralda), que están pendientes de certificación de Retie y la energización de las acometidas, para

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>suscribir la habitabilidad. Éste trámite se espera cerrar en Julio de 2021.</p>
Julio	<p>Se continuó con la terminación de viviendas superando así la meta establecida al llegar a un total acumulado de 509 viviendas.</p> <p>En este periodo se terminaron 62 nuevas viviendas distribuidas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca -43 en el municipio de Sevilla, departamento del Valle del Cauca. -15 en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba.
Agosto	<p>Se terminaron 72 viviendas adicionales, para completar un total acumulado de 581 viviendas terminadas en el año, superando así la meta definida para el periodo.</p>
Septiembre	<p>Se logró la terminación de 28 soluciones de Vivienda en 4 municipios diferentes, así:</p> <p>Caldono, Cauca: 1</p> <p>Sevilla, Valle del Cauca: 1</p> <p>María la Baja, Bolívar: 14</p> <p>Belén de Umbría, Risaralda: 12</p> <p>Con estas terminaciones, el sector ya acumula 609 Viviendas terminadas con acta de Habitabilidad firmadas para reporte en la presente vigencia.</p> <p>Por otro lado las lluvias y las afectaciones de inundación en algunos municipios del norte del país, han generado un impacto negativo en el avance de las obras, ya que ha sido necesario mantener la suspensión de los contratos 188 y 220 de 2016 (424 viviendas). Así mismo,</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>algunos problemas de orden público en el municipio de Tibú, Norte de Santander también han derivado en la necesidad de suspender el contrato de manera temporal (96 viviendas). Por otro lado, Comfacesar operador Zonal contratante, está pendiente de la actualización por parte del contratista de las garantías exigidas, para la reanudación y ejecución del proyecto Ararat II en el municipio de Plato, Magdalena en el cual están involucradas 130 viviendas.</p>
--	--

Bitácora de Seguimiento

(AEA33)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	Enero	Se reporta hito ejecución "Entregadas" así: 47 viviendas de Grupo 1 Nuevas Contrataciones, 2 viviendas de Grupo 2 Directas y 4 viviendas de Grupo 3 Operadores Zonales. Total: 53.
	Febrero	No se pudo concluir la entrega para el mes de febrero de 31 viviendas en Bochalema (Norte de Santander), debido a retrasos por obras de alcantarillado que se encontraba ejecutando el Municipio.
	Marzo	Se reporta el hito Entregadas para el mes de marzo/21 así: 66 viviendas del Grupo 2 Directas en Puerto Nariño (Amazonas) y del grupo 1 de Nuevas Contrataciones, 31 viviendas en Bochalema (Norte de Santander) y 102 viviendas en Manatí (Atlántico). Total: 199 viviendas.
	Abril	Para el mes de abril/21, se tenía planteada la entrega de 43 viviendas en Coello (Tolima), las cuales fueron entregadas en el mes de enero de 2021. No obstante lo anterior, para el

	<p>presente mes se reporta la entrega de 31 viviendas por parte del Grupo 2 Contrataciones Directas, así: 4 viviendas en Putumayo, 1 vivienda en Sucre (Sucre) y 26 viviendas en Ayapel (Córdoba).</p>
Mayo	<p>A pesar que la meta para el periodo ascendía a 290 SV, se logró el reporte de entrega de 108 viviendas así:</p> <p>Grupo 1 Nuevas contrataciones: 43 SV en Manatí (Atlántico). Grupo 2 Directas: 1 vivienda en el Peñón (Bolívar). Grupo 3 Operadores Zonales: 58 SV en Hatillo de Loba (Bolívar). 5 SV en Pachavita (Boyacá) 1 SV en Saboyá (Boyacá). El Proyecto de Lorica (Córdoba) con 279 SV que estaba planteado entregar para el mes de mayo de 2021, tuvo retrasos en el proceso de entrega debido a las demoras en la instalación de los medidores de agua y energía individuales. A la fecha se tienen instalados 130 medidores de energía y se encuentra en proceso de instalación 279 medidores de agua.</p>
Junio	<p>Se reporta el hito entregadas, con dos viviendas de la estrategia del Grupo 2 Directas: 1 vivienda en el Peñón (Bolívar) y 1 vivienda en Ayapel (Córdoba).</p> <p>Se tenía planteado para este mes la entrega de las siguientes viviendas: Grupo 2 Directas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato 130 de 2016. Vigía del Fuerte (Antioquia) 11 viviendas. El reporte de estas viviendas se ha retardado, se reportará la

	<p>terminación de las viviendas para el mes de agosto de 2021.</p> <p>2. Contrato 175 de 2016. Supía (Caldas). 1 vivienda que está reportada como entregada en febrero de 2021.</p> <p>3. Contrato 178 de 2016. Cauca y Nariño. 143 viviendas. Se espera que se superen las dificultades de conexión de servicios públicos en todos los proyectos, para reportar la entrega de las viviendas en el mes de noviembre de 2021.</p> <p>4. Contrato 179 de 2016. Putumayo. 4 viviendas que fueron reportadas como entregadas en abril de 2021.</p> <p>5. Contrato 188 de 2016. Caimito (Sucre). 35 viviendas que están pendientes de conexión a energía para dar paso a la entrega de las viviendas en el mes de octubre de 2021.</p> <p>6. Contrato 213 de 2016. Tenerife (Magdalena). 89 viviendas: 64 viviendas en el casco urbano y 25 viviendas en el corregimiento de Real del Obispo. Se espera que el contratista culmine con trámites de escrituración pendientes para continuar con el trámite de entrega hacia el mes de agosto de 2021.</p> <p>7. Contrato 237 de 2016. Ayapel (Córdoba). 5 viviendas: 2 viviendas reportadas como entregadas en febrero de 2021 y 1 que se reporta éste mes. Las 2 viviendas restantes se asignarán en el marco de la liquidación del contrato, ya que los registros inicialmente asignados fallecieron sin grupo familiar. Por lo</p>
--	---

tanto su entrega no se reportará este año.
GRUPO 3 OPERADORES ZONALES

8. Contrato 242 de 2013 COMFACHOCÓ. 12 viviendas en Carmen del Darién (Chocó). CONTRATO EN LIQUIDACIÓN EN PROCESO DE DEMANDA EN CURSO. Proyecto con dificultades en la actualización de pólizas, por lo tanto no ha sido posible el giro de recursos que permita la culminación del proyecto. Se planteó una reprogramación para la entrega de estas viviendas en 2022.

9. Contrato 242 de 2013 COMFACHOCÓ. 7 viviendas de reconstrucción en Alto Baudó (Chocó). CONTRATO EN LIQUIDACIÓN EN PROCESO DE DEMANDA EN CURSO. Se espera que el Operador Zonal de cumplimiento a los requisitos para el reporte de entregas correspondiente en la vigencia 2021. Se planteó reprogramación de entregas para agosto de 2021.

10. Contrato 088 de 2012 COMFANDI. 44 viviendas en Sevilla (Valle). La entrega de las viviendas se retrasó debido a los inconvenientes presentados por el Paro Nacional, que no ha permitido la gestión para la conexión de los servicios públicos por parte del operador zonal. Se planteó una reprogramación para la entrega de estas viviendas para agosto de 2021.

11. Contrato 0004 de 2013 Comfenalco Cartagena. 70 viviendas en Hatillo de Loba (Bolívar). 60 viviendas ya fueron reportadas como entregadas en febrero y mayo de 2021 y quedan 10 viviendas que se reprogramaron


		<p>para entrega en diciembre de 2021, por temas relativos a ocupación ilegal.</p>
	<p>Julio</p>	<p>Se continuó con la entrega de Viviendas a la población afectada, en esta ocasión con 48 nuevas soluciones distribuidas así: 4 en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca. 1 en el municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre. 43 en el municipio de Sevilla, departamento de Valle del Cauca. Con estas entregas el sector acumula un total de 466 viviendas entregadas en el año con lo cual se tiene un rezago con respecto a la programación acumulada inicial. Los proyectos pendientes por entrega y sobre los cuales se adelantan gestiones al respecto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 279 Viviendas del contrato 127 de 2016 desarrollado en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba, entrega que se ha rezagado por demoras en el recibo de los medidores de energía, mismos que el contratista importó desde la China y sobre los cuales se está adelantando el proceso de instalación. - 143 Viviendas del contrato 178 de 2016, distribuidas en los municipios de Arboleda, Corinto, El Peñol, Imués y Puracé, las cuales se encuentran terminadas y en espera de la finalización del proceso de notariado y registro público demorado por las respectivas oficinas responsables y sobre los cuales el Fondo Adaptación ha solicitado en reiteradas ocasiones celeridad en los trámites.

	<p>Agosto</p>	<p>Se entregaron 96 viviendas por parte del sector para un acumulado de 562. La entrega de este mes superó la meta establecida para el periodo y sirve para disminuir el rezago acumulado en periodos anteriores. Las viviendas entregadas se distribuyeron así: 9 en el municipio de Labateca (Norte de Santander), 30 en Caldon (Cauca), 4 en Albania (Santander), 24 en Ayapel (Córdoba), 6 en Manaure (La Guajira), 22 en Panqueba (Boyacá) y 1 en la Dorada (Caldas).</p> <p>Adicional a las entregas reportadas se continuaron realizando las gestiones pertinentes para finalizar los trámites que permitan llevar a cabo la entrega final y el reporte de las 279 viviendas de municipio de Lorica donde se continúa con la instalación de los medidores de energía y de 47 viviendas en los municipios de Vigía del Fuerte y Arboleda pendientes de registro notarial. Para las 99 viviendas de los municipios de Caimito y Tenerife los contratos asociados se han visto afectados por suspensiones de obra y se evalúa el replanteamiento de los plazos asociados.</p>															
	<p>Septiembre</p>	<p>El sector vivienda entregó a sus beneficiarios 39 nuevas soluciones vivienda en 6 municipios del país, para un gran acumulado en la presente vigencia de 601 viviendas.</p> <p>Los municipios en los cuales se entregaron Viviendas son:</p> <table data-bbox="755 1654 1510 1875"> <tr> <td>Caldono,</td> <td>Cauca:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sevilla,</td> <td>Valle:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Cantón de San pablo,</td> <td>Chocó:</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Hatillo de Loba,</td> <td>Bolívar:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>María la Baja,</td> <td>Bolívar:</td> <td>14</td> </tr> </table>	Caldono,	Cauca:	1	Sevilla,	Valle:	1	Cantón de San pablo,	Chocó:	11	Hatillo de Loba,	Bolívar:	1	María la Baja,	Bolívar:	14
Caldono,	Cauca:	1															
Sevilla,	Valle:	1															
Cantón de San pablo,	Chocó:	11															
Hatillo de Loba,	Bolívar:	1															
María la Baja,	Bolívar:	14															

Belén de Umbría, Risaralda: 11

Igualmente, las gestiones realizadas por el Fondo Adaptación finalmente contribuyeron a finalizar la instalación de los contadores en 279 viviendas en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba, en las cuales se realizan procesos de revisión de pendientes y demás tramites necesarios, con el objeto de cumplir los requisitos exigidos para su próxima entrega y reporte en las metas del sector.

Por otro lado, las desviaciones negativas en el avance de algunos proyectos del norte del país derivadas de la necesidad de suspenderlos por las lluvias y las afectaciones de inundación, la suspensión del proyecto Tibú, Norte de Santander, por problemas de orden público y la espera en la actualización de las garantías del proyecto Ararat II en Plato, Magdalena, han afectado las metas de terminación y por ende las de entrega del sector, casos todos sobre los cuales se mantiene las gestiones pertinentes para propender por su normalización y su entrega en la presente vigencia.

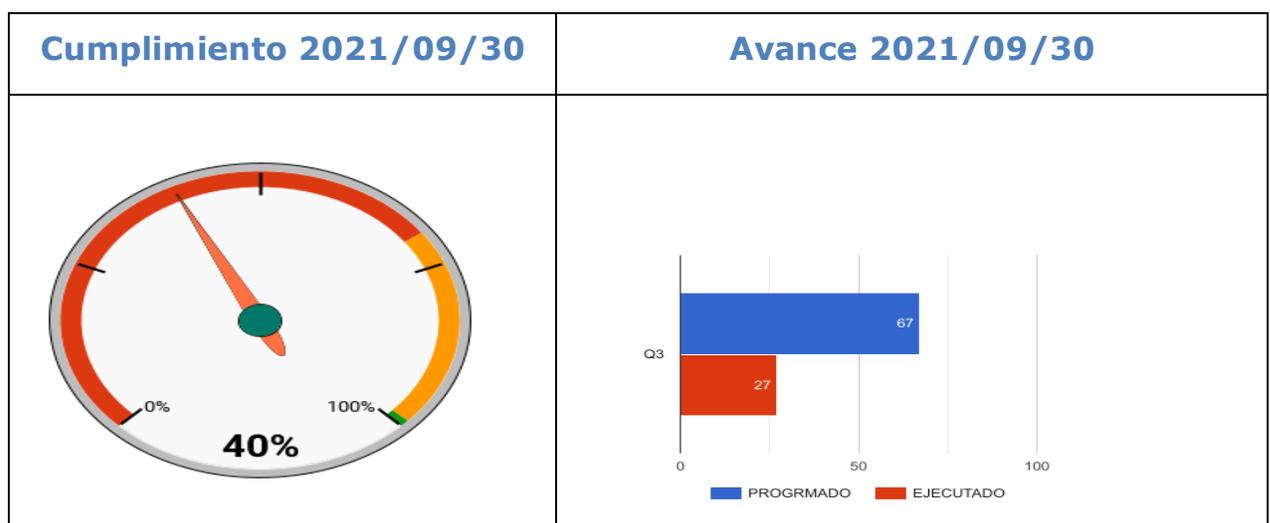


4.2. Área Subgerencia de Proyectos

En la Subgerencia de Proyectos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con cinco portafolios de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:



Las gráficas a continuación muestran la relación de los indicadores formulados para la Subgerencia de Proyectos en la vigencia 2021 trimestre a trimestre, adicionalmente, el avance cuantitativo total.

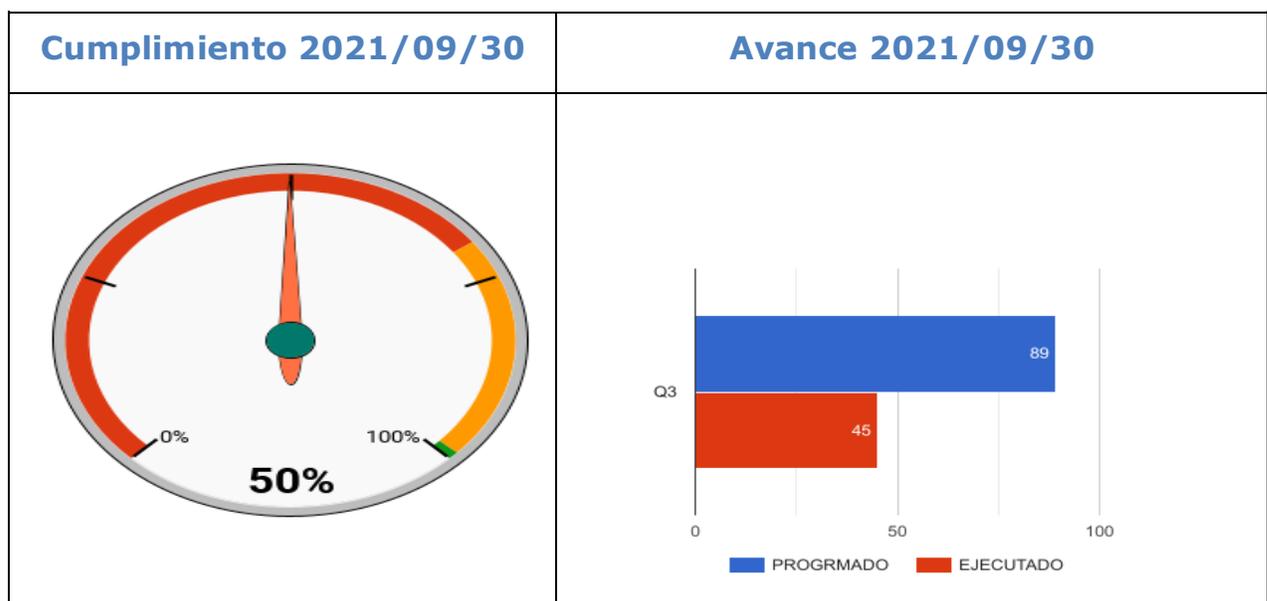

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS Portafolio/Programa/Proyecto: TRANSPORTE



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades /Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFOR O)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB01_Terminar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB01)_Sitios Críticos con Obras terminados	#	1	0	0	1	0	0
AEB02_Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB02)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	#	1	0	0	1	0	0

Bitácora de Seguimiento

	Enero	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Febrero	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Marzo	No se tenían metas planeadas para este mes.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEB01)_Sitios Críticos con Obras terminados	Abril	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Mayo	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Junio	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Julio	No se tenían metas programadas para este período.
	Agosto	Para este mes se tenía programada la terminación del proyecto puente La Colorada, pero debido a una externalidad presentada en el proyecto por diferentes situaciones de orden público, suscitadas desde mayo de 2021, el contratista de obra solicitó suspensión del contrato de obra FA-IC-I-S-213-2018 por un periodo de un mes, razón por la cual se suspendió desde el 7 de mayo de 2021, situación que continuo durante el mes de junio de 2021, por lo cual se tuvo que ampliar la suspensión hasta el 7 de julio de 2021. Escenario que conlleva a que se trasladara el tiempo de terminación y ejecución del contrato por un periodo de dos meses. Por lo anterior, la terminación del contrato se trasladó del 24 de agosto al 24 de octubre de 2021.
	Septiembre	No se tenían metas programadas para este mes.
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador


Bitácora de Seguimiento

	Enero	No se tenían metas planeadas este mes.
	Febrero	No se tenían metas planeadas para este mes.


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEB02)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	Marzo	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Abril	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Mayo	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Junio	No se tenían metas planeadas para este mes.
	Julio	No se tenían metas programadas para este período.
	Agosto	No se tenían metas programadas para este mes.
	Septiembre	Para este mes se tenía programada la entrega del proyecto puente La Colorada, pero debido a una externalidad presentada en el proyecto por diferentes situaciones de orden público, suscitadas desde mayo de 2021, el contratista de obra solicitó suspensión del contrato de obra FA-IC-I-S-213-2018 por un periodo de un mes, razón por la cual se suspendió desde el 7 de mayo de 2021, situación que continuo durante el mes de junio de 2021, por lo cual se tuvo que ampliar la suspensión hasta el 7 de julio de 2021. Escenario que conllevo a que se trasladara el tiempo de terminación y ejecución del contrato por un periodo de dos meses. Por lo anterior, la terminación del contrato se trasladó del 24 de agosto al 24 de octubre de 2021 y de igual forma se traslada la entrega del proyecto.
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

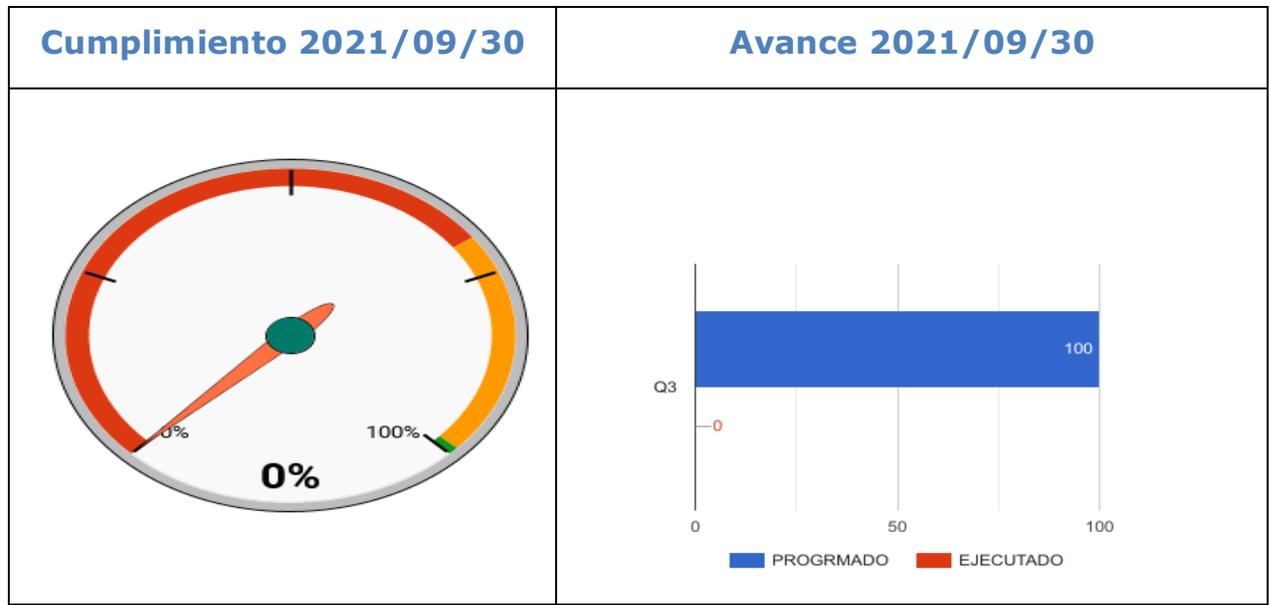

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS Portafolio/Programa/Proyecto: EDUCACIÓN

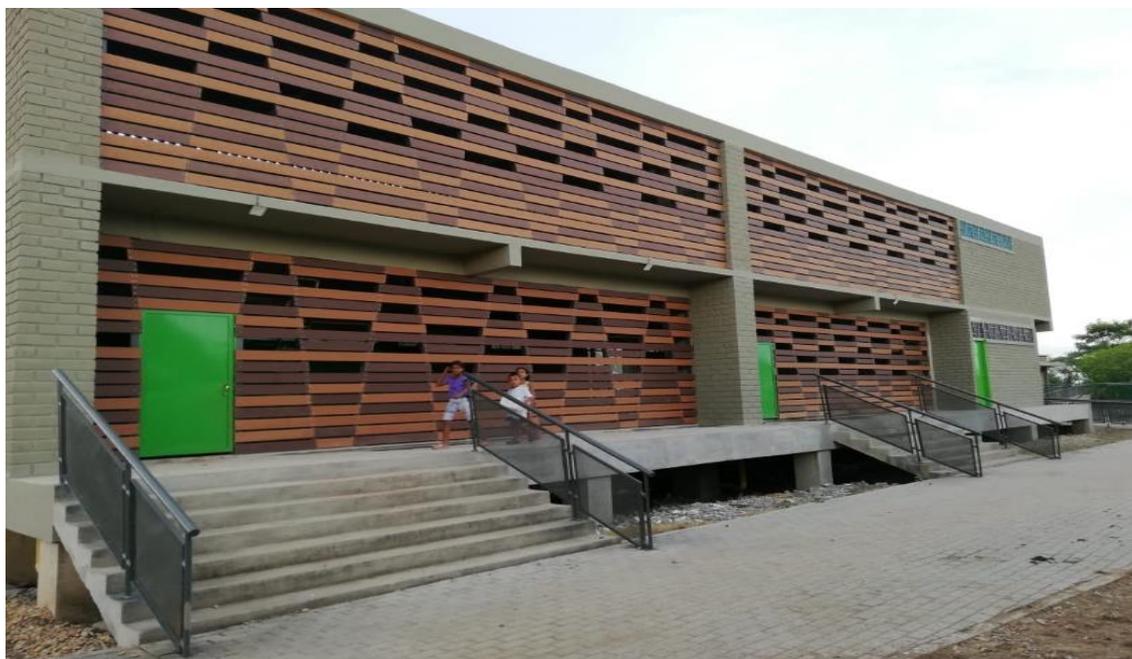

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB03_Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB03)_Sedes Educativas, terminadas	# 2	15	2	7	4	2	10
AEB04_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB04)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	# 2	17	5	2	5	5	11

Bitácora de Seguimiento

	Enero	En el mes de enero de 2021 y en atención al avance y ejecución de los proyectos del sector educación no se proyectó ninguna sede por terminar.
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

(AEB03)_Sedes Educativas, terminadas	Febrero	En el mes de febrero 2021, no se proyectó la terminación de ninguno de los proyectos en ejecución derivados del sector educación.
	Marzo	En el mes de Marzo 2021, se tenía previsto la terminación de los proyectos educativos CE LA CHAPETONA – Bolívar y IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – Sucre, de los cuales y debido a la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logró la terminación de la sede IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – Sucre, así como la sede EUM Darío Vásquez Caballero / Remolino – Magdalena, esta última planeada inicialmente para el mes de junio de 2021. En cuanto a la sede CE LA CHAPETONA – Bolívar, es preciso indicar que este proyecto es ejecutado en el marco del Convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar quien realizó la contratación directa de la obra y que ha dilatado las audiencias de incumplimiento al contratista en el marco del proceso de incumplimiento realizado con el acompañamiento de Entes de control, proceso que ha sido solicitado reiteradamente por parte del sector a la Gobernación.
	Abril	En el mes de abril 2021, se tenía previsto la terminación del proyecto de IE DE ARMENIA PRINCIPAL (2 sedes), proyecto que no se logró terminar y del cual es preciso indicar que es ejecutado en el marco del Convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra y que adelantó proceso de incumplimiento con el acompañamiento de Entes de control, proceso que ha sido solicitado reiteradamente por parte del sector a la Gobernación conminando a la Entidad territorial a adelantar

		<p>las gestiones correspondientes con el fin de culminar no solo este proyecto sino los asociados al contrato derivado No. 2016-CV-0001-14-978 – Consorcio CED. No obstante, y producto de la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logra la terminación de las sedes educativas de EUM Policarpa Salavarrieta – Plato/ Magdalena y SEDE ER YOTOJOROTSCHI – Maicao/ Guajira.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>En el mes de mayo 2021, se tenía previsto la terminación del proyecto de CE JORGE ELIECER GAITAN (1 sede), proyecto que no se logró terminar y del cual es preciso indicar que es ejecutado en el marco del Convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra y que adelantó proceso de incumplimiento con el acompañamiento de Entes de control, proceso que ha sido solicitado reiteradamente por parte del sector a la Gobernación conminando a la Entidad territorial a adelantar las gestiones correspondientes con el fin de culminar no solo este proyecto sino los asociados al contrato derivado No. 2016-CV-0001-14-978 – Consorcio CED. No obstante, y producto de la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logra la terminación de las sedes educativas de CE. INDIGENA RURAL CEIR NO. 01 SEDE ESC. RUR. MIX. AMUSHICHON – Maicao/ Guajira y CE. INDIGENA RURAL CEIR NO. 01 SEDE ESC. RUR. JUTTIAL– Maicao/ Guajira. Entregas: Para el mes de mayo 2021, se tenía proyectada la entrega del proyecto educativo SEDE PRIMARIA IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – SEDE PRIMARIA – Majagual/Sucre</p>

		<p>proyecto que no se logró entregar debido a que no se ha realizado la conexión definitiva de la sede.</p>
	Junio	<p>En el mes de junio 2021, el sector educación tenía previsto de acuerdo al plan de metas, la terminación de tres proyectos, en el departamento de Guajira en el municipio de Maicao, sin embargo, estas sedes educativas fueron reportadas en los meses de abril y mayo. Igualmente es importante informar que el sector tiene sedes rezagadas en su meta de terminación con los proyectos de CE JORGE ELIECER GAITAN (1 sede), SEDE CE LA CHAPETONA (1 sede), IE DE ARMENIA PRINCIPAL (2 sedes) proyectos que vale la pena indicar que son ejecutado en el marco del Convenio 2016- CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra, y que viene adelantando un proceso de incumplimiento con el acompañamiento de Entes de control, proceso que ha sido solicitado reiteradamente por parte del sector a la Gobernación conminando a la Entidad territorial a adelantar las gestiones correspondientes con el fin de culminar los proyectos, cabe resaltar que de acuerdo con lo establecido con la audiencia de presunto incumplimiento adelantada por la Gobernación de Bolívar el día 22 de junio 2021, le aprobaron las siguientes fechas para terminación de las sedes educativas Armenia y Chapetona el 7 de julio y Jorge Eliecer y Regencia para el día 13 de julio de 2021, se programó nueva fecha de audiencia de presunto incumplimiento para el día 15 de julio, por lo que el sector espera que el contratista de obra cumpla con las fechas mencionadas</p>

	anteriormente.
Julio	<p>En el mes de julio de 2021, el sector educación tenía previsto en el plan de metas, la terminación de dos proyectos: 1. Proyecto IE Departamental Thelma Rosa Arevalo, en el municipio Zona Bananera departamento de Magdalena que será reportado en este mes y 2. Proyecto CE de Regencia, en el municipio de Montecristo departamento de Bolívar. El proyecto No. 1 efectivamente es reportado como terminado de acuerdo al acta de entrega adjunto. El proyecto No. 2 hace parte del contrato No. 2016-CV-001-14-978, suscrito en el marco del convenio No. 001 con la Gobernación del Bolívar; y está en proceso de presunto incumplimiento por parte de la Gobernación. Entre el 1 y el 7 de agosto de 2021, se está adelantando una visita técnica con el Contratista, la Interventoría, la Gobernación del Bolívar y la Contraloría General de la República, para conocer el estado real del proyecto. De este contrato, se está adelantado proceso de certificación RETIE de los proyectos de las Sedes Chapetona y Armenia Principal, por lo que el sector tiene previsto que queden terminados en el mes de agosto. En el caso de las sedes Jorge Eliecer y Regencia, el contratista ha manifestado un avance por encima del 90%, una de las razones para realizar la visita y se espera que estas sedes queden terminadas en el mes de octubre.</p> <p>Es importante resaltar, que producto de la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logra la terminación de las sedes educativas IE departamental Pijiño del Carmen</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>y CE Artesanal Sede ERM El Horno, las cuales serán reportadas en este mes adelantando su meta de terminación.</p>
Agosto	<p>En el mes de agosto de 2021, el sector educación tenía previsto en el plan de metas, la terminación de un proyecto: 1. Proyecto EUM POLICARPA SALAVARRIETA del Municipio de Plato departamento de Magdalena, sede que fue reportada por el Sector en el mes de abril. Sin embargo, para el mes de Agosto, el sector Reportará la terminación de la sede CE BASICO AMPLIADO DE BOMBA del Municipio de Pedraza departamento de Magdalena, que estaba programado para el mes de Septiembre. A la fecha, el sector tiene rezagadas las terminaciones de las sedes CE JORGE ELIECER GAITAN, CE LA CHAPETONA, CE DE REGENCIA y la IE DE ARMENIA PRINCIPAL, que hacen parte del contrato No. 2016-CV-001-14-978, suscrito en el marco del convenio No. 001 con la Gobernación del Bolívar; y está en proceso de presunto incumplimiento por parte de la Gobernación. Se tiene previsto que estos proyectos queden terminadas en el último cuatrimestre del año 2021.</p>
Septiembre	<p>En el mes de septiembre de 2021, el sector educación tenía previsto en el plan de metas, la terminación de un proyecto: 1. Proyecto CER Básico ampliado de Bomba del Municipio de Pedraza, sede que fue reportada por el Sector en el mes de agosto.</p> <p>A la fecha, el sector tiene rezagadas las terminaciones de las sedes CE JORGE ELIECER GAITAN, CE LA CHAPETONA, CE DE REGENCIA y la IE DE ARMENIA PRINCIPAL, que hacen</p>

		<p>parte del contrato No. 2016-CV-001-14-978, suscrito en el marco del convenio No. 001 con la Gobernación del Bolívar; es importante aclarar que las sedes de Chapetona y Armenia se encuentran en proceso de firmas de las respectivas actas de terminación y serán reportadas el próximo mes y las sedes restantes en los meses siguientes quedando reportadas en el último cuatrimestre del año 2021.</p>
--	--	---

Bitácora de Seguimiento

<p>(AEB04)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)</p>	<p>Enero</p>	<p>En el mes de enero de 2021 y en atención al avance y ejecución de los proyectos del sector educación no se proyectó ninguna sede por entregar.</p>
	<p>Febrero</p>	<p>En el mes de febrero 2021, se tenía previsto la entrega del proyecto IE. AGRO DE TOMALA – Majagual/Sucre, conformado por 3 sedes educativas, proyecto que se logró entregar a la Entidad territorial y a la comunidad, de conformidad a lo proyectado. Así mismo, y producto de la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector y el líder sectorial también se logró la entrega a satisfacción de la IE Santa Teresa (PATIÑO) – Aguachica/ Cesar. Por lo anterior, para el presente mes se logra la entrega en total de 4 sedes educativas.</p>
	<p>Marzo</p>	<p>En el mes de marzo 2021, se tenía proyectada la entrega de los proyectos educativos IE PUERTO MELUK COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – Choco y la SEDE IER LA HONDA – Antioquia, de los cuales y debido a la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logró la entrega de la sede IE PUERTO</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


	<p>MELUK COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – Choco. En cuanto a la sede SEDE IER LA HONDA de Liborina – Antioquia, se encuentra en trámite por parte del contratista y EPM la energización definitiva del proyecto, con lo cual se podrá efectuar la entrega definitiva de la sede educativa ya terminada.</p>
Abril	<p>En el mes de abril 2021, se tenía proyectada la entrega del proyecto educativo IE Santa Teresa (PATIÑO)- Aguachica / Cesar, el cual fue entregado y legalizado en el seguimiento de plan de acción del mes de febrero de 2021. No obstante, para el presente mes y de conformidad a la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logró la formalización de la entrega del proyecto de COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO – Suratá/ Santander.</p>
Mayo	<p>En el mes de mayo 2021, se tenía previsto la terminación del proyecto de CE JORGE ELIECER GAITAN (1 sede), proyecto que no se logró terminar y del cual es preciso indicar que es ejecutado en el marco del Convenio 2016-CV-0001 suscrito con la Gobernación de Bolívar, quien realizó la contratación directa de la obra y que adelantó proceso de incumplimiento con el acompañamiento de Entes de control, proceso que ha sido solicitado reiteradamente por parte del sector a la Gobernación conminando a la Entidad territorial a adelantar las gestiones correspondientes con el fin de culminar no solo este proyecto sino los asociados al contrato derivado No. 2016-CV-0001-14-978 – Consorcio CED. No obstante, y producto de la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector se logra la terminación de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>las sedes educativas de CE. INDIGENA RURAL CEIR NO. 01 SEDE ESC. RUR. MIX. AMUSHICHON – Maicao/ Guajira y CE. INDIGENA RURAL CEIR NO. 01 SEDE ESC. RUR. JUTTIAL– Maicao/ Guajira. Entregas: Para el mes de mayo 2021, se tenía proyectada la entrega del proyecto educativo SEDE PRIMARIA IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – SEDE PRIMARIA – Majagual/Sucre proyecto que no se logró entregar debido a que no se ha realizado la conexión definitiva de la sede.</p>
	<p>Junio</p>	<p>En el mes de junio 2021, el Sector educación no tenía proyectada la entrega de ningún proyecto Sin embargo tiene dos sedes rezagadas SEDE PRIMARIA IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA – SEDE PRIMARIA – Majagual/Sucre proyecto que no se logró entregar debido a que no se había realizado la conexión definitiva de la sede y que de acuerdo con el compromiso adquirido en mesa de trabajo adelantada por el sector con la Gobernación y la Alcaldía se concertó la entrega para el mes de julio , igualmente la sede SEDE IER LA HONDA – LIBORINA será entregada en el mes de julio.</p>
	<p>Julio</p>	<p>En el mes de julio 2021, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede CE la Chapetona, del municipio de El Peñón departamento de Bolívar; sin embargo, todavía está en proceso de certificación RETIE. Finalmente, el Sector reportará en el mes de julio la entrega de dos sedes así: 1. SEDE IER LA HONDA - LIBORINA: Meta rezagada de marzo 2021 y 2. SEDE PRIMARIA - MAJAGUAL: Meta rezagada de mayo 2021.</p>

	<p>Agosto</p>	<p>En el mes de agosto 2021, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede CE JORGE ELIECER GAITAN del municipio de Barranco de Loba departamento de Bolívar; sin embargo, todavía está en proceso de ejecución y en trámite de proceso de incumplimiento con la Gobernación de Bolívar. Sin embargo, el Sector reportará en el mes de agosto la entrega de tres sedes así: 1. SEDE ER MIX. AMUSHICHON que estaba programada para el mes de agosto cumpliendo con su reporte. 2. SEDE ER YOTOJOROTSCHI y 3. SEDE ER JUTTIAL, cuya entrega se encontraban programadas para el mes de septiembre, y que debido a la gestión del Sector educación se logra adelantar estas entregas.</p> <p>El sector tiene rezagada la entrega de la sede CE la Chapetona, del municipio de El Peñón departamento de Bolívar.</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>En el mes de septiembre 2021, el Sector educación tenía proyectada la entrega de la sede ER JUTTIAL del municipio de Maicao departamento de La Guajira; sede que fue reportada por el sector en el mes de agosto. El sector tiene rezagada la entrega de la sede CE la Chapetona, del municipio de El Peñón y que se encuentra en proceso de entrega realizando el foro final, la sede Ce Jorge Eliecer Gaitán, del municipio de Barranco de Loba que se encuentra en proceso de presunto incumplimiento por la Gobernación de Bolívar</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

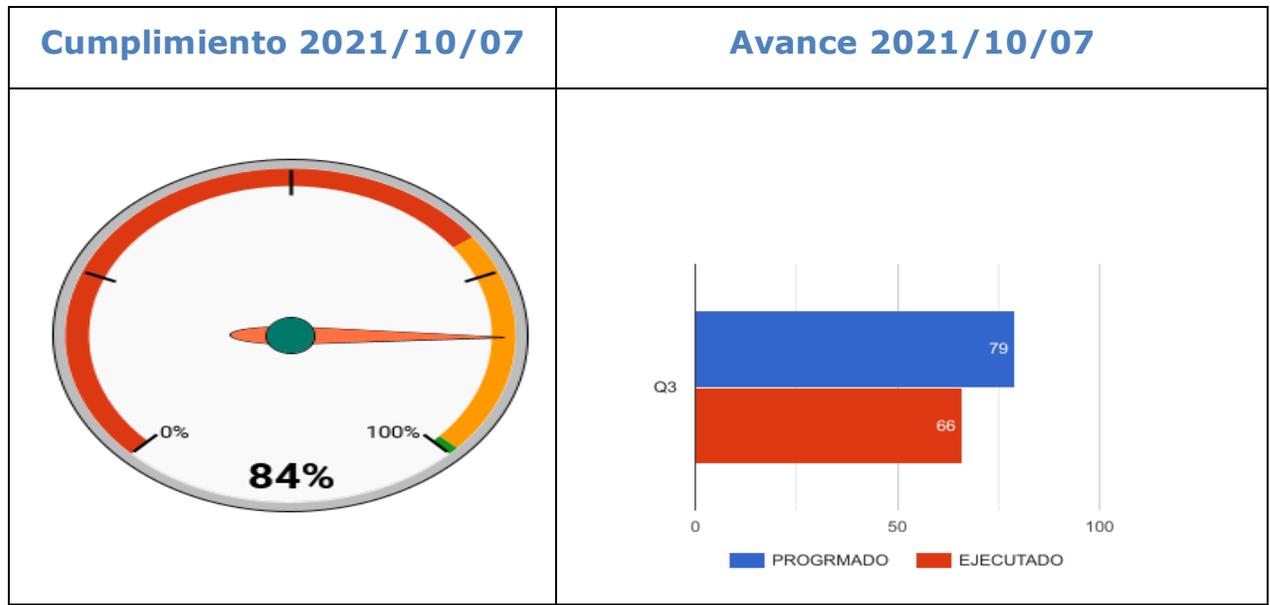

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS Portafolio/Programa/Proyecto: ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB05_Contratar obras infraestructura de acueducto	(AEB05)_Obras de Infraestructura de acueducto, contratadas	# 2	2	0	2	0	0	2
AEB06_Terminar obras infraestructura de acueducto	(AEB06)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	# 2	7	1	3	3	0	3
AEB07_Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AEB07)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas	# 2	11	1	3	3	4	3

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	(INDICADOR PEI)							
AEB08_Contratar obras infraestructura de alcantarillado	(AEC08)_Obras de Infraes-tractura de alcantarillado, contratadas	# 2	1	0	0	1	0	1
AEB09_Terminar obras infraestructura de alcantarillado	(AEB09)_Obras de Infraes-tractura de alcantarillado, terminadas	# 2	1	0	1	0	0	1
AEB10_Entregar infraestructura de alcantari-llado rehabilitada y/o reconstruida	(AEB10)_Obras de alcantari-llado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	# 2	3	1	1	1	0	0

Bitácora de Seguimiento

(AEB05)_Obras de Infraes-tractura de acueducto, con-tratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Contratación de 2 Acueductos, Nóvita - Chocó, Rehabilitación del sistema de acueducto corregimientos curundo y juntas de tamana.
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEB06)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	En el mes de marzo se cumple con el hito de terminación del acueducto de Linares
	Abril	En el mes de abril se logra la terminación de los acueductos de Dolores, Tolima, Reconstrucción del sistema de acueducto para la vereda Llanitos del municipio de Dolores y el Acueducto, Guamo - Tolima, Reconstrucción de la planta de tratamiento acueducto de la vereda Cerrogordo del municipio del Guamo Respecto al Acueducto de SAMANIEGO, NARIÑO (670-0108-ACUEDUCTO-SAMANIEGO), META 1 ACUEDUCTO, PROYECTO QUE ESTABA PROGRAMADO PARA "TERMINAR" EN ABRIL DE 2021, el proyecto se encuentra terminado desde el 01 de febrero de 2021, sin embargo, no se ha suscrito el acta de recibo pues está pendiente por resolver algunos detalles de urbanismo. Se tiene estimado tener el acta suscrita el día 31 de mayo 2021.
	Mayo	Acueducto de SAMANIEGO. Las obras físicamente de la planta de tratamiento de agua potable se encuentran terminadas al 100% pero no se realizado la puesta en marcha del sistema que permita certificar el suministro de agua potable y suscribir el acta de recibo final debido a: i) Se encuentra pendiente de que el municipio termine el proceso de trámite de conexión eléctrica de la caseta de operaciones

	<p>y ii) El contratista entregue la vía afectada con las obras de empalme en las mismas condiciones que se encontraba antes de la intervención de las obras, para ello, el Sector ha realizado distintos requerimientos al contratista pero está renuente a realizar la reparación, en caso contrario, se deberá iniciar el proceso sancionatorio por presunto incumplimiento, lo cual fue solicitado a la interventoría.</p> <p>Una vez se supere estos inconvenientes, se procederá con la suscripción del acta de recibo final de obras.</p>
Junio	<p>SAMANIEGO: Para la terminación del proyecto, está pendiente de que el municipio culmine el trámite del permiso de conexión eléctrica requerido para la caseta de operaciones, el contratista termine de reparar la vía afectada con las obras de empalme y se realicen las pruebas de calidad de agua para la puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable.</p>
Julio	<p>SAMANIEGO: El operador CEDENAR dio respuesta al municipio de la solicitud del permiso de conexión eléctrica, donde ha solicitado varios ajustes los cuales es necesario revisar con el municipio por tratarse de redes existentes. Se programará mesa de trabajo con el municipio. Hasta tanto no se realice la conexión eléctrica, no se podrá realizar la puesta en marcha de la PTAP para el recibo final de obras y entrega de la infraestructura.</p>
Agosto	<p>SAMANIEGO: El municipio ha informado que está pendiente de que el operador CEDENAR realice la conexión eléctrica que permita al contratista hacer la conexión interna, requerida para la dosificación, calibración y puesta en</p>

		<p>marcha de la planta de tratamiento de agua potable. Estas actividades son requeridas para suscribir el acta de recibo final.</p> <p>YOPAL: Teniendo en cuenta la entrega final de los productos de la consultoría estudios y diseño de las obras de integración, FINDETER ha informado que se ha prorrogado el plazo de ejecución en 4 meses para ejecutar las obras de integración, las cuales, en condiciones normales estarían terminando en octubre de 2021.</p> <p>PRADO: Actualmente no se ha logrado suscribir el acta de recibo entre la interventoría y el contratista pues el contratista no ha culminado la etapa II-construcción ni ha puesto en operación el proyecto.</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>SAMANIEGO</p> <p>El municipio no ha obtenido el permiso de conexión eléctrica del operador CEDENAR, requerido para la puesta en marcha de la planta de tratamiento. Se debe programar mesa de trabajo con el municipio y operador para dar solución a la problemática presentada.</p> <p>YOPAL</p> <p>Las obras de integración de los sistemas se encuentran pendiente de inicio por oposición de la comunidad rural La Vega. Una vez se inicie su ejecución y sean terminadas, se podrá programar la terminación parcial del funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de agua potable.</p> <p>PRADO</p> <p>El contratista se encuentre en ajustes finales para terminar las obras, de acuerdo con el plan de contingencia se prevé su terminación a</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>mediados de octubre de 2021.</p> <p>AGUACHICA</p> <p>Pendiente de la respuesta de CORPOCESAR del trámite del permiso ambiental, requerido para la reactivación del contrato previa modificación contractual de recomposición en valor y plazo para su terminación.</p>
--	--	---

Bitácora de Seguimiento

(AEB07)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se cumplió el hito de entrega del Acueducto de Cáchira
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	LINARES: El acta de entrega de infraestructura fue suscrita por el Subgerente de Proyectos el día 28 de mayo de 2021, la cual, fue remitida al municipio de Linares para su suscripción, sin embargo, al cierre del periodo no se obtuvo el acta de entrega firmada por la Alcaldesa.
	Junio	<p>LINARES: Para la suscripción del acta de entrega de infraestructura, el municipio y la comunidad solicitaron unos arreglos de algunas obras, los cuales fueron atendidos por el contratista, para lo cual, se programara visita a las obras para verificar el estado de las mismas que permita al municipio firmar el acta.</p> <p>SAMANIEGO: El proyecto no se ha terminado debido a que está pendiente de que el municipio culmine el trámite del permiso de</p>

		<p>conexión eléctrica requerido para la caseta de operaciones, el contratista termine de reparar la vía afectada con las obras de empalme y se realicen las pruebas de calidad de agua para la puesta en marcha de la planta. Una vez se suscriba el acta de recibo final, se podrá adelantar el trámite de la entrega de la infraestructura.</p> <p>DOLORES: Las obras se encuentran terminadas, el contratista hizo entrega de la documentación que soporta el acta de entrega, sin embargo, no se ha cumplido con la actualización de la totalidad de las pólizas. Se ha puesto en conocimiento a la aseguradora para que intervenga en el proceso, a fin de que el contratista cumpla con la obligación contractual, que permita la aprobación de las pólizas y proceder con la entrega de la infraestructura.</p>
	<p>Julio</p>	<p>LINARES: En el proceso de cierre de observaciones de calidad, se evidenció la necesidad de revisar la estructura lechos de secado que no operan de manera óptima, para lo cual, el contratista hará revisión y ajustes, para posterior validación de la interventoría que permita la suscripción del acta de entrega de infraestructura que fue remitida al municipio.</p> <p>SAMANIEGO: El operador CEDENAR dio respuesta al municipio de la solicitud del permiso de conexión eléctrica, donde ha solicitado varios ajustes los cuales es necesario revisar con el municipio por tratarse de redes existentes. Se programará mesa de trabajo con</p>

		<p>el municipio. Hasta tanto no se realice la conexión eléctrica, no se podrá realizar la puesta en marcha de la PTAP para el recibo final de obras y entrega de la infraestructura.</p> <p>DOLORES: A la espera de que el contratista entregue la póliza de Todo Riesgo, documento soporte requerido para el acta de entrega de infraestructura.</p>
	<p>Agosto</p>	<p>Entrega 1 Alcantarillado Chachagüí Nariño</p> <p>LINARES: Ya fueron atendidas las observaciones de calidad de obras y las relacionadas con los planos record y cantidades de obra que presentó el municipio. El municipio dio aceptación de las subsanaciones realizadas, lo que permitió programar el foro final de cierre para el 11 de septiembre de 2021. Se está a la espera de que la Alcaldesa municipal suscriba el acta de entrega de la infraestructura.</p> <p>SAMANIEGO: el municipio ha informado que está pendiente de que el operador CEDENAR realice la conexión eléctrica con la instalación del medidor que permita al contratista hacer la conexión interna, requerida para la dosificación, calibración y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable. Se están realizando mesas de trabajo con el municipio de seguimiento al cumplimiento del compromiso.</p> <p>DOLORES: Se realizó mesa de trabajo el 01 de septiembre de 2021 con la aseguradora Sura, contratista, interventoría y el Sector para revisar la argumentación de la aseguradora en no expedir la totalidad de los rubros que hacen parte de la póliza de todo riesgo. Desde el</p>

	<p>punto de vista jurídico, ya no hay interés asegurable porque las obras ya terminaron y no hubo siniestro, por lo tanto, en el acta de entrega de infraestructura se dejará la trazabilidad de lo actuado</p> <p>Se tiene previsto remitir el acta de entrega de infraestructura al ente territorial en la 4ta semana de septiembre para la suscripción.</p> <p>CUCUTA :Se llevó a cabo mesa de trabajo con el municipio de Cúcuta, donde se acordó el 2 de septiembre de 2021 realizar mesa de trabajo y visita a las obras con la participación del contratista para revisar el estado de las obras y establecer el plan de trabajo que permita concertar la entrega de las obras al municipio.</p>
<p>Septiembre</p>	<p>Entrega 1 Acueducto Linares – Nariño</p> <p>SAMANIEGO: El municipio no ha obtenido el permiso de conexión eléctrica del operador CEDENAR, requerido para la puesta en marcha de la planta de tratamiento. Se debe programar mesa de trabajo con el municipio y operador para dar solución a la problemática presentada. Una vez sea terminado con la puesta en marcha, se podrá realizar la entrega de la infraestructura.</p> <p>DOLORES: El acta de entrega de la infraestructura fue remitida al municipio 21 de septiembre de 2021, se realizó ese mismo día visita conjunta con la CGR para revisar el estado de las obras. Pendiente de que el municipio suscriba el acta.</p> <p>CUCUTA :En cumplimiento con el compromiso</p>

		<p>establecido en la mesa de trabajo del 2 de septiembre de 2021, el Fondo remitió al municipio mediante radicado No. E-2021-006494 del 13-09-21, el informe de aclaración del alcance técnico de la intervención postulada, diseñada y ejecutada, para revisión del municipio. A la espera de confirmación del municipio para mesa de trabajo para establecer las acciones que permita concertar la entrega del sistema.</p> <p>UNION PANAMERICANA :Para la entrega de estos acueductos, la entidad contratará el diagnóstico técnico y operativo para evaluar el estado físico de los sistemas que permita establecer las acciones a seguir para la entrega al municipio.</p>
--	--	---

Bitácora de Seguimiento

(AEC08)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Contratación de 1 alcantarillado en Cimitarra Santander
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEB09)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Se logro el hito de terminación del alcantarillado CHACHAGUÍ - NARIÑO
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEB10)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	SANTA LUCIA, ATLÁNTICO (215-0033-ALCANTARILLADO Y PTAR-SANTA LUCIA), META 1 ALCANTARILLADO, PROYECTO QUE ESTABA PROGRAMADO PARA "ENTREGAR" EN MARZO DE 2021. De acuerdo a la programación de metas del

(INDICADOR PEI)

plan de acción 2021, se tenía previsto a cierre primer trimestre la entrega del proyecto PTAR Santa Lucía, el cual no ha sido posible entregarlo por las siguientes circunstancias:

Este proyecto fue terminado y puesto en marcha en el primer trimestre 2019, para lo cual, se alcanzó a suscribir el acta de entrega de infraestructura con la administración municipal anterior, pero dicha acta requirió de ajustes y actualización de pólizas, lo cual se logró a finales de la vigencia 2020 cuando concluyó el otro proyecto PTAR de Campo de la Cruz.

En este sentido, el 21/12/2020 se remitió por parte del Sector al Municipio la nueva Acta de Entrega y los documentos soportes para la suscripción, reiterando nuevamente la solicitud de suscripción del Acta el 05/01/2021 mediante radicado E-2021-000020.

Se adelantó reunión el 26/03/2021 con el Sector, la Subgerencia de Proyectos, Subgerencia de Regiones y Secretaria de Planeación del Municipio, mediante la cual el Municipio informó sobre inconvenientes y dificultades presentadas en el proyecto y se comprometió a remitir un informe a más tardar el 06/04/2021 al FONDO con el concepto de la ESP

Al 06/04/2021 no se recibió informe por parte del Municipio. Se remitió comunicación por parte del Fondo al Municipio el 07/04/2021 haciendo el requerimiento del informe como insumo necesario para convocar reunión de seguimiento.

		<p>Se adelantó reunión el 14/04/2021 con el Sector, Subgerencia de Proyectos, Subgerencia de Regiones y Secretario de Planeación para la suscripción del Acta de Entrega por el Municipio, con los siguientes temas tratados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se reiteró al Municipio la necesidad de remisión al FONDO del informe de diagnóstico y transición de entrega del Municipio al Operador. 2. Una vez se reciba el informe se remitirá una respuesta oficial por parte del Fondo. 3. Se realizará una visita técnica para hacer diagnóstico y articular las capacidades del acueducto con la Triple A. <p>El Municipio no remitió al FONDO el informe con los inconvenientes y dificultades presentados en el proyecto, de acuerdo a lo mencionado en la reunión del 14/04/2021. Se reiteró al Municipio la solicitud de informe mediante comunicación E-2021-003192 del 20/04/2021</p>
	<p>Mayo</p>	<p>SANTA LUCIA: De acuerdo a la última mesa de trabajo realizada el 14 de abril de 2021 con la Secretaria de Planeación, el municipio informó sin ningún soporte que las obras presentan inconvenientes en su operación, quedando como compromiso que el municipio hiciera entrega del informe técnico sobre las observaciones, sin embargo, a la fecha no se ha recibido el mismo. Por lo cual, se requiere convocar a una nueva mesa de trabajo, para lo cual, se ha solicitado acompañamiento de la PGN.</p> <p>Por otra parte, se solicitó al municipio, informar</p>

		<p>desde que fecha se tiene la operación a cargo del nuevo prestador y hasta que fecha la anterior administración realizó la prestación de los servicios públicos domiciliarios, teniendo en cuenta que el Sector el 23/10/2019 dio respuesta a unas observaciones del municipio, las cuales, de acuerdo al informe presentado por la interventoría obedecían a la falta de actividades de mantenimiento del sistema.</p> <p>CUCUTA: Como resultado de la visita realizada el 20 de abril de 2021 a las obras, que contó con la participación del municipio, contratista e interventoría, se evidenció que ya fueron subsanadas las fallas de calidad de obras reportadas por el municipio, sin embargo, sigue pendiente la entrega de los resultados de la prueba de estanqueidad de la tubería del tramo del colector rehabilitado, prueba que no fue posible realizar debido a los inconvenientes presentados por el paro nacional. Se ha realizado el requerimiento al contratista de que la realice y entregue los resultados el 9 de junio de 2021.</p> <p>Una vez el contratista realice la prueba, se remitirá los resultados al municipio junto con el acta de entrega de infraestructura para su suscripción.</p>
	<p>Junio</p>	<p>SANTA LUCIA: A la fecha, el municipio sigue incumplimiento el requerimiento de entrega del informe con las observaciones que le impiden suscribir el acta de entrega de infraestructura. En el marco del proceso de acompañamiento que realiza la CGR, el ente de control convocará a mesa de trabajo en los primeros días de julio</p>

		<p>de 2021.</p> <p>CUCUTA (Alcantarillado): Se hizo requerimiento formal al contratista para que realizara la prueba de hermeticidad al colector rehabilitado, sin embargo, el contratista por el inconveniente del paro nacional pudo realizar la prueba a finales del mes de junio de 2021, por lo cual, se remitirá oficialmente los resultados al municipio para proceder con la suscripción del acta de entrega de infraestructura, como compromiso establecido en la visita a las obras del 20 de abril de 2021.</p>
	<p>Julio</p>	<p>SANTA LUCIA: En atención a los compromisos de la mesa de trabajo del 12 de julio, se realizó visita a las obras el 22 de julio de 2021, se identificó inconvenientes en la operación del sistema (cámara de ingreso) y falta de mantenimiento del sistema a cargo del operador. Se solicitó al municipio el informe de diagnóstico para dar respuesta al mismo y se haga entrega de las evidencias de los mantenimientos realizados, que permita la entrega de la infraestructura.</p> <p>CUCUTA: No se ha tenido respuesta del municipio respecto a los resultados de la prueba de hermeticidad del colector, requisito establecido por el municipio de aceptación del proyecto que permita la entrega de la infraestructura. Pendiente de respuesta de Seguros del Estado de solicitud cambio de beneficiario de la póliza de cumplimiento (amparo calidad y estabilidad).</p> <p>CHACHAGUI: A la espera de que el municipio</p>


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>remita el acta de entrega de infraestructura suscrita. El Sector remitirá oficio de reiteración al municipio conforme a los compromisos establecidos en el Plan Especial de Gestión (PEG) del proyecto.</p> <p>PIEDECUESTA: Se suscribió el acta de entrega de infraestructura el 27 de mayo de 2021, proyecto que no genera producto por ser segunda fase.</p>
Agosto	<p>SANTA LUCIA: La entidad realizó mesa de trabajo y visita a las obras el 22 de julio de 2021 para revisar el estado de las mismas y la funcionalidad del sistema. Se ha reiterado al municipio la necesidad de la entrega del informe de diagnóstico del sistema para dar respuesta a las observaciones que no permiten el recibo del proyecto. Por otra parte, mediante oficio E-2021-006080 del 24 de agosto de 2021, se hizo requerimiento a la interventoría de la entrega del informe de diagnóstico.</p> <p>CÚCUTA (Alcantarillado): Se está a la espera de que el municipio se pronuncie respecto a los resultados de la prueba de hermeticidad de la tubería del colector. Se ha programado mesa de trabajo para el 2 de septiembre de 2021 con el municipio para reiterar la necesidad de la suscripción del acta de entrega de infraestructura y se informe si tienen alguna otra objeción para el recibo.</p>
Septiembre	<p>SANTA LUCIA: Se actualizó el acta de entrega de la infraestructura. Teniendo en cuenta que el municipio ha operado el sistema desde marzo de 2019, se citará al señor Alcalde a</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

mesa de trabajo para suscripción del acta de entrega.

CUCUTA: Se está a la espera de que el municipio termine el proceso de revisión del acta de entrega de infraestructura entregada en mesa de trabajo del 2 de septiembre de 2021. Se ha solicitado mesa de trabajo, pendiente de que el municipio informe la fecha de la misma.

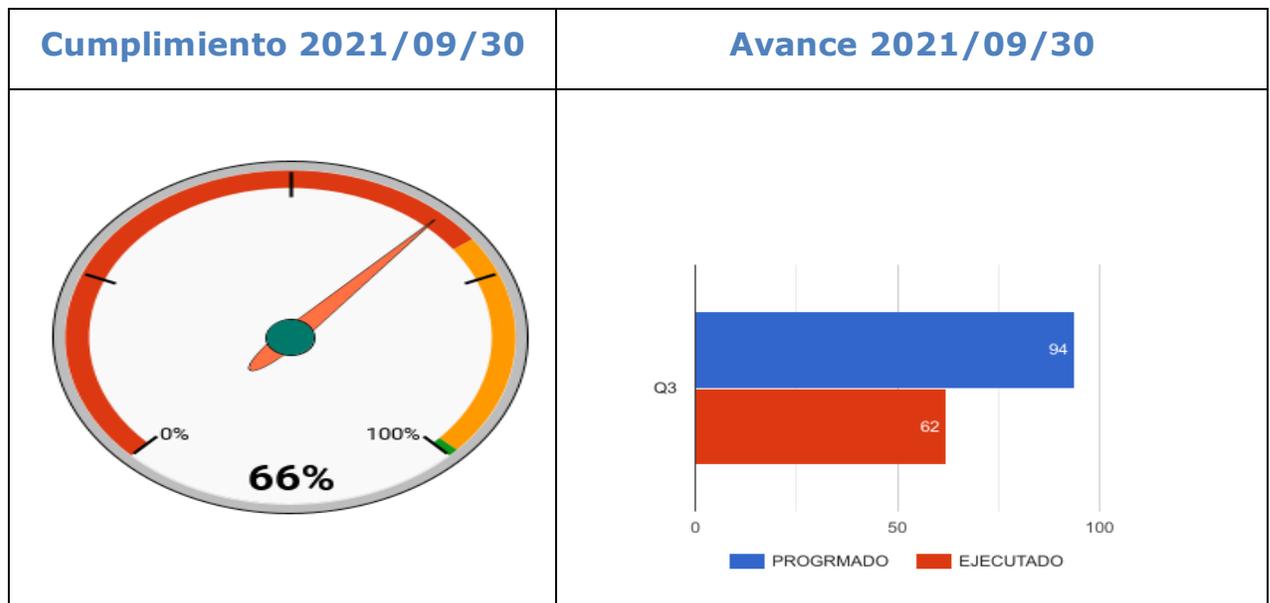

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS Portafolio/Programa/Proyecto: SALUD



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB11_Terminar obras de infraestructura de IPS	(AEB11)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	#	6	1	2	3	0	1
AEB12_Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AEB12) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	#	6	0	1	2	3	1

Bitácora de Seguimiento

(AEB11)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se carga el 05/04/2021 el acta de terminación del Hospital de Gramalote, la cual fue suscrita el 20/03/2021, dando cumplimiento a la meta de terminación.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	<p>Terminación Fase Ejecución de la ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA - GUARANDA/SUCRE: Se indica que debido a las situaciones de orden público que obligaron a suspender el contrato desde el día 28 de abril de 2021 y hasta el 26 de junio de 2021, no se pudo ejecutar la terminación de las actividades y ha sido necesario aceptar la solicitud de prórroga enviada por el contratista. A la par, en este momento se encuentra proceso de evaluación la selección de los proveedores para la dotación de equipos biomédicos para el proyecto. De esta forma, se hace necesario modificar la fecha para el mes de Octubre de 2021.</p> <p>Terminación Fase Ejecución de la IPS CENTRO DE SALUD DE LA GABARRA - TIBÚ / N. DE SANTANDER: Se indica que debido a las situaciones de orden público desde el día 28 de abril de 2021 y hasta la fecha, la Administración municipal no ha podido realizar el movimiento de la maquinaria amarilla para ejecutar las adecuaciones de endurecimiento</p>


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		de la zona de acceso vehicular y peatonal, responsabilidad de la Administración Municipal. Así mismo, si bien es cierto que las obras a cargo del contratista se encuentran terminadas, debido a las situaciones de orden público señaladas, el contratista no ha podido ingresar a la zona con el certificador RETIE para ejecutar la última visita y obtener el concepto favorable para proceder a la energización definitiva.
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(AEB12) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Se realiza el cargue del acta de entrega de la ESE de Gramalote el día 29/04/2021
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

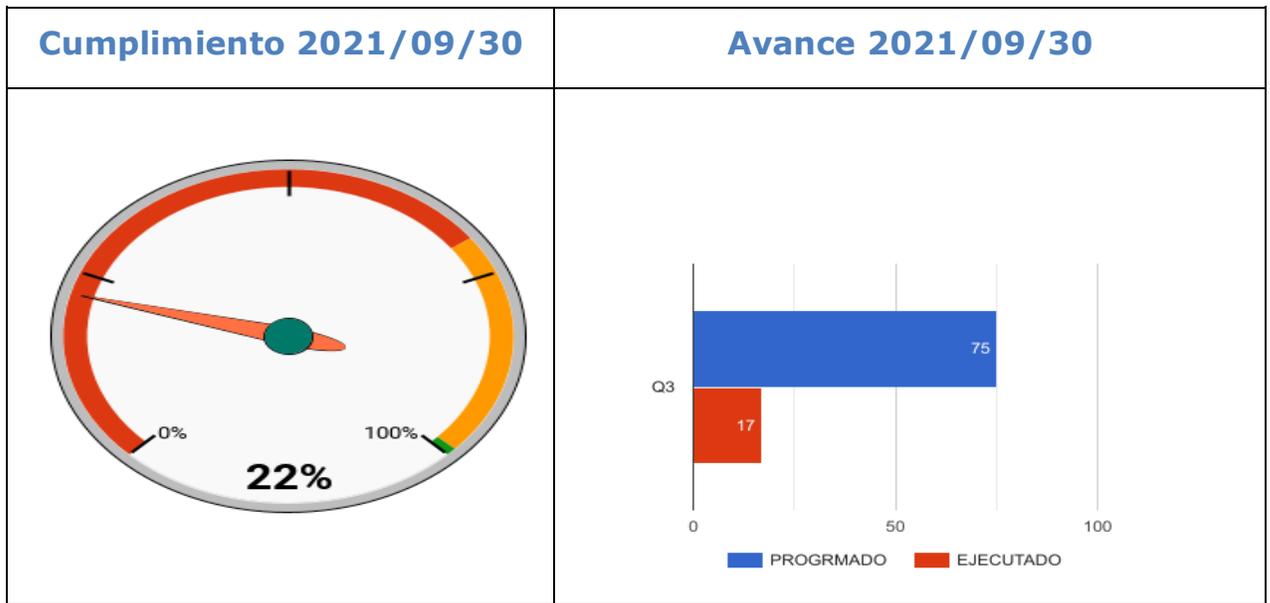


4.3. Área Subgerencia de Estructuración

En la Subgerencia de Estructuración, se gestionan las acciones relacionadas con la estructuración técnica y financiera de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:



Las gráficas a continuación muestran la relación de los indicadores formulados para la Subgerencia de Estructuración en la vigencia 2021 trimestre a trimestre, adicionalmente, el avance cuantitativo total.

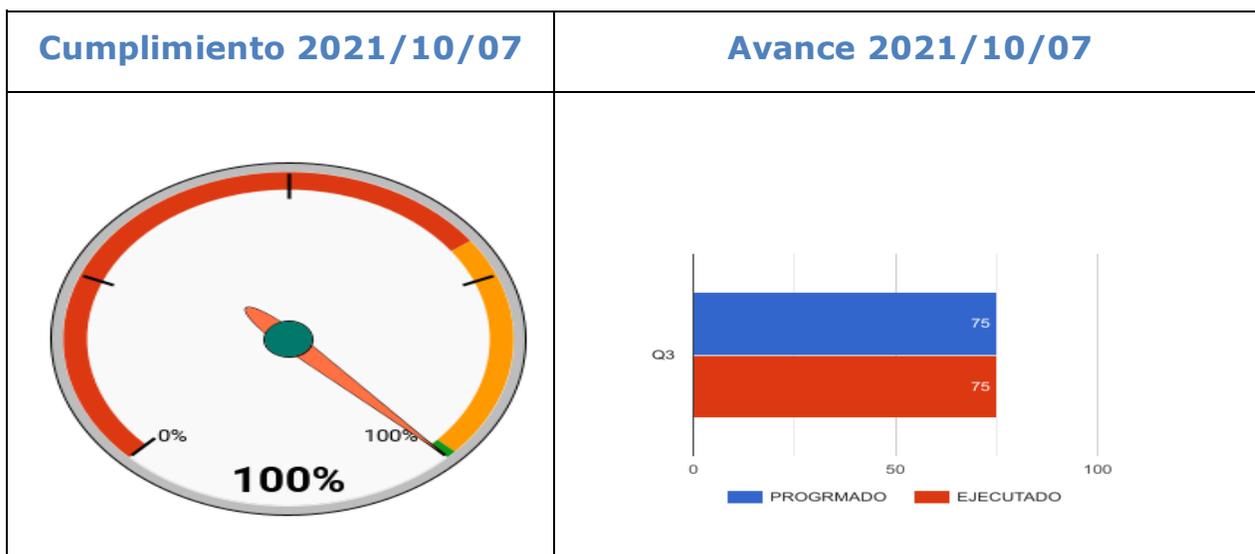

Área/Portafolio: ÁREA C – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Portafolio/Programa/Proyecto: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Estructurar el 100% de los estudios de sector y mercado de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y macroproyectos	Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	# 2	400	100	100	100	100	300
Evaluación técnica, financiera y económica de las diferentes modalidades de contratación de la Entidad.	Procesos evaluados técnica y financ./Evaluaciones designadas por SG	# 2	400	100	100	100	100	300
Identificar y / o establecer y/o actualizar políticas y lineamientos, para la priorización y/o estructuración de los	Proyectos o lineamientos identificados o analizados/Proyectos o lineamientos	# 2	400	100	100	100	100	300

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

proyectos desfinanciados y/o nuevos proyectos de la Entidad	nuevos o desfinanciados							
Revisión ítems o APU's contractuales adicionales / no previstos de los contratos en ejecución	Revisión ítems o APU's contratos/Modificaciones contractuales	# 2	400	100	100	100	100	300

Bitácora de Seguimiento

Estudios de sector y mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	Enero	<p>Durante el mes de Enero, la Subgerencia de Estructuración asesoro y realizo los respectivos estudio de mercado de los procesos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los insumos recibidos por las diferentes áreas de la entidad, a continuación se detallan los procesos:</p> <p>Rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y Juntas de Tamaná, municipio de Novitá- Choco</p>
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>Durante el mes de Marzo, la Subgerencia de Estructuración asesoro y realizo los respectivos estudios de mercado de los procesos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los insumos recibidos por las diferentes áreas de la entidad, a continuación se detallan los procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar la interventoría integral para la actualización de los diseños y realizar las obras de reforzamiento y reconstrucción de los diques margen izquierda del río cauca: sectores comfenalco y floralia, margen derecha del río cali: sector río cali, así como la construcción de obras complementarias, para la disminución del riesgo contra inundaciones por desbordamiento, licuación y corrimiento lateral, en el municipio de Santiago de Cali. Aunar esfuerzos entre el Fondo y el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote, a fin de adelantar el proceso de

	<p>consulta previa ordenado por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Cartagena Sala Laboral, mediante el fallo de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, en relación con las obras preventivas de mitigación del riesgo por inundación realizadas en Gambote municipio de Arjona Bolívar dentro del Macroproyecto de Canal del Dique.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica para la reconstrucción del sistema de alcantarillado en la avenida de la paz del casco urbano del municipio de cimitarra-santander • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Atlantico
Abril	Sin registro de avance en el indicador
Mayo	<p>Durante este periodo, la Subgerencia de Estructuración realizo los siguientes estudios de sector y mercado de acuerdo con la necesidades técnicas radicadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compraventa de vivienda para el municipio de Sucre-Sucre, radicado mediante memorando I-2021-002595 del 13 de mayo. • Compraventa de vivienda para el municipio de Manaure-La Guajira, radicado mediante memorando I-2021-002663 del 19 de mayo. • Compraventa de vivienda para el municipio de Uribia-La Guajira, radicado mediante memorando I-2021-002668 del 19 de mayo.. • Obras para la terminación de viviendas del municipio de Gramalote, radicado mediante I-2021-002743 del 24 de mayo.

		Se estructuraron todos los procesos previstos durante los meses de abril y mayo.
	Junio	<p>Durante el mes de junio, a la Subgerencia de Estructuración se le designaron las siguientes evaluaciones financieras y económicas por parte de la Secretaria General:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación financiera y económica de FA-CMA-I-S-002-2021 cuyo objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental de la rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de curundó y juntas de tamaná, municipio de nóvita – departamento del chocó" • Evaluación financiera y Económica del proceso Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para la e.s.e. centro de salud de Guaranda en el departamento de sucre
	Julio	<p>Durante este periodo, se realizaron los siguientes estudios de sector para los proyectos que tiene por objeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proveer soluciones de vivienda en el departamento de Cundinamarca, municipio de Viotá • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Risaralda, municipio de Dosquebradas • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de norte de Santander" • Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para las ips empresa social del

		<p>estado suroriente e.s.e del municipio de la vega y empresa social del estado norte 3 – ese del municipio de puerto tejada en el departamento del cauca y centro de salud Saul quiñones e.s.e. del municipio de magui payan en el departamento de Nariño.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar acompañamiento socioeconómico a las familias beneficiarias del programa de vivienda del Fondo Adaptación en la modalidad de reubicación en la zona de la Mojana mediante la estructuración, implementación y asistencia técnica de las medidas tendientes a la recuperación de las redes económicas y sociales de la población. • Contratar la compra de elementos ergonómicos para los colaboradores del Fondo Adaptación
	<p>Agosto</p>	<p>Durante este periodo, se realizaron los siguientes estudios de sector para los proyectos que tiene por objeto de acuerdo con las necesidades técnicas radicadas en la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suministro instalación y capacitación del kit de videoconferencia para Gerencia • Realizar acompañamiento socioeconómico a las familias beneficiarias del programa de vivienda del Fondo Adaptación en la modalidad de reubicación en la zona de la Mojana mediante la estructuración, implementación y asistencia técnica de las medidas tendientes a la recuperación de las redes económicas y sociales de la población • Aunar esfuerzos administrativos y financieros para la ejecución del proyecto de dotación de la infraestructura de las IPS de

		<p>Magui Payan y La Tola en el Departamento de Nariño, las cuales se encuentran en fase de construcción por parte del FONDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para las ips empresa social del estado suroriente e.s.e del municipio de la vega y empresa social del estado norte 3 – ese del municipio de puerto tejada en el departamento del cauca y centro de salud Saul quiñones e.s.e. del municipio de Magui payan en el departamento de Nariño. • Adquisición y/o renovación de certificado digital para los usuarios del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación • Contratar el suministro de los elementos de emergencia para la Sede Fondo Adaptación
	Septiembre	<p>Durante el mes de septiembre, se estructuro el siguiente estudio de sector de acuerdo con la necesidad técnica radicada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestar el servicio continuo de auditoría técnica integral con enfoque preventivo (atip), sobre los actos y contratos que ejecute el fondo adaptación en el marco de sus procesos misionales.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	<p>Durante el mes de enero, se delego a la Subgerencia de Estructuración la siguiente evaluación financiera:</p> <p>Construcción de las obras faltantes de control de inundaciones en el Municipio de Santa Lucia, area de influencia de Canal de Dique.</p>
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Procesos evaluados técnica y financ./Evaluaciones designadas por SG	Marzo	<p>Durante el mes de marzo se asignaron a la Subgerencia de Estructuración las evaluaciones financieras de los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para la e.s.e. Camu canalete en el departamento de Córdoba.• Rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de Curundó y juntas de tamaná, municipio de Nóvita – departamento del Chocó”
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	<p>Durante el mes de mayo, a la Subgerencia de Estructuración se le designaron las siguientes evaluaciones financieras por parte de la Secretaria General:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar la actualización de los diseños y la construcción de las obras de reforzamiento y reconstrucción de los diques margen izquierda río cauca, sectores comfenalco y floralia, margen derecha del río Cali sector río Cali, y obras complementarias, para la disminución del riesgo contra inundaciones por desbordamiento, licuación y corrimiento lateral, en el municipio de Santiago de Cali• Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica para la reconstrucción del sistema de alcantarillado en la avenida de la paz del casco urbano del municipio de Cimitarra-Santander• Prestar servicios para la administración

	<p>de redes, elaboración de piezas graficas y realización de contenidos para redes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventoria de Novita
Junio	<p>Durante el mes de junio, a la Subgerencia de Estructuración se le designaron las siguientes evaluaciones financieras y económicas por parte de la Secretaria General:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación financiera y económica de FA-CMA-I-S-002-2021 cuyo objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental de la rehabilitación del sistema de acueducto de los corregimientos de curundó y juntas de tamaná, municipio de nóvita – departamento del chocó" • Evaluación financiera y Económica del proceso Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para la e.s.e. centro de salud de Guaranda en el departamento de sucre
Julio	<p>Durante el mes de julio, a la Subgerencia de Estructuración se le designo la evaluación financiera y económica por parte de la Secretaria General de los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para la e.s.e. centro de salud de Guaranda en el departamento de Sucre • construcción, terminación y entrega de las viviendas faltantes, del nuevo casco urbano del municipio de gramalote en el departamento de norte de Santander.
Agosto	<p>Durante el mes de agosto, a la Subgerencia de Estructuración se le designo la evaluación financiera de los siguientes procesos:</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para la e.s.e. centro de salud de Guaranda en el departamento de Sucre. • Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación de equipamiento hospitalario para e.s.e centro de salud la gabarra en el departamento de norte de Santander.
	Septiembre	Durante este periodo, no se le asignaron designacion de evaluaciones a la Subgerencia de Estructuración.

Bitácora de Seguimiento

Proyectos o lineamientos identificados o analizados/Proyectos o lineamientos nuevos o desfinanciados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Durante el mes de febrero, La Subgerencia de Estructuración lideró la actualización de los Lineamientos para la Compraventa de Vivienda Nueva -Instructivo 4-GPY-I-15-. La gestión realizada finalizó con la publicación de la versión 2 de este instructivo el día 22 de febrero 2021, después de realizar todo el proceso de revisiones y aprobaciones respectivo.
	Marzo	La Subgerencia de Estructuración lideró la actualización de los Lineamientos para la Compraventa de Vivienda nueva -Instructivo 4-GPY-I-15 versión 2 oficialmente publicado. Actualmente, se encuentra trabajando en la elaboración del Instructivo para Compraventa de Vivienda Usada.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Mayo	Durante el mes de mayo, se adelantaron mesas de trabajo con la Secretaria General para analizar los procesos que se han adelantado para la terminación o reconstrucción de las obras y así poder aplicar estos criterios en los futuros casos que se presenten en la entidad. Recomendaciones para la contratación de obras inconclusas.
	Junio	Durante este mes, la subgerencia de Estructuración gestiona internamente la formalización de la actualización de los lineamientos de calidad de las obras mediante la aprobación de la propuesta del manual de calidad.
	Julio	Durante el mes de julio, Se completó la elaboración del instructivo para las compraventas de vivienda usada el cual se encuentra en revisión por parte de la Secretaria General
	Agosto	Durante el mes de agosto, se presentó la modificación al instructivo de compraventa de vivienda nueva, el cual fue aprobado en comité de desempeño del 20 de agosto y fue registrado en el mapa de procesos de la entidad quedando ya en firme su aplicación.
	Septiembre	Durante el mes de septiembre, se logró la publicación de los lineamientos de calidad de las obras mediante, 4-GPY-M-08. Versión 1.0

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Durante el mes de enero, se establecieron los siguientes APU No Previstos: - Adición interventoría Hospital de Mahates por prórroga ocasionada por Covid
--	-------	---

<p>Revisión ítems o APU's contratos/Modificaciones contractuales</p>		<p>- Adición interventoría Viviendas Nariño por prórroga ocasionada por Covid</p>
	<p>Febrero</p>	<p>Durante el mes de febrero se asignaron a la subgerencia de estructuración la revisión de los siguientes ítems y APUS no previstos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Revisión adición por covid-19 contrato de interventoría fa-cd-i-s-138-2018, celebrado entre el fondo adaptación y gustavo Adolfo torres duarte para "realizar la interventoría integral al contrato de obra para la construcción del hospital del cincuentenario nivel i ese norte 3, en el municipio de puerto tejada, departamento de Cauca. 2.Revisión APU no previstos contrato fa-ic-i-s-213-2018, celebrado entre el fondo adaptación y la unión temporal puentes 2019 para la ejecución del proyecto "terminación puente vehicular la colorada ubicado en la via Sacama - la Cabuya - Saravena en el departamento de Arauca. 3.Revisión APU no previstos - paps contrato FA-IC-I-S-213-2018, celebrado entre el fondo adaptación y la unión temporal puentes 2019 para la ejecución del proyecto "terminación puente vehicular la colorada ubicado en la via -Sacama - la Cabuya - Saravena en el departamento de Arauca." 4.Revisión adición por covid-19 contrato de interventoría FA-CD-I-S-031-2018, celebrado entre el fondo adaptación y proyectos y gestión del desarrollo SAS para

		<p>realizar la interventoría integral al contrato de obra para la construcción del "hospital del nivel i de la vega-ese suroriente", en el municipio de la Vega, departamento de Cauca.</p> <p>5. Revisión presupuesto contrato no. FA-IC-I-S-351 de 2019 celebrado entre el fondo adaptación y el consorcio infraestructura educativa 2019 para la "Contratación de los estudios, diseños y construcción de la infraestructura educativa en los departamentos Bolívar, Sucre y Magdalena, afectadas por el fenómeno de la niña 2010 - 2011", IE Achí - Bolívar.</p>
	Marzo	<p>Durante el mes de marzo se asignaron a la Subgerencia de Estructuración la revisión de los siguientes items y apus no previstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de obra FA-IC-I-S-353-2019, celebrado entre el Fondo Adaptación y el consorcio Tolima 2019 para la "reconstrucción de los sistemas de acueducto vereda llanitos - municipio dolores, sistema de acueducto vereda la esperanza - municipio Murillo, cambio de trazado de la línea de conducción sistema acueducto vereda tortugas - municipio de prado y reconstrucción de la planta de tratamiento acueducto vereda cerrogordo - municipio de el guamo, departamento de Tolima.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	<p>Durante el mes de mayo, se asignaron a la Subgerencia de Estructuración la revisión de los siguientes APUS No Previstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión presupuesto del convenio aunar

		<p>esfuerzos para adelantar actividades encaminadas para la conducción de las aguas tratadas del colegio integrado camacho carreño al río suratá, localizado en el municipio de Suratá – Santander</p> <p>- Revisión apu no previstos del contrato de obra FA-IC-I-S-108 de 2019 celebrado entre el fondo adaptación y fernando ramirez s.a.s. para la ejecución del proyecto “terminación de la construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011, en el departamento del Magdalena grupo 3 - i. e. básico ampliado de bomba, Pedraza (Magdalena)</p> <p>Revisión APU no previstos contrato de obra fa-ic-i-s-353-2019</p>
	<p>Junio</p>	<p>Durante el mes de junio, se asignaron a la Subgerencia de Estructuración la revisión de los siguientes APUS No Previstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de obra publica no. fa-ic-i-s-244-2019 cuyo objeto es “obras para la reconstrucción del sistema de acueducto (bocatoma, aducción, tratamiento preliminar y obras adicionales), del municipio de Aguachica, departamento del Cesar”. • Contrato de obra pública no. FA-IC-I-S-064-2020 cuyo objeto es “realizar la ejecución y entrega de las obras requeridas para la construcción de los equipamientos denominados escenario deportivo y casa del adulto mayor en el municipio de gramalote departamento de Norte de Santander”.

		<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de obra FA-IC-I-S-210 de 2018 celebrado entre el fondo adaptación y el consorcio itiel para la ejecución del proyecto "terminacion de la construccion de la infraestructura educativa afectada por el fenomeno de la niña 2010-2011 en el departamento de Magdalena, grupo 2". • Contrato de obra fa-ic-i-s-087-2019 celebrado entre el Fondo Adaptación y el consorcio arcoci atlántico para la ejecución del proyecto "construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011, en el departamento del Atlántico". • Contrato de obra FA-IC-045-2018 celebrado entre el Fondo Adaptación y Fernando Ramírez S.A.S. para la ejecución del proyecto "terminación de la construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010 -2011, en el departamento de Magdalena" • Contrato de obra fa-sa-mc-i-s-002-2020 celebrado entre el Fondo Adaptación y Constructora VMJ S.A.S. para la ejecución del proyecto "construcción de las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de Santa Lucia, área de influencia del Canal del Dique".
	Julio	<p>Durante el mes de julio, se asignaron a la Subgerencia de Estructuración la revisión de los siguientes APUS No Previstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de obra pública no. fa-ic-i-s-358-2019, cuyo objeto es "realizar la ejecución y entrega de las obras requeridas para la

		<p>construcción de los equipamientos denominados casa de la cultura y casa del campesino en el municipio de Gramalote departamento de Norte de Santander”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de obra FA-IC-045-2018 celebrado entre el Fondo Adaptación y Fernando Ramírez S.A.S. para la ejecución del proyecto “terminación de la construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010 -2011, en el departamento de Magdalena” • Contrato de obra FA-SAMC-I-S-002-2020 celebrado entre el Fondo Adaptación y constructora VMJ S.A.S. para la ejecución del proyecto “construcción de las obras faltantes de control de inundaciones en el municipio de Santa Lucia, área de influencia del Canal del Dique • Contrato de obra pública no. FA-IC-I-S-244-2019 cuyo objeto es “obras para la reconstrucción del sistema de acueducto (bocatoma, aducción, tratamiento preliminar y obras adicionales), del municipio de Aguachica, departamento del Cesar”.
	Agosto	<p>Durante el mes de agosto, se realizó la revisión de los siguientes APUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión costos de adición por mayor permanencia de interventoría Contrato No. 234 de 2016, interventoría integral a la ejecución de los contratos de reubicación o reconstrucción en sitio de viviendas en algunos municipios del departamento de Magdalena • Contrato no. 158 de 2017, celebrado

		<p>entre el Fondo Adaptación y la sociedad ingeniería master S.A.S., que tiene como objeto “realizar la interventoría integral a los contratos de reubicación de vivienda en el municipio de Achí – Bolívar y reubicación y reconstrucción en sitio de las viviendas en el municipio de Santa Lucia – Atlántico”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato no. 153 de 2017 celebrado entre el Fondo Adaptación y el consorcio nuevo Achí para la ejecución del proyecto “reubicación de viviendas en el municipio de Achí departamento de Bolívar” • Revisión del informe técnico y jurídico para reconocimiento de costos de interventoría por mayor permanencia, asociados a la prórroga del contrato de obra 107 de 2013, contrato de interventoría no. 019 de 2014, celebrado entre el Fondo Adaptación y HMV ingenieros limitada, para la ejecución de la interventoría integral de la construcción de 43 proyectos educativos en los departamentos de Magdalena, Guajira y Cesar.
	<p>Septiembre</p>	<p>Durante el mes de septiembre, se realizó la revisión de los siguientes APUS por parte de la Subgerencia de Estructuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato no. 234 de 2016, interventoría integral a la ejecución de los contratos de reubicación o reconstrucción en sitio de viviendas en algunos municipios del departamento de Magdalena • Contrato de obra No. 251 de 2017, cuyo objeto es “construcción del hospital del cincuentenario nivel I ese norte 3, en el

municipio de Puerto Tejada, departamento del Cauca, incluyendo la actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías”.

- Contrato de obra No. 300 de 2017, cuyo objeto es “construcción del hospital Nivel I de la Vega – ese suroriente, en el municipio de la Vega, departamento del Cauca, incluyendo actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías”.

- Contrato de obra No. 300 de 2017, cuyo objeto es “Construcción del hospital nivel I de la Vega – ese suroriente, en el municipio de la Vega, departamento del Cauca, incluyendo actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías”.


- Contrato No. 153 de 2017 celebrado entre el Fondo Adaptación y el consorcio nuevo achí para la ejecución del proyecto “reubicación de viviendas en el municipio de Achí departamento de Bolívar”

- Contrato de obra pública no. FA-IC-I-S-151-2020, cuyo objeto es “rehabilitación sistema tratamiento de aguas residuales municipio de Candelaria – Atlántico

- Contrato de obra publica no. FA-IC-I-S-358-2019, cuyo objeto es “realizar la ejecución y entrega de las obras requeridas para la construcción de los equipamientos denominados casa de la cultura y casa del campesino en el municipio de Gramalote, departamento de Norte de Santander”.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

- Contrato no. FA-CD-I-F-031-2018, celebrado entre el Fondo Adaptación y proyectos y gestión del desarrollo S.A.S., que tiene como objeto "realizar la interventoría integral al contrato de obra para la construcción del hospital nivel I de la Vega – E.S.E. suroriente, en el municipio de la Vega, departamento del Cauca, incluyendo actualización y ajuste a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías".
- Contrato de interventoría No. 082 de 2015, celebrado entre el Fondo Adaptación y G.O.C. sucursal colombia, que tiene como objeto "realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental, sobre el contrato de obra para la construcción de la IPS Saúl Quiñones del municipio de Maguí Payán, departamento de Nariño".

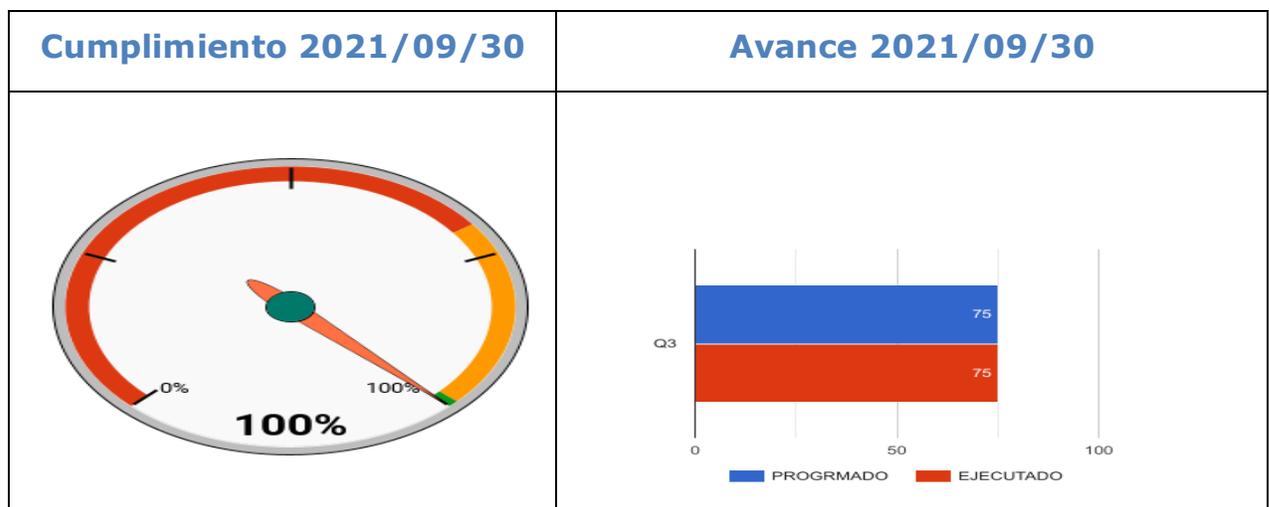

5. Seguimiento Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales

Perspectiva Externa:

OE1. Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

OE2. Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

OE3. Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.


OE4. Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población.

Perspectiva Interna:


OE5. Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

OE6. Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

Objetivo Estratégico #5: Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

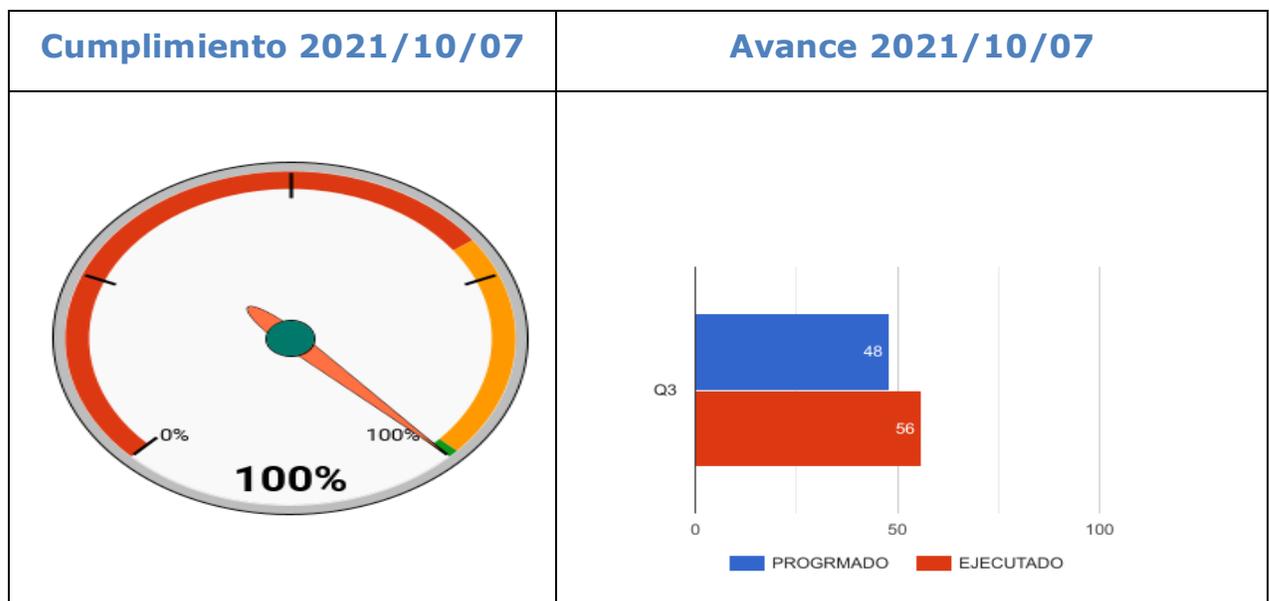

Objetivo Estratégico #6: Modernizar y fortalecer el Funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

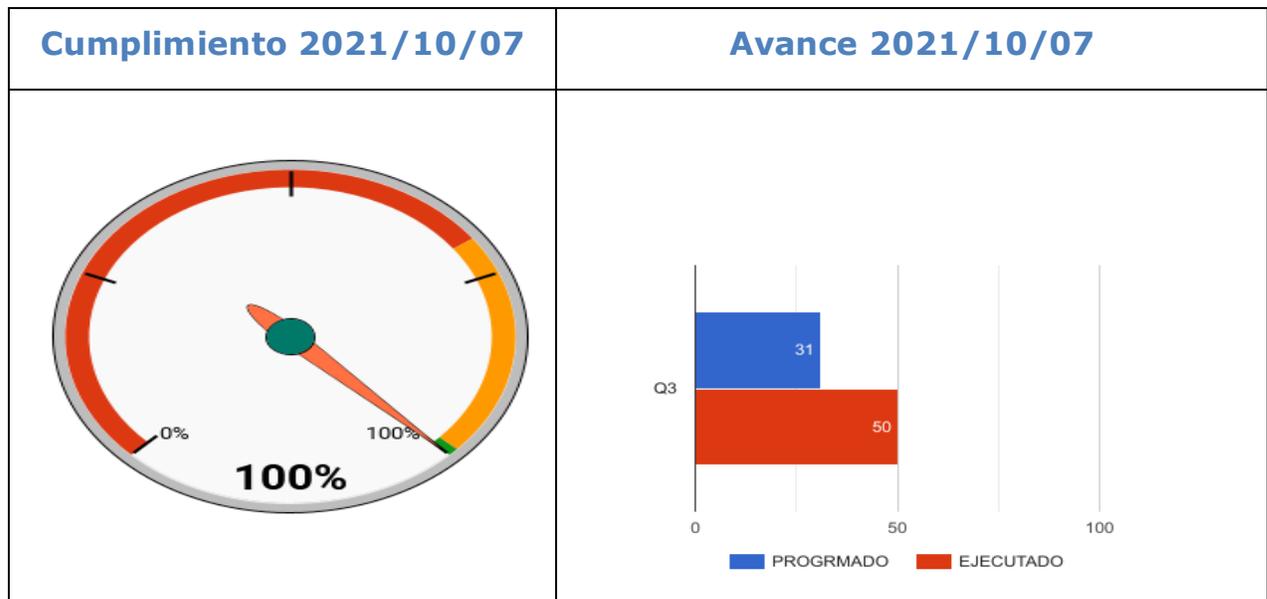


5.1 Avances cierre de brechas Políticas MIPG

Resultados MIPG / FURAG

Como insumo de plan se observaron los atributos mínimos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) establecido por la Función Pública y demás entidades líderes de política, haciendo énfasis en aquellas iniciativas que agregan valor a la misión y fortalecen las capacidades institucionales para el logro de los objetivos estratégicos.

Con corte a 2019 y a través del Formulario Único de Avances a la Gestión FURAG, se llevó a cabo la evaluación de la gestión institucional del Fondo Adaptación con base al MIPG, la cual arrojó los siguientes resultados por cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño del modelo. Estos resultados se tomaron como base para la formulación de acciones en los planes relacionados en el punto 6 – anexos, los cuales están encaminados al cierre de brechas en cada una de las políticas, atendiendo los límites de recursos humanos, técnicos y financieros:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

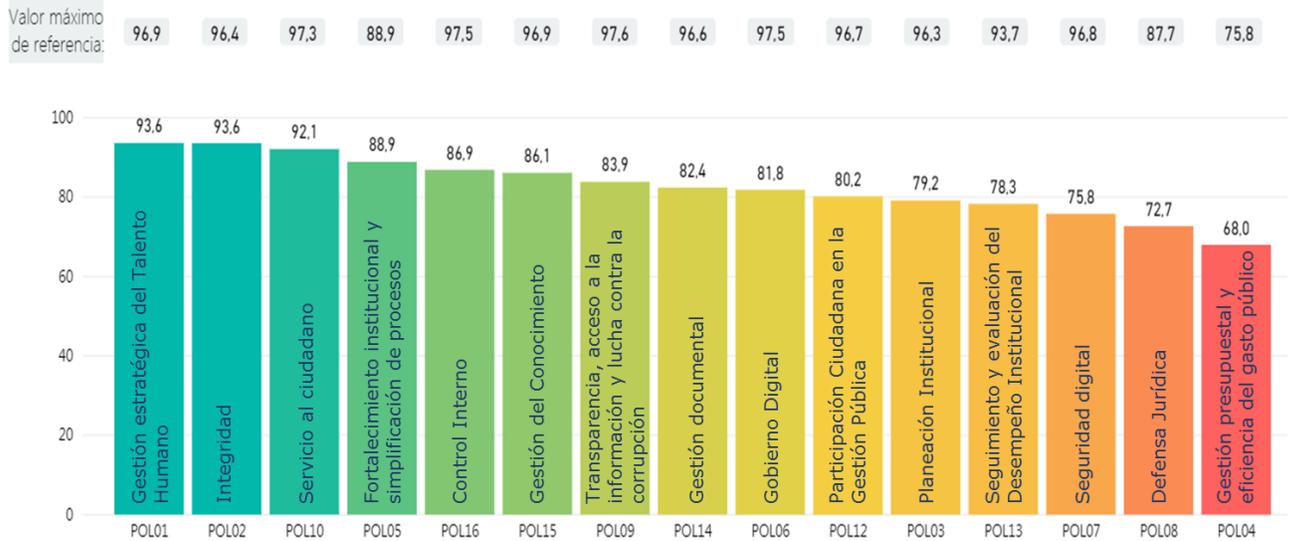

5.2 Área D: Subgerencia de Regiones



Fondo Adaptación

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Área/Portafolio: **ÁREA D – SUBGERENCIA DE REGIONES**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN SOCIAL**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES)	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES), implementada	# 4	166	30	40	40	56	119
Implementar la Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social* (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales)	Política de Interacción y Sostenibilidad Social (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales), implementada	# 4	250	50	60	60	80	196
Realizar seguimientos a	Seguimientos a las	#	12	3	3	3	3	9

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana	oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, realizados	4						
Ejecutar estrategia del proceso de revocatoria de viviendas	Estrategia del proceso de revocatoria de viviendas ejecutada (averiguaciones preliminares, cierres de investigación y acompañamientos sociales)	# 4	300	75	75	75	75	355

Bitácora de Seguimiento

Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Espacios de participación - Auditorías visibles y CORES), implementada	Enero	Participación Ciudadana, se da cumplimiento este mes así: Auditoria Visibles 2, Fortalecimiento ELS 5, Cores 1 por sector.
		Sector Vivienda: 1 Fortalecimiento ELS: para el proyecto Reconstrucción en sitio propio Ayapel 13/01/2021
		Sector Salud: tres (3) fortalecimiento al ELS en los proyectos de: Hospital de la Vega, Cauca - Puerto Tejada, Cauca -Centro de salud de Guaranda, Sucre. Acompañamiento a una AV del proyecto IPS la Gabarra.
	Sector Educación:	un Fortalecimiento

		<p>ELS:20/01/2021 IE San Juan Bautista de Pisa - Majagual Sucre y una AV Acompañada 21/01/2021 - Foro 50% de la Sede IE Policarpa Salavarrieta - Plato, Magdalena.</p> <p>Finalmente se lleva a cabo el primer CORES para el departamento del Valle del Cauca temas del sector Vivienda el día 28/01/2021</p>
	<p>Febrero</p>	<p>Participación Ciudadana: 13: 4 AV; 8 Espacios de Fortalecimiento ELS; 1 Cores. Por sector el</p> <p>Sector Vivienda: Fortalecimiento ELS: 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación ELS - Reconstrucción de Vivienda en sitio Ayapel Córdoba - 24/02/2021. 2. Capacitación ELS - Reconstrucción y / o Reubicación de Viviendas- C- 2016-213 Tenerife - Magdalena - 09/02/2021 3. Capacitación ELS - Reconstrucción y / o Reubicación de Viviendas- C- 2016-213 Tenerife - Magdalena - 12/02/2021 4. Reubicación en el municipio de San Benito Abad - Sucre - C-2016-188 - 05/02/2021. <p>Sector Salud. Fortalecimiento al ELS 2: Hospital de la Vega, Cauca; Centro de salud de Guaranda, Sucre. AV Acompañados 2: - Auditoria visible acompañada del proyecto Centro de salud Guaranda; - Auditoria visible acompañada del proyecto Hospital Puerto Tejada</p> <p>Sector Acueducto: Fortalecimiento al ELS: 2: -Fortalecimiento a ELS Guamo. - Fortalecimiento a ELS Dolores. AV Acompañados 2: Acompañamiento a Foro</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>intermedio Guamo -Acompañamiento a Foro intermedio Dolores</p> <p>CORES. 2/02/2021 Departamento de Sucre – municipios Guaranda y Majagual Sector Salud</p>
Marzo	<p>Participación Ciudadana 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AV acompañadas: 6 - Fortalecimiento ELS: 12 <p>Por sector los espacios fueron los siguientes:</p> <p>Sector Vivienda. Fortalecimiento ELS: 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación ELS Urbanización San Francisco - Mallama - Nariño, 4/03/2021 - Capacitación ELS Urbanización San Francisco – Mallama - Nariño 04/03/2021 - Capacitación ELS Proyecto Reubicación San Benito Abad - Sucre 09/03/2021. - Capacitación ELS Proyecto Reubicación Caimito - Sucre 18/03/2021. - Capacitación ELS Proyecto Reconstrucción en sitio - Ayapel - Córdoba, 25/03/2021 - Capacitación ELS Urbanización San Francisco - Mallama - Nariño 17/03/2021 - Capacitación ELS Urbanización Sueños de Paz - Los Andes Sotomayor - Nariño 18/03/2021 <p>Sector Salud. Fortalecimiento al ELS 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPS La Gabarra- Norte de Santander <p>AV Acompañados 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foro del 50% Hospital de Puerto Tejada Cauca - Foro del 50% Hospital de la Vega - Cauca <p>Sector Reactivación</p> <p>AV acompañadas: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reactivación - Acompañamiento Foro de Seguimiento Reactivar Agrícola Cauca - Balboa Cauca Vereda Lomitas <p>Sector Educación. Fortalecimiento ELS 1</p>

	<p>- Capacitación ELS IED Pijiño del Carmen 09-03-2021</p> <p>Auditorias Visibles Acompañadas 2</p> <p>- Acompañamiento a Foro Inicial IE de Guaranda, Guaranda - Sucre 24-03-2021</p> <p>- Acompañamiento a Foro Inicial IE Técnico Agropecuario Puerto Venecia 24-03-2021</p> <p>Macroproyecto Mojana Fortalecimientos al ELS 2. Temática Mecanismos de Participación ciudadana, el día 17 de marzo se hizo capacitación en el municipio de Magangué y el día 25 de marzo en el municipio de San Marcos.</p> <p>Sector Acueducto: AV Acompañados 1. Foro 50% Prado. Tolima.</p>						
Abril	<p>Para el cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana durante el mes de abril se acompañaron 2 AV en el Sector Salud, a los proyectos: Foro de seguimiento Hospital de la Vega – Cauca y Mesa de Gestión Interinstitucional IPS Gabarra- Norte de Santander. Además, se realizó el fortalecimiento de 8 ELS, en los sectores de Vivienda, en los proyectos: NARIÑO LOS ANDES SOTOMAYOR, NARIÑO, MALLAMA, y en NARIÑO LOS ANDES SOTOMAYOR, y dos Sucre San Benito Abad. Así como en el sector Salud, en los proyectos de Hospital de la Vega – Cauca y Hospital de Puerto Tejada Cauca. Finalmente, el sector educación realizó un fortalecimiento en la Sede CE Básico Ampliado de Bomba en Pedraza.</p>						
Mayo	<table> <tr> <td>Participación Ciudadana</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- AV acompañadas:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>- Fortalecimiento ELS:</td> <td>3</td> </tr> </table>	Participación Ciudadana		- AV acompañadas:	2	- Fortalecimiento ELS:	3
Participación Ciudadana							
- AV acompañadas:	2						
- Fortalecimiento ELS:	3						

		<p>- CORES: 1</p> <p>Sector Vivienda: Fortalecimiento ELS: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31/05/2021 - Capacitación ELS PI Reubicación Guaca Santander • 31/05/2021 - Capacitación ELS PI Reubicación Málaga Santander <p>Macroproyecto La Mojana. Fortalecimiento ELS -Manejo de residuos sólidos ELS San Marcos</p> <p>Sector Educación: CORES: 1. Comité Regional de Seguimiento Magdalena-Educación 26-05-2021.</p> <p>2 Espacios de participación: - Reunión de Seguimiento ELS Sede IE Antonio Brujes Carmona de Santa Ana Magdalena 28-05-2021. - Reunión de Seguimiento ELS Sede IE Nuestra Señora del Carmen, Chimichagua Cesar. 208-05-2021</p>
Junio		<p>Participación Ciudadana 7 espacios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AV acompañadas: 5 - Fortalecimiento ELS: 2 <p>Sector Vivienda: Auditorias Visibles Acompañadas: 1. 25/06/2021. Foro Inicial Proyecto Vivienda Matanza - Santander</p> <p>Sector Salud: Auditoria Visible acompañada: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foro de Seguimiento la Vega - Cauca • Foro de Seguimiento Puerto Tejada - Cauca <p>Sector Acueducto: AV acompañadas: 2</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Foro Final Acueducto de Dolores • Visita de obra con comunidad del proyecto. Acueducto del Guamo. <p>Macroproyecto La Mojana: Fortalecimientos ELS 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto en San Marcos • Proyecto en Magangué
	<p>Julio</p>	<p>Participación Ciudadana 14</p> <ul style="list-style-type: none"> - AV acompañadas: 8 - Fortalecimiento ELS: 6 - MATRIZ SEGUIMIENTOS <p>SECTOR VIVIENDA:</p> <p>AV ACOMPAÑADAS: 1 FORTALECIMIENTO ELS: 4 Capacitación ELS Urbanización San Francisco 99 Viviendas Mallama Nariño - Cto 079 de 2019 Maeco Capacitación ELS Urbanización San Francisco 10 Viviendas Mallama Nariño - Cto 226-2019 Techos Nariño. Capacitación ELS PI Viviendas Málaga, Santander - Cto 081-2019 Maeco Capacitación ELS PI Viviendas Guaca, Santander - Cto 081-2019 Maeco</p> <p>SECTOR SALUD:</p> <p>AV ACOMPAÑADAS: 3 Auditoria Visible acompañada: Foro de Seguimiento la Vega – Cauca Auditoria Visible acompañada: Foro de Seguimiento Puerto Tejada - Cauca</p>

		<p>Auditoria Visible acompañada: Mesa de gestión Interinstitucional Puerto Tejada – Cauca</p> <p>FORTALECIMIENTOS ELS: 2 La Vega - Cauca Puerto Tejada – Cauca</p> <p>SECTOR EDUCACIÓN:</p> <p>AV ACOMPAÑADAS: 4 2 socializaciones comunitarias Sede Yotojorotshi 28 y 29 de julio de 2021 1 socialización comunitaria Sede Amushichón 28 de julio de 2021 1 foro final San Juan Bautista de Piza, Majagual</p>
	<p>Agosto</p>	<p>Participación Ciudadana 25 - AV acompañadas: 17 - Fortalecimiento ELS: 8</p> <p>VIVIENDA</p> <p>1. Espacios de Participación Acompañados: 3: - Socialización Comunitaria Beneficiarios PI La Morenita - Toledo Nte Santander - Entrega de viviendas PI Urbanización San Rafael - Labateca, Norte de Santander- Convenio 012-2015 FONVIVIENDA. - Entrega de viviendas PI Urbanización San Rafael - Labateca, Norte de Santander- Convenio 012-2015 FONVIVIENDA.</p> <p>2. Fortalecimiento ELS: 3 -Capacitación ELS Mallama 10 PI Cto 226 de 2018</p>

-Capacitación ELS Mallama 40 PI Cto 105 de 2019

-Capacitación ELS Mallama 40 PI Cto 105 de 2019

SECTOR SALUD:

-Reunión ELS la Vega - Cauca

-Fortalecimiento al ELS (1)

Puerto Tejada – Cauca: tema de Estrategias de Negociación

SECTOR EDUCACIÓN:

Espacios de Participación Acompañados 10

-3 mesas de gestión interinstitucional con la Alcaldía de Maicao y las autoridades de las sedes Amushichón, Yotojorotshi y Juttial.

-3 foros Finales en las sedes Amushichón, Yotojorotshi y Juttial, Maicao

-2 socializaciones Comunitarias virtuales de las sedes: Mixta No.1 San Antonio de Gamarra

-2 socializaciones Comunitarias virtuales Sedes Nuestra Señora del Carmen en Chimichagua Cesar y Antonio Brujes Carmona en Santa Ana Magdalena.

SECTOR REACTIVACIÓN:

Espacios de participación acompañados (3)

-Reactivación - Acompañamiento Reunión ELS Caldono Reactivar Panela Cauca - Caldono Cauca Vereda Andalucía

-Reactivación - Acompañamiento

Fortalecimiento ELS Caldono Reactivar Panela Cauca - Caldono Cauca Vereda Andalucía

-Reactivación - Acompañamiento Foro Final Reactivar Panela Cauca - Caldono Cauca

		<p>Vereda Andalucía Fortalecimiento ELS: (4) -Reactivación - Fortalecimiento ELS Reactivar Panela Cauca - Cajibío Cauca -Reactivación - Fortalecimiento ELS Reactivar Panela Cauca - Caldono Cauca -Reactivación - Fortalecimiento ELS Reactivar Panela Cauca - El Tambo Cauca -Reactivación - Fortalecimiento ELS Reactivar Panela Cauca - Popayán Cauca</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>Participación Ciudadana 18 - AV acompañadas: 14 - Fortalecimiento ELS: 4</p> <p>SECTOR VIVIENDA: Espacios de Participación Acompañados: 10 -Acompañamiento Foro Final PI LOTE LA JABONERÍA - Belén de Umbría, Risaralda -Acompañamiento Sorteo Cupo de Vivienda en el PI Lote Japón - Sevilla, Valle -Acompañamiento Reunión ELS PI VILLA PAOLA - Miranda, Cauca -Acompañamiento Reunión líderes PI LUCERNA - LA Unión, Nariño. -Acompañamiento Sorteo Urbanización María Auxiliadora - Campo de la Cruz, Atlántico Acompañamiento Sorteo Urbanización Villa Yeimy Tamalameque - Cesar -Acompañamiento Sorteo Urbanización Jade 2 - Soledad, Atlántico -Acompañamiento Foro 50% PI TAJUMBINA 1 - Cto. 226 de 2019 UT Techos Nariño, y Socialización Comunitaria PI TAJUMBINA2. -Acompañamiento entrega de 14 unidades de vivienda en Maria La Baja, Bolívar. -Acompañamiento a visita y socialización comunitaria PI URB VILLA DANIELA</p>

	<p>Montecristo, Bolívar.</p> <p>Fortalecimiento ELS: 3</p> <ul style="list-style-type: none">-Capacitación ELS Contrato 109 de 2019 REDES Y EDIFICACIONES Ancuya, Nariño-Capacitación ELS Contrato 080 de 2019 - MAECO - Matanza, Santander-Capacitación ELS Contrato 081 de 2019 - MAECO - La Guaca, Santander <p>SECTOR SALUD:</p> <p>Auditoria Visible acompañada: 1</p> <p>Foro de Inicio IPS Don Bosco Currulao, Turbo Antioquia</p> <p>SECTOR EDUCACIÓN:</p> <p>Acompañamiento AV 2</p> <ul style="list-style-type: none">-Mesa de trabajo con comunidad Sede IE Pijiño del Carmen-Mesa de trabajo con comunidad Sede ERM El Horno San Zenón. <p>MOJANA</p> <p>Fortalecimiento ELS 1</p> <p>Normatividad para la adquisición predial Magangué, Bolívar Contrato N°140 de 2020 15 y 29 de septiembre de 2021.</p> <p>SECTOR ACUEDUCTO</p> <p>Acompañamiento AV 1</p> <p>Foro Final en el municipio de Linares (Nariño)</p>
--	--

Bitácora de Seguimiento

<p>Política de Interacción y Sostenibilidad Social (Comités de seguimiento, Planes de gestión y cierres sociales), implementada</p>	Enero	<p>Los avances de Política de Gestión Social se discriminan así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 Comités de seguimiento - 1 Plan de Gestión Social Salud aprobado - 4 Cierres sociales para el sector vivienda: - 4 Detalle: Vivienda - 4 Comités de Seguimiento
	Febrero	<p>Política de Gestión Social: (28) Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22 Comités de seguimiento - 3 Cierres sociales vivienda - 3 Planes de gestión social aprobados – Acueducto: <p>La Subgerencia de Regiones lleva a cabo mesas interinstitucionales con el fin de articular trabajo con Alcaldías y Gobernaciones para hacer seguimiento a compromisos que permitan el cierre, entrega y finalización de los proyectos.</p> <p>Detalle Política Social por Sector:</p> <p>Sector Vivienda:</p> <p>Comités de Seguimiento: 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento Contrato 107 de 2020 - 05/02/2021 - Seguimiento Contrato 107 de 2020 - 07/02/2021 - Seguimiento Contrato 107 de 2020 - 15/02/2021 - Seguimiento Contrato 107 de 2020 - 17/02/2021 - Seguimiento Contrato 107 de 2020 - 19/02/2021 - Seguimiento Caso Brisas del Parrantial - Comfaguajira - 19/02/2021

Cierres Sociales aprobados: 3

1. Cierre Social y Paz y Salvo Social Urbanización Ciudadela Nuevo Renacer - Dagua, Valle Del Cauca – COMFANDI.
2. Cierre Social y Paz y Salvo Proyecto Urbanización La Plazuela - Quinchía Risaralda – COMFANDI.
3. Cierre Social y Paz y Salvo Social Proyecto Urbanización Panorama 004 Ansermanuevo – Valle – COMFANDI.

Sector Salud:

Comités de seguimiento:2

- Hospital Puerto Tejada Cauca
- Hospital de la La Vega, Cauca

Sector Reactivación:

Comités de seguimiento:3

Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 01/02/2021 -

Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 15/02/2021 -

Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 16/02/2021

Sector Educación:

Comités de Seguimiento: 10

- Seguimiento Liquidación Convenio 017 de 2016 Gobernación de Córdoba. - 25/02/2021.
- Seguimiento Obras Contrato 113 de 2019 con Alcaldía de Maicao - 25/02/2021.
- Seguimiento Proyecto Pedraza Contrato 108

		<p>de 2019 con Secretaría de Educación Departamental de Magdalena. - 12/02/2021 y /19/02/2021. -Seguimiento Energización Sedes Contrato derivado 978 de 2014 Bolívar - CV001 de 2016 Gobernación de Bolívar. - 16/02/2021.</p> <p>- Seguimiento Energización CE de Regencia Contrato derivado 978 de 2014 - CV001 de 2016 Gobernación de Bolívar. - 16/02/2021. - Seguimiento Conexión Acueducto CE Chapetona CV. 001 de 2016 Gobernación de Bolívar - Cto Derivado 978 de 2021. - 16/02/2021. -Seguimiento Liquidación Contrato 072 de 2017 - PROINARK. - 16/02/2021.</p> <p>- Seguimiento energización sedes Majagual - Sucre – AFINIA</p> <p>Macroproyecto La Mojana</p> <p>Comités de seguimiento:3</p> <p>- Comité Proyecto diseño de obras de protección San Marcos y Magangué – 02022021</p> <p>- Comité Proyecto diseño de obras de protección San Marcos y Magangué – 10022021</p> <p>- Comité Proyecto diseño de obras de protección San Marcos y Magangué – 26022021</p> <p>Sector Acueducto</p> <p>Planes de gestión social aprobados – Acueducto:3</p> <p>- Plan de gestión social proyecto de Guamo</p> <p>-Plan de gestión social proyecto Dolores -Plan de gestión social municipio de Prado</p>
	Marzo	Política de Gestión Social 26

- Comités de seguimiento: 21
- Cierres sociales educación: 1
- Cierres sociales reactivación: 1
- Cierres sociales salud: 1
- Cierres sociales vivienda: 1
- Planes de gestión social – educación: 1

Vivienda

Comités de Seguimiento: 2

- Seguimiento contrato 228 de 2020 - Tamalameque - Magdalena 24/03/2021.
- Seguimiento Contrato OZ COMFANDI - 12/03/2021

Cierre social: 1

- Villas de San Pablo I/Barraquilla – Comfenalco Valle

Salud

Comités de Seguimiento 3

- 2 hospital de Puerto Tejada Cauca,
 - 1 IPS La Gabarra- Norte de Santander
- Cierre social 1
- Hospital de Miraflores - Boyacá

Reactivación

Comités de seguimiento: 2

- Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca – 09/03/2021
- Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 12/03/2021

Cierres sociales: 1

-Reactivación Cierre Social Reactivar Café Magdalena - Magdalena

Educación

Planes de Gestión Social 1

-IE Técnica Agropiscicola de Compuertas - Manatí, Atlántico: ARCOCI Atlántico

Comités de Seguimiento 11

-Seguimiento entrega sedes Contrato 978 de 2014 Bolívar 01-03-2021

-Seguimiento compromisos Colegio Gerardo Valencia Cano - Alcaldía de San Zenón 02-03-2021

-Seguimiento Liquidación Contrato 072 de 2017 - PROINARK 02-03-2021

-Seguimiento entrega sedes Contrato 978 de 2014 Bolívar 05-03-2021

-Seguimiento proyectos con Alcaldía de Maicao 09-03-2021

-Seguimiento compromisos Liquidación Convenio 033 de 2013 Alcaldía de Cúcuta 10-03-2021

-Seguimiento entrega sedes Contrato 978 de 2014 Bolívar 12-03-2021

-Seguimiento Alcaldía de Pedraza Sede CE Básico Ampliado de Bomba 16-03-2021

-Seguimiento Alcaldía de Plato Sede Policarpa Salavarrieta 17-03-2021

-Seguimiento Liquidación Convenio 017 de 2016 Gobernación de Córdoba 19-03-2021

-Seguimiento Energización Obras Bolívar y Magdalena - AFINIA 25-03-2021

		<p>Cierres Sociales 11</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cierre Social y Paz y Salvo Social - IER La Honda FA-CD-I-S-223-2019 - Luis Oscar Vargas Abondano -Cierre Social y Paz y Salvo Social - Sede EU San Francisco del Caraño - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017 -Cierre Social y Paz y Salvo Social - Sede IE Integrado Carrasquilla Sede Rogelio Velásquez - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017 -Cierre Social y Paz y Salvo Social - Centro Educativo El Barranco - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017 -Cierre Social y Paz y Salvo Social - Centro Educativo El Barranco, sede ERM Calle Quibdó - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017 -Cierre Social y Paz y Salvo Social - Centro Educativo El Barranco, Sede ERM Sanceno - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017 -Cierre Social y Paz y Salvo Social - Centro Educativo Las Mercedes, Sede ERM Bocas de Purdú - Cto. 256 de 2017 - Consorcio Educar 2017 -Cierre Social y Paz y Salvo Social – Litoral de San Juan (4) <p>Mojana</p> <p>Comités de Seguimiento 3</p> <ul style="list-style-type: none"> -3 de marzo 2 reuniones, y el día 17 de marzo
Abril		<p>Durante el mes de abril se dio cumplimiento a la implementación de la Política de Gestión Social así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comités de seguimiento: 23 - Conceptos sociales – vivienda: 4 - Cierre social – vivienda: 1

A continuación se detalla el cumplimiento de las anteriores metas por sector:

Vivienda

Comités de Seguimiento: 2

- El 9 de abril del 2020 al proyecto de Malaga, contrato 081 del 2019.
- El 15 de abril del 2021 con los proyectos que se desarrollan en Los andes Sotomayor - contratos 104 y 226.

Cierre Gestión Social 1

- PI SIAPANA 3 Uribia, Guajira

Conceptos sociales 4

- Uribia, Guajira con radicado I-2021-002062
- Manaure, Guajira con radicado I-2021-002063
- Sucre, Sucre nuevo contrato I-2021-001931
- Cierre de proceso Corpacero I-2021-001805

Salud

Comités de Seguimiento 1

- Hospital de Puerto Tejada Cauca

Reactivación

Comités de seguimiento: 2

- Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca – 06/04/2021
- Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 30/04/2021

Educación

Comités de Seguimiento 12

Reunión de Seguimiento Energización con EPM Sede Liborina 06-04-2021

	<p>Mesa de Seguimiento a compromisos de Contrato 978 Sedes de Bolívar 06-04-2021 Seguimiento entrega sedes Contrato 978 de 2014 Bolívar 16-04-2021 Seguimiento Energización obras de Bolívar y Magdalena AFINIA 13-04-2021 Mesa de Seguimiento servicio de Acueducto Sede la Chapetona Bolívar 15-04-2021 Mesa de Seguimiento Energización Proyectos Magdalena AIRE 15-04-2021 Seguimiento Liquidación Contrato 256 De 2017 21-04-2021 Mesa de Seguimiento a compromisos de Contrato 978 Sedes de Bolívar 23-04-2021 Seguimiento a liquidación Contrato 011 de 2014 19-04-2021 Seguimiento a liquidación Contrato LP 004-2014 19-04-2021 Seguimiento Convenio 001 De 2020 30-04-2021 19-04-2021 Mesa de Seguimiento Permisos de Vertimiento Contrato 978 Sedes de Bolívar 29-04-2021</p> <p>Mojana Comités de Seguimiento 5 Avances socio prediales del Contrato N°140 de 2020</p> <p>CANAL DEL DIQUE Comités de Seguimiento 1 • Avances socio prediales del Contrato N°140 de 2020</p>
Mayo	<p>Política de Gestión Social</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comités de seguimiento: 16 - Conceptos sociales – vivienda: 4 - Acercamiento con Comunidad: 4

- Cierre social – vivienda: 1

VIVIENDA

Cierres Sociales: 1

- 31/05/2021 - Cierre Social y Paz y Salvo Social PI Nuevo Amanecer - Hatillo de Loba.

Acercamiento con la Comunidad: 3

- 04/05/2021 - Ata Socialización Comunitaria PI Lucerna - La Unión Nariño
- 25/05/2021 Acta Socialización Comunitaria Labateca Nte Santander. Estoy pendiente de subirla al drive, está en revisión y firmas.

Conceptos Sociales: 4

- I-2021-003017 - Alcance Concepto Social Tamalameque del radicado: I-2020-005793
- I-2021-002037 - Concepto Social Boavita Boyacá.
- I-2021-002734 - Concepto Social Casabianca - Tolima.
- I-2021-002736 - Concepto Social Segunda Fase de Molinitos - Dosquebradas, Risaralda

Comités de Seguimiento: 2

- 21/05/2021 Seguimiento balance social proyectos compraventas Campo De la Cruz, soledad y malambo.
- 28/05/2021. Seguimiento balance social proyectos Santander. Ctos 080, 081, 100, 350.

SALUD

Comité de Seguimiento: 1

		<ul style="list-style-type: none">• Centro de Salud IPS la Gabarra <p>Acercamiento con la comunidad: 1</p> <ul style="list-style-type: none">• Reunión informativa con el Equipo Local de Seguimiento de Mahates - Bolívar <p>REACTIVACIÓN</p> <p>Comités de Seguimiento:1</p> <ul style="list-style-type: none">• Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 04/05/2021 <p>MOJANA</p> <p>Comités de Seguimiento 4</p> <ul style="list-style-type: none">• Avances socio prediales del Contrato N°140 de 2020 <p>EDUCACIÓN</p> <p>Cierres Sociales: 12</p> <p>Córdoba, en los municipios de Ayapel, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, Lorica y Moñitos. Contrato 528 de 2014- UNIÓN TEMPORAL AULAS CÓRDOBA</p> <ul style="list-style-type: none">• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Nueva Sede Las Mujeres• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Nidos• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE San José del Pantano• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Sincelejito• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE San Jerónimo• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Villa Concepción• Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Isla de los Milagros
--	--	--

	<p>Sucre, en el municipio de Majagual, Contrato COP 11 de 2014 del convenio 2013-CV-0018, CONSORCIO MAJAGUAL 2014</p> <ul style="list-style-type: none">• Cierre social y Paz y Salvo Social - IETA Agro de Tomala• Cierre social y Paz y Salvo Social - IE San Vicente de Paul <p>Sucre, Municipios de San Benito Abad y Majagual, Convenio 2013-CV-0020- contrato LP004 de 2014, del contratista CONSORCIO AULAS SUCRE 2014</p> <ul style="list-style-type: none">• Cierre social y Paz y Salvo Social - IE Cuiva Sede Parcelas de Santa F• Cierre social y Paz y Salvo Social - IE Cuiva Sede Las Pozas• Cierre social y Paz y Salvo Social - IE Santander <p>Comités de Seguimiento: 8</p> <ul style="list-style-type: none">• Seguimiento Contrato Derivado 978 de 2014 04-05-2021• Seguimiento Contrato Derivado 978 de 2014 13-05-2021• Seguimiento Contrato Derivado 978 de 2014 27-05-2021• Mesa de Trabajo Sede Bellavista Concordia 11-05-2021• Reunión Viabilidad Patos y Pavitas 13-05-2021• Reunión Situación Yotojorotshi 19-05-2021• Reunión Viabilidad Piñón 21-05-2021• Mesa de Trabajo Alcaldía de Maicao- Previo Entrega de Sedes 27-05-2021
--	--

	<p>Junio</p>	<p>Política de Gestión Social 12 soportes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comités de seguimiento: 6 - Acercamiento con comunidad Conceptos sociales – vivienda: 3 - Planes de gestión social educación: 2 - Cierres social educación: 1 <p>VIVIENDA</p> <p>Comités de Seguimiento: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03/06/201. Seguimiento con Interventoría al Contrato no.177 de 2019 - Manizales • 4/06/2021. Seguimiento con Interventoría a los contratos: 080 de 2019, 081 de 2019 y 100 de 2019 en Santander, y 350 de 2019 en Norte de Santander. • 25/06/2021. Seguimiento Contrato 088-2012 COMFANDI. (pendiente acta, quedaron de remitir de Comfandi) <p>Acercamiento con comunidad – conceptos sociales vivienda: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • I-2021-003441 - Concepto Social Abrego, Norte de Santander • I-2021-003548 - Concepto Social Prado, Tolima • I-2021-003442 - concepto Social Ocaña, Norte de Santander <p>SALUD</p> <p>Comité de Seguimiento: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hospital San Vicente De Paul- Gramalote • IPS La Gabarra <p>EDUCACIÓN</p> <p>Planes de gestión Social: 2</p>
--	--------------	---

	<p>Se revisaron y aprobaron los planes de gestión social del contrato FA-IC-I-S-351-2019 del Consorcio Infraestructura Educativa 2019 de las Sedes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE Puerto Venecia en Achí Bolívar • IE Guaranda en Guaranda Sucre. <p>Cierres Sociales: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Nuestra Señora del Carmen de Puerto Meluk - Chocó, en el municipio de Medio Baudó 072 de 2017 de Proinark S.A <p>MOJANA</p> <p>Comité de seguimiento al contrato 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21/06/2021 Avances socio prediales del Contrato N°140 de 2020
<p>Julio</p>	<p>Plan de acción mes de JULIO 2021</p> <p>Política de Gestión Social: 17</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comités de seguimiento: 11 - Acercamiento con comunidad Conceptos sociales – vivienda: 3 - Planes de gestión social vivienda: 2 - Cierres social vivienda: 1 <p>VIVIENDA</p> <p>1. COMITÉS DE SEGUIMIENTO: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12/07/2021. Comité de Seguimiento Cto. 350 de 2019 - CONASPEC - Municipios Albania Carcasi y Molagavita (Santander) • 15/07/2021. Comité de Seguimiento CONSORCIO VIVIENDAS NARIÑO - Contratos:

079-2019, 104-2019, 105-2019, 109-2019, 226-2019.

- 03/07/2021. Comité de Seguimiento Cto.107 de 2020 CONSORCIO CONDAN 45 Manizales - Caldas
- 06/07/2021. Comité de Seguimiento INTERVENTORÍA MARIO GIL CARDONA Manizales - Caldas
- 27/07/2021. Comité de Seguimiento Cto.107 de 2020 CONSORCIO CONDAN - 45 Manizales - Caldas

2. CONCEPTOS SOCIALES/ACERCAMIENTO CON COMUNIDAD: 2

- I-2021-003942 Concepto Social - Viotá, Cundinamarca.
- Reunión de verificación de aceptación de los beneficiarios para el proyecto compraventa en el municipio de Pacho -Cundinamarca

3. PLANES DE GESTIÓN SOCIAL: 2

- Contrato 081 de 2019 - Proyecto de Vivienda - Reubicación Guaca, Santander
- Contrato 081 de 2019 - Proyecto de Vivienda - Reubicación Málaga, Santander

4. CIERRES SOCIALES: 1

- Cierre y Paz y Salvo social Medio Baudó Reconstrucción 45 PI

SALUD

1. COMITÉS DE SEGUIMIENTO: 1

- Comité de Seguimiento: Hospital Puerto Tejada

		<p>2.ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión ELS Hospital de Mahates <p>MOJANA</p> <p>1. COMITÉS DE SEGUIMIENTO: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión del organigrama de la Versión 0 del Contrato N°140 de 2020 <p>REACTIVACIÓN</p> <p>1. COMITÉS DE SEGUIMIENTO: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 07/07/2021 • Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 12/07/2021 • Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca – 07/07/2021 • Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca – 12/07/2021
	<p>Agosto</p>	<p>Política de Gestión Social: 14</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comités de seguimiento: 11 - Acercamiento con comunidad Conceptos sociales – vivienda:2 - Cierre social Reactivación: 1 <p>VIVIENDA</p>

1. Comités de Seguimiento: 3
 - 10-08-2021. Comité de Seguimiento Cto 107 de 2020 -Reubicación de viviendas. Manizales - Caldas
 - 18-08-2021. Comité de Seguimiento Cto 107 de 2020 -Reubicación de viviendas. Manizales - Caldas.
 - 31-08-2021. Comité de Seguimiento Cto 107 de 2020 -Reubicación de viviendas. Manizales - Caldas.
2. Conceptos Sociales: 1
 - I-2021-04741 Alcance 3 Concepto Social - Viotá, Cundinamarca.
3. Acercamiento con Comunidad: 1
 - 05-08-2021. Socialización Comunitaria beneficiarios PI La Morenita - Toledo Norte de Santander.

SALUD

1. Comité de seguimiento (1)
 - a. ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA

EDUCACIÓN

1. Comités de seguimiento 1
 - Seguimiento Energización Proyectos Magdalena con AIR-E 30-08-2021
2. Cierres Sociales 3
Chocó, en el municipio de Litoral del San Juan, Contrato 120 de 2017- Contratista INICO S.A.S:
 - Cierre Social y Paz y Salvo Social - CE María Auxiliadora De Isla Mono Sede Escuela Rural Mixta La Milagrosa (García Gómez)
 - Cierre Social y Paz y Salvo Social - IE Colegio indígena La Unión Pichima Quebrada ER indígena Olga Melba (Unión Balsalito)

		<p>Actualmente IE Wounaan David Gregorio Sede Principal</p> <ul style="list-style-type: none"> Cierre Social y Paz y Salvo Social – IE indígena Gerardo Chiripua Valencia Sede ER indígena Santa Rosa (Pangara). <p>MOJANA</p> <p>Comités de seguimiento (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> Contrato N°140 de 2020 <p>REACTIVACIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> Comités de seguimiento (2) <ul style="list-style-type: none"> Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Agrícola Cauca – 25/08/2021 Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 27/08/2021 Cierres sociales (1) <ul style="list-style-type: none"> Reactivación - Cierre Social Reactivar Agrícola Cauca – Cauca
Septiembre		<p>Política de Gestión Social: 18</p> <ul style="list-style-type: none"> Comités de seguimiento: 11 Acercamiento con comunidad: 4 Cierre social vivienda: 1 Plan de Gestión Social salud aprobado: 1 Plan de Gestión Social vivienda aprobado: 1 <p>VIVIENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> Acercamiento con Comunidad: 2 <ol style="list-style-type: none"> 13-09-2021. Socialización Comunitaria PI LUCERNA - LA Unión, Nariño. 23-09-2021. Socialización comunitaria

- PI URB VILLA DANIELA Montecristo, Bolívar
- Plan de Gestión Social: 1
- Aprobación Plan de Gestión Social Contrato 107 de 2019 Viviendas Estrategia Directas Manizales Caldas
- Comités de Seguimiento: 6
1. 02/09/2021. Seguimiento a contrato Manizales CONASTEC-107 de 2019
 2. 08/09/2021. Seguimiento a contrato Manizales CONASTEC-107 de 2019
 3. 15/09/2021. Seguimiento a contrato Manizales CONASTEC-107 de 2019
 4. 1/09/2021. Seguimiento a contratos Nariño: Ancuya - UT Techos Nariño: 226 de 2019, Mallama -Maeco 079 de 2019 Los Andes - Maeco 104 de 2019 y Mallama - Maeco 105 de 2019.
 5. 07/09/2021. Seguimiento a contratos Nariño: Ancuya - UT Techos Nariño: 226 de 2019, Mallama -Maeco 079 de 2019 Los Andes - Maeco 104 de 2019 y Mallama - Maeco 105 de 2019.
 6. 28/09/2021. Seguimiento a contratos Nariño: Ancuya - UT Techos Nariño: 226 de 2019, Mallama -Maeco 079 de 2019, Los Andes - Maeco 104 de 2019 y Mallama - Maeco 105 de 2019.
- Cierres Sociales: 1
1. 30/09/2021. Urbanización Los Robes - San Benito Abad - Cto 227 de 2016

SALUD

- Plan de Gestión Social Aprobado: 1
- IPS Don Bosco Currulao, Turbo Antioquia

EDUCACIÓN

- Cierres social 4
CTO 077 DE 2017 EDUARDO GHISAYS VITOLA de 4 sedes educativas:
 1. ESCUELA RURAL MIXTA DE ANGOSTURA en San Zenón
 2. COLEGIO BACHILLERATO DE TRONCOSO SEDE ERM DE TRONCOSO en San Sebastián de Buenavista.
 3. IET DEPARTAMENTAL ANDRES DIAS VENERO DE LEIVA SEDE ERM FRANCISCO JOSE DE CALDAS en San Sebastián de Buenavista.
 4. IE SANTA TERESA de Aguachica Cesar.

- Acercamiento con Comunidad 2
Mesa de trabajo con comunidad Sede IE Pijiño del Carmen
Mesa de trabajo con comunidad Sede ERM El Horno San Zenón.

MOJANA

- Comités de seguimiento 2
Reunión de avance de los componentes social, socio predial y predial del Contrato N°140 de 2020 15 y 29 de septiembre de 2021.

APROPIACIÓN DE CAPACIDADES

- Comités de seguimiento: 3
 1. Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 01/09/2021
 2. Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 08/09/2021
 3. Reactivación - Acta comité de seguimiento Reactivar Panela Cauca – 14/09/2021

--	--	--

Bitácora de Seguimiento

Seguimientos a las oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de participación ciudadana, realizados	Enero	En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos. En esta oportunidad – enero 2021- se cuenta con los sondeos realizados en los foros de auditorías visibles de los sectores de Educación, Reactivación Económica y Jarillón de Cali. Además, cabe mencionar que otro espacio donde se reciben sugerencias por parte de la comunidad son las reuniones de ELS, este mes se reportaron 12. Cabe mencionar dentro de las oportunidades de mejora o sugerencias más reiterativas se encuentran: 1. Dar a conocer los proyectos que lleva a cabo el Fondo de Adaptación en las regiones y los Canales para responder PQRSF. 2. Continuar fortaleciendo las relaciones del Fondo con los Entes Territoriales haciendo mayor presencia en las Comunidades Locales. 3. Que continúe liderando obras en el Municipio bajo la misma disciplina y compromiso, ya que se han logrado buenos resultados. 4. Hacer seguimiento a los proyectos después de haber finalizado y que se siga apoyando al cafetero.
	Febrero	En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos

		<p>de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos. En esta oportunidad – febrero 2021- se cuenta con los sondeos realizados en los foros de auditorías visibles en el sector de Reactivación Económica. Además, cabe mencionar que desde este mes se empezaron a recibir sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, entre otros. Este mes se reporta 28 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación. Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de las obras/proyectos. 2. Comprometer al contratista a realizar los pagos puntuales a los trabajadores. 3. Generar espacios de articulación con la institucionalidad, para que los entes territoriales se hagan cargo de los proyectos desde el día 0. 4. Mejorar los canales de comunicación con las personas allegadas a los proyectos.</p>
	<p>Marzo</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – marzo 2021- se cuenta con los sondeos realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores de salud, educación, agua y Jarillón de Cali. Además, cabe mencionar que en marzo se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de</p>

		<p>participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, entre otros. Este mes se reportan 51 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Entregar las obras oportunamente debido a que se están presentando fuertes lluvias. 2 realizar próximas fases a los proyectos, para aumentar la cobertura del servicio de Agua. 3. Continuar periódicamente socializando la evolución de las obras. 4 vincular a más personas de las regiones para fortalecer las dinámicas económicas de las comunidades. 5. las últimas estrategias que se han tenido como la creación de la página de facebook, la elaboración de los videos y toda la parte tecnológica ha sido muy positiva, importante que se siga fortaleciendo y vinculando mucho más a la comunidad.</p>
	Abril	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – abril 2021- se cuenta con los sondeos realizados en los foros de auditorías visibles en el sector educación y Macroproyecto Canal del Dique. Además, cabe mencionar que en marzo se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones</p>

		<p>comunitarias, entre otros. Este mes se reportan 69 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Realizar pagos puntuales a trabajadores por parte de contratistas de obra. 2. Que se agilice y se cumpla con la entrega de las obras. 3. Articular todos los procesos con la institucionalidad municipal.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – mayo 2021- no se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en los foros de auditorías visibles. Sin embargo, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 38 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Cumplir con los acuerdos planteados durante el espacio de reunión. 2. Pago de los honorarios y liquidación de los trabajadores de la obra oportunamente por parte de los contratistas en territorio. 3.</p>

		Garantizar la sostenibilidad de los proyectos a través de la articulación interinstitucional.
	Junio	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – JUNIO 2021- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores agua, educación y, vivienda. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 16 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Socializar y cumplir con la fecha de finalización y entrega de ellos proyectos. 2. Pago de los honorarios y liquidación de los trabajadores de la obra oportunamente por parte de los contratistas en territorio. 3. Articulación con la comunidad para fomentar el adecuado desarrollo del proyecto, evitando información errónea y posibles conflictos.</p>
	Julio	En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los

		<p>avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – JULIO 2021- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores de educación, vivienda y Jarillón. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 46 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Socializar y cumplir con la fecha de finalización y entrega de los proyectos. 2. Pago de los honorarios y liquidación de los trabajadores de la obra oportunamente por parte de los contratistas en territorio. 3 enviar por WhatsApp fotografías del avance de la obra a los miembros del ELS.</p>
	Agosto	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – AGOSTO 2021- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores de educación, vivienda, reactivación y Jarillón. Además, cabe mencionar que en este</p>

	<p>mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, reunión de ELS, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 35 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p> <p>Cabe mencionar que dentro de las más reiterativas se encuentran: 1. Retomar los recorridos de obra con miembros de ELS. 2. Cumplir con la entrega de los proyectos en los tiempos socializados. 3 Los integrantes del Equipo Local de Seguimiento sugieren seguir adelantando espacios de capacitación que aportan conocimientos para la comunidad en general.</p>
<p>Septiembre</p>	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad y otros interesados estén enterados de los avances de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción para poder tener en cuenta mejoras continuas en los diferentes procesos.</p> <p>En esta oportunidad – SEPTIEMBRE 2021- se cuenta con sondeos de satisfacción realizados en los foros de auditorías visibles en los sectores de salud y vivienda. Además, cabe mencionar que en este mes se recibieron sugerencias de la comunidad en espacios de participación como: mesas de trabajo con comunidad, mesas de gestión interinstitucional, foros reunión de ELS, socializaciones comunitarias, seguimiento al SAC, entre otros. Este mes se reportan 32 espacios donde se recibieron algún tipo de sugerencia/recomendación.</p>

		<p>Cabe mencionar que dentro de algunas sugerencias las que más llaman la atención son: 1. Enviar soportes de avance de obra a los miembros del ELS semanalmente a los grupos de whatsapp. 2. Mantener actualizada la cartelera del servicio de atención al ciudadano. 3 Realizar visitas de atención al ciudadano domiciliarias para personas que tienen algún tipo de incapacidad.</p> <p>Este mes la Subgerencia implemento en el seguimiento mensual la gestión que se hacen a estas recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de motivar a los responsables a dar respuestas y llevar a cabo acciones de mejora.</p>
--	--	---

Bitácora de Seguimiento


<p>Estrategia del proceso de revocatoria de viviendas ejecutada (averiguaciones preliminares, cierres de investigación y acompañamientos sociales)</p>	<p>Enero</p>	<p>Se avanza en proyección de autos de averiguaciones preliminares de 90 nuevas aperturas, las cuales se tienen proyectado realizar sus diligencias de visitas a finales de mes de febrero de 2021, en el municipio de Mompox, Bolívar.</p>
	<p>Febrero</p>	<p>Para la estrategia de restitución de viviendas se reporta para el mes de febrero: 116 SOPORTES DE AVANCE – EN DETALLE ASÍ: • Soporte de 89 averiguaciones abiertas en lo que lleva del año 2021. • Se cerraron 27 averiguaciones, por lo que se carga su respectivo soporte de apertura y cierre. • La evidencia del tema social para el primer trimestre será reportado en el mes de marzo, debido a que en el mes de febrero no se realizaron visitas de campo.</p>

	Marzo	<p>El informe da cuenta de que en virtud del alto componente social que por ley implementa en Fondo en la ejecución de sus proyectos y en cumplimiento a los lineamientos del PASRV, se brindó el acompañamiento social durante las diligencias de visitas programadas, las cuales fueron divididas en tres comisiones al Distrito de Mompós, de acuerdo a la tipificación realizada por el área jurídica con el fin de verificar el uso adecuado de 362 soluciones de vivienda y el cumplimiento de las normas que reglamentan la habitabilidad en las soluciones de viviendas asignadas por el Fondo Adaptación en la urbanización villas de Mompós, Mompós (Bolívar), dentro del marco del Programa Nacional de Vivienda.</p>
	Abril	<p>Durante el mes de abril la Secretaría General con apoyo de la Subgerencia de Regiones, aperturó 231 averiguaciones preliminares dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio de Vivienda, en los municipios de El Zulia Norte de Santander en la Urbanización Portal de la Victoria (11 Viviendas), municipio de Cereté, Córdoba en la Urbanización la Florida 219 viviendas, y en el municipio de Moñitos Córdoba, en la urbanización el Progreso (1 vivienda).</p> <ul style="list-style-type: none"> •Un Informe social El Zulia, Santander, dentro del marco de las averiguaciones preliminares se brindó por parte de la Subgerencia de Regiones, el acompañamiento social durante las diligencias de visitas programadas del entre el 22 y 23 de abril del 2021, con el fin de verificar el uso adecuado de 11 soluciones de vivienda en la urbanización Portal de la Victoria, asignadas por el Fondo Adaptación,

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		dentro del marco del Programa Nacional de Vivienda, las cuales El día 03 de marzo de 2020, Comfenalco Santander, en oficio enviado a la Entidad con consecutivo FA-BGA-CTO-003-0036-2020, informó sobre las irregularidades del uso debido de las viviendas asignadas, en dicho informe reportó que en visita realizada el 19 de febrero de 2020, se identificaron 11 viviendas arrendadas.
	Mayo	1 informe social del proceso administrativo sancionatorio de revocatoria, se realizaron las visitas programadas por medio de los autos de apertura de averiguación preliminar, proferidos en el mes de abril, razón por lo cual, se reporta informe social de diligencias de visitas realizadas al municipio de Cereté, Córdoba del 03 al 08 de mayo.
	Junio	Apertura a una averiguación preliminar en el municipio de Yacuanquer, (Nariño) proyecto urbanización el Manzano.
	Julio	Acompañamiento social proceso de revocatorias de viviendas en visita realizada al municipio de Yacuanquer, Nariño.
	Agosto	No se presento avance en los indicadores de esta actividad para el mes de agosto, se esta adelantando tramites que permita reportar nuevos avances el próximo mes
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Cumplimiento 2021/09/30	Avance 2021/09/30
--------------------------------	--------------------------

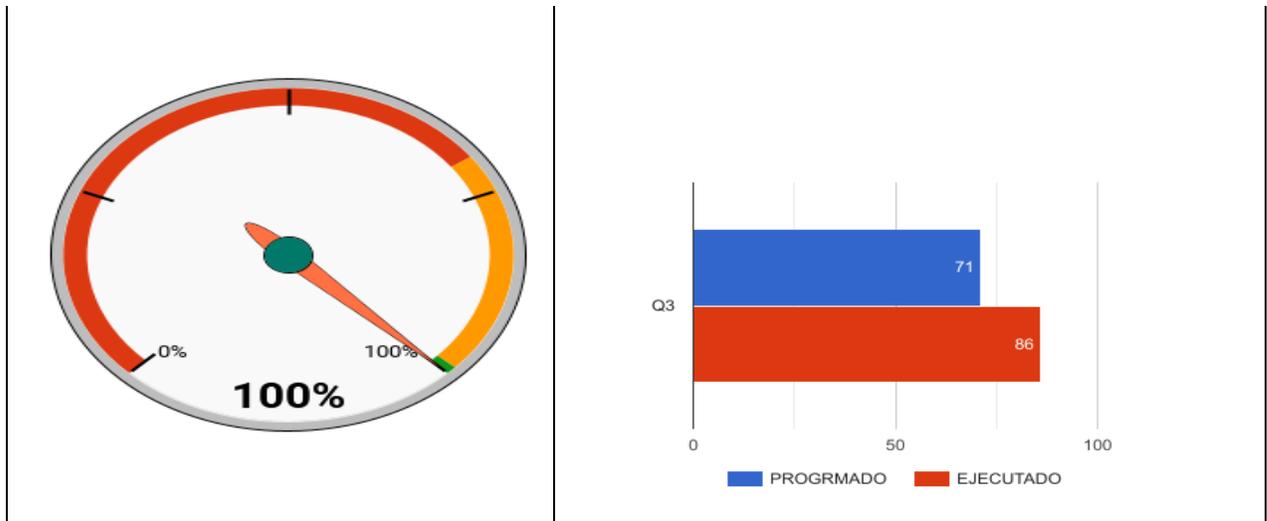

5.3 Área E: Gerencia - Comunicaciones



Fondo Adaptación

Área/Portafolio: **ÁREA E – GERENCIA**
Portafolio/Programa/Proyecto: **COMUNICACIONES**

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Desarrollar la estrategia de comunicación externa mediante la cual se informa de los avances y la gestión que realiza el Fondo Adaptación	Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa	# 5	280 0	700	700	700	700	2158
Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas 365 de la Entidad	Índice de rendición de cuentas la gestión Pública, espacios virtuales y presenciales de diálogo con la ciudadanía	# 5	11	2	2	2	5	4
Fortalecer la estrategia de comunicación interna para satisfacer las necesidades	Acciones, contenidos y productos	# 5	600	150	150	150	150	771

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y potencializar el trabajo en equipo	desarrollados en la estrategia de comunicación interna de la entidad							
Ejecutar institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015	# 5	12	3	3	3	3	9
Participar en las mesas de trabajo lideradas por el MHCP, para identificar acciones que permitan fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia	Mesas de trabajo para fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia	# 5	2	0	0	0	2	0
Participar en la celebración del día de la transparencia, de acuerdo con el cronograma establecido por el líder sectorial	Participación en la celebración del día de la transparencia	# 5	100	0	0	0	100	0

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Durante el mes de enero se desarrolló la nueva estrategia de comunicación externa 2021 acorde con esta estrategia que busca posicionar al Fondo Adaptación como una
--	-------	---

<p>Acciones y productos entregados en el desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa</p>		<p>Entidad experta en adaptación al cambio climático, comprometida con el desarrollo de las poblaciones más vulnerables, el Equipo de Trabajo de Comunicaciones adelantó varias acciones relacionadas con la divulgación de información a través de comunicados de prensa, redes sociales y página web de la entidad.</p> <p>Así mismo, se socializó información noticiosa con medios regionales y nacionales para lograr un mayor alcance y se elaboró material audiovisual relacionado con las jornadas de entrega de proyectos. A continuación, se presentan los resultados alcanzados en cada una de las acciones durante el mes.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Comunicados y boletines de prensa: 5 * Impactos positivos en medios de comunicación: 60 * Registro de las actividades del Fondo Adaptación en video: 3 * Número de mensajes publicados en redes sociales para socializar los avances en la gestión de la Entidad: 141 * Actualización de "En el Radar": 1
	<p>Febrero</p>	<p>En desarrollo de la nueva estrategia de comunicación externa planteada para la vigencia 2021 y que busca posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad experta en adaptación al cambio climático, comprometida con el desarrollo de las poblaciones más vulnerables, el Equipo de Trabajo de Comunicaciones adelantó durante el mes de febrero varias acciones relacionadas con la divulgación de información a través de (7) comunicados de prensa, (168) mensajes en</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>redes sociales y la actualización permanente de la página web de la entidad.</p> <p>Así mismo, se socializó información noticiosa con medios regionales y nacionales para logrando un impacto de (62) noticias positivas para el Fondo y se elaboró material audiovisual (6 videos) relacionados con las jornadas de entrega de proyectos.</p>
	Marzo	<p>Durante el mes de marzo, el Equipo de Comunicaciones realizó varias acciones, en cumplimiento de la estrategia de comunicación externa planteada para la vigencia 2021 y que busca posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad experta en adaptación al cambio climático, comprometida con el desarrollo de las poblaciones más vulnerables.</p> <p>En ese sentido, se redactaron y publicaron seis (6) comunicados de prensa, dos (2) crónicas, (156) mensajes en redes sociales y la actualización permanente de la página web de la entidad.</p> <p>Esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación logrando 30 impactos en medios regionales y locales con un free press de \$ 332.021.389. Así mismo, se elaboraron 4 videos y se realizaron 9 transmisiones en directo con el propósito de visibilizar los resultados de las intervenciones del Fondo en los siete proyectos y macroproyectos.</p>
	Abril	<p>En el mes de abril y en cumplimiento de la estrategia de comunicación externa planteada para la vigencia 2021 el Equipo de Trabajo de</p>

	<p>Comunicaciones adelantó varias acciones con el propósito de mantener a la comunidad informada respecto a la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto. En ese sentido, se redactaron y publicaron cuatro (4) comunicados de prensa, una (1) crónica, (63) mensajes en redes sociales y la actualización permanente de la página web de la entidad.</p> <p>Esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales para logrando un impacto de (31) noticias positivas y neutras y por último, se elaboraron (24) videos relacionados con el alcance y resultados de las intervenciones del Fondo en los siete proyectos y macroproyectos. Se adjunta informe con el detalle de los resultados y las evidencias.</p>
<p>Mayo</p>	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación externa planteada para la vigencia 2021, durante el mes de mayo el Equipo de Trabajo de Comunicaciones adelantó varias acciones con el propósito de mantener a la comunidad informada respecto a la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto.</p> <p>En ese sentido, se redactaron y publicaron un (1) comunicado de prensa, dos (2) crónicas, (9) mensajes en redes sociales y se realizó la actualización de la sección "En el Radar". Esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (92) noticias positivas y neutras y, por último, se elaboraron seis (6) videos relacionados con el alcance y resultados de las intervenciones del Fondo en los siete proyectos y macroproyectos.</p>

	Junio	<p>En el mes de junio el Equipo de Trabajo de Comunicaciones desarrolló varias acciones en cumplimiento de la estrategia de comunicaciones externa, que tiene como objetivo mantener informada a la comunidad respecto a la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto. En ese sentido, se redactaron y publicaron tres (3) comunicados de prensa y (62) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (83) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se apoyó en la transmisión de una audiencia y se realizaron (4) videos relacionados con la gestión del Fondo para redes sociales. Por último, se realizó la actualización de la sección "En el Radar".</p>
	Julio	<p>En cumplimiento de los objetivos establecidos en la estrategia de comunicaciones, durante el mes de julio el Equipo de Trabajo ejecutó acciones enfocadas a mantener informada a la comunidad respecto al avance de los proyectos y la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto.</p> <p>Los resultados de esas acciones son: redacción y publicación de trece (13) comunicados de prensa y (161) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (79) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se apoyó en la transmisión de una (1) audiencia del macroproyecto Gramalote y se realizaron (13) videos relacionados con la gestión del Fondo que se publicaron en redes sociales.</p>

	Agosto	<p>Los resultados de esas acciones son: redacción y publicación de cinco (5) comunicados de prensa y (141) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (146) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron ocho (8) galerías fotográficas y se realizaron ocho (8) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.</p>
	Septiembre	<p>En cumplimiento de los objetivos establecidos en la estrategia de comunicación externa, durante el mes de septiembre el Equipo de Trabajo de Comunicaciones ejecutó varias acciones enfocadas en la divulgación de información relacionada con los avances de los proyectos y la gestión del Fondo Adaptación en cada sector y macroproyecto, con el objetivo de mantener informados a los beneficiarios y a la comunidad en general.</p> <p>Los resultados de esas acciones son: redacción y publicación de once (11) comunicados de prensa y (117) mensajes en redes sociales, esa información noticiosa fue socializada con medios de comunicación regionales y nacionales logrando un impacto de (290) noticias positivas y neutras. Adicionalmente, se publicaron ocho (8) galerías fotográficas y se realizaron doce (12) videos que se publicaron en las redes sociales del Fondo y de la gerente con el propósito de obtener un mayor alcance de nuestros públicos de interés.</p>

Bitácora de Seguimiento

<p>Índice de rendición de cuentas la gestión Pública, espacios virtuales y presenciales de diálogo con la ciudadanía</p>	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	En cumplimiento de la estrategia rendición de cuentas 365 y las actividades propuestas en el cronograma de rendición de cuentas, que está disponible para la ciudadanía en la página web en el espacio Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el mes de febrero el E.T. de Comunicaciones realizó la transmisión de #ElFondoResponde.
	Marzo	<p>Como parte de la estrategia de rendición de cuentas 365 y de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el mes de marzo se realizó la transmisión en directo de #ElFondoResponde.</p> <p>Durante este encuentro denominado “En la educación está el futuro”, el gerente del Fondo, Edgar Ortiz, interactuó con los rectores de instituciones educativas entregadas por el Fondo en los departamentos de Chocó, Nariño, Córdoba y Cauca.</p> <p>En desarrollo de esta charla los docentes expresaron sus inquietudes y compartieron con la comunidad sus experiencias durante el proceso de ejecución y entrega de los proyectos de infraestructura de los que se beneficia actualmente la comunidad educativa a su cargo.</p> <p>Así mismo, el gerente entregó un balance de los resultados obtenidos por la entidad en los dos últimos años en materia de inversión en</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	infraestructura educativa.
Abril	Sin registro de avance en el indicador
Mayo	Sin registro de avance en el indicador
Junio	Sin registro de avance en el indicador
Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	<p>Durante el mes de agosto, en cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que tiene como objetivo informar de manera permanente sobre los resultados en la gestión de la Entidad, el Equipo de Comunicaciones desarrolló las siguientes acciones:</p> <p>-Rendición de cuentas interna:</p> <p>Con el objetivo de mantener a los colaboradores informados respecto a la gestión y avance de los proyectos ejecutados por la Entidad, se elaboró contenido que se publica a través de las cinco (5) pantallas digitales ubicadas en las instalaciones del Fondo:</p> <p>Visitas técnicas a proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento al macroproyecto de Gramalote. - Seguimiento a los avances de las obras de infraestructura hospitalaria terminadas para el corregimiento de La Gabarra en Tibú, Norte de Santander. - Visita técnica para validar las condiciones de obra hospitalaria, como parte del proceso de entrega del Hospital Cincuentenario de Puerto Tejada, Cauca.

		<ul style="list-style-type: none"> - Visita de preparación para el reinicio de las obras de protección del municipio de Santa Lucía, Atlántico, del Macroproyecto Canal del Dique. - Reunión de la subgerente de Proyectos con el secretario de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Cúcuta y @AKCucuta para trazar hoja de ruta y avanzar en el proceso de entrega de rehabilitación del acueducto Sector Canoitas corregimiento de San Pedro. - Participación del subgerente de Riesgos en la reunión de seguimiento a los compromisos del Gobierno frente a los proyectos que ejecuta en La Mojana - Primera piedra en la urbanización Las Gardenias en Uribia, La Guajira - Visita para verificar el avance de las 68 viviendas en Tamalameque, Cesar, que beneficiarán a 272 personas afectadas en la ola invernal. <p>Entrega de proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tres instituciones educativas en La Guajira - 80 apartamentos en Jarillón de Cali - 22 viviendas en el municipio de Panqueba, Boyacá - Jornada de cierre del proyecto Reactivar Panela Cauca
	<p>Septiembre</p>	<p>En septiembre y en desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que tiene como objetivo informar de manera permanente sobre los resultados en la gestión de la Entidad, el Equipo de Comunicaciones desarrolló las siguientes acciones:</p>

		<p>Rendición de cuentas interna:</p> <p>Con el objetivo de mantener a los colaboradores informados respecto a la gestión y avance de los proyectos ejecutados por la Entidad, se elaboró contenido que se publica a través de las cinco (5) pantallas digitales ubicadas en las instalaciones del Fondo:</p> <p>Visitas técnicas a proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Seguimiento al macroproyecto de Gramalote.- Visita de la gerente a las obras en el departamento de Atlántico- Reunión del subgerente de Riesgos con alcaldes de Nariño para seguimiento a proyectos- Recorrido a las obras del Canal del Dique con las alcaldías de San Cristóbal y San Estanislao.- Reunión con la gobernación de Magdalena y las operadoras de energía Afinia y Air-E y las alcaldías para darle celeridad a los procesos de energización de las instituciones educativas de los municipios de Concordia, Remolino, Zona Bananera, Plato y Pedraza.- Reunión con el alcalde de Concordia, Magdalena, Eliseo José Barraza, con quien definiremos el reinicio de las obras de la Escuela Rural Mixta Bellavista.- La gerente del Fondo Adaptación anunció un plan de choque que incluye la “pagatón” a todos los contratistas que cumplan con los tiempos de ejecución de las obras <p>Entrega de proyectos:</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Entrega de dos instituciones educativas en Bolívar (La Chapetona y Pinillos) - 120 apartamentos en Jarillón de Cali - 14 viviendas en Turbo, Antioquia - Acueducto de Linares, Nariño - Entrega de viviendas en María la Baja
--	--	---

Bitácora de Seguimiento

<p>Acciones, contenidos y productos desarrollados en la estrategia de comunicación interna de la entidad</p>	Enero	<p>El equipo de comunicaciones ejecuta la estrategia interna que busca satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, mantener comunicado a los equipos de trabajo, así como generar unidad y sentido de pertenencia al interior del Fondo Adaptación. En el desarrollo de esa estrategia se gestionan actividades como el fortalecimiento de canales, creación de contenido, diseño de piezas informativas, generación de espacios de diálogo y ejecución de campañas.</p> <p>Durante el mes de enero se desarrollaron acciones para cumplir con este propósito, que se reflejan en los siguientes resultados: 39 piezas de comunicación interna, 2 Campañas de promoción y divulgación interna, 1 actividad con los colaboradores y el fortalecimiento de canales internos reflejado en 2 emisiones del noticiero Somos Fondo y actualización y fortalecimiento de AdaptaNET (14 slides diseñados y publicados y 6 notas informativas en la intranet)</p>
	Febrero	<p>En el mes de febrero se planearon y desarrollaron 42 piezas de comunicación, se realizó una actividad de diálogo con los colaboradores, 1 emisión del noticiero Somos</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		Fondo, 7 cápsulas informativas, 14 slides y 7 notas para la intranet y 2 campañas de comunicación.
	Marzo	Durante el mes de marzo, el equipo de comunicaciones ejecutó varias acciones con el propósito de dar cumplimiento a la estrategia de comunicación interna que tiene como objetivo satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral. En ese sentido, se identificaron los temas relevantes y se establecieron los canales para su difusión logrando en el mes de marzo la publicación de 50 piezas de comunicación, se realizaron 8 cápsulas informativas Somos Fondo, se actualizó la intranet con 7 slides y 8 notas informativas y se ejecutaron dos campañas dentro de la estrategia denominada Campana.
	Abril	En cumplimiento de la estrategia de comunicación interna, durante el mes de abril el equipo de comunicaciones ejecutó varias acciones con el propósito de satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral. Durante este periodo se elaboraron y publicaron de 65 piezas de comunicación, se realizaron 7 cápsulas informativas Somos Fondo, se actualizó la intranet con 10 slides y 6 notas informativas y se publicaron dos Campana de logros y se diseñaron y publicaron 7 piezas como parte de las campañas denominadas "Cuidándote nos

	<p>cuidamos todos” y “Juntos somos más fuertes”. Se adjunta informe con el detalle de las actividades y las evidencias.</p>
Mayo	<p>En mayo, el equipo de comunicaciones elaboró y publicó 98 piezas informativas con el propósito de satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, generar sentido de pertenencia y aportar a la construcción de un mejor clima laboral. Las piezas elaboradas corresponden a: 70 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y actividades internas, 10 cápsulas informativas Somos Fondo, se actualizó la intranet con 5 slides y 7 notas informativas y se publicó una (1) Campana de logros. Se diseñaron y publicaron 4 piezas como parte de las campañas denominadas “Cuidándote nos cuidamos todos” y “Juntos somos más fuertes”. Así mismo, se hizo la revisión de (1) material institucional de los proyectos de Vivienda en Málaga y Guaca (Santander).</p>
Junio	<p>Como parte de la estrategia de comunicación interna, en el mes de junio el equipo de comunicaciones diseñó y publicó 79 piezas informativas con contenido relevante para mantener informados a los colaboradores de temas como: actualización de formatos, información relacionada con los protocolos de bioseguridad para el regreso a las oficinas, procedimientos y demás temas indispensables para el desarrollo de las actividades. El material gráfico corresponde a: 59 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y actividades internas, 2 cápsulas</p>

	<p>informativas Somos Fondo, se actualizó la intranet con 6 slides y 7 notas informativas. Así mismo, se diseñaron y publicaron 5 piezas como parte de las campañas denominadas "Cuidándote nos cuidamos todos" y "Juntos somos más fuertes".</p>
Julio	<p>En desarrollo de la estrategia de comunicación interna, en julio el equipo de comunicaciones diseñó y publicó 84 piezas informativas con el objetivo de mantener informados a los colaboradores de temas como: las capacitaciones de los sistemas de Infodoc, PSA y SIFA, el proceso para autorizar el ingreso de visitantes a las oficinas, socialización del formato al seguimiento de compromisos del personal de planta, instrucciones para el trabajo en casa y actualización de formatos, entre otros.</p> <p>El material gráfico corresponde a: 51 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y actividades internas, 6 cápsulas informativas Somos Fondo y se actualizó la intranet con 10 slides y 9 notas informativas. Así mismo, se diseñaron y publicaron 4 piezas como parte de la campaña "Cuidándote nos cuidamos todos".</p>
Agosto	<p>En agosto el equipo de comunicaciones diseñó y publicó 103 piezas informativas como parte de las acciones definidas dentro de la estrategia de comunicación interna que busca mantener informados a los colaboradores de temas como: el nuevo organigrama, horario de cierre de la oficina, portabilidad de la tarjeta de acceso a las oficinas, pausas activas, capacitaciones, socialización de formatos, entre otros.</p>

		<p>El material gráfico corresponde a: 73 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y actividades internas, 1 cápsula informativa Somos Fondo, 4 videos de los ejercicios de pausas activas, se actualizó la intranet con 11 slides y 7 notas informativas. Así mismo, se diseñaron y publicaron 1 pieza como parte de la campaña "Cuidándote nos cuidamos todos".</p>
	Septiembre	<p>Como parte de la estrategia de comunicación interna, durante el mes de septiembre de 2021 el E.T. de Trabajo de Comunicaciones diseñó y publicó 93 piezas informativas con el propósito de mantener informados a los colaboradores de temas como: capacitaciones, socialización de formatos y circulares, plazos de radicación, pago retroactivo a funcionarios, entre otros. El material gráfico corresponde a: 66 mailings para socializar circulares, lineamientos, formatos y actividades internas, 4 videos internos (publicados en pantallas), se actualizó la intranet con 9 slides y 6 notas informativas. Así mismo, se publicó 4 piezas como parte de la campaña "Cuidándote nos cuidamos todos" (publicados en pantallas) y se realizaron 4 actualizaciones de pantallas con información relacionada con los resultados y la gestión del Fondo.</p>

Bitácora de Seguimiento

	Enero	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de enero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así</p>
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Realizar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015		<p>el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de enero se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de enero se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3pPOZUD</p>
	Febrero	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de enero se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de febrero se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de febrero así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3reuLT7</p>
	Marzo	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los</p>

		<p>lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de marzo se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de marzo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de marzo así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/39TmrSp</p>
	Abril	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de abril se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de abril se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de abril así como los</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3uogKnu</p>
	Mayo	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de mayo se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de mayo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de mayo así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3uGOhsp</p>
	Junio	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de junio se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de junio se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de junio así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3wkiJcZ</p>
Julio	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de julio se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de julio se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de julio así como los enlaces de consulta respectivos para cada uno de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3lplIyH</p>
Agosto	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de agosto se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems</p>

		<p>dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de agosto se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de agosto así como los enlaces de consulta respectivos para cada unos de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3n1Yq2D</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de septiembre se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, garantizando así el cumplimiento con la totalidad de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014).</p> <p>El listado de publicaciones realizadas en el mes de septiembre se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rhW8vi</p> <p>El detalle del diagnóstico realizado a la Ley 1712 de 2014 para el mes de septiembre así como los enlaces de consulta respectivos para cada unos de los 53 ítems se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3F2MC6W</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Octubre	Sin registro de avance en el indicador
--	---------	--

Bitácora de Seguimiento


Mesas de trabajo para fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Participación en la celebración del día de la transparencia	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

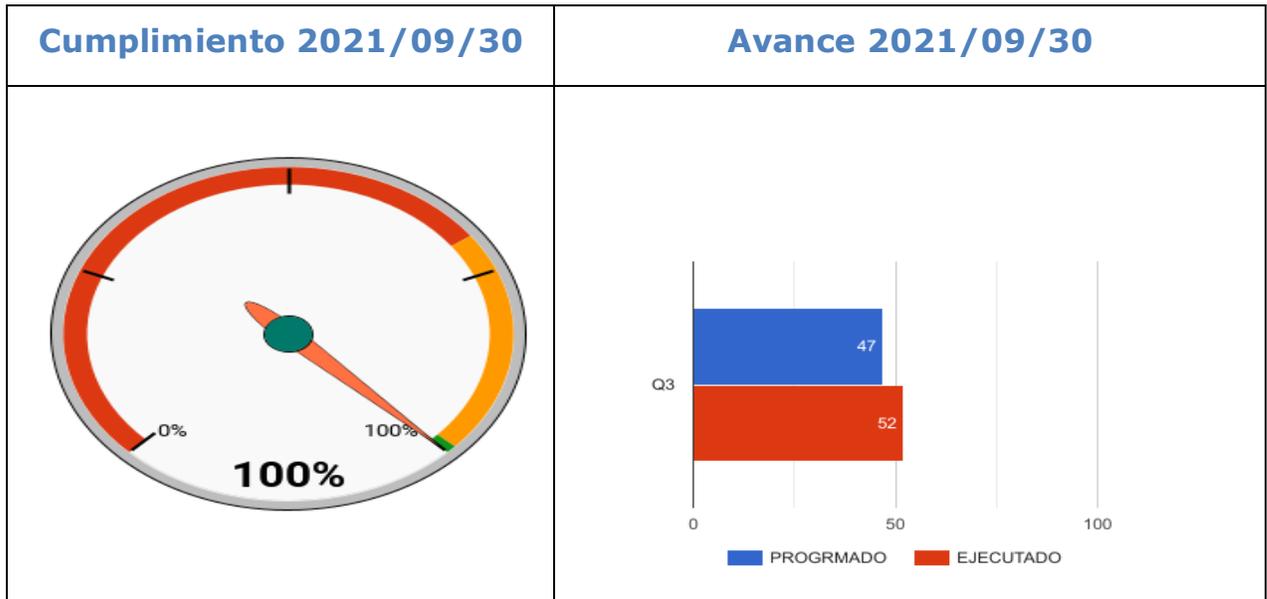

5.4 Área F: Oficina de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Arquitectura Organizacional vista desde los procesos, los y la tecnología, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCUIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS y GOBIERNO DIGITAL, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Área/Portafolio: **ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Portafolio/Programa/Proyecto: **PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar la Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG)*	Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG), ejecutada	# 3	60	0	0	0	60	85
Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del FURAG de la vigencia 2020	Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020 en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	# 3	1	0	0	0	1	1
Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e	Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del	# 3	2	0	0	0	2	2

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

innovación	Conocimiento e innovación							
Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad	Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado	# 6	100	0	50	0	50	75
Ejecutar la Estrategia de Gestión de Riesgos	Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada	# 6	100	0	50	0	50	75

Bitácora de Seguimiento

Estrategia de Gestión del Conocimiento (MIPG), ejecutada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se realizan la presentación de las actividades de la vigencia 2021 para la gestión de conocimiento de la entidad, la cual es aprobada por el comité de gerencia, de la misma manera se da inicio a la realización de herramientas para la captura de información, estructuración y publicación de conocimientos que materialicen la estrategia.
	Abril	<p>Para la vigencia 2021 se tiene previsto un plan de trabajo que incluye tres componentes a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevistas a grupos focales: Se definieron los exfuncionarios a quienes se va a invitar a participar en la experiencia, se adelanto el diseño de las preguntas para las entrevistas, y se adelantan los contactos iniciales para asegurar su participación. 2. Formulario de captura de conocimiento: Se adelanta la adquisición de conocimiento estructurado por parte de funcionarios que están en el proceso de abandonar la Entidad a partir de un formulario en línea el cual evita la fuga de capital de conocimiento, a la fecha se cuenta con tres (3) registros completos que empiezan a mostrar algunas líneas de tendencia según el análisis de datos. 3. Concurso gestión con valor: Se aprueban las etapas del documento que nos va a permitir estructurar el conocimiento tácito de las

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>diferentes dependencias de la Entidad para su posterior puesta en marcha. Todas estas acciones se encuentran aprobadas por el comité estratégico de la Entidad.</p>
Mayo	Sin registro de avance en el indicador
Junio	Se adelanta la estrategia de gestión de conocimiento con el lanzamiento del concurso "gestión con valor" a todos los funcionarios y contratistas el cual pretende capturar, estructurar y compartir el conocimiento tácito de la Entidad; de la misma manera se adelanta la captura y estructuración de conocimiento de funcionarios y contratistas que por diferentes motivos se han retirado de la Entidad.
Julio	La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento en cumplimiento del objetivo estratégico número 3 viene adelantando la estrategia de gestión de conocimiento evitando la fuga de conocimiento de la Entidad mediante la captura de datos por parte de funcionarios y contratistas que se han retirado durante el periodo de transición de gerencia mediante a los formularios electrónicos 2-CVC-F-04 y 2-CVC-F-05 los cuales son de obligatorio diligenciamiento; a la fecha se han realizado 38 registros los cuales se analizarán y tabularán durante el tercer trimestre de la vigencia.
Agosto	La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento en cumplimiento del objetivo estratégico número 3 viene adelantando la estrategia de gestión de conocimiento evitando su fuga de la Entidad mediante al análisis de los datos consignados por parte de funcionarios y contratistas que se han retirado con corte al mes de agosto de 2021.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Septiembre	La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento en cumplimiento del objetivo estratégico número 3 viene adelantando la estrategia de gestión de conocimiento evitando su fuga de la Entidad mediante al análisis de los datos consignados por parte de funcionarios y contratistas que se han retirado con corte al mes de septiembre de 2021, de la misma manera continua el concurso gestión con valor el cual pretende captura información de manera estructurada de lecciones aprendidas y buenas prácticas de los proyectos en al Entidad, también se adelantan comunicaciones con Función Pública para integrar la Entidad a las redes institucionales que se manejan en la página web de dicha Entidad.
--	------------	--

Bitácora de Seguimiento

Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020 en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se realizó el diligenciamiento del Formulario único reporte de Avances de la Gestión cumpliendo con los tiempos establecidos por la Función Pública para dicha aplicación.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	De acuerdo con los resultados publicados por la Función Pública en el Índice de Desempeño Institucional del último año y resultado de las transformaciones internas la entidad alcanzó 94.5 puntos sobre 100, puntaje superior al promedio de las entidades del orden nacional que estuvieron en el rango promedio de los 82.9 puntos, y también con relación al

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		promedio de las entidades del sector hacienda que estuvieron en 88.4 puntos. En particular en la política de Gestión de Conocimiento e Innovación la entidad obtuvo un puntaje de 98%, 12 puntos por encima del promedio obtenido en al año inmediatamente anterior.
	Junio	Se viene trabajando en la estructuración del plan de acción que permita obtener, mejores resultados en la próxima medición. Este plan fue puesto a consideración y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño de la entidad.
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	La oficina Asesora de planeación y Cumplimiento realizó el análisis a los resultados obtenidos en FURAG para la vigencia 2020 donde se destacan los siguientes aspectos: -El Fondo Adaptación termina con una calificación del 94,2 % lo cual la sitúa como la quinta mejor entidad -En conjunto con Función Pública y las directrices emitidas, se establece un plan de mejora el cual garantiza resultados para el último trimestre de 2021 lo cual la posicionaría en el top 3 de las mejores entidades del sector.
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se asiste a la primera Mesa Sector Hacienda-

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Sesiones de reuniones sectoriales de Gestión del Conocimiento e innovación		Políticas Talento Humano e Integridad-Gestión del Conocimiento e Innovación el 26 de febrero de 2021.
	Abril	Se asiste a la primera mesa de líderes sectoriales de talento humano y gestión de conocimiento
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Se asiste a las mesa sectoriales de gestión de conocimiento tecnología e innovación presididas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptando y cumpliendo los compromisos impartidos
	Julio	La Oficina Asesora de Planeación ha asistido a las dos mesas sectoriales de gestión de conocimiento organizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dando por cumplida al 100% este indicador para la vigencia 2021
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se actualizan el macroproceso de talento humano al incluir el proceso de seguridad y salud en el trabajo. Se articula la política de SG-SST con los procesos de la Entidad.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

<p>Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, actualizado</p>		<p>Se crean formatos de trazabilidad de documentos en la pirámide documental de la Entidad.</p> <p>Se actualizan los documentos de apoyo a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.</p>
	<p>Abril</p>	<p>El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar..</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a la fecha se han analizado e incorporado al SGC 34 tipos documentales 2. Se Incluyó el proceso de SG-SST dentro del macroproceso de talento humano 3. Se elaboró el repositorio documental para los indicadores de procesos de la Entidad 4. Se actualizaron las definiciones de la pirámide documental de la Entidad 5. Se actualizaron los indicadores de Gestión financiera
	<p>Mayo</p>	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
	<p>Junio</p>	<p>El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de</p>

	<p>Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar.. 1. a la fecha se han analizado e incorporado al SGC 14 registros, 20 tipos documentales como guías, manuales y lineamientos así como la incorporación a la intranet de la Batería de indicadores de la Entidad</p>
Julio	<p>El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. Para el presente corte la Oficina Asesora de Planeación en conjunto secretaría general y el equipo de trabajo de comunicaciones se encuentra rediseñando el mapa de procesos de la Entidad donde se pretende darle un enfoque más ágil y que se articule de una manera más eficiente a los requerimientos y retos que presenta la nueva gerencia de la Entidad.</p>
Agosto	<p>El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del</p>

		<p>comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. Para el presente corte la se rediseña el mapa de procesos de la Entidad dándole un enfoque más dinámico que permite una mayor lectura y facilidad al usuario final articulándose con los requerimientos de la gerencia frente al nuevo enfoque institucional.</p> <p>De la misma manera se han venido adelantando reuniones con el equipo de trabajo de gestión financiera revisando la pertinencia de las caracterizaciones que se encuentran en la actualidad al interior del Sistema de Gestión de Calidad.</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>El sistema de gestión de calidad del Fondo Adaptación se rige bajo el principio de mejora continua el cual puede actualizarse por demanda, cuando los líderes de proceso solicitan la incorporación de documentos, registros, actualización de procesos o indicadores; o cuando la Oficina asesora de Planeación realiza un análisis del comportamiento que tuvo el sistema durante el año y actualiza las políticas de calidad o los elementos del Sistema a que haya lugar. Para el presente corte la se rediseña el mapa de procesos de la Entidad a nivel de procesos dándole un enfoque más dinámico que permite una mayor lectura y facilidad al usuario final articulándose con los requerimientos de la gerencia frente al nuevo enfoque institucional. El resultado de la gestión por procesos para todo el trimestre arroja 71 tipos documentales actualizados entre registros, documentos (lineamientos, manuales y guías),</p>

caracterizaciones, flujogramas, normogramas e indicadores.

Bitácora de Seguimiento


Estrategia de Gestión de Riesgos, ejecutada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>Durante el primer trimestre de 2021 la Oficina de Planeación realizó diferentes actividades que permiten dar un avance frente a la ejecución de la estrategia de gestión de riesgos, entre las cuales se incluye:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el Comité de Control Interno de marzo se presentó a los miembros del comité tres temas: <ul style="list-style-type: none"> - Riesgos materializados en el 2020, con el fin de generar acciones que eviten que esta situación se vuelva a repetir. - Se presentó una propuesta de los riesgos de seguridad digital, la cual fue aprobada. - De acuerdo con el seguimiento anual a la gestión de riesgos que la Oficina de Planeación lidera, se presentó al Comité una propuesta para la ejecución del seguimiento, la cual finaliza con un taller de riesgos que se espera realizar durante el segundo trimestre del 2021 2. En el Consejo Directivo de marzo se presentó un avance del Plan de Acción con corte al 28 de febrero de 2021, en donde se incluyó la identificación de riesgos respecto a posibles incumplimientos de las metas del Plan de Acción programadas, con el fin de establecer acciones para la mitigación de estos riesgos.

	Abril	<p>La Oficina de Planeación y Cumplimiento coordinó con todos los responsables, el proceso de seguimiento y monitoreo de los riesgos institucionales de la Entidad, a través del diligenciamiento del instrumento Lista de Chequeo, en donde anualmente cada responsable debe validar que la información relacionada en la matriz de riesgos institucionales (causas, consecuencias, evaluación del riesgo inherente y residual, controles, entre otros) corresponda con la actualidad de los procesos. Esta propuesta de ajustes se terminará de revisar y aprobar en el Comité Institucional de Control Interno programado para mayo.</p> <p>Por otra parte, se realizó el seguimiento cuatrimestral a los cinco riesgos de corrupción, en donde se evidenció que en este periodo no se ha materializado ningún riesgo de este tipo. Los resultados en detalle del seguimiento se encuentran en el Informe de seguimiento publicado en la página web de la Entidad.</p>
	Mayo	<p>De acuerdo con el seguimiento realizado a través del instrumento lista de chequeo por cada uno de los responsables en los equipos respecto a la gestión de riesgos, el 11 de mayo se presentó al Comité de Control Interno la propuesta de ajustes en la Matriz de Riesgos Institucional en donde se validaron en detalle los ajustes propuestos en materia de riesgos, causas, consecuencias, evaluación de riesgo inherente, diseño de controles y evaluación de riesgo residual. En esta sesión del comité se hicieron observaciones y finalmente se procedió a aprobar la versión 4 de la matriz, la</p>

	<p>cual se encuentra publicada en la Intranet y en la página web de la Entidad. Una vez se publicó la matriz de riesgos en su nueva versión se procedió a su socialización a través de correo electrónico con todos los colaboradores de la entidad. Por otra parte, en el Comité de Control Interno también se presentó el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital para el Fondo Adaptación y el concepto frente a la identificación de riesgos de Ciberseguridad aprobando para este último punto que la entidad no cuenta con este tipo de riesgos de acuerdo con los análisis realizados.</p>
Junio	Sin registro de avance en el indicador
Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	<p>En el marco de la auditoría externas a procesos realizada por ATIP y el informe presentado, la oficina Asesora de Planeación establece un plan de acción donde se pretende generar un esquema de integración entre la matriz de riesgos estratégicos de la Entidad y las matrices de riesgos contractuales y de proyectos estableciendo controles efectivos minimizando la materialización de riesgos. De la misma manera la Oficina Asesora de Planeación realizó el análisis y el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción de la Entidad encontrando que no se han materializado riesgos en este aspecto.</p>
Septiembre	<p>En el marco del Informe de Seguimiento a la Implementación de la Política y lineamientos para la gestión del Riesgo realizado por la Oficina de Control Interno, la oficina Asesora de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Planeación establece un plan de mejoramiento a procesos donde se pretende articular la matriz de riesgos de la Entidad con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas en su versión 5.0 lo que fortalecerá la gestión de riesgos a través de controles mas eficaces y oportunos relacionándolos con los procesos internos de la Entidad y los cambios administrativos emanados de Gerencia.

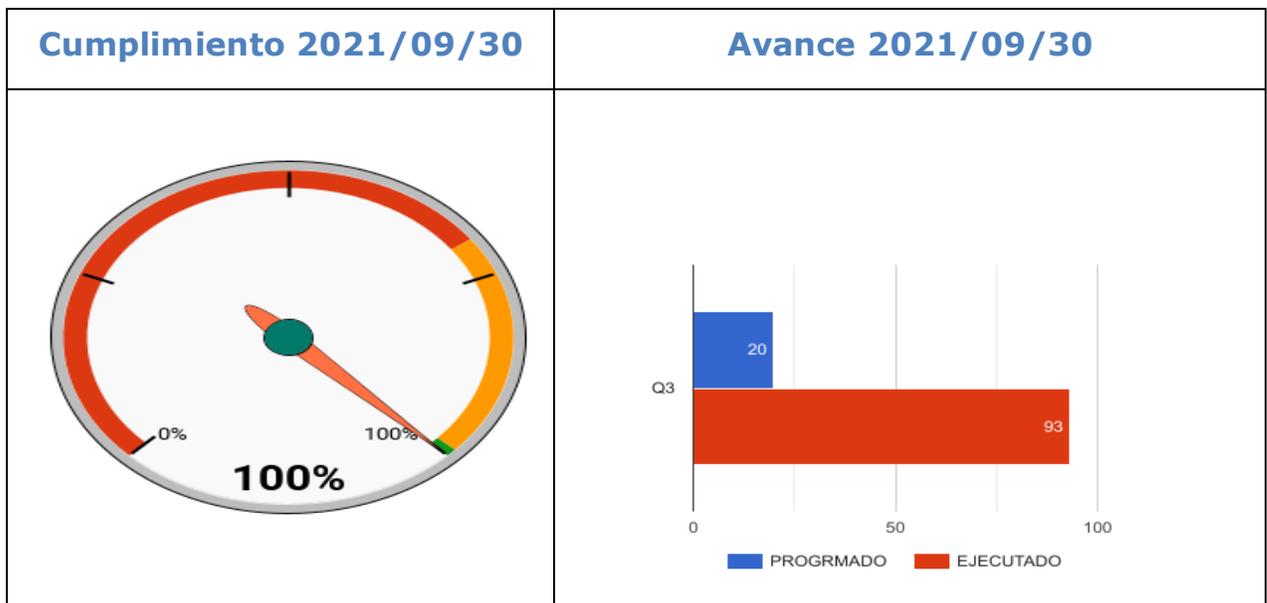

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Área/Portafolio: **ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

Portafolio/Programa/Proyecto: **TECNOLOGÍA**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado	# 5	100	0	50	0	50	47.55
Ejecutar Plan de Seguridad Digital (MIPG)	Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado	# 5	100	0	50	0	50	85.18

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	El PETI fue presentado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño el día 27 de enero de 2021. Durante el Q1 se han

<p>Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Entidad, ejecutado</p>		<p>adelantado las siguientes actividades:</p> <p>De la iniciativa para Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad, se realizó la presentación de la iniciativa al comité estratégico de la entidad el día 24 de febrero, se han realizado varias reuniones durante los meses de febrero y marzo con la profesional a cargo de la Sección Documental de la entidad. (23 de febrero, 16 de marzo y 18 de marzo) con el fin de conocer y detallar más fondo la iniciativa y la documentación existente en la materia por parte de Archivo General de la Nación y el Ministerio de las TIC, se solicitaron reuniones con otras entidades para hacer el benchmarking en la implementación de un proyecto de gestión de documento electrónico de archivo. Específicamente ya se ha hablado en la Agencia Nacional de Minería con la Líder del Equipo de Tecnología Milena Sandoval, en el Ministerio de Hacienda con Alejandro Ignacio Cruz, Asesor de la Dirección de Tecnología y en la Secretaria de Hacienda del Distrito con John Jairo Vargas, Subdirector Técnico de la Subdirección de Gestión Documental. Estamos a la espera de la confirmación para las reuniones. También se ha adelantado las fases de la planeación y análisis del proyecto para la implementación de un SIstema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo o SGDEA por sus siglas.</p> <p>2. De la iniciativa para continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información: ya se comenzaron a documentar y actualizar las</p>
--	--	--

		<p>políticas y guías del macro proceso de Gestión de Arquitectura de TI, de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura de TI V.2.0. Al respecto se han generado los siguientes documentos: a) Procedimiento de Gestión de Soporte de Tecnología, b) Catálogo de Sistemas de Información, c) Catálogo de elementos de Infraestructura, d) Catálogo de Servicios de TI.</p> <p>3. De la iniciativa para desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad, se han adelantado las siguientes mejoras:</p> <p>a) Sistema SIFA: En este sistema se implementó la nueva transacción de reintegro de anticipos para Tesorería. Adicionalmente se trabaja en la estructuración para el manejo del nuevo catálogo de productos.</p> <p>b) Sistema PSA: En este sistema se implementó y se puso en marcha el nuevo portal público de proyectos, que le permite a cualquier ciudadano consultar la información de los proyectos que ejecuta o que ya ejecutó la entidad en cualquier sector o Macroproyecto, También se trabaja actualmente en una iniciativa para el manejo de la calidad en los proyectos. Ya se han adelantado varias reuniones con personas de la Subgerencia de estructuración de la entidad y con PWC y ya se tiene una propuesta de solución que se dará a conocer al jefe de Planeación y a la Subgerencia de Estructuración para conseguir el aval y comenzar con su implementación.</p>
	Abril	Iniciativas estratégicas en el PETI:

a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes actividades en este período:

- Se generó el proyecto para la implementación de un "Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA". Para este proyecto se buscaron procesos similares en SECOP, así como experiencias de otras entidades y además un análisis del estado actual en la gestión actual del documento electrónico en la entidad.
- Se realizó la presentación del proyecto al comité estratégico de la entidad el día 26 de abril y se logró la aprobación del proyecto por parte del comité para continuar con su implementación. Se adjunta la presentación, así como el acta del comité.
- Se hizo la revisión del Plan de Adquisiciones con la Subgerencia de estructuración para registrar este proyecto y eliminar algunos que no irían debido al cambio en el PETI. Se adjunta el PAA modificado.

b. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:

- Sistema SIFA: En este mes de abril se trabajó en la implementación del nuevo catálogo de productos. Al respecto se generaron las plantillas para el cargue en el sistema de aquellos sectores en donde debe hacerse la división de un producto a dos productos del nuevo catálogo. Se adjunta el correo enviado

		<p>al equipo de PSA de la entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema PSA: Se presentó la propuesta para el manejo de calidad en los proyectos que ejecuta el Fondo. La propuesta está en etapa de estudio. Se adjunta la propuesta realizada por PWC.
	<p>Mayo</p>	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con respecto al proyecto para la implementación de un "Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo – SGDEA", se realizó la ficha técnica del sistema que contiene los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, basado en el modelo de requisitos MOREQ. Se adjunta la ficha técnica elaborada. • Adicionalmente se analizó el Acuerdo Marco de Precios de Software Empresarial para realizar el primer evento de solicitud de información a todos los proveedores del segmento del sistema de gestión documental. Se adjunta el documento RFI que se elaboró para este evento. <p>b. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema SIFA: En este mes de mayo se trabajaron varios requerimientos entre ellos: modificación de radicados, registro de novedades, modificación de terceros, nueva entidad proyectos para registrar los dos nuevos proyectos de Viviendas Gramalote y herramientas inclusión productiva zona Yati – Bodega y asociarlos a los dos nuevos sectores.
Junio	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se registró el evento en Colombia Compra Eficiente de la solicitud de información o RFI, a lo cual contestaron 3 posibles proveedores de la categoría de Software de Gestión Documental. Se analizaron las respuestas y en vista que los oferentes no contestaron la totalidad del RFI se realizó una reunión con CCE para aclarar dudas con respecto al Acuerdo Marco de Software Empresarial. De esta reunión se pudo concluir que es necesario abrir un nuevo evento de RFI para indagar sobre otros aspectos relacionados con las soluciones de cada oferente y además el tiempo que estiman para la implementación y puesta en marcha. • También se le solicitó a Planeación la redistribución de los recursos del proyecto de "Fortalecimiento en la Gestión de la Información", para así solicitar los recursos para este proyecto. ofrecidas por los oferentes.

		<p>b. Gobierno Digital: En este mes se elaboraron los siguientes documentos con respecto a la política de Gobierno Digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Política de respaldo y recuperación de la información -Plan de mantenimiento preventivo y correctivo -Catálogo de servicios de TI <p>c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema SIFA: En este mes de junio se trabajaron varios requerimientos entre ellos: formulario para otras transacciones de tesorería o compensaciones y la opción para la importación de la información de los embargos. <p>El Avance del PETI al término del mes de junio es del 34.38%.</p>
	Julio	<p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Después de analizar las respuestas al RFI solicitado, se decidió revisar el Instrumento de Agregación de Demanda – IAD de Software por Catálogo en donde también hay proveedores de sistemas SGDEA. Para este caso se realizó una consulta a Colombia Compra Eficiente para ver cuál es la forma en que se puede hacer la selección del proveedor, ya que la solicitud de cotización se le hace directamente al proveedor

	<p>elegido, y en este caso del SGDEA existen 2 proveedores. Se adjunta la respuesta de CCE. Con base en esa respuesta se procede a contactar a los proveedores para hacer la evaluación funcional y técnica de las soluciones y así poder tomar una decisión y elegir si es viable a alguno de los dos proveedores para los eventos posteriores de solicitud de cotización y solicitud de compra.</p> <p>b. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema SIFA: En este mes de julio se trabajaron varios requerimientos entre ellos: generación del reporte de asignado, Construcción de programa para el control de los reintegros por aportes, Modificación al programa de recomposición de giros agregando las columnas Nuevo Contrato, Modificación al programa listado de IG. <p>El Avance del PETI al término del mes de julio es del 37.09%.</p>
Agosto	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se procedió a contactar los dos proveedores del software SGDEA a través del instrumento de agregación de demanda de

Software por Catálogo, ellos son: Macroproyectos SAS y Digitalware SAS. Con estos dos proveedores se solicitaron demostraciones de los productos FOREST y OPHELIA e inclusive se realizó una visita en campo en la entidad IGAC para conocer el producto FOREST de Macroproyectos. Finalmente, después de analizar ambos productos se llegó a la conclusión que el producto FOREST es el idóneo porque reúne todas las características funcionales y técnicas que requiere la entidad. En los documentos adjuntos están la justificación para el no uso del Acuerdo Marco de Precios de Software Empresarial y la justificación para la selección del producto FOREST.

La siguiente fase en este proyecto es la contratación de la empresa MACROPROYECTOS SAS a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Software por Catálogo para la adquisición del producto FOREST. Además, se requiere modificar el proyecto de "Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de información", para redistribuir los recursos de las vigencias 2021 y 2022 y solicitar vigencias futuras de este proyecto.

b. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades en los siguientes sistemas de información:

- Sistema SIFA: En este mes de agosto se trabajaron varios requerimientos entre ellos: Se implementó la nueva transacción de reintegro de aportes en el módulo de tesorería.

		<p>Se realizan modificaciones en solicitudes de CDR para tener en cuenta la nueva delegación del gasto y del pago de acuerdo con la resolución 344 de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema PSA: Se dio comienzo al proyecto de la nueva ficha regional o por departamentos de acuerdo con la estructura de la base de productos y proyectos que manejan los sectores y macroproyectos a través del equipo de PSA. <p>El Avance del PETI al término del mes de agosto es de 40.09%</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>Iniciativas estratégicas en el PETI:</p> <p>a. Diseñar e Implementar un Modelo de Gestión y Analítica de Información en la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se adelantaron las siguientes gestiones en este período:</p> <p>Con el área de contratación de la entidad se revisó la factibilidad jurídica de hacer la contratación de la empresa Macroproyectos SAS a través del IAD, pero se llegó a la conclusión que no es viable jurídicamente hacer la contratación, dado que el producto de esta empresa no es exclusivo y existen en el mercado otros productos que pueden cumplir con los requerimientos de la entidad y por ende no se justifica hacer una compra directa a través del IAD de Software por Catálogo. Por esta razón se procede a abrir un proceso de contratación abierta a través de los diferentes tipos de procesos que contempla la Ley. Teniendo en cuenta las condiciones técnicas y</p>

tecnológicas del objeto a contratar, y que por ser servicios informáticos que corresponden a las características específicas de la necesidad de la Entidad, para la estimación del presupuesto oficial se utilizó como metodología el análisis de cotizaciones. El día 17 de septiembre de 2021, se publicó en la página Web del SECOP II, el evento de solicitud de cotizaciones a los proveedores del sector, para "La adquisición e implementación de un sistema de gestión de documento electrónico (SGDEA) que incluya una herramienta para la automatización de procesos BPM y un gestor de contenidos empresariales (ECM), el cual soporte la gestión de la información física y electrónica en el Fondo Adaptación". Se recibieron en total cinco (5) cotizaciones dentro del plazo dado para su recepción - 24 de septiembre de 2021. Con las cotizaciones se realizó el estudio del mercado para determinar el presupuesto oficial del presente proceso. Se adjunta el documento del "Estudio del mercado y del sector".

b. Continuar con la implementación de la Política de Gobierno Digital en sus habilitadores de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información.

Con respecto a esta iniciativa se continuó en la documentación y actualización de las políticas y guías del macroproceso de Gestión de Arquitectura de TI, de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura de TI V.2.0. Al respecto se generaron y actualizaron los siguientes documentos:

- Plan_Transicion_IPV6

- Catálogo_Servicios_2021
- Procedimiento de Gestión de Incidentes de seguridad
- Guía de gestión de incidentes de seguridad

c. Desarrollar las mejoras requeridas en los sistemas de información de la Entidad: Con respecto a esta iniciativa se han realizado nuevas funcionalidades y desarrollo de nuevos requerimientos en los siguientes sistemas de información:

Sistema SIFA: En este mes de septiembre se trabajaron principalmente en los siguientes requerimientos:

- Captura del departamento en la radicación de las cuentas con base en la regionalización de los contratos y asignación del delegado de la subgerencia de acuerdo con la nueva estructura de departamentos por subgerencias.
- Revisión técnica por subgerencias, en la cual pueden ser varios delegados dependiendo de los departamentos que se capturen en el radicado. Esto modificó las acciones y estados del radicado.
- Modificación de la asignación del ordenador del gasto y del pago en las solicitudes de CDR y ordenes de pago de acuerdo con la resolución 503 de delegación de la ordenación de gasto y de pago.

Sistema PSA: Está casi terminado el desarrollo de la nueva ficha regional o departamental en la cual se han realizado varios ajustes con base en reuniones con el equipo PSA, con el equipo de planeación y en comités directivos,

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>quedando pendiente solo el cambio para que se puedan consultar los resultados de cortes anteriores y que las observaciones que se registren de los proyectos tengan el visto bueno de los subgerentes.</p> <p>El Avance del PETI al término del mes de septiembre es de 47.55%</p>
--	--	---

Bitácora de Seguimiento

Plan de Seguridad Digital (MIPG), ejecutado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>Las actividades desarrolladas en el plan de seguridad digital al 31 de marzo de 2021 han sido las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se actualizó el plan de Seguridad y Privacidad de la información el cual fue aprobado por el Jefe de la Oficina de Planeación el día 12 de marzo. 2. Se aprobó el mapa de riesgos de seguridad digital en la sesión del Comité de Control Interno del mes de marzo. 3. Se solicitó la publicación de las políticas de seguridad de la información las cuales fueron aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de septiembre de 2020. 4. Se elaboraron las guías para la gestión de activos de información, vulnerabilidades técnicas y borrado seguro de la información. 5. Se elaboró la propuesta de indicadores para medir la gestión de seguridad de la información en el Fondo Adaptación. 6. Se atendieron requerimientos solicitados


		<p>por MINTIC especialmente en temas de gestión de activos de información.</p>
	<p>Abril</p>	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de abril de 2021 con respecto al plan de seguridad digital fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó mesa de trabajo para realizar el diligenciamiento de la matriz del registro de activos de información e información clasificada y reservada en todas las oficinas que conforman la entidad. A la fecha han reportado 17 matrices de activos de información. 2. Se realizó concepto sobre la identificación de Infraestructuras Críticas Cibernéticas y Gestión de Riesgos de Ciberseguridad en el Fondo. Este concepto fue enviado al Asesor I de la Oficina de Planeación y Cumplimiento para que sea incluido en la Política de Riesgos del Fondo. 3. Se elaboraron 12 procedimientos de seguridad de la información los cuales son requisito del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - Guia # 3 Procedimientos de Seguridad. Estos procedimientos se encuentran en proceso de formalización en la intranet del Fondo. 4. Se elaboró el normo-grama del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información el cual se encuentra incluido en el formato oficial de la entidad. 5. Se enviaron dos campañas de sensibilización enfocadas a la consulta del nuevo manual de políticas de seguridad de la información y consejos sobre el buen uso de redes sociales, creación de contraseñas y realización de copias de respaldo.

	<p>6. Se formularon los indicadores de gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información los cuales se encuentran en proceso de formalización en la intranet de la entidad.</p> <p>7. Se elaboró el Manual de Incidentes de Seguridad de la Información el cual se encuentra en proceso de formalización en la intranet de la entidad.</p>
Mayo	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de mayo de 2021 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se consolidó la matriz de activos de información después del ejercicio llevado a cabo con cada dueño de proceso. 2. Se presentó la matriz de activos de información consolidada en el comité de gestión y desempeño dejando como conclusión hacer una revisión más detallada de la matriz por cada equipo de trabajo y debiendo hacer también una revisión de la criticidad de los activos que quedaron con criticidad alta. 3. Se hizo la revisión de los activos con criticidad alta y finalmente quedaron definidos 16 activos con criticidad alta. Se adjunta la matriz de activos definitiva. Queda pendiente la aprobación definitiva del comité de gestión y desempeño. 4. Se presentó la matriz de riesgos de seguridad digital y el plan de tratamiento de riesgos en el comité de control interno del 11 de mayo siendo aprobados. Se adjuntan ambos documentos.
Junio	Las actividades desarrolladas en el mes de

		<p>junio de 2021 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se construyó la matriz de contacto con las autoridades y se avanzó en la validación del Anexo A de la Norma ISO 271001 con respecto a los controles que se deben implementar en el área Técnica. Se adjunta la matriz de contacto con las autoridades y el avance en el autodiagnóstico del modelo de seguridad que incluye los controles de acuerdo al Anexo A de la norma ISO 27001.
	Julio	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de julio de 2021 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicación del instrumento de diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el área de tecnología, de acuerdo con el Anexo A de la Norma ISO 27001. Pendiente las áreas de Talento humano, jurídica y contratación. 2. Se realizó revisión del plan de tratamiento de riesgos y la Política de gestión de riesgos y se propusieron algunos ajustes que están pendientes de ser aprobados en el Comité de Control Interno. 3. Se realizaron actividades internas y externas para buscar alternativas para la adquisición del pool de direccionamiento IPv6.
	Agosto	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de agosto de 2021 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicación del instrumento de diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el área de

		<p>tecnología, de acuerdo con el Anexo A de la Norma ISO 27001. Se realizó el diagnóstico con el área de Talento humano.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se realizó charla del MSPI y se presentó la política general de seguridad y de manera global algunas políticas específicas. 3. Se formalizo la Guía de Contacto con autoridades y grupos de interés. 4. Se desarrollo y emitió capsula de seguridad a través del correo electrónico de prensa.
	<p>Septiembre</p>	<p>Las actividades desarrolladas en el mes de septiembre de 2021 fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización y Formalización del plan de tratamiento de riesgos 2. Alineación de las actividades del plan de seguridad con actividades de FURAG 3. Revisión del instrumento de seguimiento de riesgos de seguridad Digital 4. Implementación del procedimiento de Gestión de Incidentes 5. Actualización de la Guía de Gestión de Incidentes 6. Socialización de política de Seguridad Digital y anexos 7. Tips de Seguridad Digital <p>El avance del plan de seguridad digital al término del mes de septiembre de 2021 es del 85.17%</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

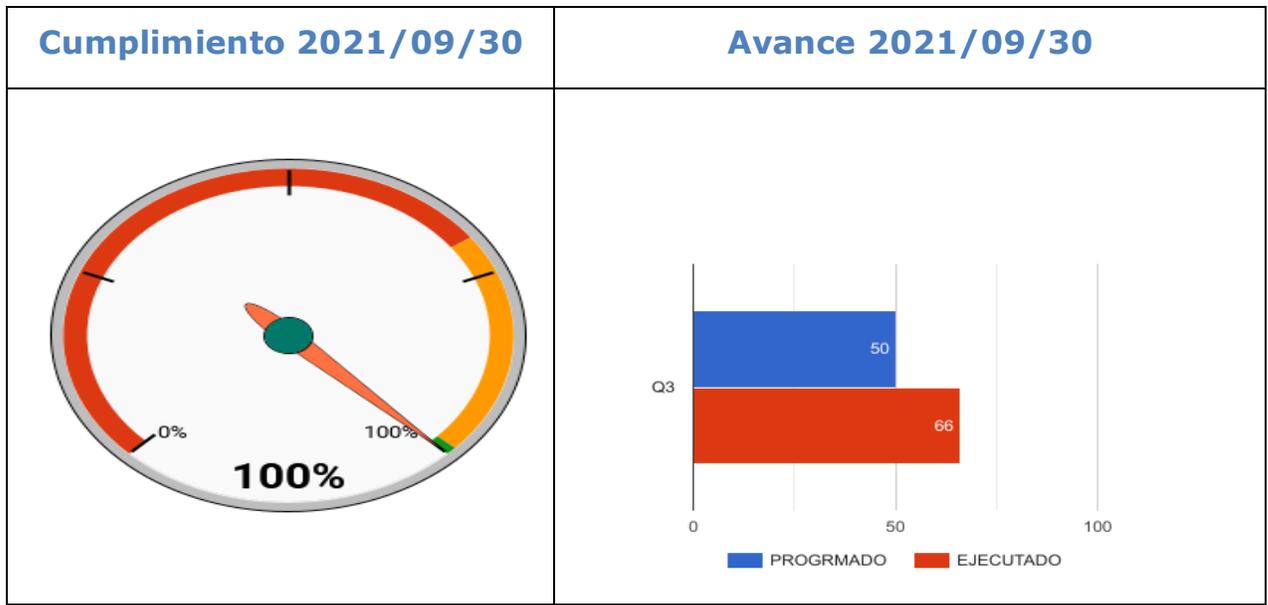

5.5 Área G: Secretaria General



Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación




 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

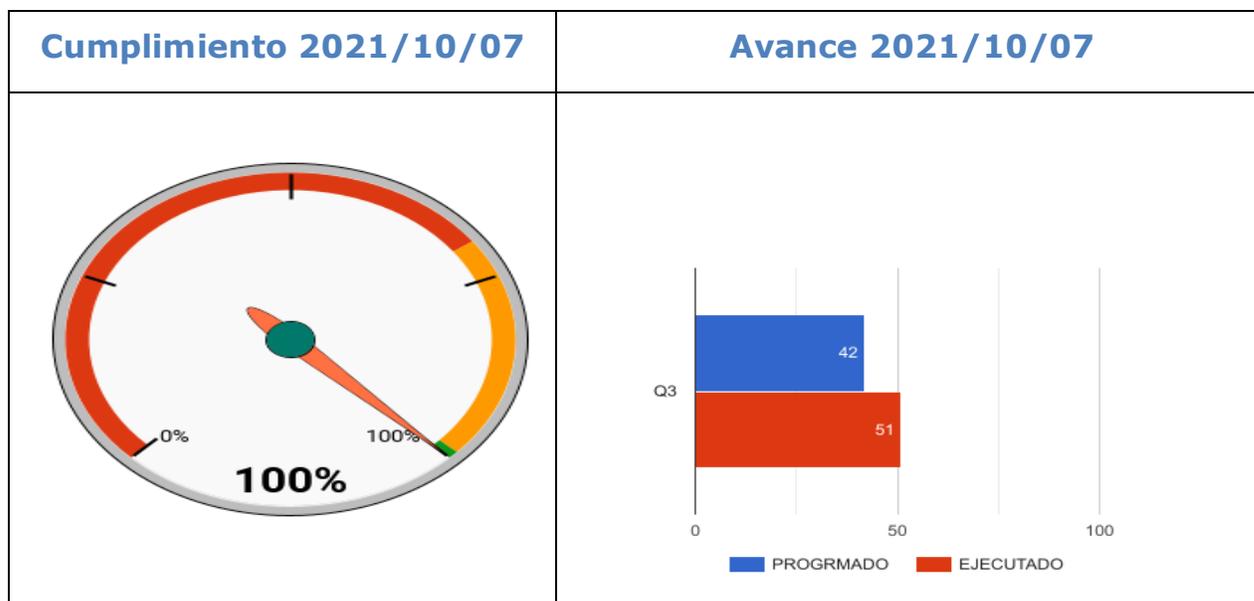

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: TALENTO HUMANO



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar Plan de Previsión	Plan de previsión, ejecutado	# 6	100	25	25	25	25	69
Alcanzar la cobertura de	Porcentaje de	#	95	20	30	25	20	92

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

personas capacitadas a través del Plan Institucional de Capacitación	personas capacitadas a través del Plan institucional de capacitación	6						
Generar satisfacción sobresaliente a través de las actividades del Plan Institucional de bienestar e incentivos	Satisfacción de las actividades del Plan Institucional de bienestar e incentivos	# 6	4	0	0	0	4	0
Cumplir con el porcentaje de implementación de los estándares mínimos a través del Plan de trabajo del SG-SST	Porcentaje de implementación de los estándares mínimos del Plan de trabajo del SG-SST	# 6	70	20	20	20	10	60
Generar satisfacción sobresaliente a través de las actividades Plan de trabajo del SG-SST	Satisfacción de las actividades del Plan de trabajo del SG-SST	# 6	4	0	0	0	4	0
Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano	Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	# 6	100	0	0	0	100	2
Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano	Sesiones de capacitaciones sectoriales de la Política de Talento Humano	# 6	100	0	0	0	100	3
Analizar los resultados de la política de Talento Humano en la medición del FURAG de la vigencia 2020	Análisis de los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la	# 6	1	0	0	0	1	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

gestión 2020 en
relación con la
política de Talento
Humano

Bitácora de Seguimiento

Plan de previsión, ejecutado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	A corte 31 de marzo de 2021 la entidad Fondo Adaptación ha ejecutado el 21% del 25% que se tenía programado como indicador para este primer trimestre sobre el presupuesto asignado para la vigencia actual, sin embargo, es de aclarar que la estimación de porcentaje de cumplimiento se realiza bajo supuestos de novedades de nómina para el periodo en mención.
	Abril	Teniendo en cuenta los gastos de personal presentados en el mes de abril, se avanzó en un 7% y se presenta un acumulado para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 del 28%
	Mayo	Se avanza en un 8% del cumplimiento de la ejecución presupuestal teniendo en cuenta los pagos realizados en el mes de mayo de 2021 de gastos de personal
	Junio	A la fecha se lleva un acumulado de 42% de ejecución del presupuesto asignado. Sin embargo, se tenía presupuestado el pago del retroactivo a la fecha el Gobierno Nacional no ha decretado dicho aumento.
	Julio	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Para el cuatro trimestre de 2021, se evidencia un avance del 27% en la ejecución presupuestal

Bitácora de Seguimiento

Porcentaje de personas capacitadas a través del Plan institucional de capacitación	Enero	<p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de enero se realizaron o participaron en 2 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres con la participación de 59 colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar.</p> <p>Adicionalmente, en el mes de enero se realizaron o participaron en 4 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres no programadas, con la participación de 60* colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar.</p> <p>Luego de realizar el análisis de cobertura en las jornadas de capacitación, entrenamiento, charlas o talleres llevados a cabo en enero, se obtiene un 25% de participación frente al 100% de la población a la fecha corte del informe.</p>
	Febrero	En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de febrero se realizaron o participaron en 5 eventos de entrenamiento, capacitación,

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>charlas y/o talleres con la participación de 20 colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar. Adicionalmente, en el mes de febrero se realizaron o participaron en 4 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres no programadas, con la participación de 28* colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.</p>
	<p>Marzo</p>	<p>Meta ejecutada marzo: 35% Meta ejecutada acumulada: 74%</p> <p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se realizaron o participaron en 5 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres con la participación de 24* colaboradores, las cuales fueron divulgadas por mailing e invitadas por Google Calendar. Las temáticas son las siguientes: Curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Gestión del talento humano Programa de Bienvenida a colaboradores nuevos Encuentros transversales de Función Pública Capacitación al Comité Coppasst Capacitación al Comité Convivencia Laboral Derechos humanos: entendimiento en los impactos psicológicos y emocionales de la violencia (género, minorías, otros): *Foro Premio Mujer Cafam *Foro Love for Business Skandia</p> <p>Adicionalmente, en el mes de marzo se realizaron o participaron en 8 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres no programadas, con la participación de 148* colaboradores, las cuales fueron divulgadas por</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>mailing e invitadas por Google Calendar. Las temáticas son las siguientes: Lanzamiento Programa Estado Joven Formación A Fondo en Gestión Documental Capacitación SMGI MinHacienda Curso virtual sobre el Catálogo de clasificación Presupuestal (CCP) Capacitación Obligaciones garantías contractuales Capacitación Formulación y Seguimiento a Planes de mejoramiento Capacitación SIIF proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito Curso virtual Registro anteproyecto Luego de realizar el análisis de cobertura en las jornadas de capacitación, entrenamiento, charlas o talleres llevados a cabo en marzo, se obtiene un acumulado de 74% de cobertura frente al 100% de los colaboradores a la fecha corte del informe.</p>
	Abril	<p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de abril se realizaron o participaron en 17 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 174 colaboradores y un porcentaje de cobertura total de 83% de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.</p>
	Mayo	<p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de mayo se realizaron o participaron en 20 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>programadas, con la participación de 172 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 89% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.</p>
Junio	<p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de mayo se realizaron o participaron en 17 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 128 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 91% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.</p>
Julio	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
Agosto	<p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de agosto se realizaron o participaron en 14 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 160 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 92% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.</p>
Septiembre	<p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de septiembre se realizaron o participaron en 12 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 137 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 92% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas</p>

por mailing y/o invitadas por Google Calendar.

Bitácora de Seguimiento

<p>Satisfacción de las actividades del Plan Institucional de bienestar e incentivos</p>	<p>Enero</p>	<p>En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de enero se realizaron o participaron en 2 actividades de bienestar y/o incentivos con la participación de 12 colaboradores.</p> <p>La actividad de celebración de cumpleaños fue divulgada por mailing y programada a los invitados por Google Calendar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de clima y cultura organizacional <p>Es importante mencionar, que se dio continuidad a la encuesta de clima organizacional, la cual inició a finales de diciembre de 2020 y con el fin de promover su diligenciamiento, se ofreció un premio al primer equipo de trabajo del cual todos sus integrantes presentaran soporte de haber diligenciado la encuesta, siendo así que el Equipo de la Sección Documental fueron los ganadores.</p> <p>Por otro lado, el 4 de febrero de 2021 se recibió el informe final de la encuesta, con una muestra poblacional de 192 colaboradores y con resultado de la medición de clima organizacional correspondiente al 91% de favorabilidad. Este se dará a conocer a los directivos y colaboradores, luego de la socialización de los resultados y recomendaciones programada para la líder del</p>
---	--------------	--

		<p>ET Talento Humano y Servicios por parte de Cafam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta semanal de Feliz cumpleaños <p>Además de la actividad de celebración de cumpleaños, se envió una tarjeta de cumpleaños por parte de La Entidad en un mailing masivo donde se mencionan los colaboradores que cumplen años en la correspondiente semana y adicionalmente, a cada colaborador en su día de cumpleaños se le envía una tarjeta de felicitación individual y personalizada, manifestando el acompañamiento del Fondo en las fechas especiales.</p> <p>(Evidencia: Mailing de Cumpleaños de la semanal)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación <p>A través de mailing, el 6 de enero se envió a todos los colaboradores de la Entidad el borrador de la propuesta del Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación solicitando sus aportes, sugerencias o comentarios al mismo, con un plazo de 5 días hábiles, para luego proceder a la formalización del Código.</p>
	Febrero	<p>En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de febrero se gestionaron y/o realizaron o participaron en 4 actividades de bienestar y/o incentivos con la participación de 13 colaboradores.</p>

Además de las actividades relacionadas anteriormente, las cuales fueron programadas dentro del PIBI 2021, también se gestionaron y realizaron las actividades descritas a continuación:

- Encuesta de clima y cultura organizacional

El 4 de febrero de 2021 se recibió el informe final de la encuesta, con una muestra poblacional de 192 colaboradores y con resultado de la medición de clima y cultura organizacional correspondiente al 91% de favorabilidad. Este se socializó con la Secretaria General y se dio a conocer a todos los colaboradores a través de mailing de comunicación interna el 19 de febrero.

- Tarjeta semanal de Feliz cumpleaños
Además de la actividad de celebración de cumpleaños, se envió una tarjeta de cumpleaños por parte de La Entidad en un mailing masivo donde se mencionan los colaboradores que cumplen años en la correspondiente semana y adicionalmente, a cada colaborador en su día de cumpleaños se le envía una tarjeta de felicitación individual y personalizada, manifestando el acompañamiento del Fondo en las fechas especiales.

- Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación
A través de mailing, el 15 de febrero se dio a conocer a todos los colaboradores de la Entidad el nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación adoptado mediante Resolución 030 de 2021, junto con los formatos

de declaración de intereses particulares del servidor público o contratista y formato de declaración de conflictos de intereses. El Código fue publicado en la intranet a través del siguiente enlace: <https://drive.google.com/file/d/1PqpdP9YEnFDvOUchpiFw7qH7PD6KaoTw/view?usp=sharing> y en la página web a través del siguiente enlace: <https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/fondo-adaptacion/marco-conceptual.html>

- Solicitud entrega de formatos de seguimiento a la gestión y concertación de actividades de los servidores públicos El 3, 11 y 18 de febrero se solicitó a los jefes inmediatos presentar a Talento Humano los formatos de seguimiento a la gestión del desempeño de los servidores públicos a su cargo, con corte a diciembre de 2020. De igual manera, se requirieron los formatos de concertación de actividades del periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 para el personal de planta temporal y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 al personal de Libre nombramiento y remoción. El plazo máximo de entrega de los formatos fue de 15 días hábiles, es decir, hasta el 19 de febrero.

- Ruta de la convivencia Como iniciativa del Comité de convivencia laboral y con apoyo del ET Talento Humano y Servicios se desarrolló una encuesta digital con el fin de consultar el estado de ánimo de los colaboradores y poder identificar acciones para promover un mejor ambiente de trabajo y

fomentar las relaciones sociales positivas a través de la formulación de un plan de trabajo, como parte de la estrategia la Ruta de la convivencia.

- Oferta de beca Programa Servimos Con la finalidad de dar a conocer los múltiples beneficios que tienen los colaboradores de la entidad como parte del Programa Servimos, se dio a conocer la última beca ofertada por la Universidad European Business School en alianza con la Función Pública.
- Circular compensatorio de Semana Santa El 24 de febrero se expidió la circular 003 de 2021 con la cual se otorga un día de descanso compensatorio para tomar en la semana santa con dos opciones de selección para disfrutarlo. Allí se indican los turnos, los periodos y los horarios de compensación, los cuales se divulgaron a través de mailing de Prensa.
- Gestionar el apoyo institucional para implementar la Sala Amiga de La Familia Lactante del Entorno Laboral Luego de solicitar el apoyo al Banco de la Republica para hacer uso de la Sala amiga de la familia lactante ubicado en el piso 3 del Edificio Avianca con una respuesta positiva, a través de correo electrónico del 15 de febrero se requirió a las personas encargadas de administrar la sala y gestionar los permisos necesarios, programar una reunión de coordinación para suscribir el convenio interadministrativos. Nos encontramos a la espera de la respuesta por parte del Banco de la República.

		<ul style="list-style-type: none"> Agradecimiento a la labor con ocasión de retiro de servidor público Con ocasión del retiro de Magda Suárez y Keyla Flórez, el Equipo de trabajo Talento Humano y Servicios remitió mediante correo electrónico una carta a cada exfuncionaria manifestando agradecimiento por su servicio y compromiso con el país y deseándole éxitos en su nueva etapa de vida laboral.
	<p>Marzo</p>	<p>Meta ejecutada marzo: No se ha realizado actividad objeto de medición de satisfacción En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Fondo Adaptación, en el mes de marzo se gestionaron y/o realizaron o participaron en 4 actividades de bienestar y/o incentivos con la participación de los colaboradores de la Entidad. Día libre de cumpleaños para el disfrute en familia Celebración mensual de cumpleaños a colaboradores Conmemoración Día de la mujer Conmemoración Día del hombre Además de las actividades relacionadas anteriormente, las cuales fueron programadas dentro del PIBI 2021, también se gestionaron y realizaron las actividades descritas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarjeta semanal de Feliz cumpleaños Además de la actividad de celebración de cumpleaños, se envió una tarjeta de cumpleaños por parte de La Entidad en un mailing masivo donde se mencionan los colaboradores que cumplen años en la correspondiente semana y adicionalmente, a cada colaborador en su día de cumpleaños se

le envía una tarjeta de felicitación individual y personalizada, manifestando el acompañamiento del Fondo en las fechas especiales.

- Actividades programadas en el marco de la conmemoración del mes del género Además de la invitación a conmemorar el día de la mujer y el día del hombre en las fechas previstas, el 5 de marzo se informó a toda la entidad a través de mailing la programación de otras actividades para conmemorar el mes del género. Las actividades programadas y ejecutadas fueron las siguiente:

- o Foro Mujer Cafam, 8 de marzo a las 8:00 am.

- o Encuentro Productividad desde el poder de lo Femenino por Skandia "Love for Business", 11 de marzo a las 8:00 am.

- o Juego de Lotería virtual Día del Genero FA, 12 de marzo a las 5:30 pm

- o Conferencia en vivo con Yokoi Kenji "El sentido de la vida", 25 de marzo a las 5:00 pm

- Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación

A través de mailing, el 16 de marzo se dio a conocer a todos los colaboradores de la Entidad la cartilla de apoyo al Código de Integridad y Buen Gobierno del Fondo Adaptación. Así mismo, mediante cápsula enviada por mailing se presentó a la Oficial de transparencia designada por la Gerencia, Alejandra Silva – Profesional II, quien a su vez dio a conocer los canales de denuncia para reportar posibles irregularidades o incumplimiento del Código de Integridad y Buen Gobierno. <https://sites.google.com/a/fondoadaptacion.gov.co/intranet/para-saber/somos-fondo/somosfondo-capsulainformativa14>

		<ul style="list-style-type: none"> • Oficina virtual Cafam El 11 de marzo se informó a los colaboradores la disponibilidad de una sala virtual por Meet desde la 1:00 pm a las 4:00 pm donde los afiliados a la caja de compensación Cafam podrían hacer sus consultas sobre los diferentes servicios de la caja y en línea se encontraba disponible la asesora Maribel Rodríguez de Cafam para atender a todos los usuarios que ingresaran en este periodo de tiempo. • Gestionar el apoyo institucional para implementar la Sala Amiga de La Familia Lactante del Entorno Laboral Luego de solicitar el apoyo al Banco de la Republica para hacer uso de la Sala amiga de la familia lactante ubicado en el piso 3 del Edificio Avianca con una respuesta positiva, a través de correo electrónico del 15 de febrero se requirió a las personas encargadas de administrar la sala y gestionar los permisos necesarios, programar una reunión de coordinación para suscribir el convenio interadministrativos. Como respuesta a esta solicitud, se programó la reunión para el 7 de abril de 2021 a las 2:00 pm. • Premiación Concurso Gestión Ambiental Premiación del concurso de gestión ambiental a la señorita Jessica Cárdenas a quien se le informó a través de mailing del 30 de marzo.
	Abril	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de abril se realizaron 5 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 115 colaboradores y 21 niños. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google

	<p>Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI las cuales se describen en el informe presentado.</p>
Mayo	<p>En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de mayo se realizaron 4 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 54 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI las cuales se describen en el informe presentado.</p>
Junio	<p>En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de junio se realizaron 7 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 129 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI las cuales se describen en el informe presentado.</p> <p>Respecto a la medición de satisfacción de las actividades realizadas en junio objeto de medición, se reporta el promedio de satisfacción de las 3 actividades: Día de la familia, Día del Servidor Público y Vacaciones recreativas, el cual fue de: 4,8 sobre 5, siendo 5 la calificación más alta. (Evidencia: Resultados de las encuestas</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	diligenciadas por los asistentes a las diferentes actividades)
Julio	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de julio se realizaron 3 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 5 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI como la participación en el Programa Estado Joven y la divulgación de servicios del Programa Servimos, entre otras actividades que se describen en el informe presentado.
Agosto	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de agosto se realizaron 5 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 75 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI y se describen en el informe presentado.
Septiembre	En el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIBI del Fondo Adaptación, en el mes de septiembre se realizaron 5 actividades programadas de bienestar y/o incentivos con la participación de 70 colaboradores. Las actividades fueron divulgadas por mailing y programada a los invitados por Google Calendar. Adicionalmente, se realizaron otras actividades o gestiones que hacen parte del PIBI y se describen en el informe presentado.

Bitácora de Seguimiento

<p>Porcentaje de implementación de los estándares mínimos del Plan de trabajo del SG-SST</p>	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	No estaba programada
	Marzo	Se registra una meta ejecutada para marzo de 2021 de 41% con una meta acumulada de 90% evidenciando un cumplimiento anticipado del Plan de Mejoramiento que hace parte integral del Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021 correspondiente para este periodo.
	Abril	Respecto al Plan de Mejoramiento que hace parte integral del Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento anticipado del Indicador, el cual ha sido reportado durante el primer trimestre de la vigencia 2021. En cuanto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021 se reportó cumplimiento previamente de la actividad de "Elaborar el informe del análisis estadístico de la accidentalidad del año inmediatamente anterior", el cual también fue socializado con el COPASST en sesión ordinaria de febrero de 2021.
	Mayo	Respecto al Plan de Mejoramiento que hace parte integral del Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento anticipado del Indicador, el cual ya ha sido reportado. En cuanto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021 se reportó cumplimiento de la actividad de "Realizar seguimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad para la prevención del covid-19" con la Socialización Instructivo de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>bioseguridad - Viajes y desplazamientos llevada a cabo el 27 de mayo. Adicionalmente y como estrategia de fortalecimiento en la implementación del protocolo de bioseguridad, se gestionó la publicación de información para la prevención del covid-19 la cual tuvo un alcance a todos los colaboradores de la Entidad</p>
Junio	<p>Respecto al Plan de Mejoramiento que hace parte integral del Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento del Indicador, el cual ya ha sido reportado. En cuanto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021 se reportó cumplimiento de la actividad de "Realizar la evaluación al cumplimiento de los requisitos normativos SST definidos en la matriz de requisitos legales". Adicionalmente se completó "Actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de acuerdo con los requisitos legales" se inicia proceso de publicación para todos los colaboradores de la Entidad.</p>
Julio	<p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de julio se realizaron o participaron en 5 eventos de entrenamiento, capacitación, charlas o talleres programadas y no programadas, con la participación de 27 colaboradores y un porcentaje de cobertura acumulado de 91% sobre total de la población de la Entidad. Estas jornadas fueron divulgadas por mailing y/o invitadas por Google Calendar.</p>
Agosto	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
Septiembre	<p>Respecto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento del 60% con corte a septiembre</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	<p>2021 sobre el 70% esperado a cumplir al mes de diciembre de 2021. Dicho cumplimiento se ve reflejado en la actividad de "Atender la auditoría interna al SG-SST en coordinación con Control Interno de Gestión". De acuerdo con solicitud de Gestión Administrativa y de Talento Humano realizada a la Oficina de Planeación y Cumplimiento, se introduce un valor negativo para ajustar el cumplimiento a la meta real a la fecha correspondiente al 60%.</p>
--	---

Bitácora de Seguimiento

Satisfacción de las actividades del Plan de trabajo del SG-SST	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Respecto al Plan de Trabajo Anual en SST vigencia 2021, se ha generado un cumplimiento del 53.3% con corte a agosto 2021 sobre el 60% esperado a cumplir al mes de septiembre de 2021. Dicho cumplimiento se ve reflejado en la actividad de "Actualizar Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos y Determinación de controles".

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
--	------------	--

Bitácora de Seguimiento

Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	El 26 de febrero se participó en la mesa sectorial de Talento Humano y Gestión del Conocimiento y la Innovación con la asistencia de 4 funcionarios.
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	El 29 de junio se participó en la Mesa Sector Hacienda Dimensión del Talento Humano con la asistencia de 3 funcionarias de Talento Humano. Evidencia: Presentación remitida y lista de asistencia
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador
	Octubre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


Sesiones de capacitaciones sectoriales de la Política de Talento Humano	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	El 19 de abril el Fondo Adaptación participó en la capacitación Analítica de datos con la asistencia de 3 colaboradores.
	Mayo	El 28 de mayo se remitió mediante correo electrónico los certificados de participación en el Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP de 8 colaboradores del Fondo Adaptación.
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Se remitió al Ministerio de Hacienda mediante correo electrónico los certificados de participación en el Curso Virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción realizado por 220 colaboradores del Fondo Adaptación.
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Análisis de los resultados obtenidos en la medición	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se realizó el diligenciamiento del formulario único reporta de avances de la gestión cumpliendo con los tiempos establecidos por la función pública para dicha aplicación.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	De acuerdo con los resultados publicados por la Función Pública en el Índice de Desempeño

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

del FURAG de la gestión 2020 en relación con la política de Talento Humano		Institucional del último año y resultado de las transformaciones internas la entidad alcanzó 94.5 puntos sobre 100, puntaje superior al promedio de las entidades del orden nacional que estuvieron en el rango promedio de los 82.9 puntos, y también con relación al promedio de las entidades del sector hacienda que estuvieron en 88.4 puntos. En particular en la política de gestión estratégica del talento humano, se obtuvo un resultado de 98, siendo unas de las políticas de mayor valoración en los resultados obtenido por la entidad. Basado en estos resultados y atendiendo las recomendaciones realizadas por la Función Pública se establecerá el plan de trabajo.
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

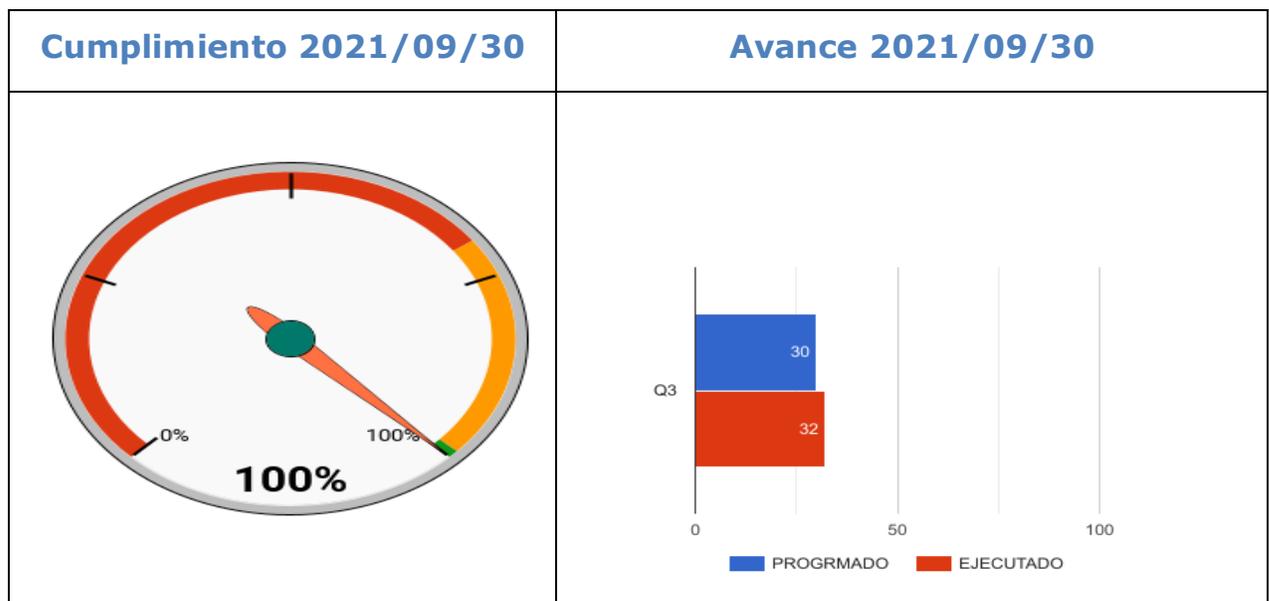

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARIA GENERAL**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **SERVICIOS**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado	# 6	100	25	25	25	25	80

Bitácora de Seguimiento


Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes, ejecutado	Enero	En este periodo se presentaron avances en el Plan de Acción Ambiental 2021 del Fondo Adaptación donde se realizaron concertaciones de actividades programadas para toda la vigencia, las cuales están definidas de acuerdo a las directrices del Manual de Gestión ambiental que responde al compromiso del Fondo Adaptación para actuar desde sus competencias y funciones dinamizadoras en pro de un Desarrollo Sostenible.
	Febrero	Se realizaron actividades para el desarrollo de la Gestión Ambiental con tareas mensuales a partir de la matriz en las cuales se ejecutan

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		acciones dentro de la Entidad para lograr una sostenibilidad ambiental deseable, encaminada en acciones de seguimiento de mejorar y cuidar los recursos públicos desde el punto de vista ambiental y presupuestal
	Marzo	Se realizaron actividades del PLAN DE ACCIÓN 2021 y para su desarrollo se hicieron diferentes actividades para cumplir con el Plan de Gestión Integral Ambiental PIGA 2021, con tareas sencillas preventivas y correctivas con corte a marzo 30 del 2021, en las cuales se ejecutaron acciones necesarias para lograr una sostenibilidad ambiental deseable en las instalaciones de la entidad, como el desarrollo de mantenimientos internos para el buen funcionamiento de la sede del Fondo Adaptación
	Abril	EL INDICADOR: Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), mes abril ejecutado el 100%, avance de ejecución 40%, cumpliendo con los indicadores propuestos para el mes de abril 2021
	Mayo	La Responsabilidad Ambiental en Fondo Adaptación es entender como entidad el trabajo en equipo y realizar en conjunto todos los mecanismos para gestionar todos los cambios y minimizar el impacto ambiental en nuestro espacio e ir desarrollando un ambiente que contribuya a mejorar la calidad de vida
	Junio	Realizar la concientización de la entidad sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, realizando actividades de seguimiento diario que generen bienestar y un ambiente sano para desarrollar en las instalaciones un trabajo armónico y eficiente.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Julio	La Responsabilidad Ambiental en Fondo Adaptación es atender el trabajo en conjunto de todas las áreas para gestionar todos los cambios y ajustes necesarios para minimizar el impacto ambiental en nuestras oficinas para mejorar el entorno de todos los funcionarios y colaboradores.
	Agosto	El trabajo en conjunto de todas las áreas es la mejor forma de realizar los cambios necesarios para minimizar el impacto ambiental en las oficinas y mejorar el entorno de todos los funcionarios y colaboradores del Fondo Adaptación
	Septiembre	La información se validó con los registros obtenidos en los diferentes procesos adelantados por el área administrativa, con el fin de sustentar las políticas y el control de activos en la gestión y desarrollo del plan de acción 2021 en fondo adaptación

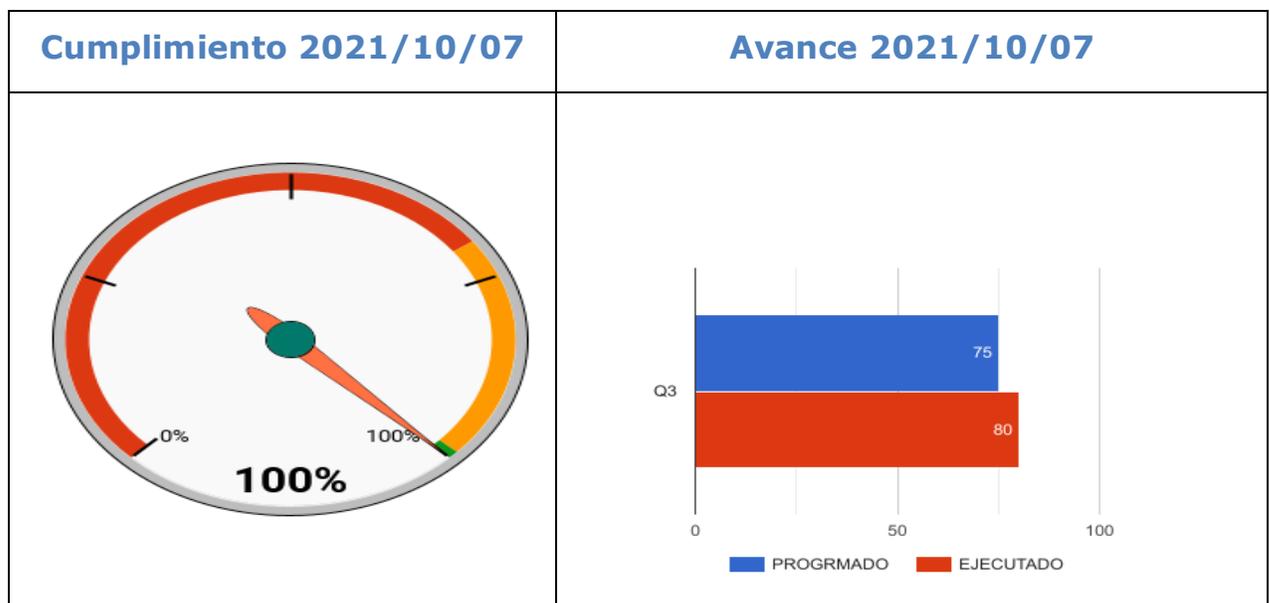

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: ATENCIÓN AL CIUDADANO



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDf respondidas dentro del término establecido	Porcentaje de PQRSDf respondidas dentro del término establecido	# 6	400	100	100	100	100	299
Participar en las mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano, coordinadas por el MHCP	Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	# 6	100	0	0	0	100	-

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Implementar la Política de Servicio al
--	-------	--

<p>Porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido</p>	<p>Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido. La Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 establece el servicio a la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado. Para cumplir este mandato, el Fondo Adaptación dispone los lineamientos, los canales y los recursos necesarios para interactuar con la ciudadanía y satisfacer sus necesidades de acceso a la información pública, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias bajo principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, para garantizar el goce efectivo de sus derechos. Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSDF recibidas mensualmente en la entidad: Para el mes de enero de 2021 se recibieron 258 PQRSDF, de las cuales 70 fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 188 PQRSDF se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte a 31 de enero de 2021 el indicador se cumplió al 100%.2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves de temas para la atención al ciudadano. En el periodo a reportar socializamos: Enero 19 de 2021 – Cómo tramitar peticiones incompletas? Enero 29 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSDF durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a
--	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.
	Febrero	N/A
	Marzo	Durante el primer trimestre de 2021 se recibieron 944 PQRSFD, de las cuales 745 fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley, 1 respondida extemporáneamente y 185 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte al periodo de enero a marzo de 2021 el indicador se cumplió al 99,8%.
	Abril	<p>Avance cualitativo Abril 2021</p> <p>1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad:</p> <p>Durante el mes de abril 2021 se recibieron 327 PQRSFD, de las cuales 157 cuentan al cierre del periodo con respuesta dentro del término establecido por la ley y 170 PQRSFD se encuentran en gestión dentro de la oportunidad del término.</p> <p>2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano.</p> <p>En el mes de marzo socializamos:</p> <p>Abril 09 de 2021 – Conoce quienes son nuestra población prioritaria.</p> <p>Abril 13 de 2021 – Reiteración de los</p>

		<p>términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>Abril 23 de 2021 – Protocolos atención población LGBTI.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad: <p>Durante el mes de mayo 2021 se recibieron 249 PQRSFD, de las cuales 106 cuentan al cierre del periodo con respuesta dentro del término establecido por la ley y 143 PQRSFD se encuentran en gestión dentro de la oportunidad del término.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano. <p>En el mes de mayo socializamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mayo 07 de 2021 – Atención personas con discapacidad visual. - Mayo 12 de 2021 – Reiteración de los

		<p>términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>-Mayo 21 de 2021 -Atención personas discapacidad cognitiva.</p>
	<p>Junio</p>	<p>Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido.</p> <p>La Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 establece el servicio a la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado. Para cumplir este mandato, el Fondo Adaptación dispone los lineamientos, los canales y los recursos necesarios para interactuar con la ciudadanía y satisfacer sus necesidades de acceso a la información pública, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias bajo principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, para garantizar el goce efectivo de sus derechos.</p> <p>Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad: <p>Durante el segundo trimestre de 2021 se</p>

recibieron 825 PQRSFD, de las cuales 693 fueron gestionadas dentro del término establecido por la ley y 132 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte al periodo de abril a junio de 2021 el indicador se cumplió al 100% (Se incluyen las PQRSFD del trimestre anterior pendientes de respuesta y que el término vencía en este reporte).

2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano.

En el trimestre socializamos la siguientes capsulas informativas:

-Abril 09 de 2021 – Conoce quienes son nuestra población prioritaria.

-Abril 13 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.

-Abril 23 de 2021 – Protocolos atención población LGBTI.

- Mayo 07 de 2021 – Atención personas con discapacidad visual.

- Mayo 12 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el

		<p>trámite oportuno de las PQRSFD. -Mayo 21 de 2021 -Atención personas discapacidad cognitiva.</p> <p>-Junio 15 de 2021 - Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p> <p>- Junio 18 de 2021 - Trámite y gestión PQRSFD y Recomendaciones generales para atención de situaciones difíciles.</p>
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	<p>Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG) a través del porcentaje de PQRSDF respondidas dentro del término establecido.</p> <p>La Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 establece el servicio a la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado. Para cumplir este mandato, el Fondo Adaptación dispone los lineamientos, los canales y los recursos necesarios para interactuar con la ciudadanía y satisfacer sus necesidades de acceso a la información pública, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias bajo principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, para garantizar el goce efectivo de sus derechos.</p>

Por lo anterior, para la vigencia 2021 la estrategia para implementar la política de servicio al ciudadano consistirá:

1. Gestionar dentro del término de ley la totalidad de las PQRSFD recibidas mensualmente en la entidad:

Durante el mes de agosto 2021 se recibieron 245 PQRSFD, de las cuales 68 cuentan al cierre del periodo con respuesta dentro del término establecido por la ley, 1 respondida extemporáneamente y 176 PQRSFD se encuentran en gestión dentro de la oportunidad del tiempo de respuesta.

2. Socializar en los canales internos 20 piezas claves dentro de la vigencia de temas para la atención al ciudadano.

En el mes de agosto socializamos:

- Agosto 13 de 2021 – Lineamientos sobre la política de servicio al ciudadano.
- Agosto 27 de 2021 – Atributos del buen servicio.

- Agosto 30 de 2021 – Reiteración de los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. considerando que es un punto con alta prioridad para el Fondo Adaptación, toda vez que están dirigidas a controlar el riesgo por incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.

https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Septiembre	Durante el tercer trimestre de 2021 se recibieron 732 PQRSFD, de las cuales 507 fueron gestionadas dentro del término establecido por ley, 5 se respondieron extemporáneamente y 220 PQRSFD se encuentran en trámite de respuesta, aclarando que con corte al 30 de septiembre se encuentran dentro de la oportunidad del término. Por lo anterior con corte al periodo de julio a septiembre de 2021 el indicador se cumplió al 99.0%.
--	------------	---

Bitácora de Seguimiento


Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	Enero	Para el mes de enero el MHCP no realizó convocatoria de mesa sectorial de atención al ciudadano.
	Febrero	<p>Para el mes de febrero se inició a ejecutar las dos primeras actividades programas del plan de trabajo para la vigencia 2021 para desarrollar la "Guía metodológica para implementar, traducir y evaluar los documentos traducidos en Lenguaje Claro".</p> <p>Actividad 1 Revisar antecedentes de implementación de Lenguaje Claro en las entidades y los lineamientos dados por el DNP para adaptarlos a las necesidades de las entidades del sector hacienda Fechas: Del 1 al 23 de febrero En esta actividad revisaremos los documentos, guías, etc. que nos oriente en la elaboración de la guía de lenguaje claro para el sector hacienda, esto nos permitirá desarrollar la actividad 2.</p>

		<p>Actividad 2 Proponer componentes tabla del contenido guía metodológica Fechas: Del 23 de febrero al 1 de marzo En las fechas relacionadas, recibiremos la propuesta de la tabla de contenido de la guía metodológica al correo electrónico Jeimy.penuela@minhacienda.gov.co</p> <p>Evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0</p>
	Marzo	<p>El 08 de marzo de 2021 se realizó reunión con la siguiente actividad programada dentro del plan de trabajo para la actual vigencia - Definir la tabla de contenido para la "Guía metodológica para implementar, traducir y evaluar los documentos traducidos en Lenguaje Claro" y la distribución por grupos para elaborar los temas de dicha tabla. https://drive.google.com/drive/folders/1-0U9_SBwWumVzqT0auhYNdEWI2LVSrJ0</p>
	Abril	<p>El 21 de abril de 2021 se realizó participación de los miembros de la Mesa Sectorial al Taller de Lenguaje Claro con Brigitte Quintero de Función Pública, con objetivo de afianzar los conocimientos sobre el tema y realizar la traducción de algunos documentos a lenguaje claro, para fortalecer la elaboración de la guía metodológica del sector hacienda.</p>
	Mayo	<p>El 12 de mayo de 2021 se recibe correo electrónico de la Mesa Sectorial requiriendo reporte de avance de las actividades pendientes, según seguimiento al diagnóstico realizado en 2019. Por lo anterior el miércoles 19 de mayo se responde el requerimiento con las respectivas evidencias de cumplimiento</p>


	dentro del tiempo indicado.
Junio	Durante el mes de junio de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó mesa sectorial, así como tampoco realizó requerimiento alguno sobre el tema. Es importante indicar que el avance de esta actividad depende directamente del MHCP, como cabeza y organizador de las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano.
Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	Durante el mes de agosto de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó mesa sectorial, sin embargo en el marco del plan de trabajo para la vigencia 2021 respecto a la elaboración de la guía metodológica del sector hacienda, realizaron solicitud de envío de contenido individual para ser remitido antes del 17 de agosto de 2021, según como se evidencia en correo adjunto. Es importante indicar que el avance de esta actividad depende directamente del MHCP, como cabeza y organizador de las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano.
Septiembre	Durante el mes de septiembre de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó mesa sectorial, así como tampoco realizó requerimiento alguno sobre el tema. Es importante indicar que el avance de esta actividad depende directamente del MHCP, como cabeza y organizador de las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Cumplimiento 2021/09/30



Avance 2021/09/30

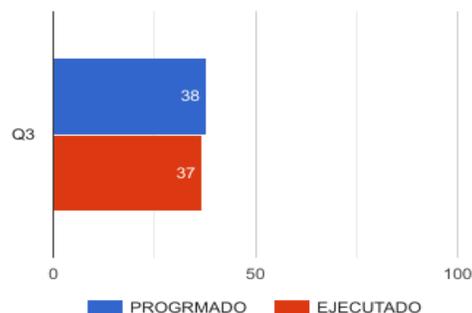

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN DOCUMENTAL



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR)	Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado	# 6	100	25	25	25	25	75.32

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP	Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	#	100	0	0	0	100	0
		6						

Bitácora de Seguimiento

Plan Institucional de Archivos (PINAR), ejecutado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se tiene las vigencias de 2011 a 2014 con todos los procesos técnicos de archivo, se adjuntan FUID Correspondientes
	Marzo	Se informa el desarrollo de la fase I del proyecto de fortalecimiento de la información el cual tiene contemplado inicialmente la organización de 833 metros lineales de información el cual se tiene previsto que finalice el 30 de abril, a cierre de 30 de marzo se cuentan con 883.25 metros lineales organizados y custodiados.
	Abril	Se informa el desarrollo de la fase I del proyecto de fortalecimiento de la información el cual tiene contemplado inicialmente la organización de 833 metros lineales de información el cual se tiene previsto que finalice el 30 de abril, a cierre de 30 de abril se cuentan con 918.44 metros lineales organizados y custodiados.
	Mayo	Durante el mes de mayo se adelantaron actividades de socialización y sensibilización en la aplicación de las TRD por parte de las oficinas productoras de información, frente al desarrollo del proyecto de fortalecimiento, se adelanto el traslado de la ubicación del archivo de la entidad, a las instalaciones de la unión temporal Fondo Adaptación 2021.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021


Junio	Se adelantó la digitalización de 200.000 imágenes correspondientes a 96 contratos, se adelantó la organización de 10 metros lineales correspondientes a 231 carpetas de las vigencias 2015, la descripción de 10 metros lineales de la vigencia 2017 correspondiente a 34 contratos con 250 carpetas, de igual forma se adelantaron mesas de trabajo para la aplicación de las TRD en las oficinas productoras de información.
Julio	Se desarrollo la organización de la organización de 50 metros lineales de información, se adelantaron proceso de descripción de 65 metros lineales y la digitalización de 700.000 mil imágenes.
Agosto	Se desarrollo la organización de la organización de 62 metros lineales de información, se adelantaron proceso de descripción de 65 metros lineales y la digitalización de 1.000.000 mil imágenes.
Septiembre	Formulación del documento del Programa de documentos electrónicos de archivo para realizar una primera versión del documento final que se tendrá a finales del 2021. Se realizó la contratación del profesional de apoyo que participará junto con la Líder del E.T de Gestión documental en las actividades de actualización de los Cuadros de clasificación documental y Tablas de retención documental. Se realizó la organización de 209 metros lineales correspondiente a las Series Contratos y Convenios de la vigencia 2015 y 2016.

Bitácora de Seguimiento

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se participo en mesa sectorial MHCP
	Marzo	Durante el mes de marzo, no se presentaron reuniones de la mesa sectorial del sector hacienda para gestión documental.
	Abril	Durante el mes de abril, no se presentaron reuniones de la mesa sectorial del sector hacienda para gestión documental.
	Mayo	Para el mes de mayo no se adelantaron actividades correspondientes a la mesa sectorial de sección documental del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
	Junio	Para el mes de junio, no se realizaron actividades correspondientes a la mesa sectorial de gestión documental del MHCP, y no se programaron reuniones.
	Julio	Se participo en la mesa sectorial el pasado 16 de julio de 2021, en donde se recibió información sobre los avances en materia de gestión documental por parte de las entidades adscritas al ministerio de hacienda.
	Agosto	No se programaron actividades de la mesa sectorial de MHCP, para el mes de agosto.
	Septiembre	Se participó en una mesa de trabajo con grupos adscritos a la mesa sectorial de gestión documental del MHCP – Ministerio de Hacienda de Crédito Público cuyo principal objetivo fue establecer las políticas del plan de preservación digital del sector Hacienda.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

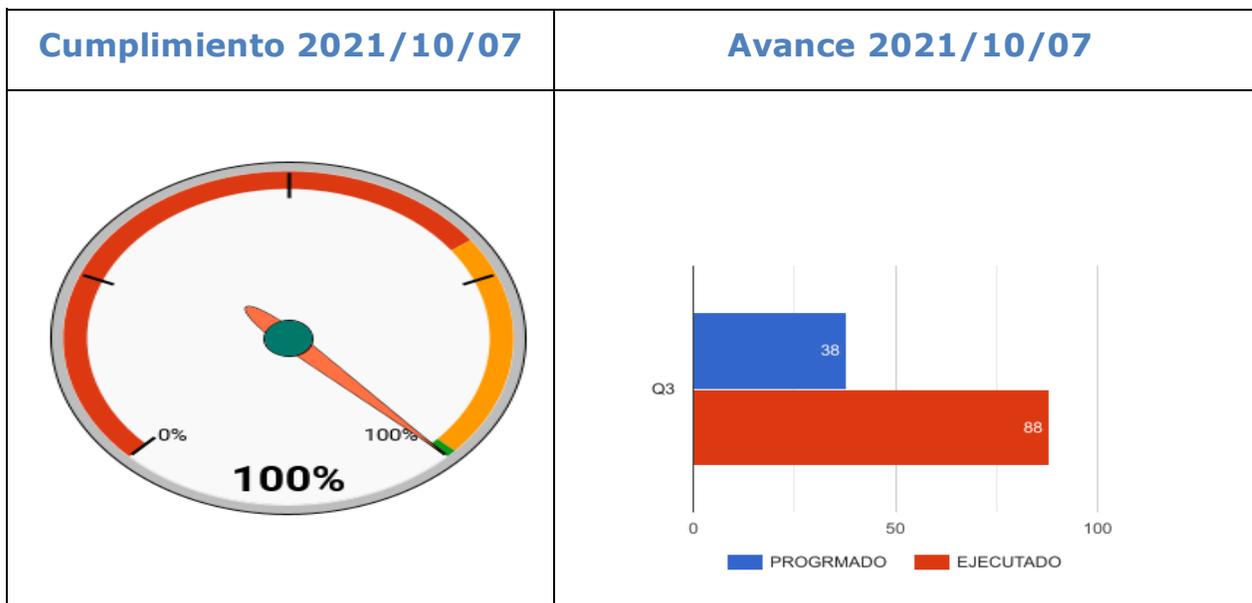

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN CONTRACTUAL



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Realizar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características	Procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios	# 6	400	100	100	100	100	175

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano							
Gestionar de forma adecuada y oportuna procesos de contratación (diferentes de bienes y servicios de características técnicas uniformes), tramitados electrónicamente a través de Secop II	Procesos de contratación (diferentes de bienes y servicios de características técnicas uniformes), tramitados electrónicamente a través de Secop II, de forma adecuada y oportuna	# 6	400	100	100	100	100	175
Realizar modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos, tramitados en las condiciones normativas	Modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos tramitados en las condiciones normativas	# 6	400	100	100	100	100	175

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Durante el mes de enero de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no
--	-------	---

<p>Procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes tramitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p>		<p>requirió utilizar la plataforma para tal fin.</p> <p>En el mes de enero de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 104 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 102 solicitudes, 2 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlos, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p> <p>En el mes de enero del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 11 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 11 solicitudes, 9 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el mes de enero de 2021, las distintas

	<p>dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin.</p> <p>En el mes de febrero de la presente vigencia, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En tal virtud, se recibieron 4 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p> <p>Durante el mes de marzo de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin.</p>
Abril	<p>Durante el mes de abril de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin.</p>

		<p>En el mes de abril de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 22 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 22 solicitudes, 4 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p> <p>En el mes de abril del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 16 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 16 solicitudes, 5 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Durante el mes de mayo de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación de acuerdo a sus necesidades, no solicitaron la adquisición bienes y servicios de características técnicas</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		uniformes por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por este motivo, el Equipo de Trabajo del Grupo de Gestión Contractual no requirió utilizar la plataforma para tal fin.
	Junio	Durante el segundo trimestre del año en curso, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En tal virtud, se recibieron en total 2 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Durante el mes de agosto de 2021, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En tal virtud, se recibió 1 requerimiento, el cual el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Septiembre	Durante el tercer trimestre del año en curso, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En tal virtud, se recibieron en total 4 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
--	--	---

Bitácora de Seguimiento

<p>Procesos de contratación (diferentes de bienes y servicios de características técnicas uniformes), tramitados electrónicamente a través de Secop II, de forma adecuada y oportuna</p>	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>En el mes de enero de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 104 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 104 solicitudes, 2 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluirlos, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p> <p>En el mes de febrero de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 29 requerimientos, los</p>

		<p>cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 29 solicitudes, 5 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p> <p>En el mes de enero de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 25 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 25 solicitudes, 3 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	<p>En el mes de mayo de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 12 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que,</p>

	<p>teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 12 solicitudes, 3 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
Junio	<p>En el segundo trimestre de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron en total 55 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 55 solicitudes, 1 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
Julio	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
Agosto	<p>En el mes de agosto de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron 20 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		<p>las 20 solicitudes, 1 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>
	Septiembre	<p>En el tercer trimestre de la presente anualidad, las distintas dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para los procesos de contratación adelantados electrónicamente a través de Secop II. En tal virtud, se recibieron en total 80 requerimientos, los cuales el E.T. de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 80 solicitudes, 1 se encuentran cursado su trámite normal para poder concluir las, según los tiempos establecidos por la normatividad contractual. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.</p>

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>En el mes de enero del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 11 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es</p>

Modificaciones, suspensiones, cesiones terminaciones de contratos tramitados en las condiciones normativas

importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 11 solicitudes, 9 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.

En el mes de febrero del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 32 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 32 solicitudes, 3 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.

En el mes de marzo del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 33 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 33 solicitudes, 5 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	En el mes de mayo del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 26 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 26 solicitudes, 7 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
	Junio	En el segundo trimestre del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron en total 61 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 61 solicitudes, 4 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	reportado fue el 100%.
Julio	Sin registro de avance en el indicador
Agosto	En el mes de agosto del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron 24 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 24 solicitudes, 6 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.
Septiembre	En el tercer trimestre del año 2021, las diferentes dependencias del Fondo Adaptación requirieron adelantar el trámite para las modificaciones contractuales. En tal virtud, se recibieron en total 69 requerimientos, los cuales el E.T.Grupo de Gestión Contractual tramitó oportunamente. Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la fecha de radicación, de las 69 solicitudes, 4 requirieron mayor tiempo, debido a las revisiones y ajustes necesarios para culminar el trámite en las condiciones normativas. De esta manera el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de modificaciones radicadas con respecto a las efectivamente gestionadas durante el mes reportado fue el 100%.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

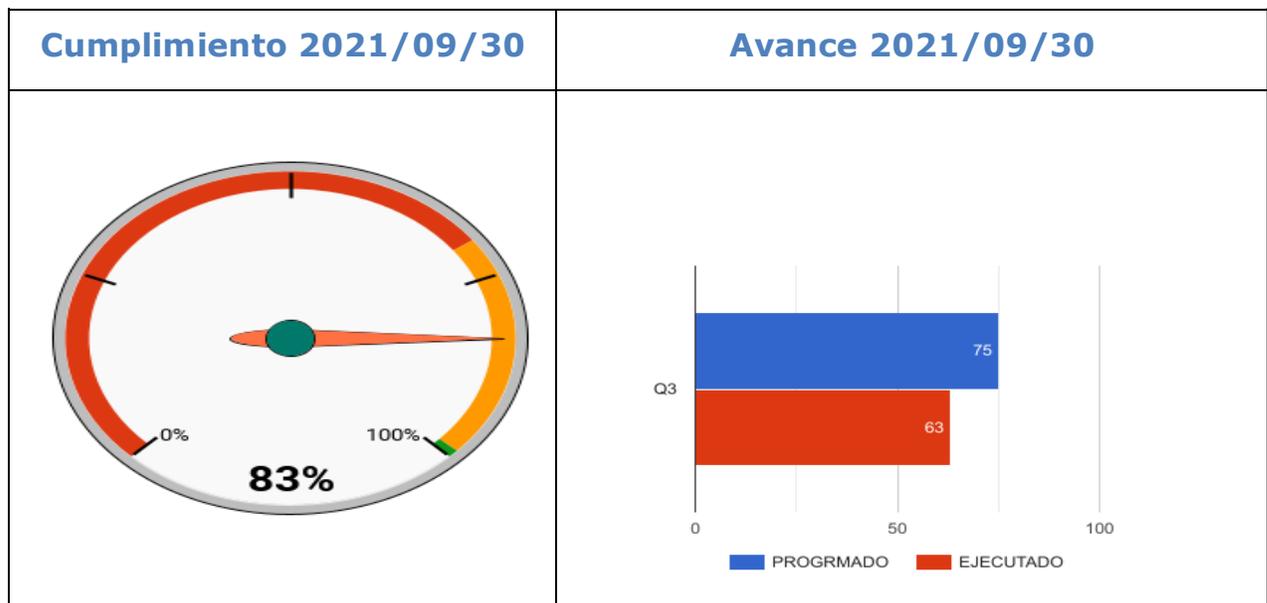

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: DEFENSA JUDICIAL



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Implementar la Política de Defensa Jurídica (MIPG)	Política de Defensa Jurídica (MIPG), implementada	# 6	100	0	50	0	50	100
Realizar capacitaciones respecto a la Política de	Capacitaciones respecto a la	# 6	2	0	0	0	2	2

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021	Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021							
Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	Sesiones ANDJE de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	# 6	100	0	0	0	100	15
Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda	Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	# 6	100	0	0	0	100	1
Gestionar trámites de Incumplimiento y/o Reclamaciones ante Compañías de Seguros	Trámites diligenciados y terminados dentro de los plazos legales/Trámites recibidos con cumplimiento de requisitos legales	# 6	400	100	100	100	100	200
Gestionar actas o informes de liquidación en un término máximo de 30 días calendario desde su radicación	Actas o informes gestionados/Actas o informes radicados según Plan de liquidaciones 2021	# 6	400	100	100	100	100	300

Bitácora de Seguimiento

Política de Defensa Jurídica (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Se culminó el proceso de implementación de la PPDA 2020-2021
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Capacitaciones respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Se realizó la capacitación sobre la Política de Prevención de Daño Antijurídico de los Sectores Salud y Medio Ambiente.
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Agosto	Se realiza capacitación sobre la Política de Prevención de Daño Antijurídico el pasado 11-08-2021 sobre la última subcausa, referente a enervar los eventuales incumplimientos a los términos judiciales, cuyo mecanismo corresponde a capacitaciones presenciales.
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Sesiones ANDJE de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Se obtienen 15 certificados por parte de los integrantes del E.T. de Defensa Judicial, Extrajudicial y Cobro Coactivo por la participación en cursos virtuales y capacitaciones.
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Trámites diligenciados y terminados dentro de los plazos legales/Trámites recibidos con cumplimiento de requisitos legales	Enero	Se seleccionó "Registro sin Avance Cuantitativo", teniendo en cuenta que de acuerdo con las metas del Plan de Acción, el primer reporte de Avance Cuantitativo se debe realizar a la terminación del primer trimestre del año 2021.
	Febrero	De acuerdo con el Plan de Acción, esta Acción Estratégica no tiene previsto registrar Avance para el mes de febrero de 2021.
	Marzo	Durante la vigencia 2021, se ha gestionado 36 de trámites de incumplimiento y/o reclamación, de los cuales se han terminado 19, que corresponden al 52% de los trámites gestionados y terminados dentro del plazo legal.
	Abril	De acuerdo con el Plan de Acción, para esta

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		Acción Estratégica no se tiene previsto registrar avance para el mes de abril de 2021.
	Mayo	De acuerdo con el Plan de Acción, para esta Acción Estratégica no se tiene previsto registrar avance para el mes de mayo de 2021.
	Junio	Durante la vigencia 2021 se han gestionado 43 de trámites de incumplimiento y/o reclamación, de acuerdo con los insumos presentados por las áreas técnicas.
	Julio	De acuerdo con el Plan de Acción, para esta Acción Estratégica no se tiene previsto registrar avance para el mes de julio de 2021.
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Actas o informes gestionados/Actas o informes radicados según Plan de liquidaciones 2021	Enero	No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación. Para el mes de enero de 2021, las radicaciones del Plan de liquidaciones se realizaron el 29 de enero de 2021, es por esto que el avance a reportar es trimestral. Sin embargo, se precisa que en el mes de enero 2021 se radicaron 35 contratos para revisión de liquidaciones, de esos, 14 no son objeto de liquidación, 6 ya fueron revisados y se encuentran en ajustes del Sector, se suscribió 1 cierre de expediente, 2 se encuentran en revisión financiera, y 12 en revisión del Equipo de Liquidaciones.
--	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Febrero	<p>No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre. Para el mes de febrero de 2021, las radicaciones del Plan de liquidaciones se realizaron entre el 25 y 26 de febrero, es por esto que el avance a reportar es trimestral. Sin embargo, se precisa que en el mes de febrero de 2021 se radicaron 31 actas de liquidación y 2 informes de cierre de expediente para revisión del Equipo de Liquidaciones, de esos 33 trámites: 8 contratos no son objeto de liquidación, 3 se liquidaron, 4 se encuentran en revisión financiera, 9 en ajustes de los Sectores, 7 en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones, y 2 en segunda revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones.</p>
	Marzo	<p>Entre el mes de enero y el 31 de marzo de 2021, se radicaron 119 proyectos de actas de liquidación y/o informes de cierre. Que se encuentran con el siguiente estado: 36 no objeto de liquidación. 1 Vo Bo financiera. 24 actas de liquidación suscritas. 5 informes de cierre de expediente tramitados. 4 en trámite de firma. 19 en revisión del Equipo de Liquidaciones, de los cuales 3 obedecen a segunda revisión. 30 devueltos a los Sectores, Macroproyectos y demás Equipos para ajuste.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	Abril	<p>No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General.</p> <p>Para el mes de abril de 2021, se radicaron 26 actas de liquidación para revisión del Equipo de Liquidaciones. El estado actual de esos 26 trámites es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7 contratos no son objeto de liquidación- 1 acta en trámite de firma- 5 actas de liquidación suscritas- 5 actas de liquidación devueltas para ajustes de los Sectores,- 7 actas en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones, y 1 acta en segunda revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones.
	Mayo	<p>No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General. Para el mes de mayo de 2021, se radicaron 25 actas de liquidación y 1 informe de cierre para revisión del Equipo de Liquidaciones. El estado actual de esos 26 trámites es el siguiente: 9 contratos con reporte de no objeto de liquidación. 3 actas de liquidación suscritas. 4 actas en revisión del Equipo Financiero. 3 actas de liquidación devueltas para ajustes de los Sectores. 6 actas y 1 informe de cierre en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones; estos últimos recibidos entre el 27 y el 31 de mayo</p>


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

	de 2021.
Junio	Entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2021, se radicaron 88 proyectos de actas de liquidación y/o informes de cierre. Que se encuentran con el siguiente estado: 27 no objeto de liquidación. 26 actas de liquidación suscritas. 1 informe de cierre de expediente tramitado. 4 en trámite de firma. 10 en revisión del Equipo de Liquidaciones, de los cuales 3 obedecen a segunda revisión. 20 devueltos a los Sectores, Macroproyectos y demás Equipos para ajuste.
Julio	No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un plazo de gestión de 30 días calendario contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General. En el mes de julio de 2021, se radicaron 16 actas de liquidación y 6 informes de cierre de expediente para revisión del Equipo de Liquidaciones. El estado actual de esos 22 trámites es el siguiente: 6 contratos con reporte de no objeto de liquidación. 1 acta en revisión del Equipo Financiero. 1 acta en trámite de firma. 3 actas de liquidación y 2 informes de cierre devueltos para ajustes de los Sectores. 5 actas y 4 informes de cierre en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones; estos últimos recibidos entre el 26 y el 31 de julio de 2021.
Agosto	No se reporta avance cuantitativo teniendo en cuenta que dentro de la acción estratégica se previó un reporte trimestral teniendo en cuenta el plazo de gestión de 30 días calendario

		<p>contado desde la fecha de radicación del proyecto de acta o informe de cierre en Secretaría General. Sin embargo, se reporta que en el mes de agosto de 2021, se radicaron 30 trámites en total, de los cuales 27 corresponden a actas de liquidación y 3 a informes de cierre de expediente para revisión del Equipo de Liquidaciones. El estado actual de esos 30 trámites es el siguiente: 2 contratos con reporte de no objeto de liquidación. 3 actas de terminación anticipada y liquidación suscritas, 8 actas de liquidación suscritas, 5 actas de liquidación y 1 informe de cierre devueltos para ajuste de los Sectores. 9 actas de liquidación en primera revisión del Equipo de Gestión de Liquidaciones recibidas entre el 30 y 31 de agosto y 2 actas en segunda revisión.</p>
	<p>Septiembre</p>	<p>Entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2021, se radicaron 107 proyectos de actas de liquidación y/o informes de cierre. El estado actual de esos 30 trámites es el siguiente: 2 Informes de cierre de expediente tramitados. 13 contratos/convenios liquidados. 57 trámites devueltos para ajuste de los Sectores, Macroproyectos y Demás Equipos de Trabajo. 1 acta de liquidación bilateral no suscrita por admisión del medio de control de controversias contractuales, por lo que pasa a liquidación judicial. 16 trámites en revisión del Equipo de Trabajo de Gestión Contractual – Liquidaciones, de los cuales 6 obedecen a segunda revisión (ajustes realizados por los Sectores) y 10 trámites corresponden a radicaciones realizadas entre el 21 y el 30 de septiembre. 2 trámites en firma. 9 contratos no objeto de liquidación y 7 trámites en revisión</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

del Equipo Financiero.

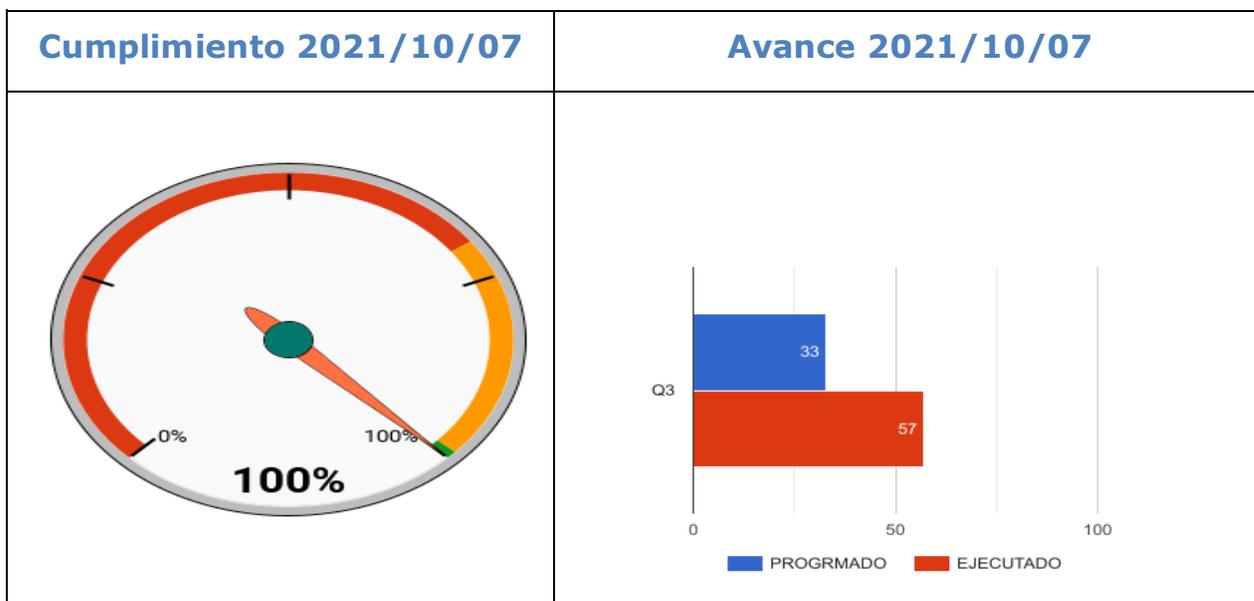

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
Gestionar las actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente	Gestión de actuaciones disciplinarias conforme a la	# 6	400	100	100	100	100	200


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

normatividad vigente/Quejas, anónimos o informes oficiales recibidos									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bitácora de Seguimiento

<p><i>Gestión de actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente/Quejas, anónimos o informes oficiales recibidos</i></p> <p>Gestión de actuaciones disciplinarias conforme a la normatividad vigente/Quejas, anónimos o informes oficiales recibidos</p>	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el periodo reportado se dio trámite a todas las quejas, anónimos e informes oficiales recibidos, dando lugar a las actuaciones disciplinarias correspondientes.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Se atendieron al 100% las quejas, informes oficiales y anónimos allegados a este equipo de trabajo durante el segundo trimestre de 2021
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
Septiembre	Sin registro de avance en el indicador	

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021



6. Seguimiento Indicadores Plan de Acción de Alcance

INDICADOR:	META 2021:	RESPONSABLES:	CALCULA:
Ejecución Plan de Contratación	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Contractual
Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	95%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	95%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de funcionamiento	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de inversión	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Total	70%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Reserva*	100%	Equipo de Trabajo Tecnología de la Información	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Vigencia	70%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC vigencia	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Porcentaje de reducción de gastos (Austeridad)	10%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen con austeridad	Equipo de Trabajo Talento Humano
Reserva presupuestal (Reserva presupuestal inversión / apropiación vigente)	<15%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2021	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Ejecución Plan de Contratación	Ejecución Plan de Contratación	# 6	100	0	0	0	100	0
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	# 6	95	0	0	0	95	96
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)	# 6	95	0	0	0	95	76
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	# 6	100	0	0	0	100	97
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Total	# 6	70	0	0	0	70	25.6
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Reserva	# 6	100	0	0	0	100	61.2
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Vigencia	# 6	70	0	0	0	70	16.81
PRESUPUESTO	Porcentaje de reducción de gastos según decreto (Austeridad)	# 6	10	0	0	0	10	0
PRESUPUESTO	Reserva presupuestal (Reserva presupuestal inversión / apropiación)	# 6	15	0	0	0	15	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

vigente)

Bitácora de Seguimiento

Ejecución Plan de Contratación	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Ejecución Presupuesto	Enero	El avance de ejecución del total ejecución al mes de enero de 2021, es del 0,65%.
	Febrero	El avance de ejecución total al mes de febrero de 2021, es del 93,05%.
	Marzo	El avance de ejecución total de los recursos al mes de marzo de 2021, es del 91.93%, se presenta una disminución en comparación al mes de febrero de 2021, debido a una adición de apropiación en recursos de funcionamiento.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Total (compromiso/apropiación)	Abril	El avance de ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión al mes de abril de 2021, es del 92.02%, se presenta un incremento del 0.09% en comparación al mes de marzo 2021.
	Mayo	El avance de ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación, al mes de mayo de 2021, es de 92,72%, presentando un incremento del 0,70% en comparación al mes de abril 2021.
	Junio	El avance de ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación, al mes de junio de 2021, es de 94,84%, presentando un incremento del 2,12% en comparación al mes de mayo 2021.
	Julio	El avance de ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación, al mes de julio 2021, es de 95.26%, presentando un incremento del 0.42% en comparación al mes de junio 2021.
	Agosto	El avance de ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación, al mes de agosto 2021, es del 95,52%, presentando un incremento del 0,26% en comparación al mes de julio 2021.
	Septiembre	El avance de la ejecución total de los recursos de funcionamiento e inversión en SIIF Nación, al mes de septiembre 2021, es del 95,80%, presentando un incremento en relación con el mes de agosto 2021 de 0.28%.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	El avance de ejecución de funcionamiento al
--	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Ejecución Presupuesto Funcionamiento (compromiso/apropiación)		mes de enero de 2021 es del 12,65%.
	Febrero	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento al mes de febrero de 2021, es del 18%.
	Marzo	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento al mes de marzo de 2021, es del 17,76%, se presenta una disminución en comparación al mes de febrero de 2021, debido a una adición de apropiación en recursos de funcionamiento.
	Abril	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento al mes de abril de 2021, es del 50.05%, presentando un incremento del 32,39% en comparación al mes de marzo 2021.
	Mayo	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de mayo de 2021, es del 54,17%, presentando un incremento del 4,12% en comparación al mes de abril 2021.
	Junio	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de junio de 2021 es del 59,47%, presentando un incremento del 5,30% en comparación al mes de mayo 2021.
	Julio	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de julio 2021 es del 66.56%, presentando un incremento del 7.09%, en comparación al mes de junio 2021.
	Agosto	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de agosto 2021 es de 71,01%, presentando un

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		incremento del 4,45%, en comparación al mes de julio 2021.
	Septiembre	El avance de ejecución de los recursos de funcionamiento en SIIF Nación al mes de septiembre 2021 es de 75,75%, presentando un incremento del 4,74%, en comparación con el mes de agosto 2021.

Bitácora de Seguimiento

Ejecución Presupuesto Inversión (compromiso/apropiación)	Enero	El avance de ejecución de inversión al mes de enero 2021 es del 0,10%.
	Febrero	El avance de ejecución de recursos de inversión al mes de febrero de 2021. es del 96,56%
	Marzo	El avance de ejecución de los recursos de inversión al mes de marzo de 2021, es del 96.57%, se presenta una disminución en comparación al mes de febrero de 2021, debido a una adición de apropiación en recursos de funcionamiento.
	Abril	El avance de ejecución de los recursos de inversión al mes de abril de 2021, es del 94,64%, se presenta una disminución en comparación al mes de marzo 2021 de 1,92%, debido a la liberación de recursos para cubrir un traslado presupuestal entre proyectos.
	Mayo	El avance de ejecución de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de mayo de 2021, es del 95,13%, se presenta un incremento del 0,49%. El total de los recursos de inversión han disminuido para cubrir un traslado presupuestal entre proyectos.
	Junio	El avance de ejecución de los recursos de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		inversión en SIIF Nación al mes de junio de 2021 es del 97,05%, se presenta un incremento del 1,92% en comparación al mes de mayo 2021.
	Julio	El avance de ejecución de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de julio 2021 es del 97.05%. No se presenta diferencia en comparación con el mes de junio 2021.
	Agosto	El avance de ejecución de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de agosto 2021 es del 97,05%. No se presenta diferencia en comparación al mes de julio 2021.
	Septiembre	El avance de ejecución de los recursos de inversión en SIIF Nación al mes de septiembre 2021 es del 97,05%. No se presenta diferencia en comparación con el mes de agosto 2021.

Bitácora de Seguimiento

Ejecución PAC Total	Enero	En enero de 2021 se efectuaron pagos por \$1.141 millones de acuerdo con la facturación radicada, los cuales fueron cargados a los recursos de las vigencia anteriores.
	Febrero	En febrero de 2021 se efectuaron pagos por \$11.521 millones de acuerdo con la facturación radicada, los cuales fueron cargados a las disponibilidades de caja anteriores.
	Marzo	En marzo de 2021 se efectuaron pagos por \$13.166 millones de acuerdo con la facturación radicada.
	Abril	En abril de 2021 se efectuaron pagos por \$24.792 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 8.90% con respecto al

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		valor de la meta anual.
	Mayo	En MAYO de 2021 se efectuaron pagos por \$26.137 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 13,50% con respecto al valor de la meta anual.
	Junio	En JUNIO de 2021 se efectuaron pagos por \$15.754 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 16,3% con respecto al valor de la meta anual.
	Julio	En JULIO de 2021 se efectuaron pagos por \$10.506 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 18,2% con respecto al valor de la meta anual.
	Agosto	En AGOSTO de 2021 se efectuaron pagos por \$24,835 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 18,2% con respecto al valor de la meta anual.
	Septiembre	En SEPTIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$17,089 millones de acuerdo con la facturación radicada y se alcanzó el 25,6% con respecto al valor de la meta anual.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	En enero de 2021 se efectuaron pagos por \$1.141 millones de acuerdo con la facturación radicada.
	Febrero	En febrero de 2021 se efectuaron pagos por \$11.521 millones de acuerdo con la facturación radicada.
	Marzo	En marzo de 2021 se efectuaron pagos por \$5.518 millones con cargo a recursos de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Ejecución PAC Reserva		vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados .
	Abril	En abril de 2021 se efectuaron pagos por \$9.275 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados .
	Mayo	En MAYO de 2021 se efectuaron pagos por \$12.147 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados .
	Junio	En JUNIO de 2021 se efectuaron pagos por \$10.841 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados .
	Julio	En JULIO de 2021 se efectuaron pagos por \$6.240 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados .
	Agosto	En AGOSTO de 2021 se efectuaron pagos por

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		\$6.194 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados .
	Septiembre	En SEPTIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$6.363 millones con cargo a recursos de vigencias anteriores de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos de Canal del Dique y La Mojana, y los sectores Rio Fonce, Medio ambiente, Reactivación económica, Vivienda y No sectorizados .

Bitácora de Seguimiento

Ejecución PAC Vigencia	Enero	En enero de 2021 no se ejecutaron pagos con afectación a recursos de vigencia.
	Febrero	En febrero de 2021 no se ejecutaron pagos con afectación a recursos de vigencia.
	Marzo	En marzo de 2021 se efectuaron pagos por \$7.647 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por los macroproyectos y sectores de jarillon de Cali, acueducto, educación, salud y transporte.
	Abril	En Abril de 2021 se efectuaron pagos por \$15.516 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Mayo	En MAYO de 2021 se efectuaron pagos por

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

		\$13.996 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Junio	En JUNIO de 2021 se efectuaron pagos por \$5.320 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Julio	En JULIO de 2021 se efectuaron pagos por \$4.266 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Agosto	En AGOSTO de 2021 se efectuaron pagos por \$18.640 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.
	Septiembre	En SEPTIEMBRE de 2021 se efectuaron pagos por \$10,725 millones con cargo a recursos de la vigencia actual de acuerdo con la facturación radicada por el macroproyecto Jarillón de Cali y los sectores de acueducto, educación, salud y transporte.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

Porcentaje de reducción de gastos según decreto (Austeridad)	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Reserva presupuestal (Reserva presupuestal inversión / apropiación vigente)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador
	Julio	Sin registro de avance en el indicador
	Agosto	Sin registro de avance en el indicador
	Septiembre	Sin registro de avance en el indicador

Cumplimiento 2021/09/30

Avance 2021/09/30

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2021

