



PROYECTO RIO FONCE



Recuperación de áreas afectadas por la ola invernal mediante el control de aguas superficiales y fenómenos de remoción en masa en los municipios de Encino, Coromoro, Charalá, Ocamonte, Paramo, Valle de San José, Onzaga, San Joaquín, Mogotes, San Gil, Pinchote y Barichara (Cuenca Hidrográfica del Rio Fonce)

Tipos de eventos a atender


Represamiento de ríos con riesgo en zonas urbanas		1
Afectación de presas de acueductos		
	Filtraciones a través de la presa	1
Afectación de escuelas	Por deslizamiento	1
	Por inundación	1
Afectación de puentes	Incapacidad hidráulica	3
	Avalancha	1
	Socavación	1
	Erosión y deslizamiento	1
Afectación de áreas urbanas	Por inundación	2
	Erosión	1
	Deslizamiento	1
Afectación de viviendas rurales	Por deslizamiento	4
Afectación de vías	Falla de bateas	2
	Erosión lateral junto a ríos	7
	Alcantarillas y box	6
	Deslizamientos	11
Grandes deslizamientos en zonas rurales sin afectación de viviendas ni de vías		2
Afectación de torres eléctricas (no aplica para el Fondo)		1
Deslizamientos menores		1



Reconstrucción dique - presa



Estabilización de taludes -vías

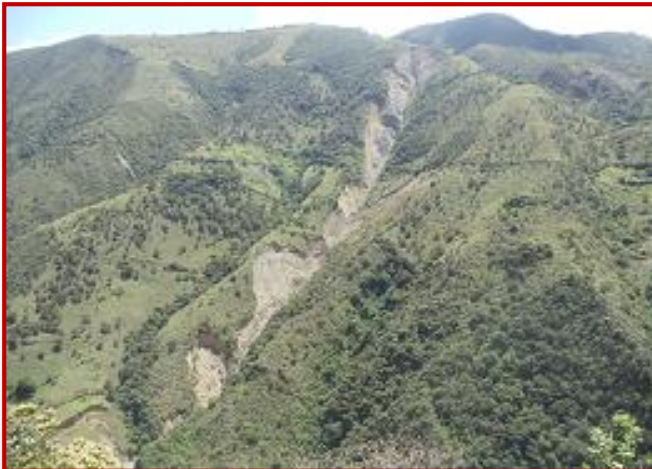

Estabilización taludes - reforestación



Reconstrucción puentes vehiculares



- Presupuesto y contratación**

PRESUPUESTO	\$ 15.298.001.304
CONTRATADO / CONVENIOS	\$ 14.715.144.379
PORCENTAJE COMPROMETIDO	96%

Principales Contratos	Productos	Valor contratado (Millones)	Avance	Entrega	Pagos
Sociedad Santandereana de Ingenieros	Eventos validados eventos postulados	\$ 116	100%	enero/14	90%
Geotecnología SAS	Estudios y diseños de obras de mitigación	\$ 1.094	99%	Agosto/14	60%
JAM Ingeniería y Medio Ambiente EU	Interventoría a estudios y diseños de obras de mitigación	\$ 307	99%	Agosto/14	65%
Convenio - Corporación Autónoma Regional de Santander *	Contratación de la reforestación que mitigue y prevenga afectación	\$ 4.757	Inicio	Julio /16	-
Convenio - Departamento de Santander*	Contratación de las obras que den solución a afectación	\$ 8.440	Inicio	Julio /16	-
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO					6,4%
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO					3,4 %



• Plan de Contratación

POR CONTRATAR	FECHA PREVISTA INICIO	FECHA PREVISTA FINALIZACION
Obras - Departamento Santander	Septiembre 2014	Julio 2016
Interventoría Obras	Septiembre 2014	Julio 2016
Reforestación - CAS	Septiembre 2014	Julio 2016
Interventoría Reforestación	Septiembre 2014	Julio 2016

• Plan de acción

Plan de Acción	Metas Avance Proyecto				
	2013	2014	2015	2016	Total
Planeado	1	24	50	25	100
Ejecutado	1	20	-	-	-



• Situaciones de interés

- Atraso en actividades de campo requeridas para diseños por dificultades de acceso y seguridad en la zona de los estudios. Por lo cual fue necesario prorrogar contratos diseño e interventoría por mes y medio.
- Los análisis preliminares de diseño indican que el monto disponible para obras no permitiría atender todos los eventos. La solución prevista es la priorización por riesgo y/o mayor afectación para seleccionar los proyectos.
- Dificultades en el trabajo interventoría – consultoría de diseños, como consecuencia ha habido demora en los ajustes a los documentos finales de la consultoría de diseño.
