

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO

FONDO ADAPTACIÓN

INFORME DE CIERRE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 31 DICIEMBRE DE 2013

RESULTADOS EN COMPROMISOS


GESTIÓN EN COMPROMISOS

**COMPROMISOS REALIZADOS POR SECTOR HASTA DICIEMBRE DE 2013
VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS**

Sector	Compromisos	Meta	Cumplimiento
Acueducto	335,00	235,83	142%
Educación	375,43	472,72	79%
Medio Ambiente	75,28	85,76	88%
Mitigación de Riesgo	394,18	274,27	144%
Reactivación Económica	73,50	124,82	59%
Salud	153,27	179,08	86%
Transporte	660,66	784,15	84%
Vivienda	416,85	779,28	53%
Gerencia Antioquia	11,91	11,91	100%
Proyectos de apoyo	16,94	16,15	105%
Total	2.513,03	2.963,98 *	85%


* El Plan de Acción fijó una meta de contratación de \$2.995,45 miles de millones. Al consolidar la información encontramos que el mes de agosto fue registrado como ejecutado y planeado con \$31,47 miles de millones, que se ajustan en este informe final de seguimiento.

**COMPROMISOS Y METAS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2013
VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS**

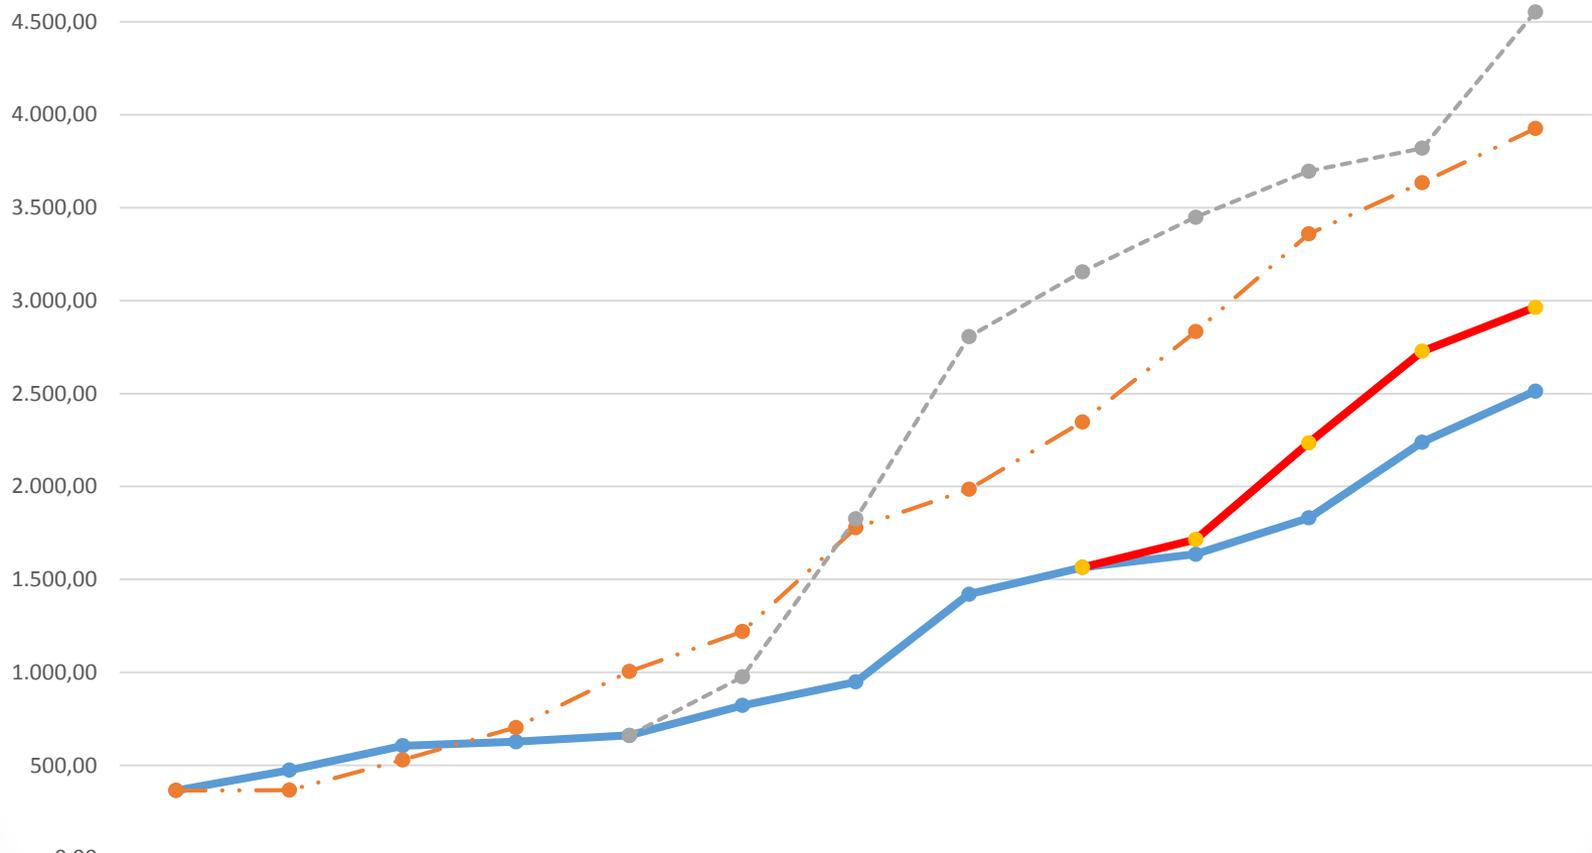

	2011 y 2012	Enero 2013	Febrero 2013	Marzo 2013	Abril 2013	Mayo 2013	Junio 2013	Julio 2013	Agosto 2013	Sept. 2013	Oct. 2013	Nov. 2013	Dic. 2013
Contratado	364,83	474,19	605,59	626,54	660,71	821,89	948,62	1.420,44	1.564,43	1.635,38	1.831,46	2.238,18	2.513,03
Plan Ene - Abr	364,83	365,95	529,70	703,25	1.005,17	1.220,02	1.778,37	1.985,04	2.347,63	2.833,44	3.359,11	3.634,56	3.926,17
Plan May - Ago					660,71	976,14	1.826,20	2.805,96	3.155,50	3.448,79	3.696,62	3.820,16	4.553,64
Plan Sep - Dic									1.564,43	1.714,81	2.235,35	2.727,43	2.963,98

COMPROMISOS Y METAS MENSUALES VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS

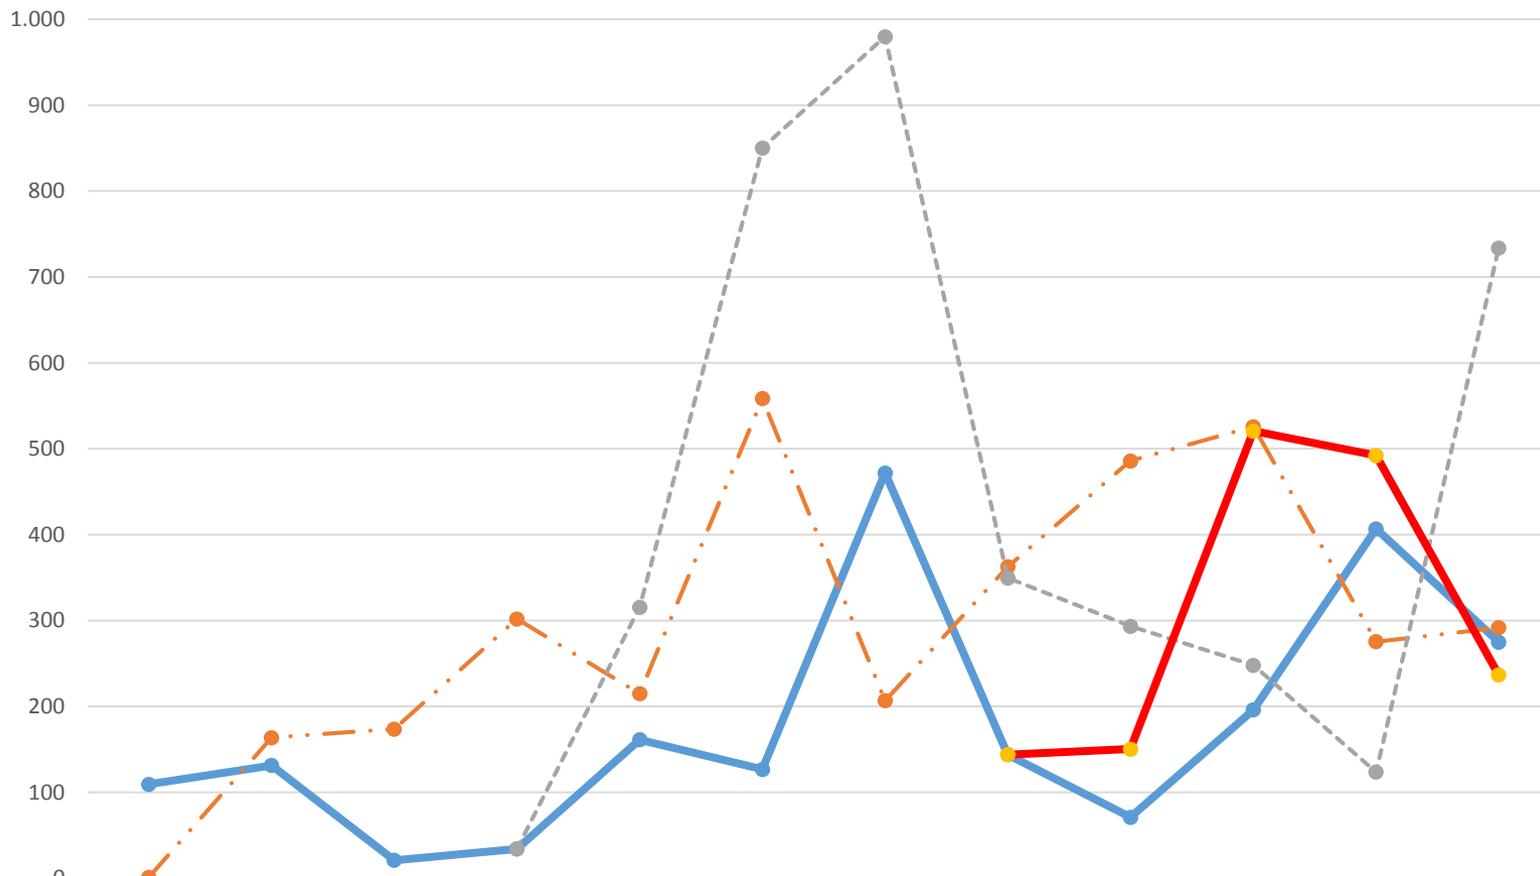

	Enero 2013	Febrero 2013	Marzo 2013	Abril 2013	Mayo 2013	Junio 2013	Julio 2013	Agosto 2013	Sept. 2013	Oct. 2013	Nov. 2013	Dic. 2013
Contratado	109,36	131,40	20,95	34,17	161,18	126,74	471,81	143,99	70,95	196,08	406,72	274,85
Plan Ene - Abr	1,12	163,75	173,56	301,91	214,86	558,34	206,67	362,59	485,82	525,67	275,45	291,61
Plan May - Ago				34,17	315,43	850,06	979,76	349,53	293,29	247,83	123,54	733,49
Plan Sep - Dic								143,99	150,38	520,54	492,08	236,55


RESULTADOS EN PAGOS

OBLIGADO Y PAGADO

OBLIGACIONES Y PAGOS REALIZADOS POR SECTOR ACUMULADOS HASTA DICIEMBRE 2013 - VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS


Sector	Obligaciones	Pagos	Meta	Obl. / Meta	Pagos / Meta
Acueducto	66,13	65,73	81,35	81%	81%
Educación	25,21	24,71	71,32	35%	35%
Medio Ambiente	44,07	44,06	52,91	83%	83%
Mitigación de Riesgo	69,69	66,55	87,02	80%	76%
Reactivación Económica	21,22	21,22	36,96	57%	57%
Salud	7,94	6,80	34,86	23%	20%
Transporte	122,45	111,00	192,41	64%	58%
Vivienda	158,78	133,81	248,06	64%	54%
Gerencia Antioquia	6,63	6,63	11,91	56%	56%
Proyectos de apoyo	3,99	3,94	4,61	87%	85%
Total	526,10	484,44	821,42	64%	59%

OBLIGACIONES Y PAGOS ACUMULADOS HASTA DICIEMBRE 2013 VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS

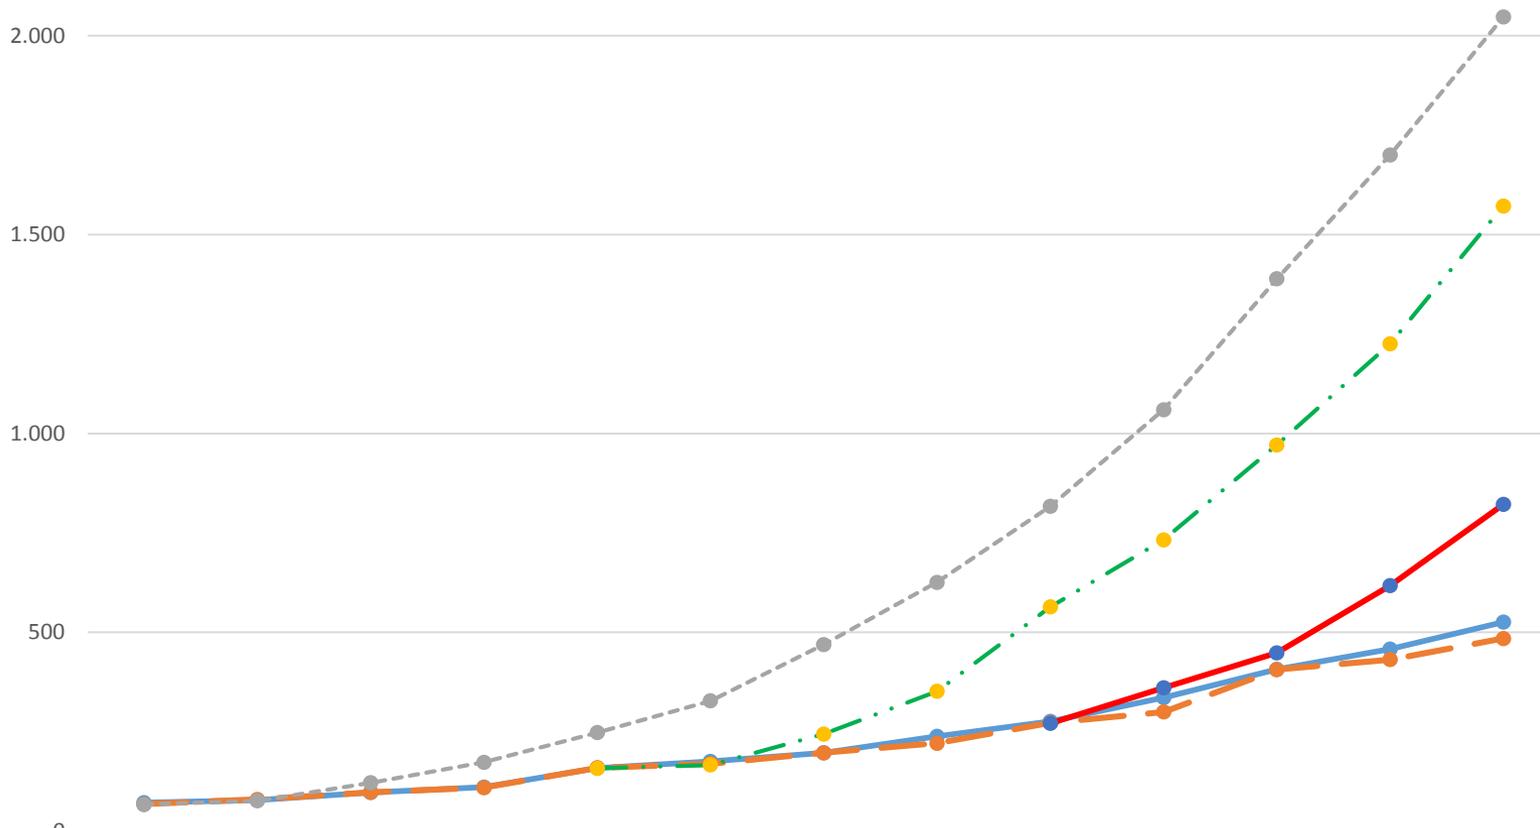

	2011 y 2012	Enero 2013	Febrero 2013	Marzo 2013	Abril 2013	Mayo 2013	Junio 2013	Julio 2013	Agosto 2013	Sept. 2013	Oct 2013	Nov. 2013	Dic. 2013
—●— Obligado	71,89	78,49	97,02	111,06	158,65	175,30	196,98	238,91	275,91	335,64	406,83	457,74	526,10
—●— Pagado	68,21	80,03	97,94	109,60	159,32	169,97	197,34	221,09	272,58	299,89	406,31	431,55	484,44
—●— Plan Ene - Abr	67,31	76,40	122,12	173,56	247,83	327,61	469,36	625,72	816,73	1.059,50	1.388,64	1.700,18	2.047,06
—●— Plan May - Ago					158,42	166,51	244,46	351,76	563,99	732,76	971,10	1.225,60	1.571,78
—●— Plan Sep - Dic									271,68	360,52	448,03	617,26	821,42

PAGOS Y OBLIGACIONES MENSUALES AÑO 2013 VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS

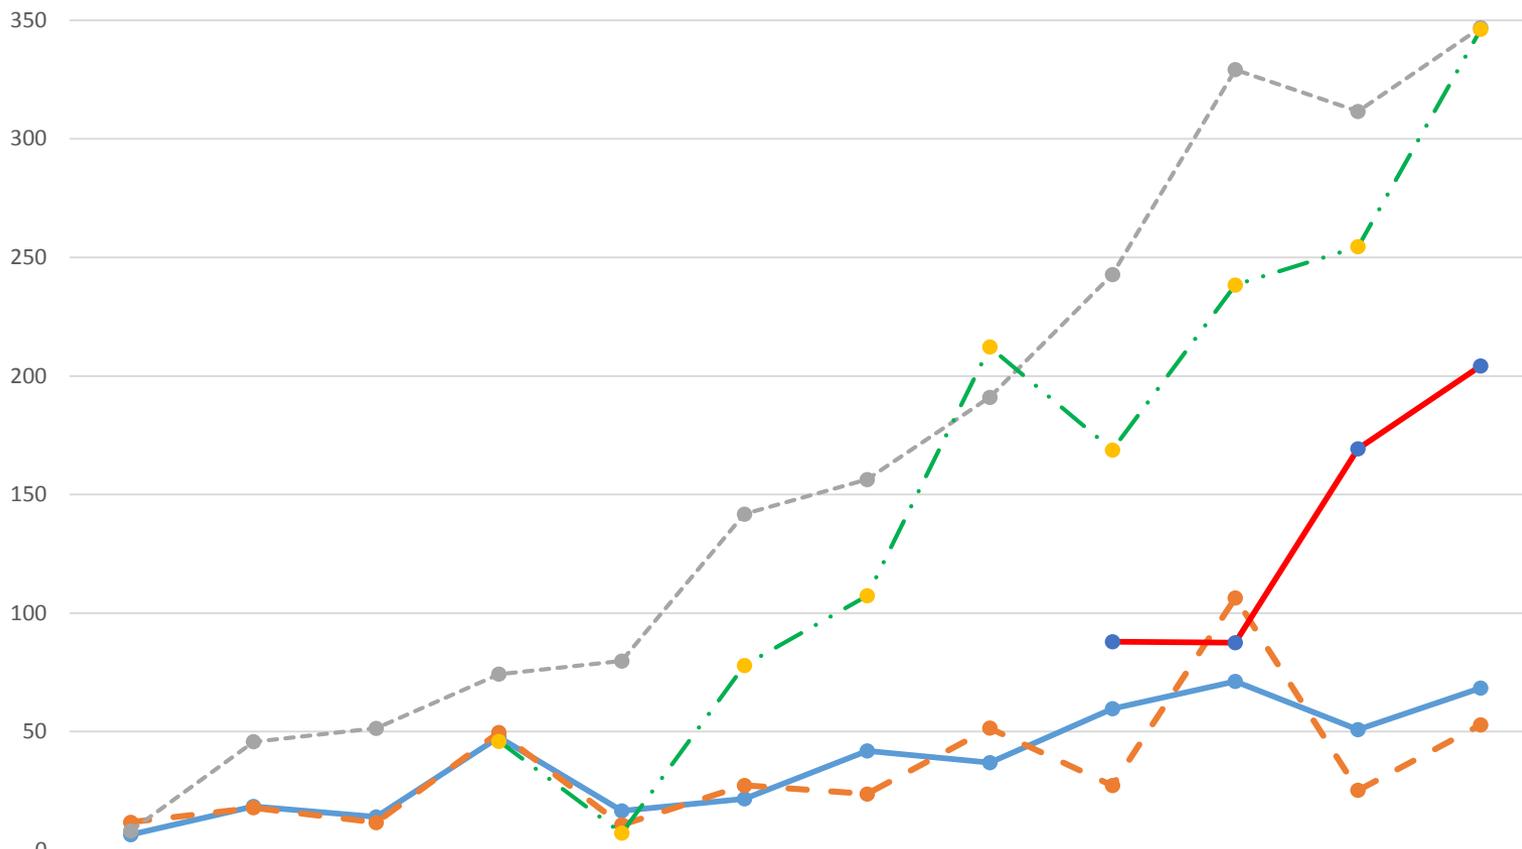

	Enero 2013	Febrero 2013	Marzo 2013	Abril 2013	Mayo 2013	Junio 2013	Julio 2013	Agosto 2013	Sept. 2013	Oct. 2013	Nov. 2013	Dic. 2014
—●— Obligado	6,61	18,53	14,04	47,59	16,65	21,68	41,92	37,00	59,73	71,19	50,90	68,37
- -●- - Pagado	11,83	17,90	11,66	49,72	10,66	27,37	23,75	51,49	27,31	106,42	25,24	52,89
- -●- - Plan Ene - Abr	8,19	45,72	51,44	74,27	79,78	141,75	156,36	191,01	242,77	329,14	311,54	346,88
- · -●- · Plan May - Ago				45,95	7,19	77,95	107,30	212,23	168,78	238,34	254,50	346,17
- · -●- · Plan Sep - Dic									87,94	87,51	169,23	204,16



RESULTADOS EN PRODUCTOS

INDICADORES

ANEXO INDICADORES DE GESTIÓN 2013

Sector	Producto	Contratado 2013	Meta 2013	% Cumpli.	Entregado 2013	Meta Entregado 2013	% Cumpli.
Vivienda	Soluciones de vivienda	10.354	14.000	74%	3.607	7.000	52%
Acueducto (2)	Sistemas de Acueducto (descentralizados)	80	96	83%	0	7	0%
	Sistemas de Alcantarillado	61	63	97%	0	6	0%
Salud	IPS	13	42	30,9%	1	3	33%
Transporte	Sitios críticos	117	123	95%	10	10	100%
	Estructuraciones integrales	4	4	100%	0	0	
Educación	Instituciones educativas	130	184	70,6%	0	0	
Reactivación	Alianzas apoyadas	101	101	100%	71	101	70,3%
	Oportunidades rurales (1)	253	335	75,5%	253	335	75,5%
	Distritos de adecuación de tierras	0	0		0	0	
	Proyectos reactivar	1	12	8%	0	12	0%
	Sistemas de producción adaptados al cambio climático	54	54	100%	6	18	33%
Medio ambiente	Actualización POMCA	0	0		0	0	
	Formulación POMCA	0	0		0	0	
	Hectáreas de páramos delimitados	2.109.667	2.109.667	100%	0	0	100%
	Hectáreas de humedales delimitados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Estaciones hidrometeorológicas nuevas	0	0		0	0	
	Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas	0	0		0	0	
	Hectáreas recuperadas / reforestadas	0	0		0	0	

(1) En la verificación final realizada por el Ministerio de Agricultura se redefinió la meta a 253 oportunidades rurales. Meta cumplida al 100%

(2) Las obras de los 6 alcantarillados, se tienen 4 obras terminadas y está pendiente la entrega y los 7 acueductos están terminados y está pendiente la entrega.

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL **VIVIENDA**

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
Viviendas contratadas para las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	14.000	10.354	74%	58.087	18%
Obras en construcción para la reconstrucción de viviendas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	14.000	6.747	48%	58.087	12%
Viviendas reconstruidas entregadas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	7.000	3.607	52%	58.087	6%

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL TRANSPORTE

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
Diseños de obras para la reconstrucción de sitios críticos de transporte en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	128	128	100%	393	33%
Obras contratadas para la reconstrucción de sitios críticos de transporte en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	123	117	95%	431	27%
Sitios críticos de transporte reconstruidos entregados en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	10	10	100%	431	2%
Estructuraciones integrales de proyectos contratadas para la reconstrucción de la infraestructura de transportes en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	4	4	100%	4	100%
Estructuraciones integrales de proyectos entregados para la reconstrucción de la infraestructura de transportes en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	4	0%

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL EDUCACIÓN

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
Diseños de obras para la reconstrucción de sedes educativas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	11	11	100%	361	3%
Obras contratadas para la reconstrucción de sedes educativas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	184	130	70,6%	361	36%
Sedes educativas reconstruidas entregadas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	361	0%

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL ACUEDUCTO

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
Convenios descentralización para la reconstrucción de sistemas de acueducto en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	96	80	83%	96	83%
Convenios descentralización para la reconstrucción de sistemas de acueducto en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	63	61	97%	63	97%
Sistemas de acueductos reconstruidos y entregados en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 (1)	0	7	0	0%	155	0%
Contratación diseños de obras para la reconstrucción de sistemas de acueducto en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 (2)	0	45	0	0%	45	0%
Contratación diseños de obras para la reconstrucción de sistemas de alcantarillado en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 (2)	0	12	0	0%	12	0%
Sistemas de alcantarillado reconstruidos en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 (1)	0	6	0	0%	87	0%

(1) Las obras de los 6 alcantarillados, se tienen 4 obras terminadas y está pendiente la entrega y los 7 acueductos están terminados y está pendiente la entrega.

(2) La meta de contratación de diseños se cumplió al 100% en enero de 2014.

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL SALUD

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
Diseños de obras para la reconstrucción de IPS en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	20	20	100%	67	30%
Obras contratadas para la reconstrucción de IPS en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	42	13	30,9%	67	19%
Proyectos estructurados para la adquisición de dotación de IPS en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	3	3	100%	67	1%
Adquisición de dotación contratada para las IPS reconstruidas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	1	1	100%	67	1%
IPS reconstruidas, dotadas y entregadas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	3	1	33%	67	0%

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL REACTIVACIÓN

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
Mapas de amenaza y vulnerabilidad elaborados para el fortalecimiento institucional para la adaptación al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	6	6	100%	18	33%
Sistema de información de alertas tempranas agroclimáticas desarrollado para el fortalecimiento institucional para la adaptación al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	20%	20%	100%	100%	20%
Ofertas tecnológicas de Sistemas Productivos Adaptados al Cambio Climático (SPACC) elaboradas para el fortalecimiento institucional para la adaptación al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 (Conjunto de: Resultados de investigaciones, informes, fichas técnicas, recomendaciones, etc.)	0	18	6	33%	54	11%
Técnicos de campo capacitados en Sistemas Productivos Adaptados al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	500	0%

- El resultado armónico de estos productos es lo que se entiende como **Sistemas Productivos Adaptados al Cambio Climático (SPACC)**. Desde un enfoque holístico, deben ser analizados en su conjunto, ya que los productos individuales por sí sólo no satisfacen el propósito del sistema. No obstante, para efectos de un seguimiento objetivo a los alcances de la intervención del Fondo, los resultados se miden individualmente.

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL REACTIVACIÓN

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
Diseños De obras elaborados para la reconstrucción de distritos de adecuación de tierras en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	4	0%
Obras contratadas para la reconstrucción de distritos de adecuación de tierras en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	4	0%
Distritos de adecuación de tierras reconstruidos en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	4	0%
Proyectos Reactivar estructurados para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	0	12	1	8%	87	1%
Proyectos Reactivar ejecutados para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	0	0	0	0%	87	0%

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL REACTIVACIÓN

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
Alianzas Productivas estructuradas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	0	101	101	100%	101	100%
Alianzas Productivas ejecutadas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	0	101	71	70,3%	101	70,3%
Oportunidades Rurales estructuradas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011 (1)	0	335	253	75,5%	335	75,5%
Oportunidades Rurales ejecutadas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	0	335	253	75,5%	335	75,5%

(1) En la verificación final realizada por el Ministerio de Agricultura se redefinió la meta a 253 oportunidades rurales. Meta cumplida al 100%

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL AMBIENTE

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
POMCAS diagnosticados para la incorporación de la gestión del riesgo en las cuencas prioritizadas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	15	15	100%	130	12%
POMCAS contratados incorporando la gestión del riesgo en las cuencas prioritizadas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	130	0%
POMCAS actualizados incorporando la gestión del riesgo en las cuencas prioritizadas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	55	0%
POMCAS formulados incorporando la gestión del riesgo en las cuencas prioritizadas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	75	0%

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL AMBIENTE

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
Proyectos estructurados para el fortalecimiento de la red de alertas tempranas de origen hidrometeorológico como componente técnico de apoyo al sistema de gestión de riesgo en Colombia en las áreas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	1	1	100%	4	25%
Estaciones hidrometeorológicas adquiridas para la recuperación de la infraestructura del medio ambiente en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	210	0%
Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas para la recuperación de la infraestructura del medio ambiente en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	247	0%

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL AMBIENTE

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
Estado del arte de la información referente a humedales del país informados de las zonas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011	0	0	0	0%	3	0%
Insumos técnicos en aspectos económicos, sociales y ambientales, para la delimitación de los 21 Complejos de Páramos entregados , de las zonas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011.	0	0	0	0%	21	0%
Líneas de delimitación de ecosistemas estratégicos recomendadas (páramos y Humedales)	0	0	0	0%	24	0%
Sitios y hectáreas definidos y priorizados para la recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en zonas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011	0	0	0	0%	11.000	0%
Hectáreas recuperadas ambientalmente y áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias rehabilitadas y protegidas para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en zonas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2010	0	0	0	0%	11.000	0%

INDICADORES PROGRAMA ESTRATÉGICO MISIONAL MEGAPROYECTOS

Indicador	Línea Base	Meta 2013	Avance Real	% de Avance	Meta Total	Avance Acumulado
Municipio de Gramalote reconstruido	0%	11%	11%	100%	100%	11%
Ecosistemas del Canal del Dique restaurados	0%	1%	1%	100%	100%	1%
Jarrillón de Cali recuperado	0%	6%	6%	100%	100%	6%
Proyecto de ordenamiento ambiental Región de la Mojana estructurado	0%	25%	25%	100%	100%	25%
Plan de manejo integral de la Mojana entregado	0%	0%	0%	100%	100%	0%
Río Fonce-San Gil recuperado	0%	1%	1%	100%	100%	1%

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO

**Ver cumplimiento en detalle en
el No. Anexo 1**
