

Fondo Adaptación



**Trabajamos en la Reconstrucción
Gestionando el Riesgo de Desastres**



PRESENTACION

ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO



Postulaciones sector de Agua Potable y Saneamiento

Sur del Atlántico

- Postulado: 29 sep. de 2011
- Valor de \$126,000 millones
- Municipios beneficiados 8
- No de proyectos a Ejecutar: 29



Proyecto Nacional

- Postulado: 1 de febrero de 2012
- Valor: 376,400 millones
- Departamento a beneficiar: 20
- Municipios beneficiados : 153
- No proyectos a ejecutar: 190



Proyecto Yopal

- Postulado: 1 de febrero de 2012
- Valor : \$5,500 millones
- Construcción Planta de tratamiento de Agua Potable Definitiva



Total recursos sector:
\$514 mil millones

Nacional de Rehabilitación, Reconstrucción , mitigación y prevención de la Infraestructura AAA

Descripción

Atención a 22 departamentos, en 159 municipios, mediante 220 obras enfocadas a la **reconstrucción y rehabilitación** de infraestructura de acueducto y saneamiento básico.

Valor estimado



\$514 Mil Millones

Entidad responsable



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Las afectaciones del sector reportadas ante el Ministerio fueron por el orden de los \$2,4 billones

De las 220 afectaciones, tan solo 7 proyectos contaban con estudios y diseños, pero sin estudio de amenaza.

Sector: Agua y Saneamiento Básico



Impacto Social



8 millones habitantes
161 municipios
19,455 empleos

Presencia Estatal

MVCT-FA-
Departamentos,
Municipios

Observaciones

Los proyectos requirieron: Validación, contratación diseños y estudio de amenaza, consecución de predios, servidumbre, permisos ambientales, permisos viales etc.

Ubicación o ilustración del proyecto



24 Departamentos:

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca,

POSTULACIONES

Postulaciones	No. Postulación	Valor FA	Intervenciones proyectos	Intervenciones Gestión	Cantidad Acueductos	Cantidad Alcantarillados
Acueducto Yopal	008	\$5.500.000.000	1	-	1	-
Sur del Atlántico	215	\$126.175.560.000	29	6	16	20
Programa Nacional	670	\$ 382.631.657.162	190	23	119	76
Total	3	\$ 514.307.217.162	220	29	136	96

De los **242** proyectos inicialmente postulados, se definieron **220** para intervención por parte del Fondo, teniendo en cuenta lo siguiente:

* De las 34 intervenciones iniciales del Sur del Atlántico, 5 no son viables porque la Corporación Autónoma Regional del Atlántico realizó las adecuaciones de las PTAR.

**De las 209 intervenciones iniciales del programa Nacional, 8 no se ejecutarán porque no fueron validadas por Fenómeno de La Niña, 11 no fueron priorizadas por los municipios.

Así mismo se adicionaron con aval del consejo directivo recursos para los proyectos de:

- Acueducto y alcantarillado de López de Micay,
- alcantarillado de San Marcos – Sucre,
- Alcantarillado 2N de Cúcuta,
- alcantarillado de Suratá – Santander

Estado de avance por Departamento



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

\$1.575.748.125




Acueducto - Cañas Gordas

Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN EJECUCION DISENOS O AJUSTES DE DISENO – ENTIDAD TERRITORIAL	2	2	10.319	21
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – FONDO ADAPTACION	3	3	29.345	36
Total general	5	5	39.664	57

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

\$126.175.560.000

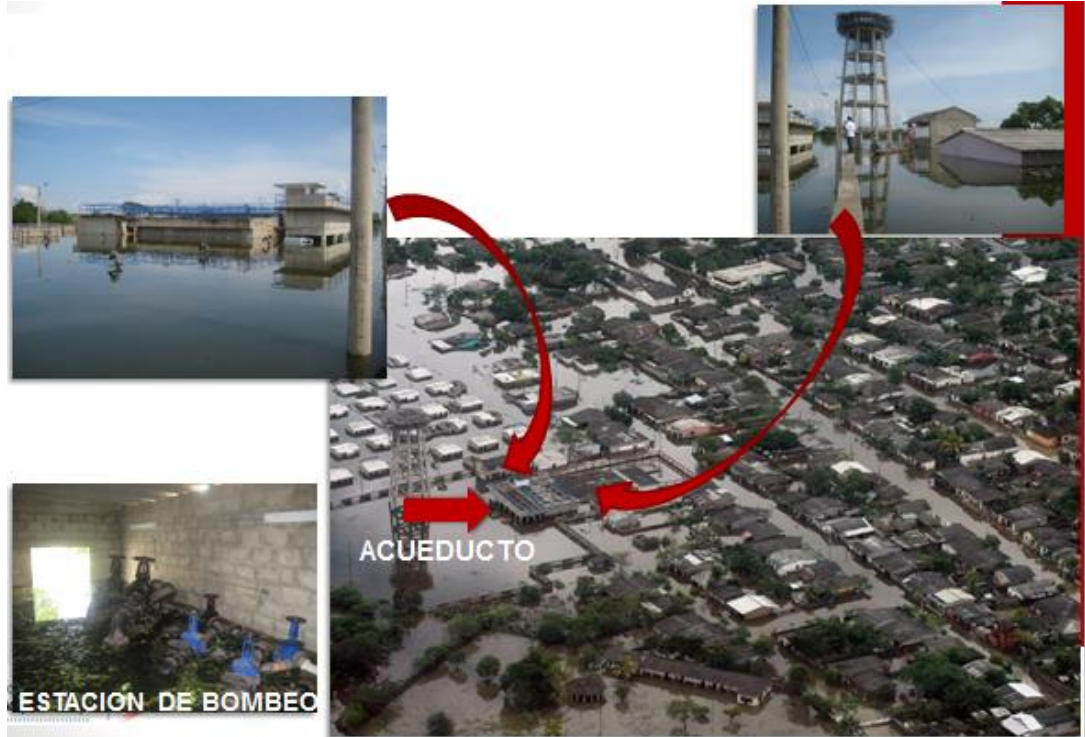

Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN CONTRATACIÓN OBRAS	6	6	23.110	1.180
EN EJECUCIÓN OBRAS	7	7	6.732	886
EN LIQUIDACIÓN OBRAS	16	23	85.188	3.271
Total general	29	36	115.030	5.336



EDUCACIÓN BOLÍVAR

\$ 3.253.381.292,90



Reconstrucción
Acueducto – Córdoba
(Sincelejito)



Reconstrucción
Acueducto – Córdoba
(La Sierra)



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – FONDO ADAPTACION	5	5	21.959	33
Total general	5	5	21.959	33



DEPARTAMENTO DE BOYACA

\$ 8.363.104.006,48



Reconstrucción
Acueducto – Soatá

Reconstrucción
Alcantarillado –
Garagoa



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN CONTRATACIÓN DISEÑOS – ENTIDAD TERRITORIAL	3	3	3.053	36
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	1	1	6.115	22
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – FONDO ADAPTACION	6	6	42.531	249
Total general	10	10	51.699	307

DEPARTAMENTO DE CALDAS

\$ 31.403.133.597,99



Reconstrucción
Acueducto –
Aranzazu



Reconstrucción
Alcantarillado –
La Dorada



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN CONTRATACIÓN DISEÑOS – ENTIDAD TERRITORIAL	1	1	8.455	25
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	12	12	313.021	1.248
Total general	13	13	321.476	1.273



DEPARTAMENTO DE CASANARE



Reconstrucción Acueducto – Yopal

Estado del proyecto	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	1	1	174.136	263
Total general	1	1	174.136	263



DEPARTAMENTO DEL CAUCA

\$ 15.218.666.493,05



Alcantarillado
Cabecera Municipal
– López de Micay



Reconstrucción
acueductos –
Buenos Aires



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN EJECUCION DISENOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	3	3	13.345	548
EN EJECUCIÓN DISENOS O AJUSTES DE DISEÑO – FONDO ADAPTACION	4	4	33.948	57
Total general	7	7	47.293	604



DEPARTAMENTO DEL CESAR

\$ 13.359.342.760,57



Reconstrucción
Alcantarillado –
Astrea



Reconstrucción
Acueducto –
Aguachica



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	3	3	108.115	520
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – FONDO ADAPTACION	1	1	44.546	15
Total general	4	4	152.661	535

DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

\$ 19.778.124.281,97



**Reconstrucción
Alcantarillado –
Acandí**

**Reconstrucción
Acueducto –
Bagadó**



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN VALIDACIÓN PROYECTO	14	14	63.647	701
Total general	14	14	63.647	701



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

\$ 14.838.793.909,86



Reconstrucción
Alcantarillado
pluvial - Sibaté



Reconstrucción
Acueducto -
Silvania



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN EJECUCION DISENOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	8	9	96.547	586
Total general	8	9	96.547	586



DEPARTAMENTO DEL HUILA

\$ 2.113.332.450,47



Reconstrucción
Acueducto -
Timaná



Reconstrucción
Alcantarillado -
Suaza



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – FONDO ADAPTACION	6	6	49.207	63
Total general	6	6	49.207	63



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

\$ 7.293.254.063,66



Reconstrucción
Alcantarillado -
Maicao



Reconstrucción
Alcantarillado -
Riohacha



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	2	2	353.084	299
Total general	2	2	353.084	299

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

\$ 8.509.143.141,37



Reconstrucción
Acueducto -
Plato



Reconstrucción
Alcantarillado –
Santa Marta



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN CONTRATACION DISEÑOS – ENTIDAD TERRITORIAL	3	3	70.957	131
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	1	1	62.307	17
EN EJECUCIÓN OBRAS	4	4	221.492	200
Total general	8	8	354.755	348



DEPARTAMENTO DE META

\$ 1.172.864.068,40



Rehabilitación
Alcantarillado – San
Carlos de Guaroa



Rehabilitación
Acueducto – El
Dorado



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN CONTRATACIÓN DISEÑOS – ENTIDAD TERRITORIAL	2	2	10.242	26
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – FONDO ADAPTACION	1	1	1.663	17
Total general	3	3	11.905	42



DEPARTAMENTO DE NARIÑO

\$ 33.707.465.898,23



Rehabilitación
Alcantarillado Casco -
Arboleda



Rehabilitación
Acueducto
Cabecera –
Roberto Payan



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN CONTRATACION DISEÑOS – ENTIDAD TERRITORIAL	1	1	10.729	60
EN CONTRATACIÓN OBRAS	1	1	1.758	86
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	14	14	95.396	1.152
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – FONDO ADAPTACION	1	1	4.535	4
Total general	17	17	112.418	1.302



DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

\$ 30.709.684.519,66



Rehabilitación
Alcantarillado –
Cúcuta



Rehabilitación
Acueducto -
Cáchira



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversion)
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	12	12	787.560	1.278
Total general	12	12	787.560	1.278

DEPARTAMENTO DE QUINDIO

\$ 10.836.912.442,33



Rehabilitación
Acueducto - Córdoba




Rehabilitación
Alcantarillado – La
Tebaida



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversion)
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	11	11	787.560	1.278
Total general	11	11	787.560	1.278

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

\$ 14.356.612.195,77

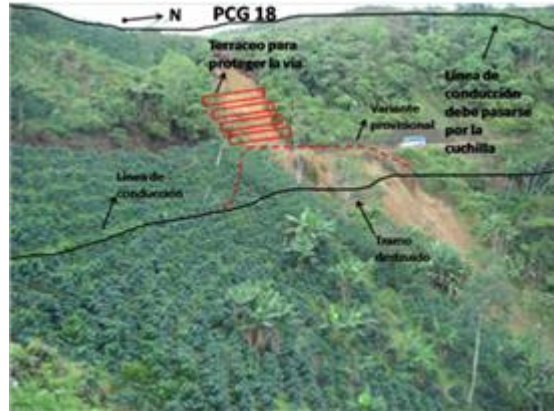

Rehabilitación
Acueducto -
Balboa



Rehabilitación
Alcantarillado
Quinchía

Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN CONTRATACION DISEÑOS – ENTIDAD TERRITORIAL	1	1	11.960	112
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	4	4	62.551	163
EN EJECUCIÓN OBRAS	1	2	641.707	334
Total general	6	7	716.217	609

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

\$66.745.119.275,34



Rehabilitación
Alcantarillado -
Piedecuesta

Rehabilitación
Alcantarillado -
Piedecuesta



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN CONTRATACIÓN DISEÑOS – ENTIDAD TERRITORIAL	3	3	177.926	1.699
EN CONTRATACIÓN OBRAS	1	1	171.135	134
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	5	5	60.400	477
EN EJECUCIÓN OBRAS	3	3	788	472
Total general	12	12	410.248	2.783



DEPARTAMENTO DE SUCRE

\$ 3.073.242.993,68



Rehabilitación Alcantarillado – San Marcos

Estado del proyecto	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	1	1	48.391	130
Total general	1	1	48.391	130

DEPARTAMENTO DE TOLIMA

\$ 45.854.538.836,63



Rehabilitación
Alcantarillado
Herbeo

Rehabilitación
Acueducto – San Luis



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN CONTRATACIÓN DISEÑOS – ENTIDAD TERRITORIAL	4	4	40.093	218
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	6	6	614.681	434
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – FONDO ADAPTACION	29	29	126.840	889
Total general	39	39	781.615	1.541



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

\$ 23.790.848.772,93



Reconstrucción de la
Bocatoma - Andalucía




Acueducto –
Zarzal



Estado de los proyectos	Número de proyectos	Cantidad de productos	Población beneficiada proyectada	Empleos generados (según inversión)
EN CONTRATACIÓN OBRAS	2	5	2.621.918	604
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – ENTIDAD TERRITORIAL	2	2	52.691	279
EN EJECUCIÓN DISEÑOS O AJUSTES DE DISEÑO – FONDO ADAPTACION	3	3	38.241	62
Total general	7	10	2.712.850	945

PSA

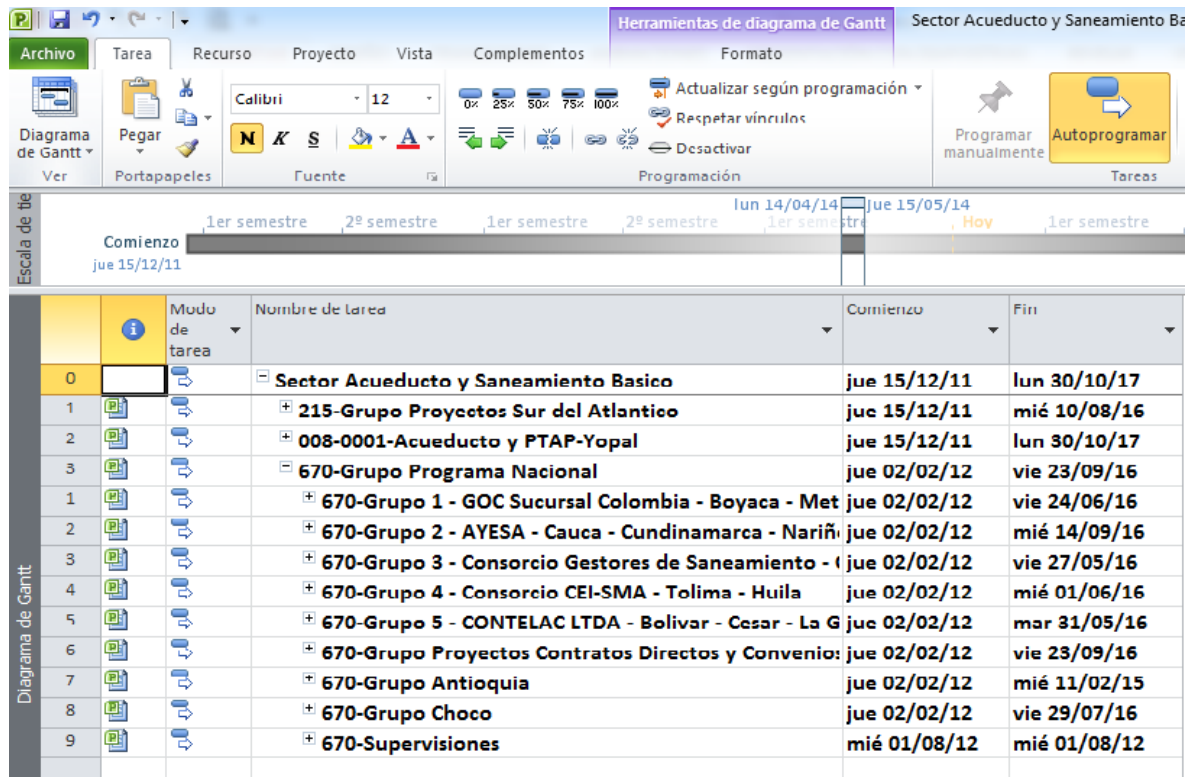

La estructura, proyectos, recursos, productos entre otra información relevante del sector, se refleja en el sistema PSA y es actualizada según el desarrollo del mismo.

Obras entregadas y en proceso de Liquidación

Ejecución Sur del Atlántico

Sector	
	VIVIENDA
	ACUEDUCTO
	SALUD
	EDUCACIÓN
	TRANSPORTE
	REACTIVACIÓN ECONÓMICA
	MEDIO AMBIENTE



AFECTACIONES FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011

1. Sur del Atlántico - Obras



ACUEDUCTO





Redes y Sedimentador PTAP – Municipio de Luruaco

DURANTE LA OBRA



Instalación redes de alcantarillado (con entibado)



Instalación de tubería de Alcantarillado



Municipio de Candelaria

GRUPO I. \$38.167 millones

MUNICIPIO DE MANATI

\$19.468 millones

- REHABILITACION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL
- REDES DE ACUEDUCTO
- AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE LURUACO

\$9.743 millones

- REHABILITACION SISTEMA DE ACUEDUCTO
- REHABILITACION Y AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE REPELON

\$7.188 millones

- OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO

MUNICIPIO DE PONEDERA – SABANALARGA

\$1.709 millones

- ADECUACION DEL CARRETEABLE DE LA ADUCCION

MUNICIPIO DE REPELON Y MANATI

\$57 millones

- REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DATOS GENERALES : CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA - GRUPO I.

	INTERVENTORIA	OBRA
No. CONTRATO	080 de 2012	089 de 2012
CONTRATISTA	Consorcio Interacueducto	Consorcio YDN 2012
REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Gutiérrez Visbal	Orlando Bianchi Banfi
SUPERVISOR FA	Lorena Ávila López	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 3.409.692.137	\$ 32.764.694.511
VALOR ACTUALIZADO	\$ 3.844.614.692	\$ 38.167.556.877
PLAZO INICIAL	14 meses	12 meses
PLAZO ACTUALIZADO	20 meses	17 meses
FECHA DE CONTRATO	16 de agosto 2012	27 de agosto 2012
FECHA DE INICIO	4 de Septiembre de 2012	19 de Septiembre de 2012
FECHA DE TERMINACION	3 de Mayo de 2014	18 de Febrero de 2014

GRUPO I

ACUEDUCTO - MANATI

Antes



Después



Proyecto: Acueducto Regional Manatí y Tanque Elevado
Inversión: \$ 12.980 millones
Beneficiados: 25.598
Estado: Terminado
Impacto: Rehabilitar el sistema de acueducto para garantizar la cobertura del 99% con calidad y continuidad de 24 h/d

Contratista:
Fecha de entrega:



GRUPO I

ALCANTARILLADO - MANATI



Proyecto: Ampliación Redes de Alcantarillado
Inversión: \$ 6.361 millones
Beneficiados: 13.475
Estado: Terminado
Impacto: Rehabilitar el sistema de alcantarillado para garantizar la cobertura del 98%.



GRUPO I

ACUEDUCTO - LURUACO



Construcción Barcaza



Proyecto: Rehabilitación sistema de acueducto
Inversión: \$ 2.327 millones
Beneficiados: 12.526
Estado: Terminado
Impacto: Rehabilitar el sistema de acueducto para garantizar la cobertura del 99% con calidad y continuidad de 24 h/d

GRUPO I

ALCANTARILLADO - LURUACO



Proyecto: Rehabilitación y ampliación alcantarillado

Inversión: \$ 7.451 millones

Beneficiados: 12.526 habitantes

Estado: Terminado

Impacto: Rehabilitar el sistema de alcantarillado para garantizar la cobertura del 96%.



GRUPO I

ACUEDUCTO - REPELON



Proyecto: Rehabilitación sistema de acueducto

Inversión: \$ 7.272 millones

Beneficiados: 19.807

Estado: Terminado

Impacto: Rehabilitar el sistema de acueducto para garantizar la cobertura del 99% con calidad y continuidad de 24 h/d.



GRUPO I

JARILLON – SABANALARGA

Antes



Después



Proyecto: Adecuación carretable de la aducción

Inversión: \$ 1.709 millones

Beneficiados: 79.912

Estado: Terminado

Impacto: Acceso garantizado a la captación del acueducto regional de Sabanalarga para su mantenimiento y operación.

Rehabilitación sistema de acueducto Regional Manatí- Candelaria



PTAP Manatí durante la Inundación

Rehabilitación sistema de acueducto Regional Manatí - Candelaria

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Impacto

99% cobertura
24 h/día



Inversión

9.949.186.028



Alcance

**Construcción
PTAP para 110 l/s**



Beneficiados

**Manatí - 13.475
Candelaria - 12.123
Habitantes**



**Fondo
Adaptación**



Rehabilitación sistema de acueducto Regional Manatí- Candelaria



Nueva PTAP Manatí

Rehabilitación sistema de acueducto Regional Manatí- Candelaria



Tanque Elevado Manatí

Rehabilitación redes de Acueducto Manati

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Impacto

Rehabilitó el 80%
de redes para una
cobertura del 99%



Inversión

3.157.771.177



Alcance

25.590 ml redes
de acueducto



Beneficiados


13.475
Habitantes



Fondo
Adaptación



Rehabilitación redes de Acueducto Manatí

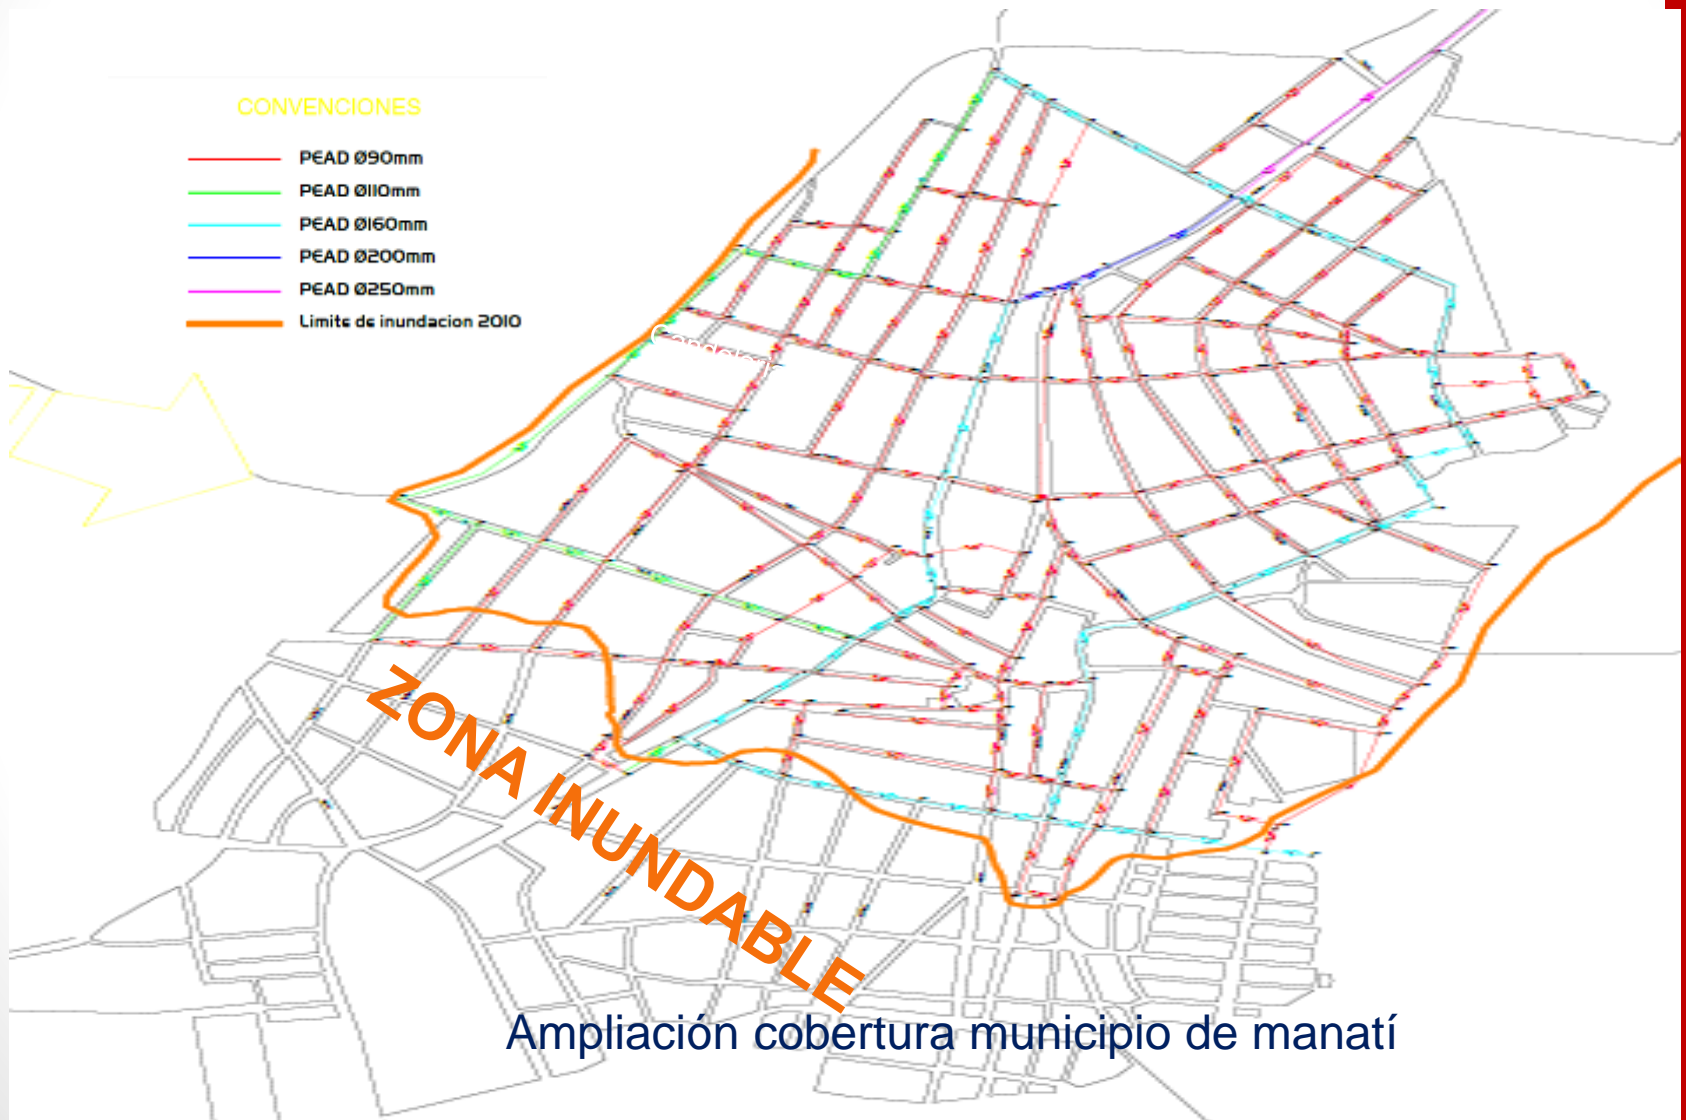

Rehabilitación redes de Acueducto Manatí



Rehabilitación y ampliación redes de Alcantarillado Manati

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Impacto

**Aumento de
coberturas del
40% al 98%**



Inversión

6.361.183.005



Alcance

**21.050 ml redes
de alcantarillado
246 Pozos de inspección
960 Registros**



Beneficiados

**13.475
Habitantes**




**Fondo
Adaptación**



AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO – MANATI

\$3.664 millones

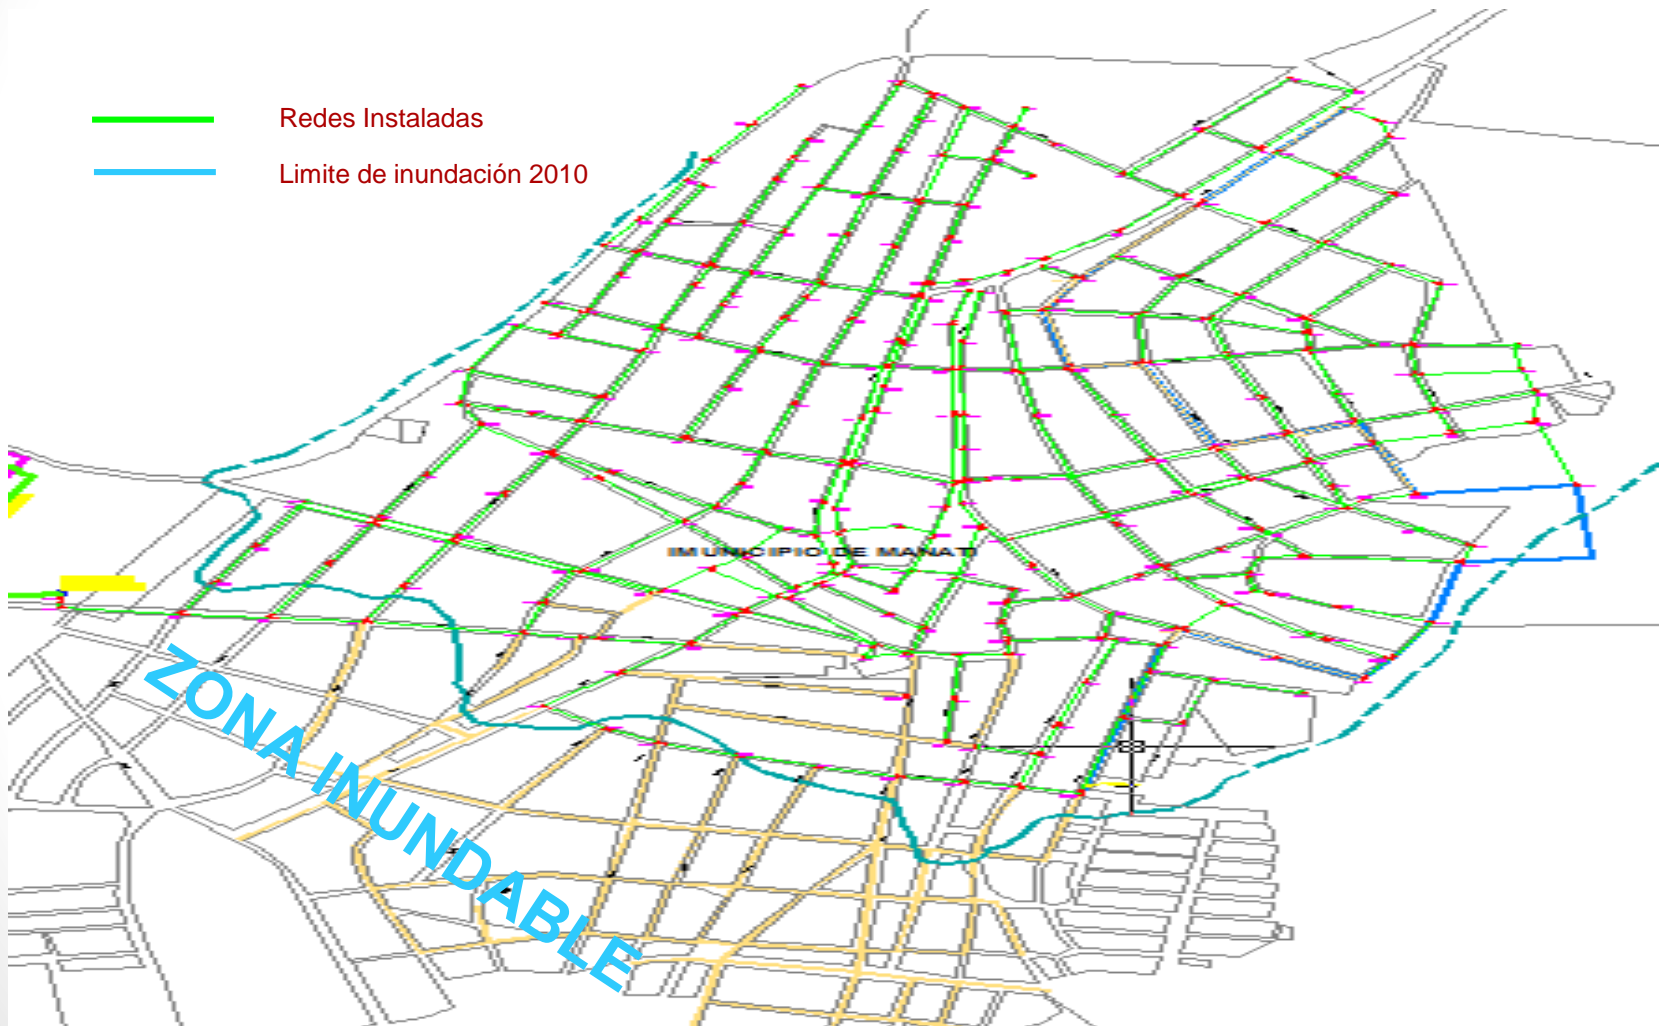

Rehabilitación y ampliación redes de Alcantarillado Manatí



Instalación pozos de inspección prefabricados

Rehabilitación sistema de acueducto Luruaco

Impacto

99% cobertura 24 h/día
Aumento de la capacidad
de la PTAP de 70 l/s a 110 l/s



Inversión

2.375.440.489



Alcance

Construcción
captación 110 l/s
708 ml de aducción
Rehabilitación
PTAP para 110 l/s



Beneficiados

22.878
Habitantes



Rehabilitación sistema de acueducto Luruaco



Captación Laguna de Luruaco

Rehabilitación sistema de acueducto Luruaco



Rehabilitación y ampliación sistema de alcantarillado Luruaco

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Impacto

Aumento de coberturas
del 40% al 96%



Inversión

7.367.902.508



Alcance

15.300 ml de redes
216 Pozos de inspección
955 Registros



Beneficiados

12.526
Habitantes



Fondo
Adaptación



Rehabilitación y ampliación sistema de alcantarillado Luruaco



Rehabilitación y ampliación sistema de alcantarillado Luruaco



Rehabilitación sistema de acueducto Repelón

Impacto

99% cobertura 24 h/día
**Aumento de la capacidad
de la PTAP de 70 l/s a 110 l/s**
**Aumento caudal
de captación de 35 l/s a 45 l/s**



Inversión

7.188.248.326



Alcance

**Construcción
captación 45 l/s**
12.100 ml de aducción
16.200 ml de redes



Beneficiados

19.807
Habitantes



Rehabilitación sistema de acueducto Repelón



MUNICIPIO INUNDADO

Rehabilitación sistema de acueducto Repelón



Rehabilitación sistema de acueducto Repelón



Protección en Gavión de la Aducción Repelón

Rehabilitación sistema de acueducto Repelón



Instalación redes de Acueducto Repelón

Adecuación del carreteable de la aducción para el acueducto Ponedera - Sabanalarga.

Impacto

Garantizar acceso a la captación del acueducto regional de Sabanalarga para mantenimiento y operación



Inversión

1.709.907.704



Alcance

Adecuación de 18.980 m3 de terraplén



Beneficiados

79.912
Habitantes




Adecuación del carreteable de la aducción para el acueducto Ponedera - Sabanalarga.



GRUPO II

ACUEDUCTO – CAMPO DE LA CRUZ

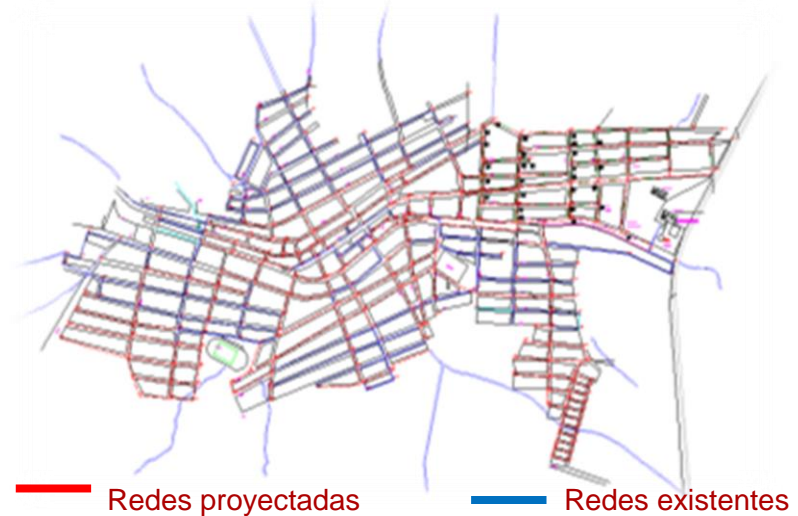

- Proyecto:** Rehabilitación y adecuación del sistema de acueducto de Campo de la Cruz y Bohórquez
- Inversión:** \$ 3.312 millones
- Beneficiarios:** 32.197
- Estado:** Terminado
- Impacto:** Rehabilitar el sistema de acueducto para garantizar la cobertura del 98%.

GRUPO II

ALCANTARILLADO – CAMPO DE LA CRUZ



- Proyecto:** Rehabilitación y adecuación del sistema de alcantarillado de Campo de la Cruz y Bohórquez
- Inversión:** \$ 12.826 millones
- Beneficiados:** 32.197
- Estado:** Terminado
- Impacto:** Rehabilitar la cuenca norte del sistema la cual se encontraba fuera de servicio con una cobertura del 42%. Instalar redes para aumentar la cobertura en la cuenca sur, alcanzando una cobertura total en el municipio de 95%.
Pendiente construcción EBAR para habilitar la cuenca sur.

GRUPO II

ALCANTARILALDO - CANDELARIA



Proyecto: Rehabilitación y adecuación del sistema de alcantarillado

Inversión: \$ 4.567 millones

Beneficiados: 16.939

Estado: Terminado

Impacto: Rehabilitar el sistema de alcantarillado para garantizar la cobertura del 96%.

— Redes proyectadas
— Redes existentes

GRUPO II

ACUEDUCTO – SANTA LUCIA

Antes



Después



Proyecto: Rehabilitación y adecuación del sistema de acueducto
Inversión: \$ 377 millones
Beneficiados: 11.686
Finaliza: 28/04/2014
Impacto: Rehabilitar y optimizar las redes existentes para alcanzar una cobertura del 99%.

GRUPO II

ALCANTARILLADO – SANTA LUCIA



Proyecto: Rehabilitación y adecuación del sistema de alcantarillado

Inversión: \$ 4.059 millones


Beneficiados: 11.686

Estado: Terminado

Impacto: Rehabilitar el sistema de alcantarillado para garantizar la cobertura del 95%. Pendiente segunda etapa que comprende habilitar la EBAR y hacer efectiva la cobertura hasta el 98%.

GRUPO II

ACUEDUCTO – SUAN

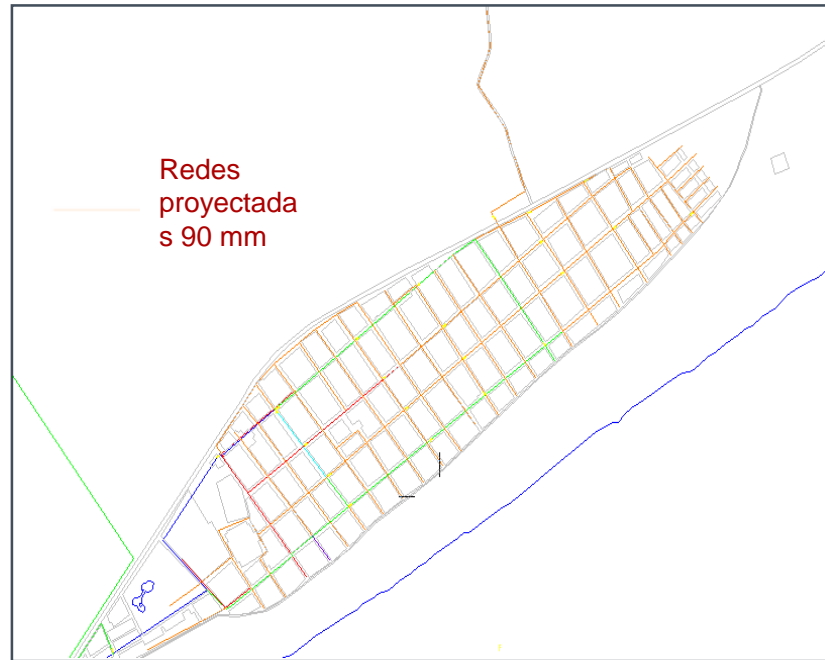

Proyecto:

Rehabilitación y adecuación del sistema de acueducto

Inversión: \$ 93 millones

Beneficiados: 12.977

Estado: Terminado

Impacto: Rehabilitar el sistema de acueducto para alcanzar el 99% en cobertura del servicio.

Alcance		
Descripción	Unidad	Cantidad Contratada
Instalación Tubería PEAD 90 mm	ml	94.00
Instalación de acometidas domiciliarias	und	13.00

GRUPO II

ALCANTARILLADO – SUAN



Proyecto:

Estación elevadora del
efluente del sistema de
tratamiento de aguas
residuales.

Inversión:

\$ 1.033 millones

Beneficiados: 12.977

Estado:

Terminado

Impacto:

Solución al vertimiento
final.

Vista general PTAP - Manatí



Fundida ultimo nivel de la base del tanque elevado - Manatí



PTAP - Luruaco



Barcaza - Luruaco




Barcaza - Repelón



**Instalación tubería de aducción -
Repelón**



**Instalación Conducción Campo –
Bohorquez**

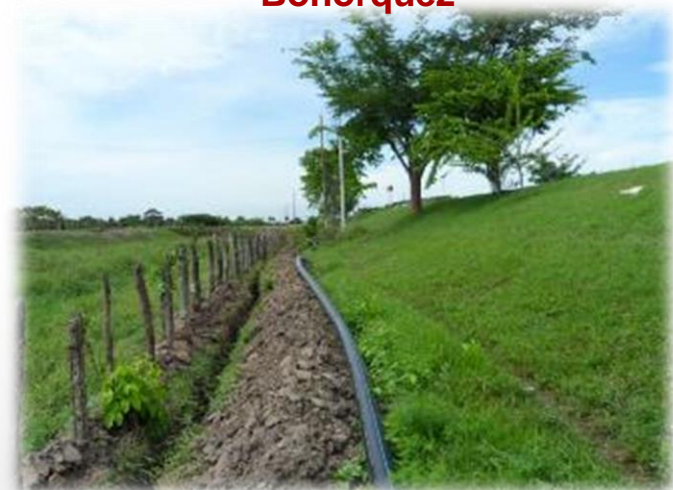

**Instalación redes de acueducto - Campo
de la Cruz**



GRUPO II. \$26.631 millones

MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ - BOHORQUEZ

\$16.185 millones

- REHABILITACION Y ADECUACION REDES DE ACUEDUCTO
- REHABILITACION Y ADECUACION REDES DE ALCANTARILLADO
- CONDUCCION AGUA POTABLE AL CORREGIMIENTO

MUNICIPIO DE CANDELARIA

\$4.426 millones

- REHABILITACION Y ADECUACION REDES DE ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

\$4.335 millones

- REHABILITACION Y ADECUACION REDES DE ACUEDUCTO
- REHABILITACION Y ADECUACION REDES DE ALCANTARILLADO
- EBAR URBANIZACION SANTA LUCIA

MUNICIPIO SUAN

\$1.123 millones

- REHABILITACION Y ADECUACION REDES DE ACUEDUCTO
- ESTACION ELEVADORA DEL EFLUENTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

MUNICIPIOS GRUPO II

\$360 millones

- REHABILITACION Y LIMPIEZA REDES REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DATOS GENERALES : CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA - GRUPO II.

	INTERVENTORIA	OBRA
No. CONTRATO	080 de 2012	090 de 2012
CONTRATISTA	Consorcio Interacueducto	Valorcon S.A.
REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Gutiérrez Visbal	Jaime Massard
SUPERVISOR FA	Lorena Ávila López	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 3.409.692.137	\$ 24.049.340.057
VALOR ACTUALIZADO	\$ 3.844.614.692	\$ 26.631.755.724
PLAZO INICIAL	14 meses	12 meses
PLAZO ACTUALIZADO	20 meses	16 meses y 15 días
FECHA DE CONTRATO	16 de agosto 2012	27 de agosto 2012
FECHA DE INICIO	4 de Septiembre de 2012	20 de septiembre de 2012
FECHA DE TERMINACION	3 de Mayo de 2014	3 de Febrero de 2014

Rehabilitación redes de acueducto campo de la Cruz y Bohórquez (incluye conducción Bohórquez)



Rehabilitación redes de acueducto Campo de la Cruz y Bohorquez (incluye conducción Bohorquez)

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Impacto

Rehabilitó el 99% de redes
para una cobertura del 98%



Inversión

3.119.871.696



Alcance

28.052 ml
redes de acueducto
11.100 mts
Conducción - Bohorquez



Beneficiados


19.500
Habitantes



Fondo
Adaptación



Rehabilitación redes de acueducto Campo de la Cruz y Bohórquez (incluye conducción Bohórquez)

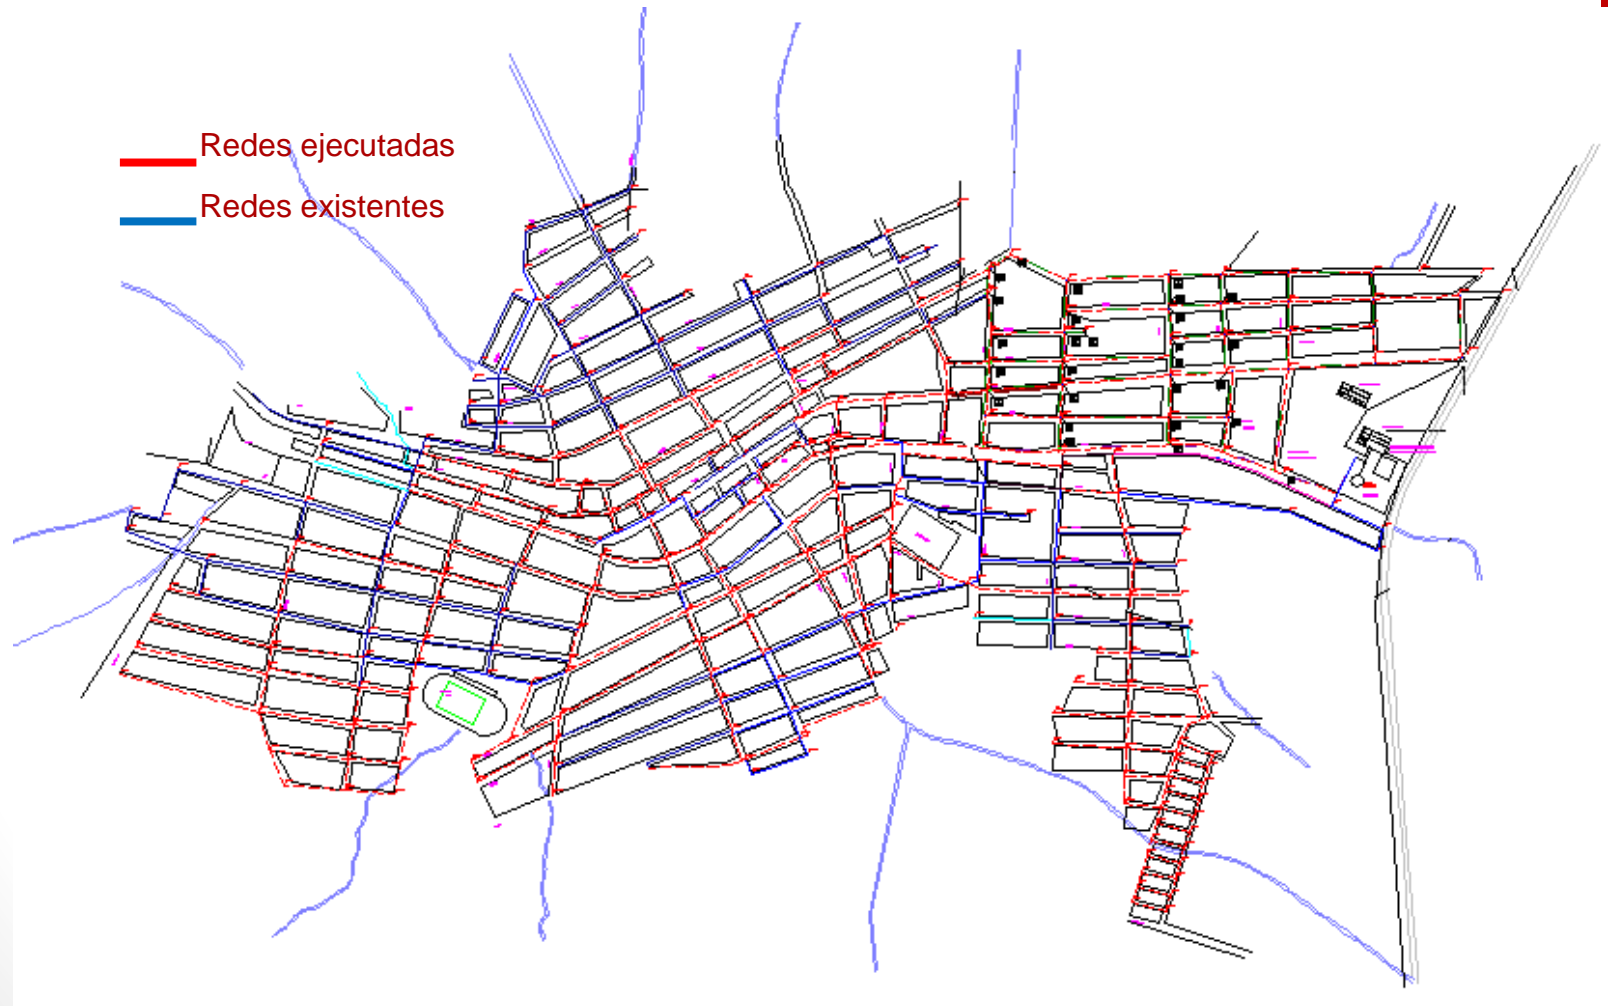

Rehabilitación redes de acueducto campo de la Cruz y Bohórquez (incluye conducción Bohórquez)



Instalación Redes de acueducto – Campo de la Cruz

Rehabilitación redes de acueducto campo de la Cruz y Bohórquez (incluye conducción Bohórquez)



Rehabilitación y ampliación redes de alcantarillado Campo de la Cruz y Bohorquez

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Impacto

Aumento cobertura
cuenca norte del 42%
al 95% para entrar en
funcionamiento

Aumento cobertura
cuenca sur del 50% al 95%,
pendiente EBAR para su funcionamiento



Inversión

13.065.870.399

Alcance

43.137 ml de redes
564 Pozos de Inspección
1.737 acometidas



Beneficiados

15.385
Habitantes

Fondo
Adaptación



Rehabilitación y ampliación redes de alcantarillado Campo de la Cruz y Bohórquez



Rehabilitación y adecuación del sistema de alcantarillado Campo de la Cruz



Instalación Colector Campo de la Cruz

Rehabilitación y ampliación redes de alcantarillado Candelaria



Municipio Candelaria durante la Inundación

Rehabilitación y ampliación redes de alcantarillado Candelaria

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Impacto

**Aumento
de cobertura
del 40% al 98%**



Inversión

4.626.684.546



Alcance

**15.258 ml de redes
655 acometidas**



Beneficiados


8.546
Habitantes



Fondo
Adaptación



Rehabilitación y ampliación redes de alcantarillado Candelaria

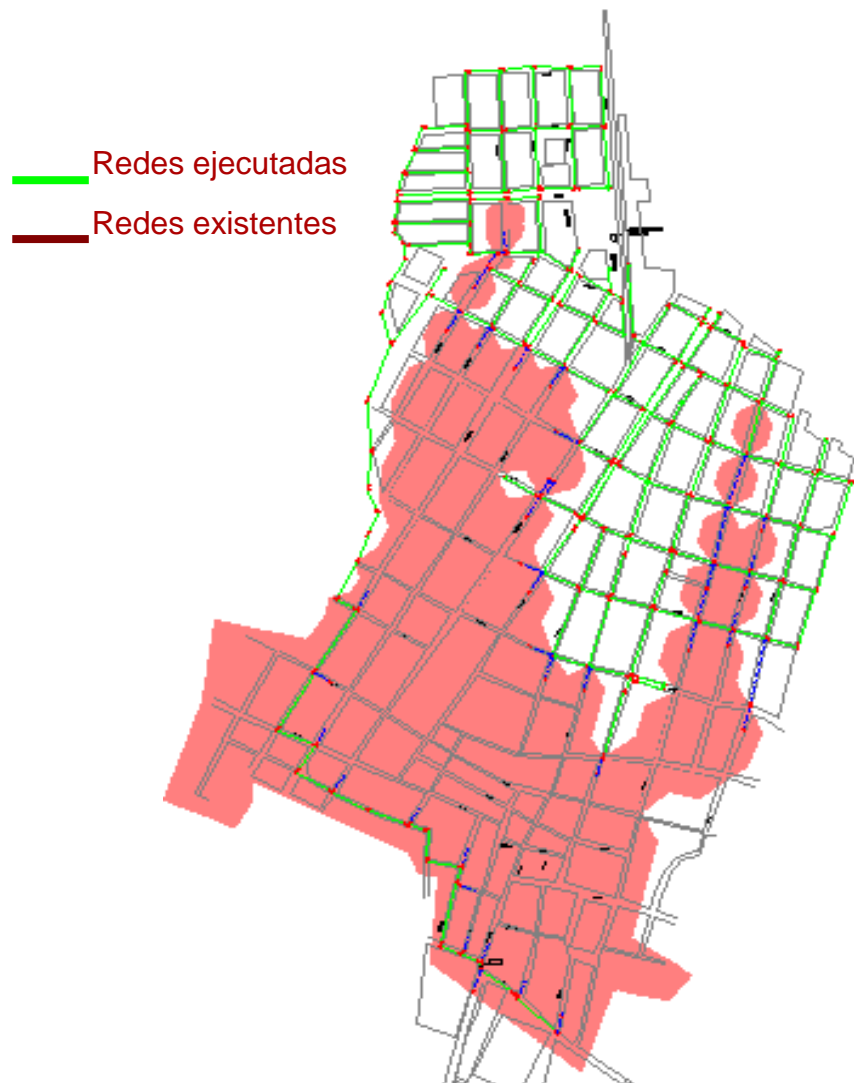

Rehabilitación y ampliación redes de alcantarillado Candelaria



Instalación de tubería de Alcantarillado

Rehabilitación y ampliación redes de alcantarillado Candelaria



Excavación para instalación colector

Rehabilitación redes de Acueducto Santa Lucia

ACUEDUCTO



Rehabilitación redes de Acueducto Santa Lucia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Impacto
Se rehabilitó el 15%
de las redes



Inversión
362.979.557



Alcance
2.364 ml de redes



Beneficiados
11.686
Habitantes



**Fondo
Adaptación**



.....

Rehabilitación y ampliación redes de alcantarillado Santa Lucia (Incluye EBAR)

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Impacto

**Aumento de cobertura
del 80% al 95%,
pendiente EBAR
para hacer efectiva
la cobertura del 98%**



Inversión

3.972.592.141



Alcance

**10.444 ml de redes
86 Pozos de Inspección
379 acometidas**



Beneficiados

11.686
Habitantes



**Fondo
Adaptación**



Rehabilitación y ampliación redes de alcantarillado Santa Lucia (Incluye EBAR)





MAY 22 2013

Rehabilitación redes de Acueducto Suan



INUNDACION ALREDEDOR DE SUAN

Rehabilitación redes de Acueducto Suan

Impacto

Cobertura 99%
Sectorización del sistema



Inversión

93.099.089



Alcance

94 ml de redes



Beneficiados

8.977
Habitantes



Estacion elevadora aguas residuales (EBAR)

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Impacto

Solución vertimiento final



Inversión

1.030.281.893



Alcance

2.150 ml de redes
Construcción EBAR



Beneficiados


8.977
Habitantes



Fondo
Adaptación



Estación elevadora aguas residuales (EBAR)

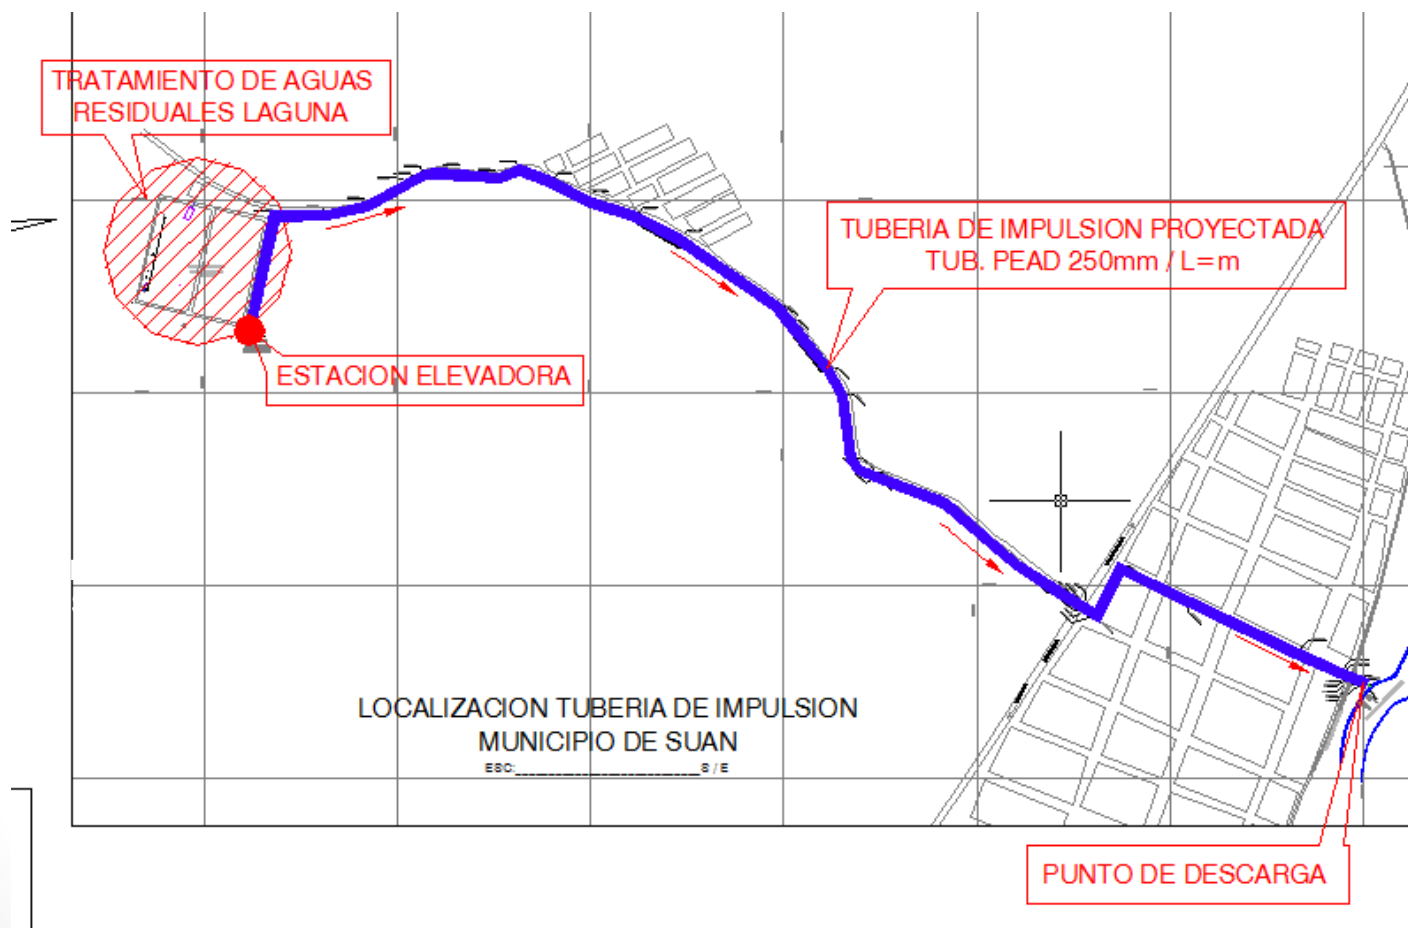

Estación elevadora aguas residuales (EBAR)



EBAR Suan

Estación elevadora aguas residuales (EBAR)



Caseta eléctrica EBAR Suan

GRUPO III

PROYECTOS CONTRATADOS EN 2014 Y CON INICIO EJECUCIÓN EN MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE SUAN
\$ 1.264 Millones

- REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.
- CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO (2 PROYECTOS)

MUNICIPIO SANTA LUCIA -
CORREGIMIENTO DE ALGODONAL
\$569 Millones

- CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO.
- INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION (1 PROYECTO)

MUNICIPIO SABANALARGA -
CORREGIMIENTO DE AGUADA DE
\$1.723 Millones

- CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO.
- INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION (1 PROYECTO)

MUNICIPIO SABANALARGA -
CORREGIMIENTO DE LA PEÑA
\$ 1.932 Millones

- CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO.
- INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION (1 PROYECTO)

MUNICIPIO DE CANDELARIA Y
CORREGIMIENTO DE LEÑA
\$4.310 Millones.

- CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO LEÑA.
- CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO CANDELARIA.
- INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION (3 PROYECTOS)

MUNICIPIO DE REPELON
\$ 8.710 Millones

- INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO.
- CONSTRUCCION DE POZOS Y REGISTROS DOMICILIARIOS.(1 PROYECTO)

2. Proyecto Nacional – obras de acueducto Pereira



Intervención canal abierto, aducción – nuevo Libaré



Intervención canal (box culvert) – nuevo Libaré



Obras externas de estabilización – canal



Manejo de aguas superficiales - canal
